




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


sábado 19 de abril de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-49
Central P. del Tigre	-2
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.284
C. Baygorria	2.123
C. Palmar	7.905
C. Salto Grande	17.244
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	1.721
TOTAL Generación	32.217

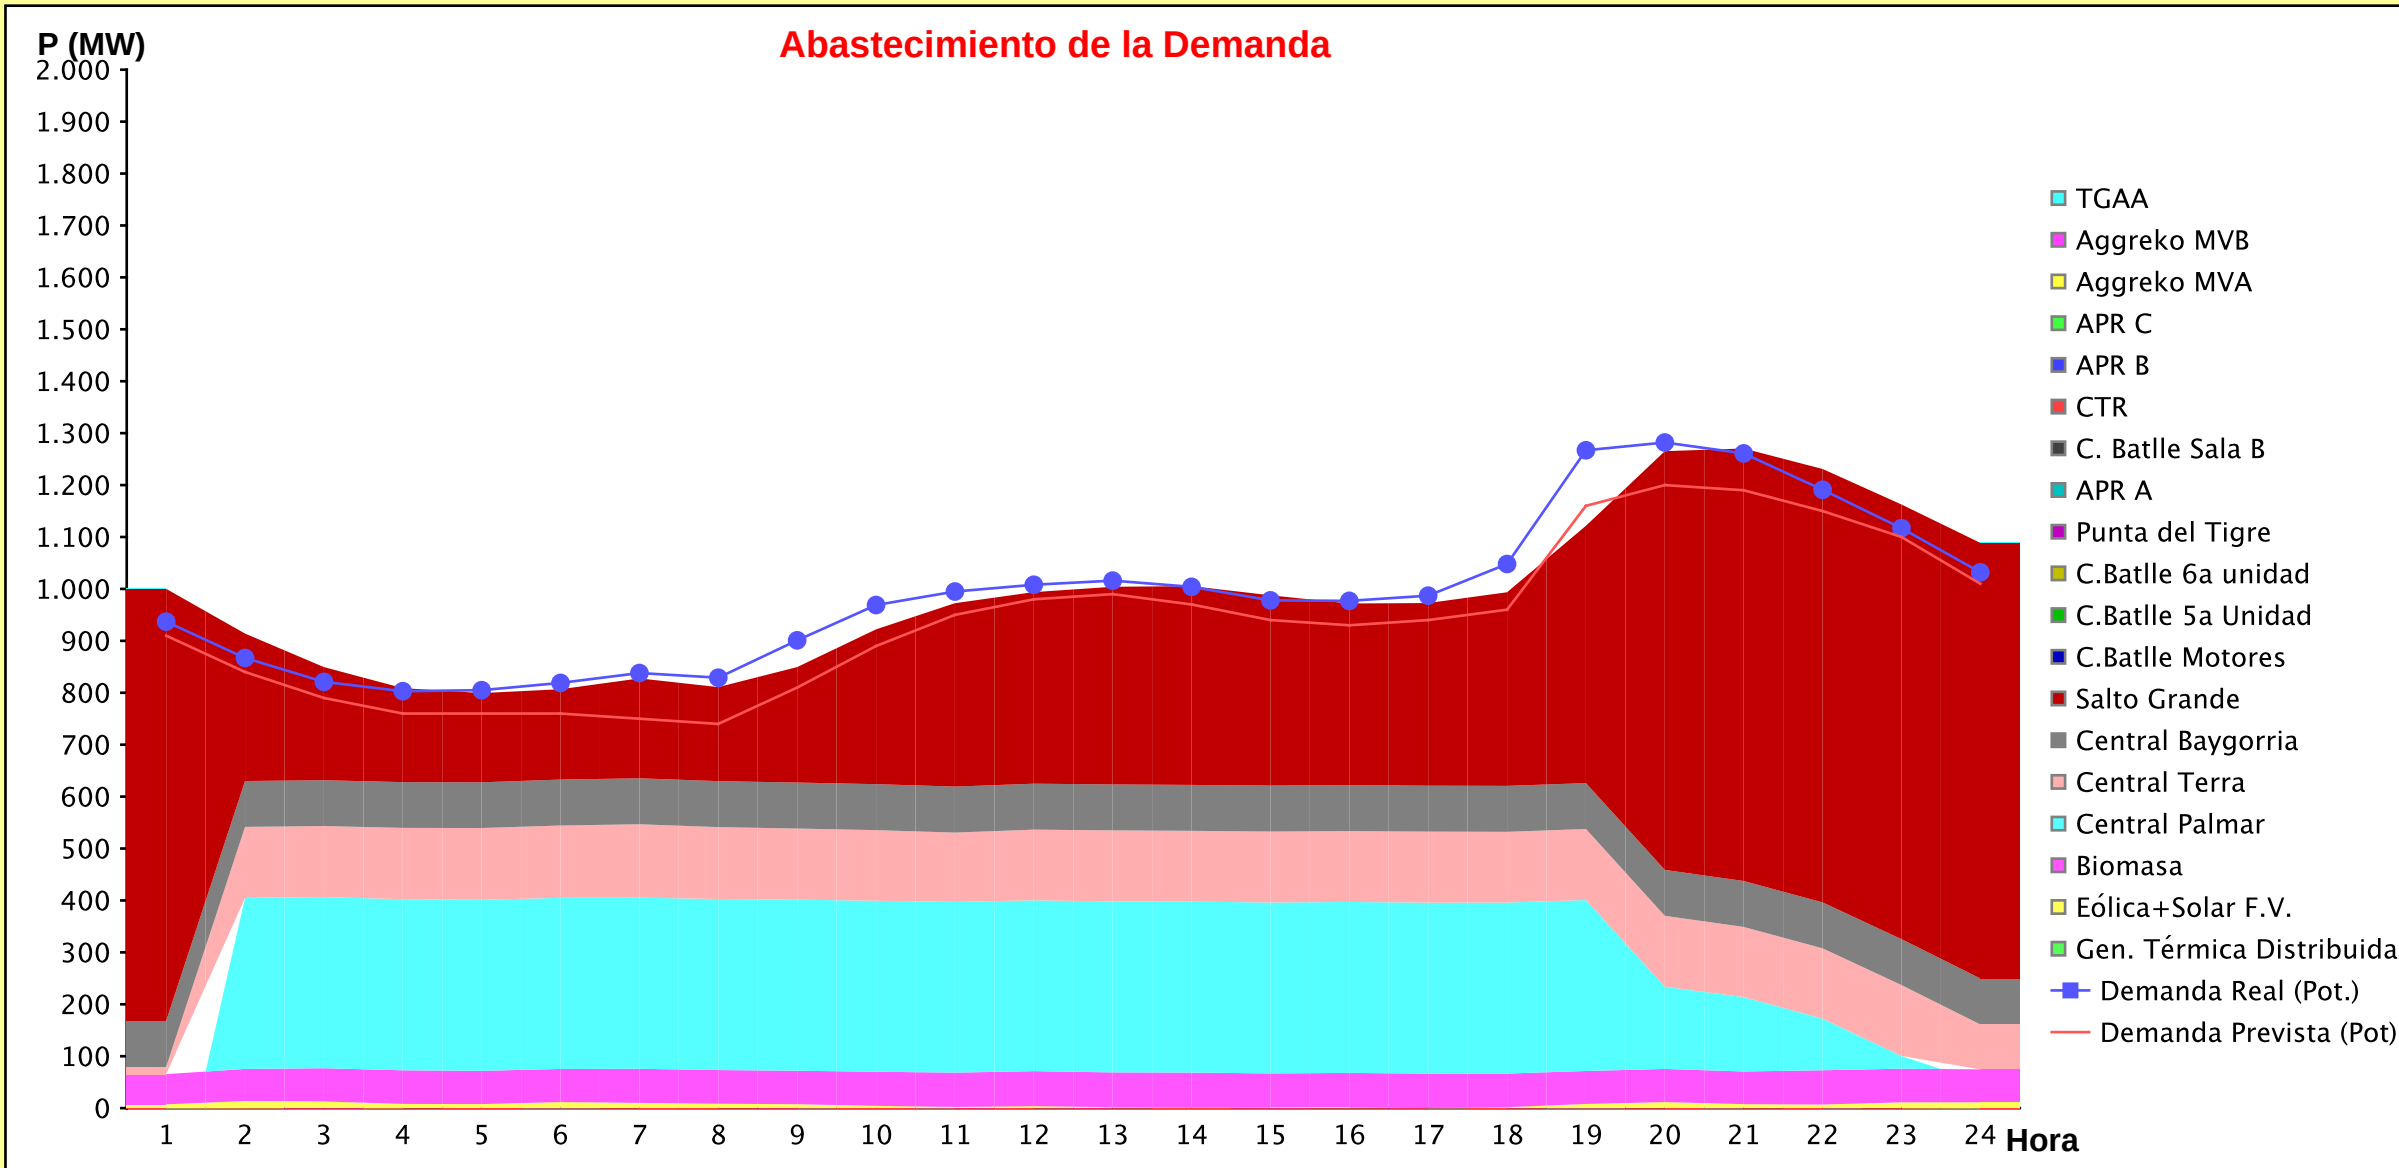




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	8.641
Hidráulica	8.641
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	8.641

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.576
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	22.480
Diferencia (MWh)	1.096
Ejecutada - Programada	4,87 %

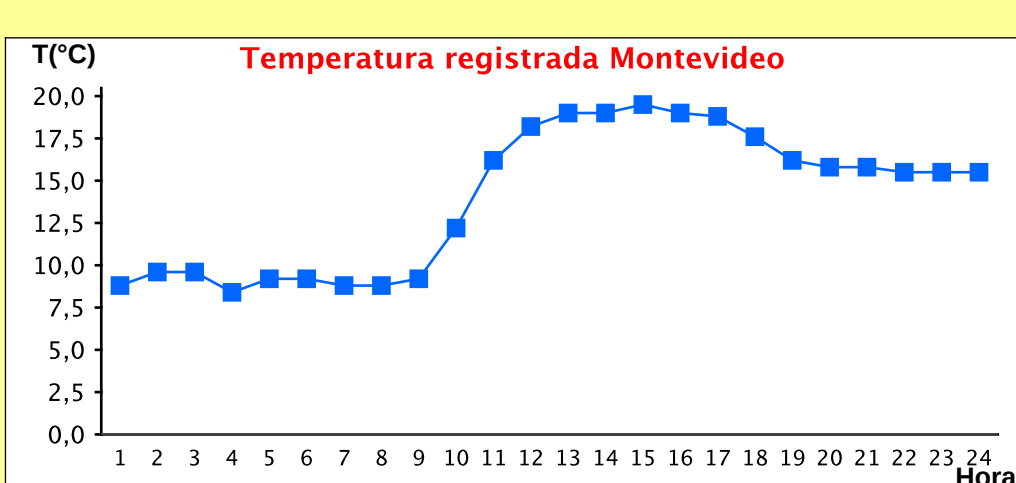



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1021,18 Hora 12:52
Potencia mínima:	800,77 Hora 07:17
Pico noche:	1290,9 Hora 19:54

Generación Media (MW)	
Eólica	7,2
Biomasa	69,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

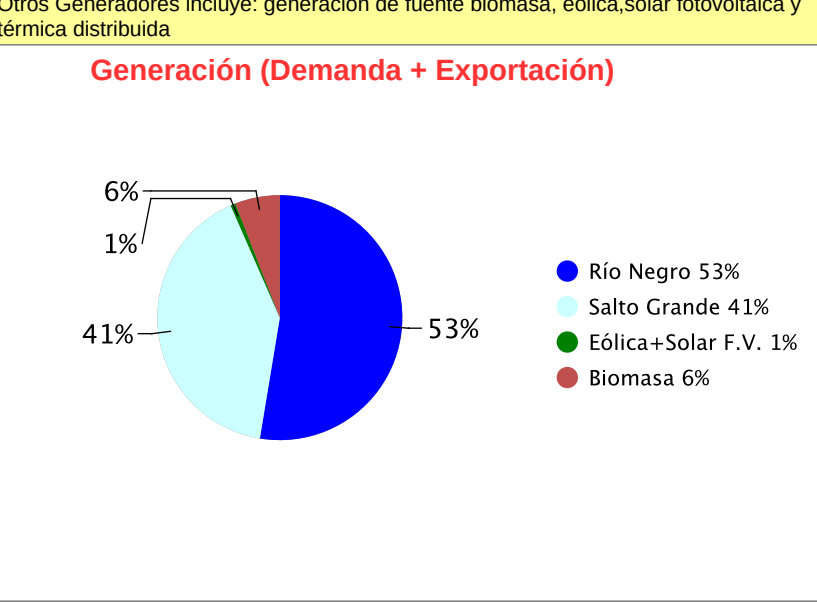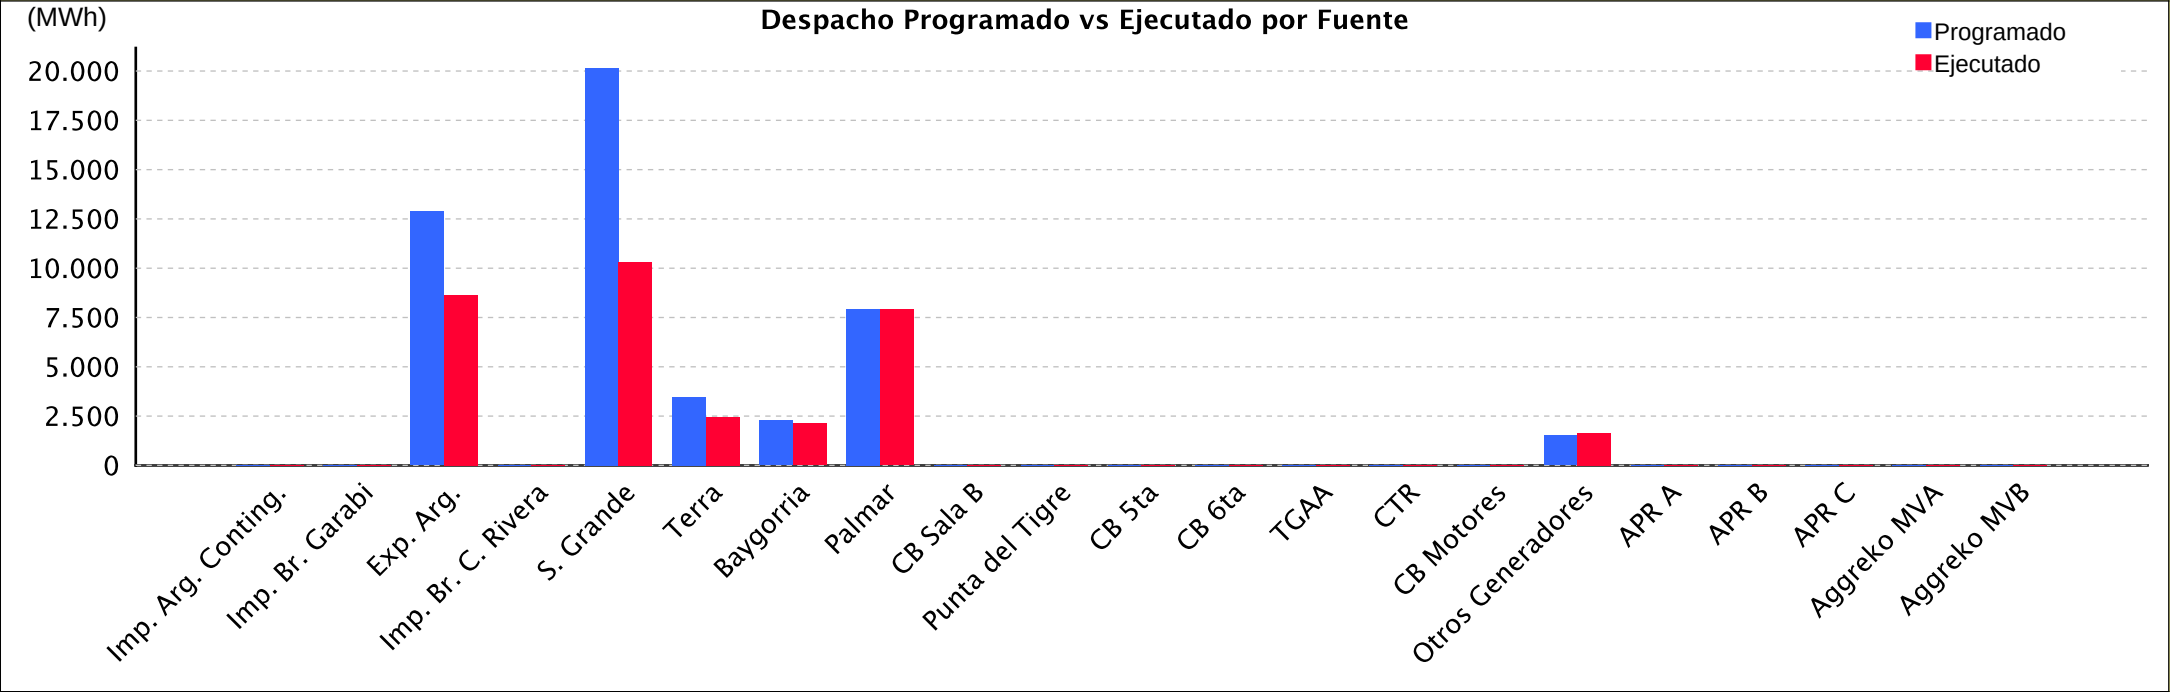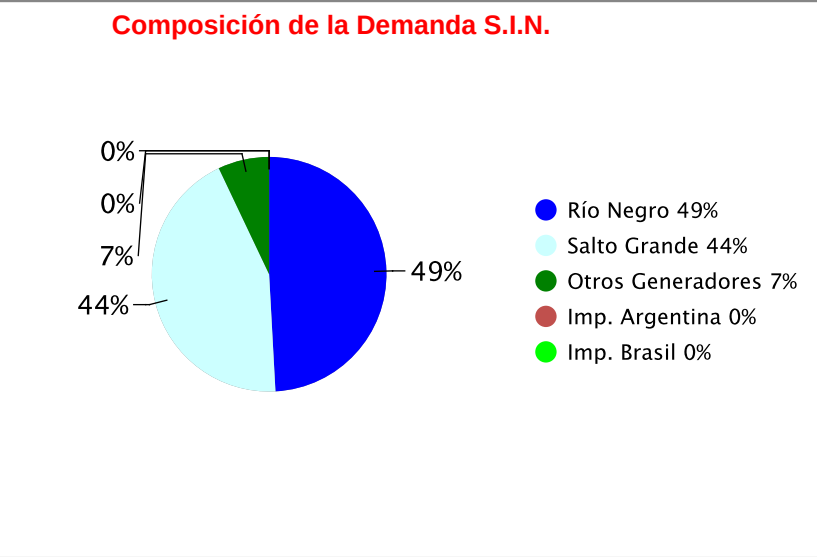



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

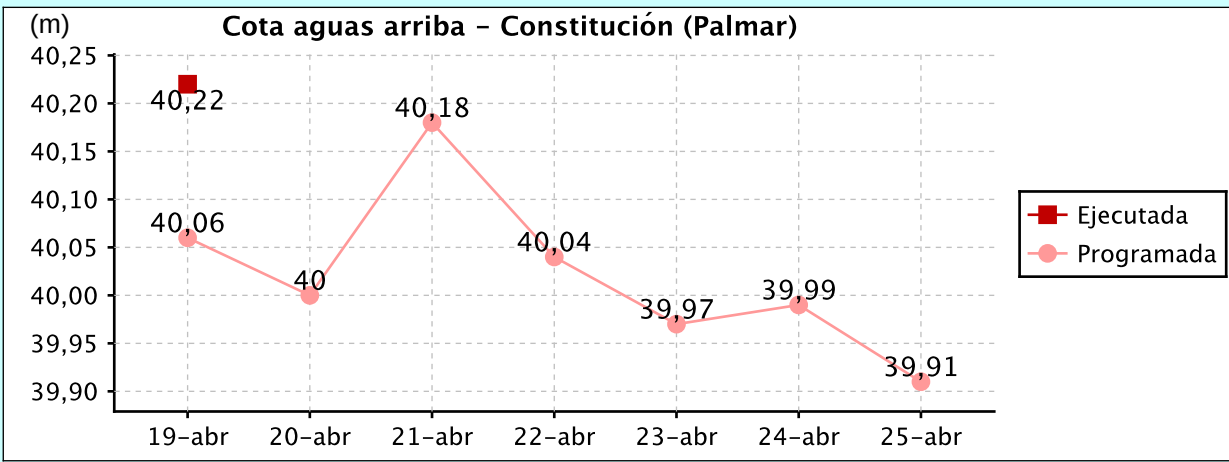
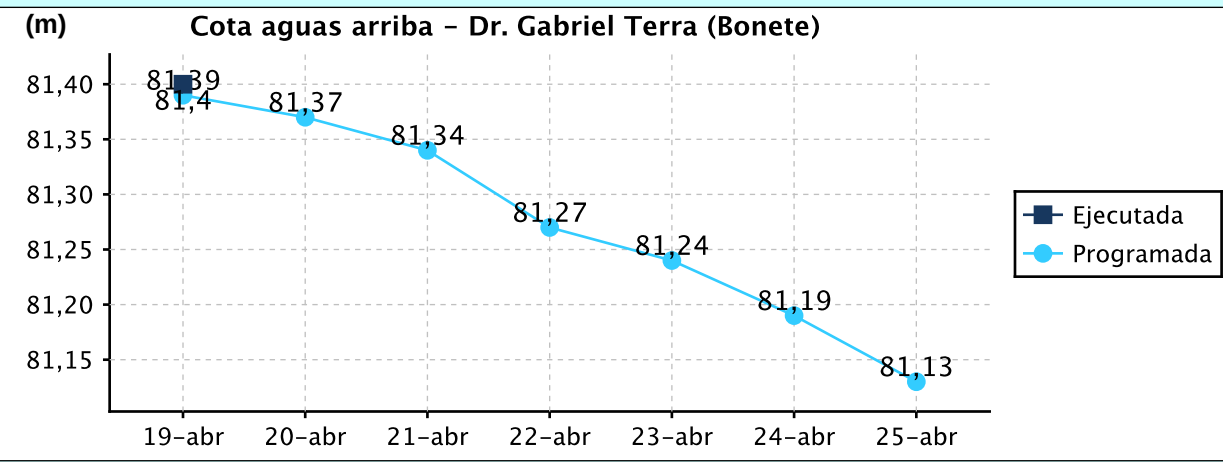


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,39	81,4
Baygorria	54,13	54,19
Palmar	40,06	40,22
SGU	35,45	35,65

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

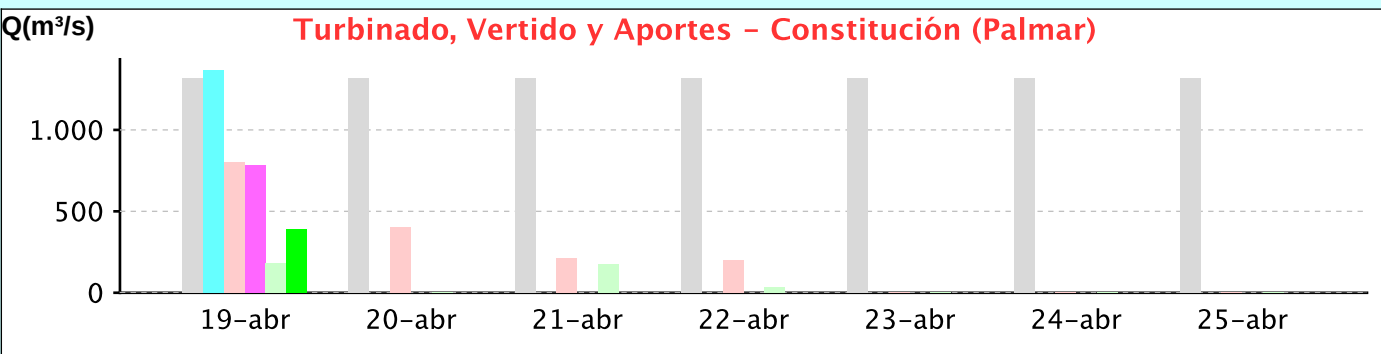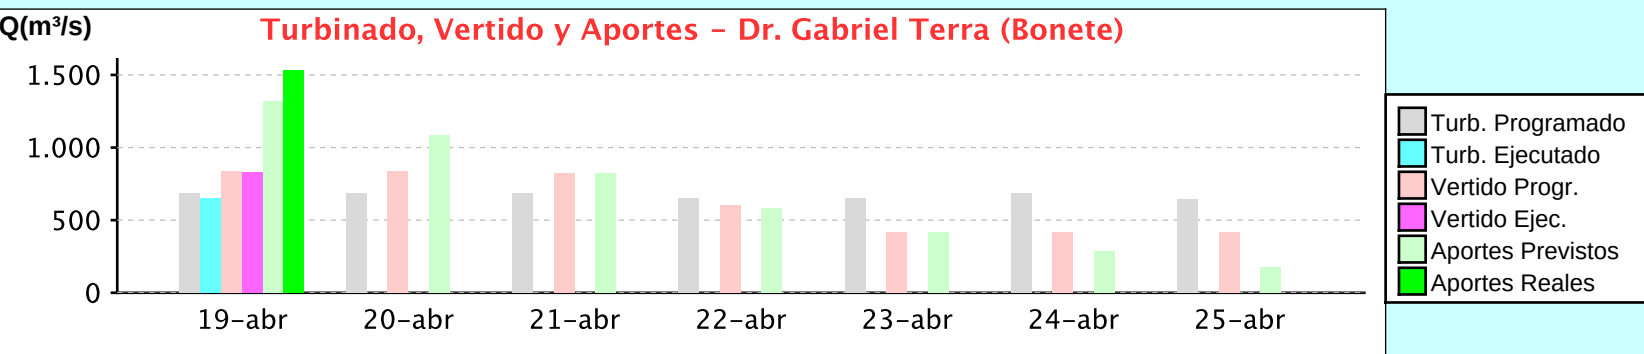

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

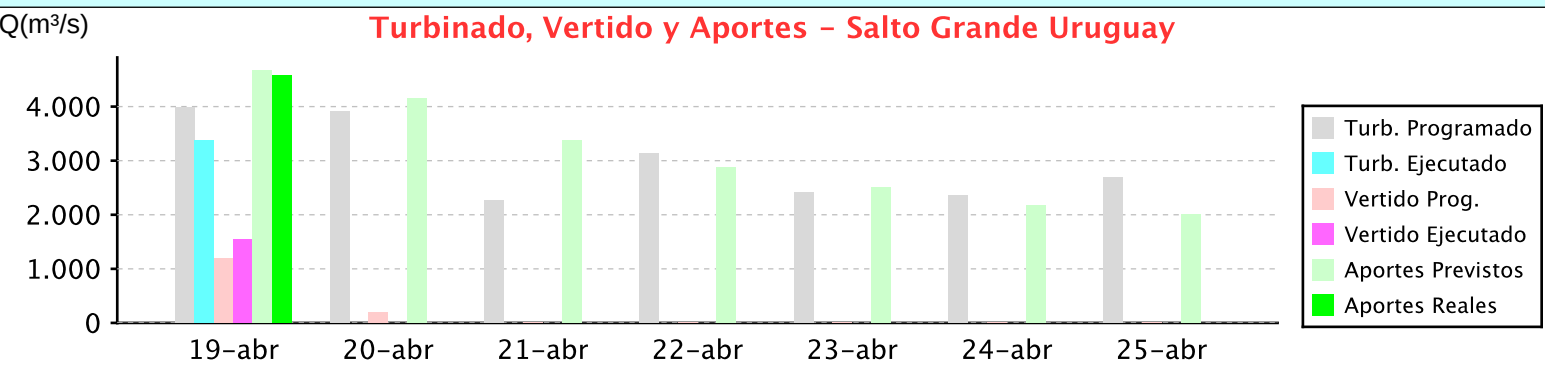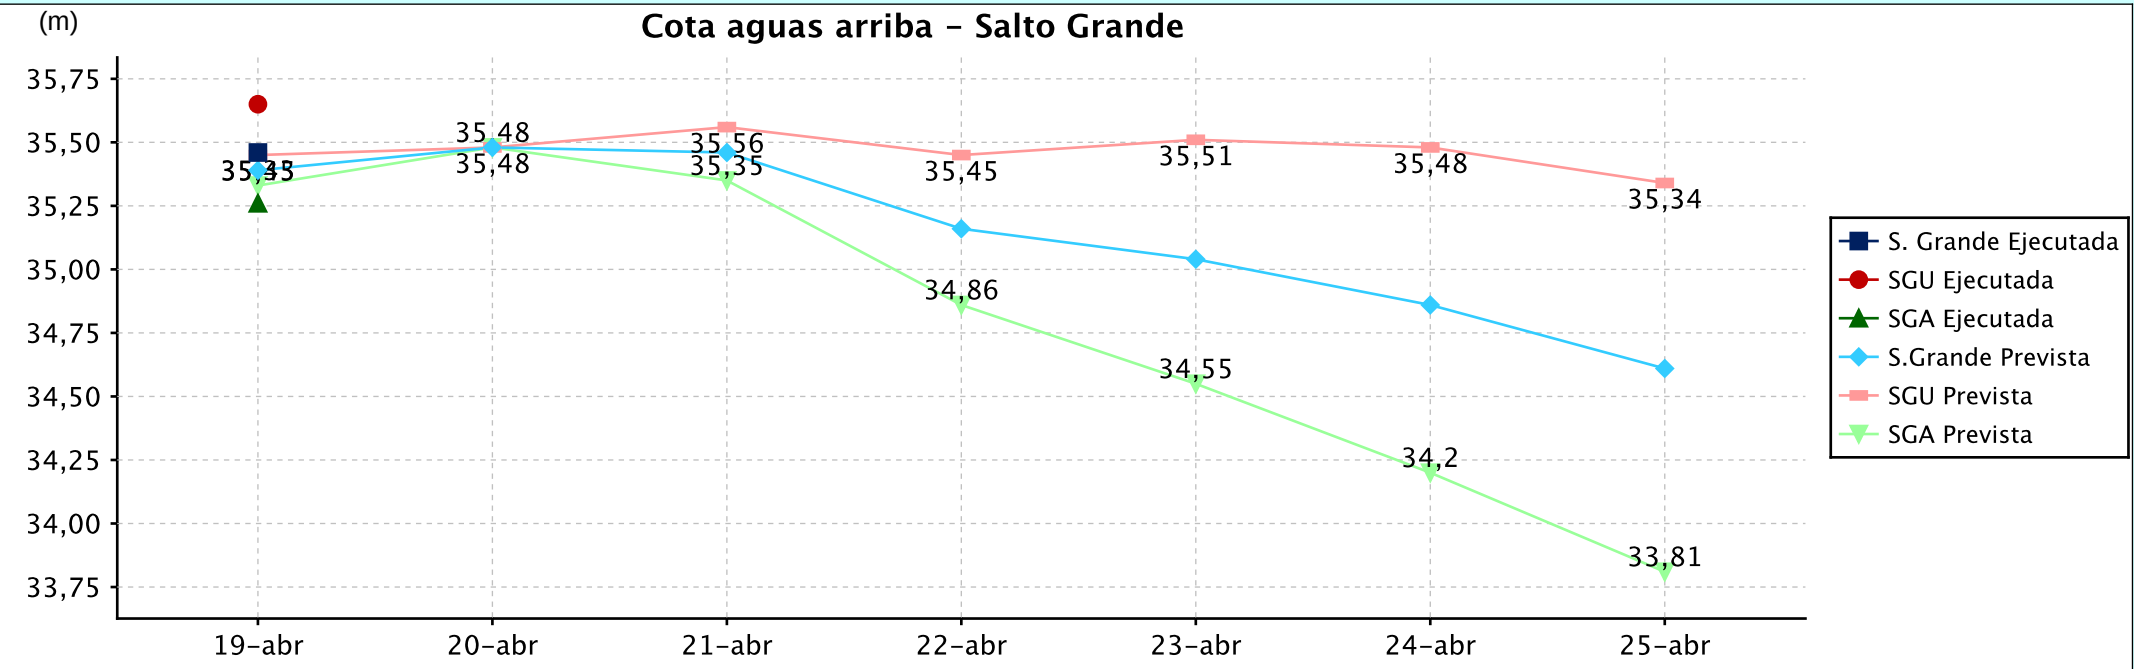

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,65
Cota Vista Arg	35,26
Cota real	35,46

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	9.463
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	650
Baygorria	754	808
Palmar	1.319	1.365
SGU	3.980	3.382

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.320	1.531
Baygorria		116
Palmar	184	391
SGU	4.675	4.578

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	840	826
Baygorria	720	834
Palmar	800	782
SGU	1.200	1.541

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
