




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 20 de abril de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-48
Central P. del Tigre	-2
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.274
C. Baygorria	2.125
C. Palmar	7.902
C. Salto Grande	16.596
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	1.744
TOTAL Generación	31.582

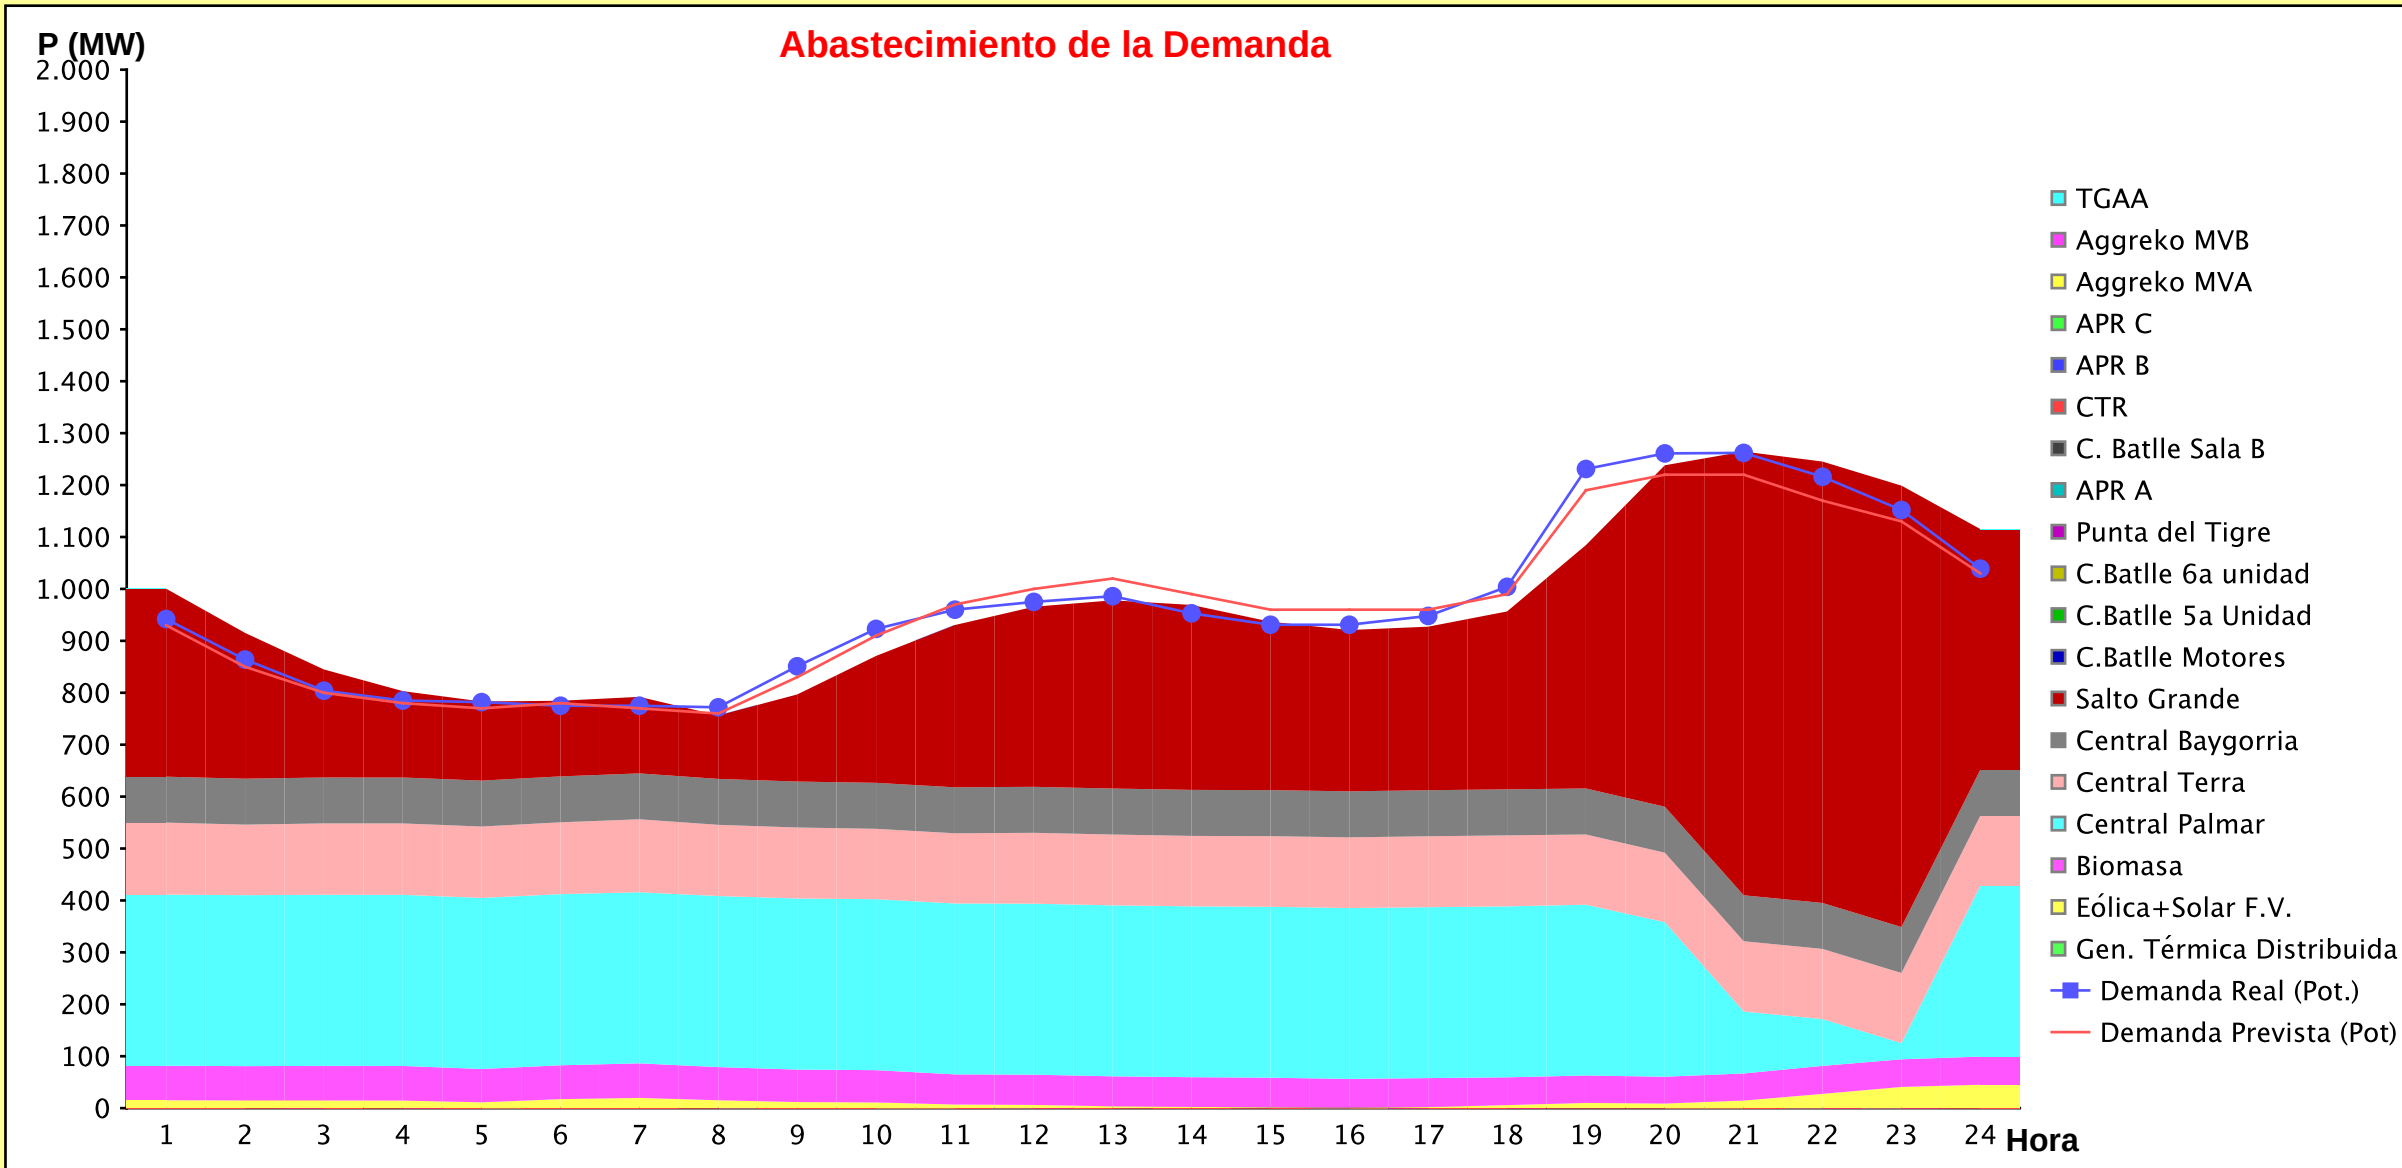

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	8.561
Hidráulica	8.561
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	8.561



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.021
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	22.990
Diferencia (MWh)	31
Ejecutada - Programada	0,14 %

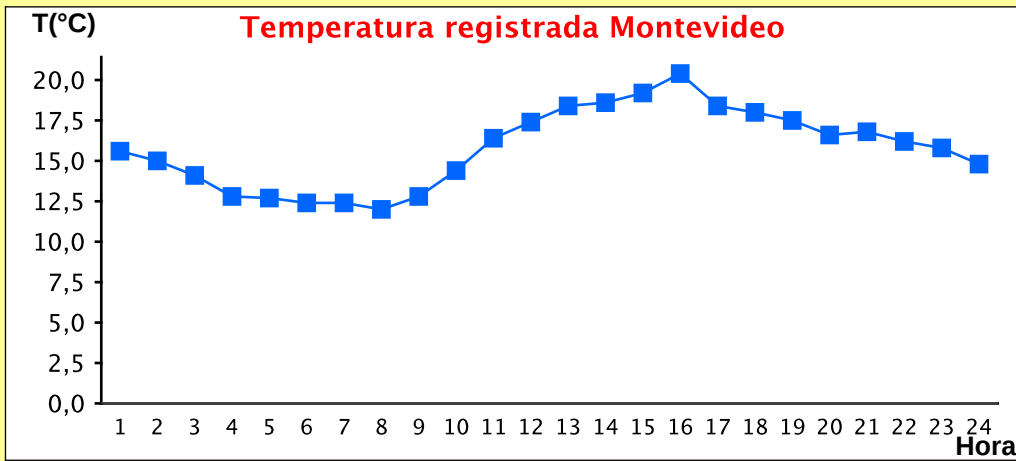


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	989,61 Hora 12:27
Potencia mínima:	731,3 Hora 07:29
Pico noche:	1279,64 Hora 20:30

Generación Media (MW)	
Eólica	13,6
Biomasa	64,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

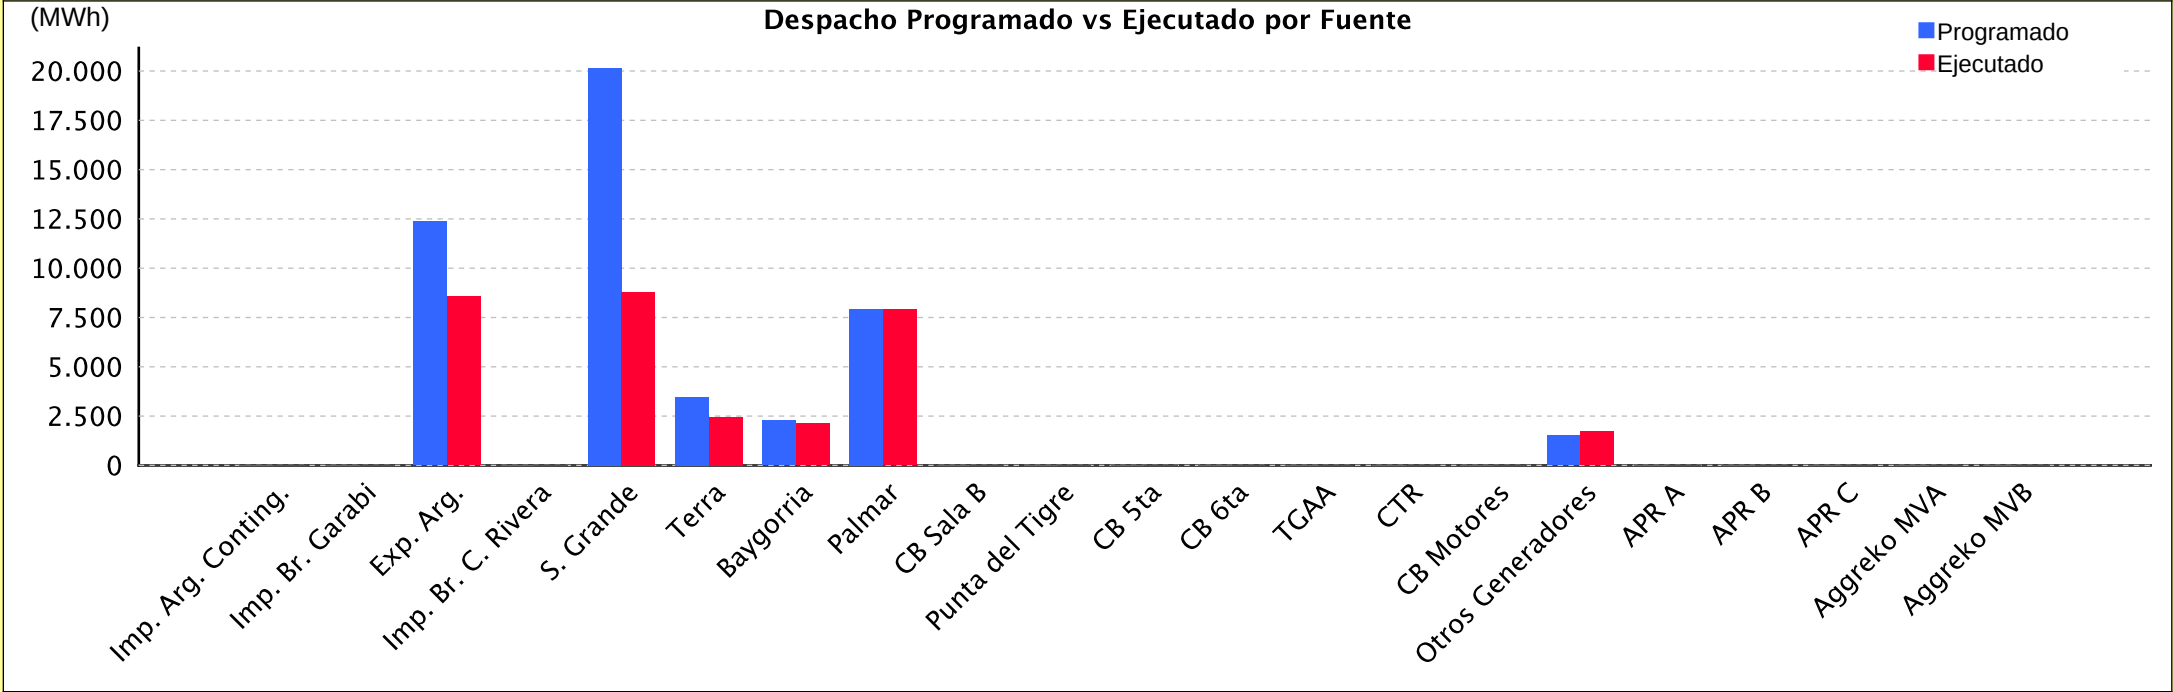
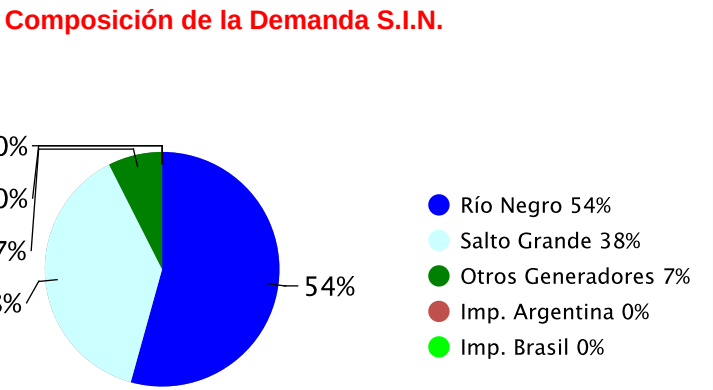


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

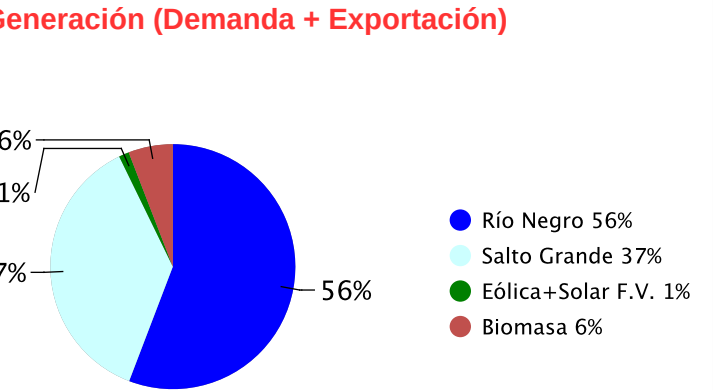



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

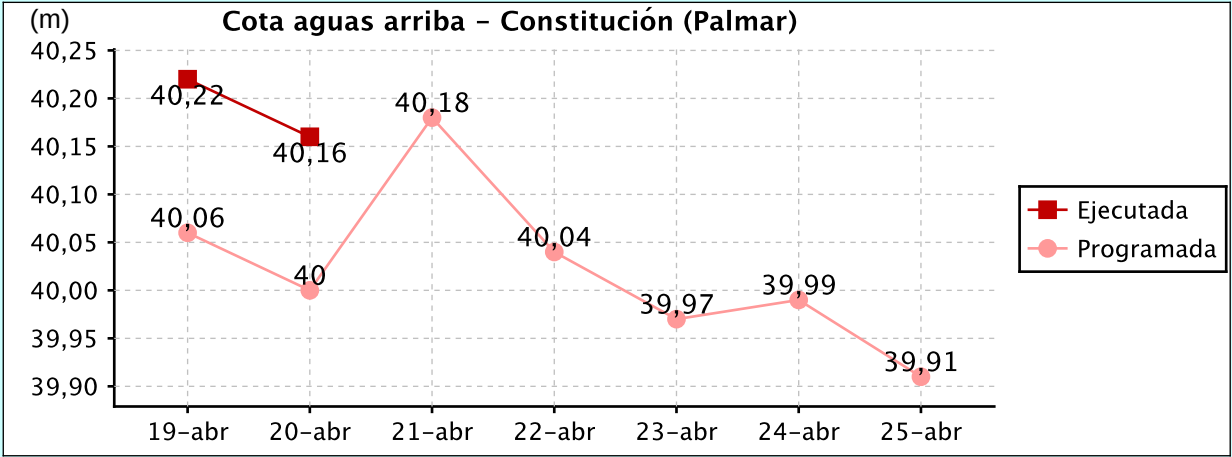
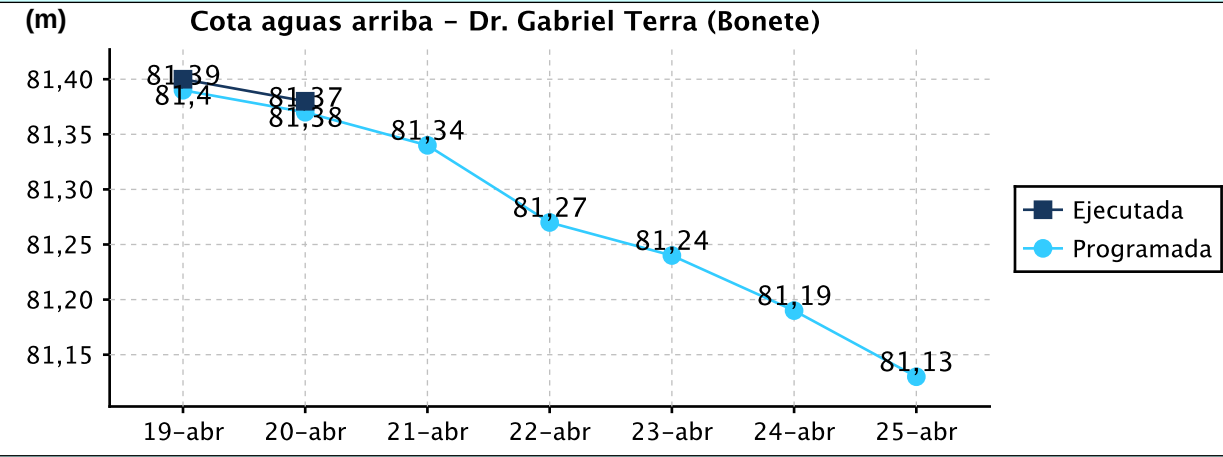


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,37	81,38
Baygorria	54,14	54,13
Palmar	40,00	40,16
SGU	35,48	35,65

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

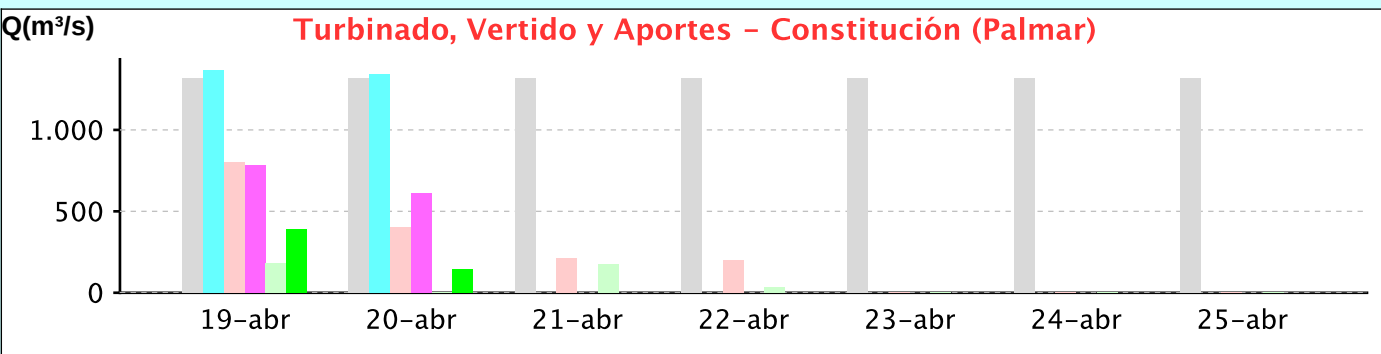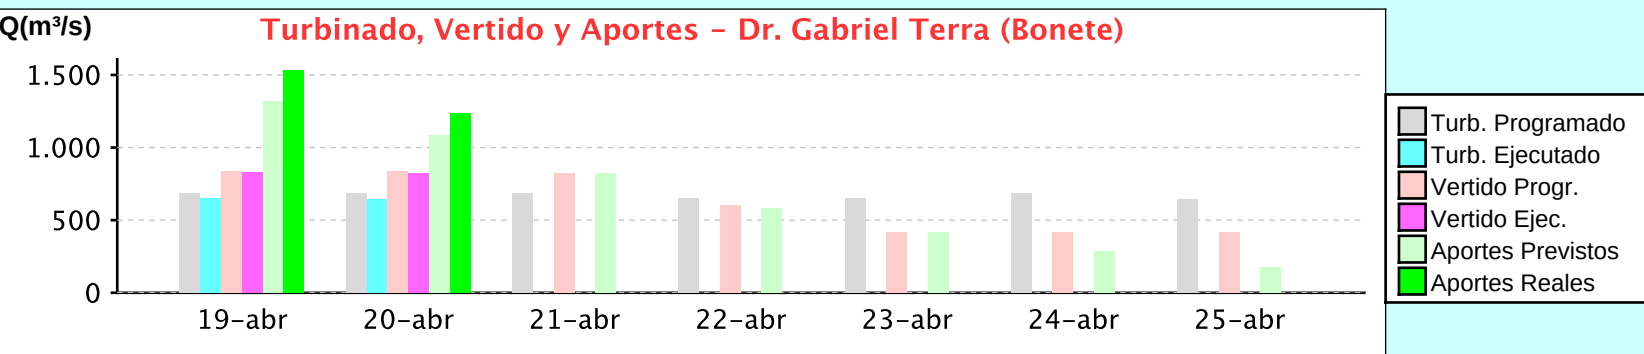

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

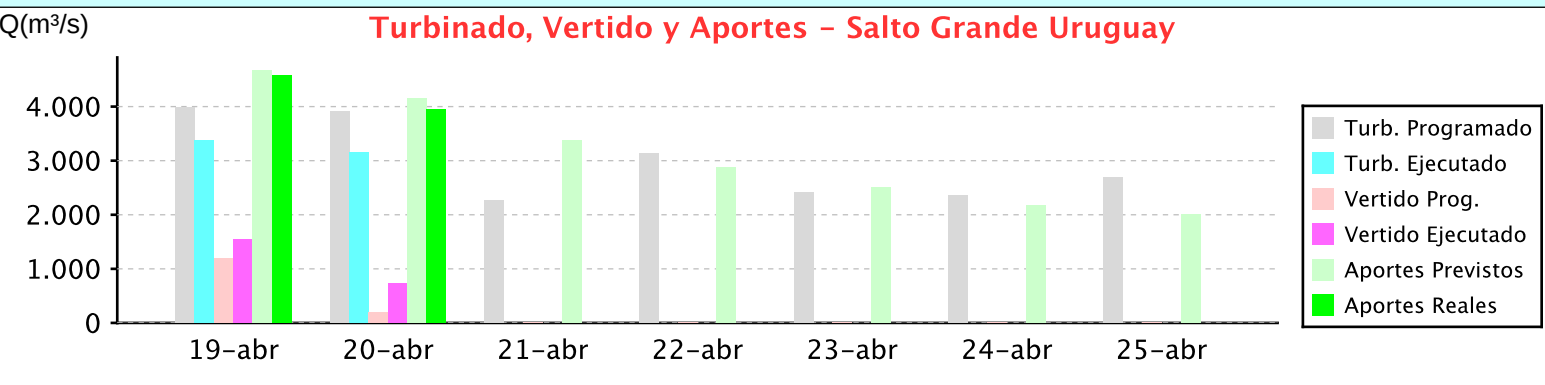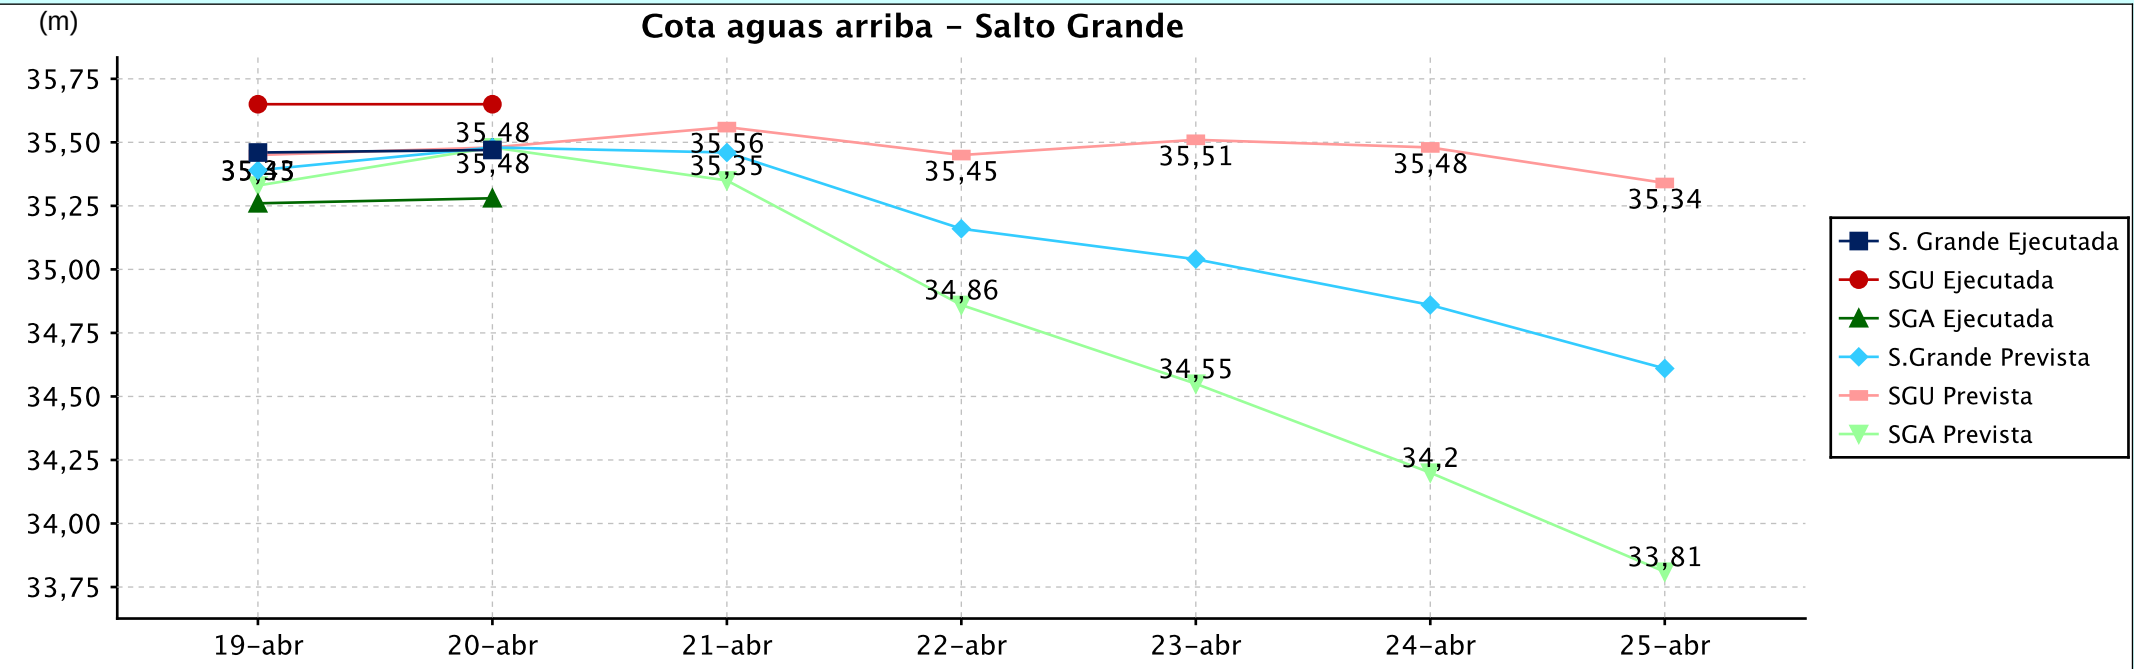

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,65
Cota Vista Arg	35,28
Cota real	35,47
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
9.290	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	645
Baygorria	754	808
Palmar	1.319	1.344
SGU	3.905	3.147

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.081	1.235
Baygorria		97
Palmar	6	142
SGU	4.160	3.944

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	840	825
Baygorria	720	831
Palmar	400	612
SGU	200	724

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
