




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


sábado 26 de abril de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-47
Central P. del Tigre	-2
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.379
C. Baygorria	2.278
C. Palmar	7.892
C. Salto Grande	10.155
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.906
TOTAL Generación	26.551



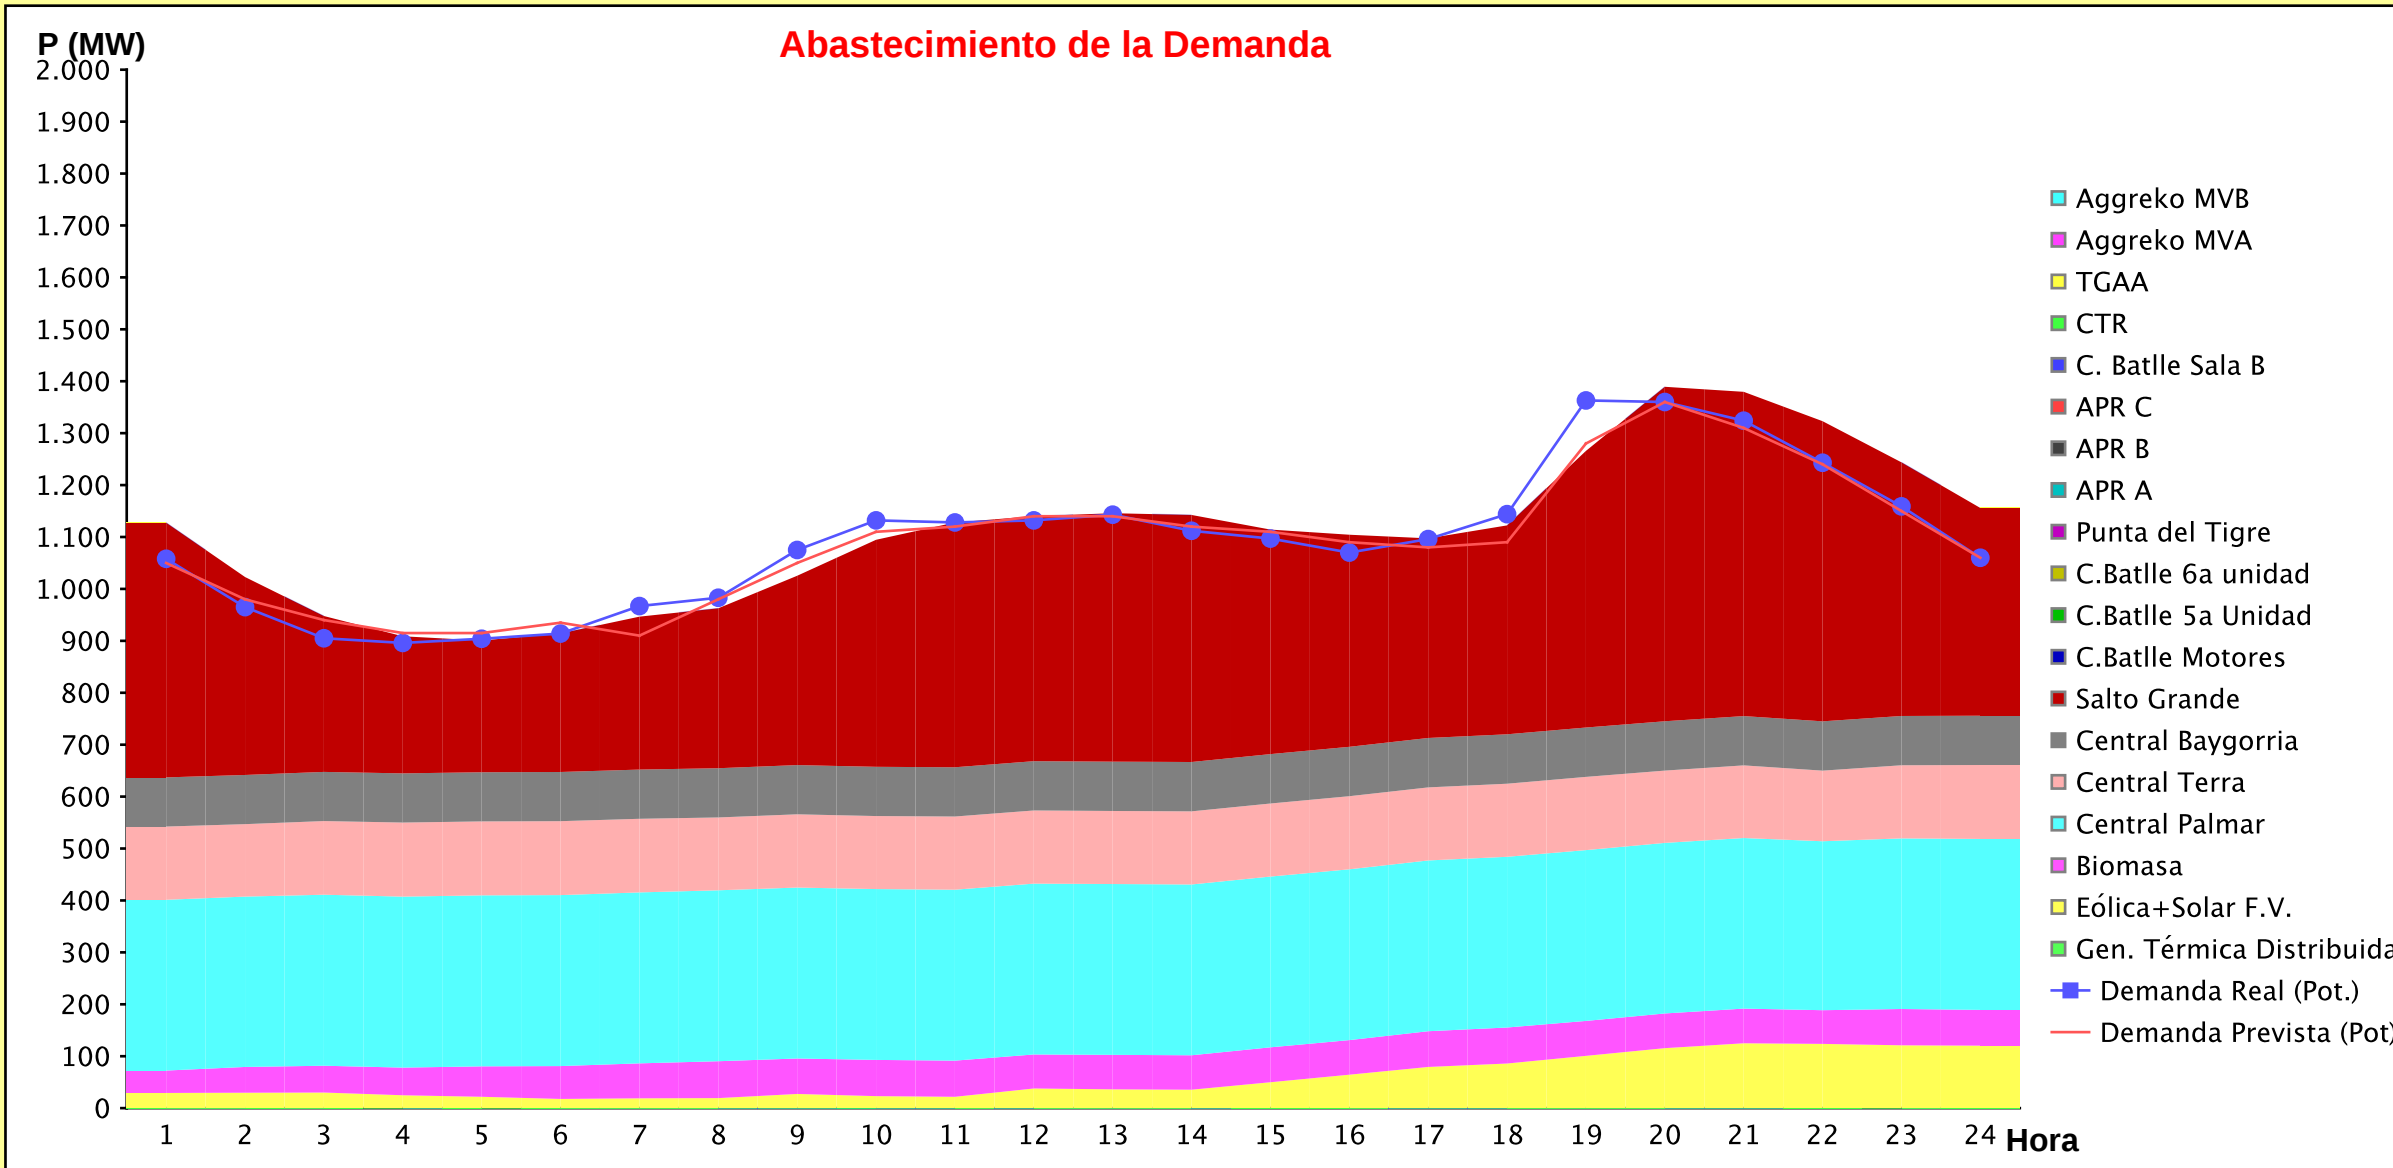


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.551
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	26.075
Diferencia (MWh)	476
Ejecutada - Programada	1,83 %


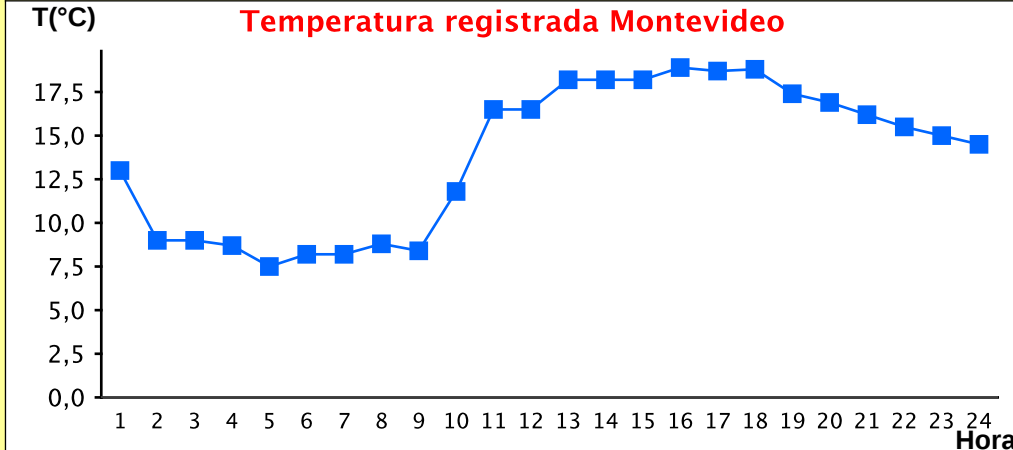


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1154,22 Hora 12:44
Potencia mínima:	882,11 Hora 04:44
Pico noche:	1374,46 Hora 19:08
Generación Media (MW)	
Eólica	57,0
Biomasa	72,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

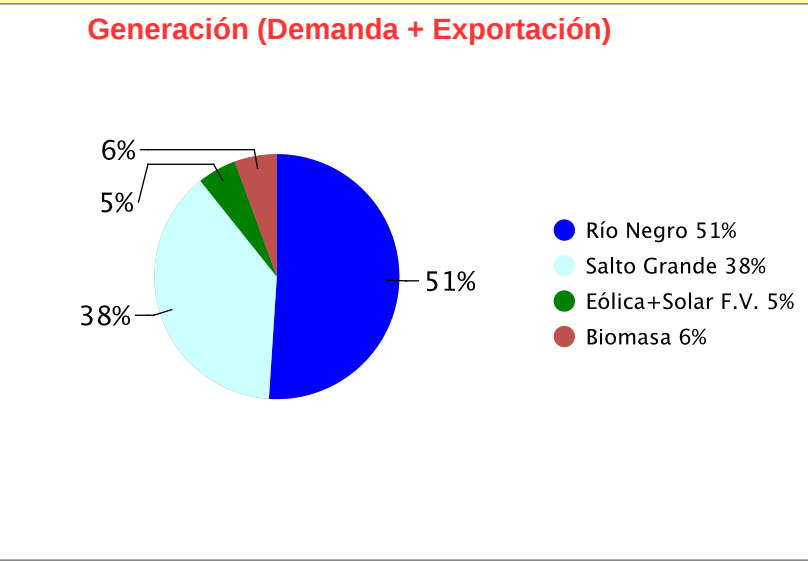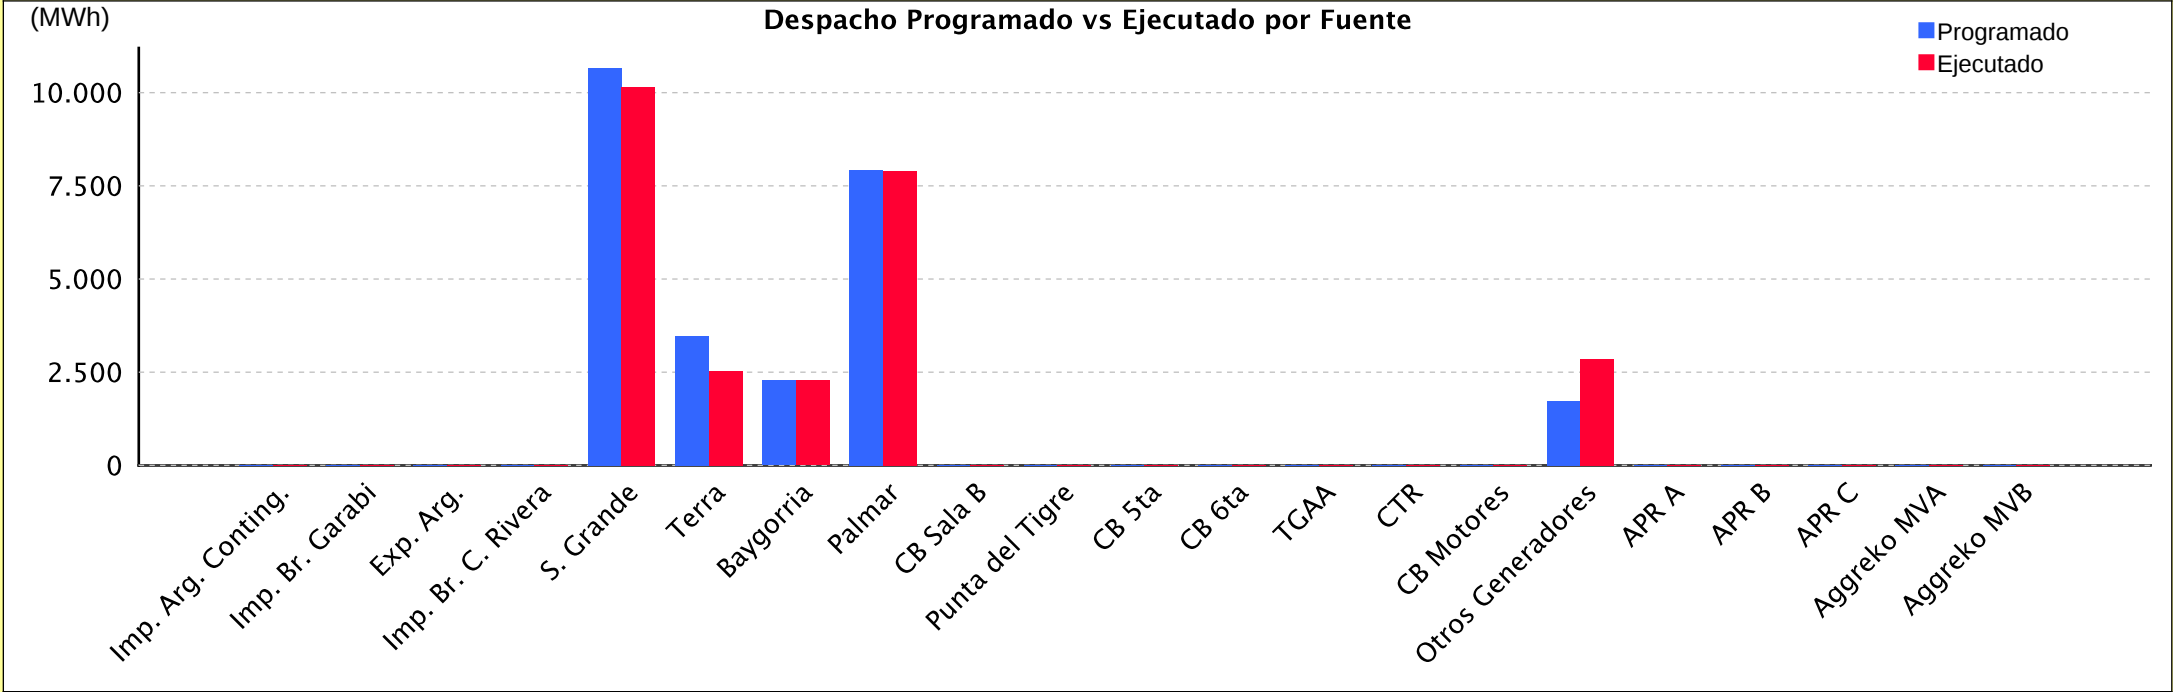
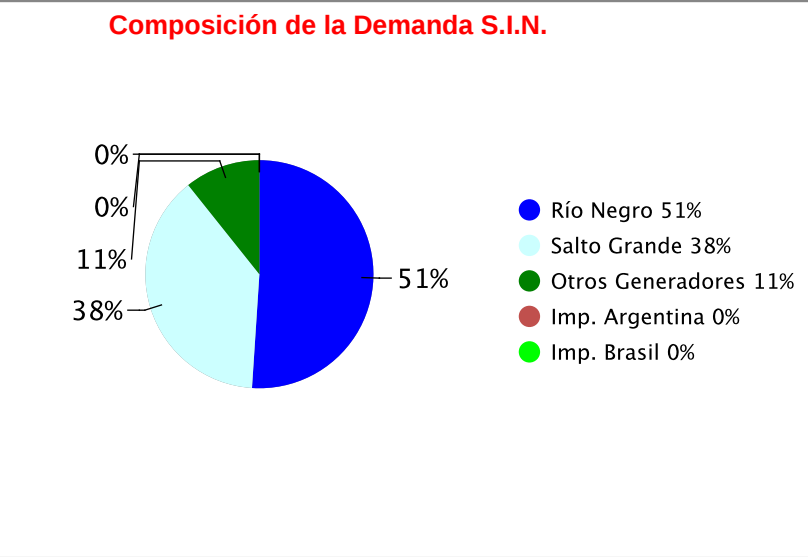


EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

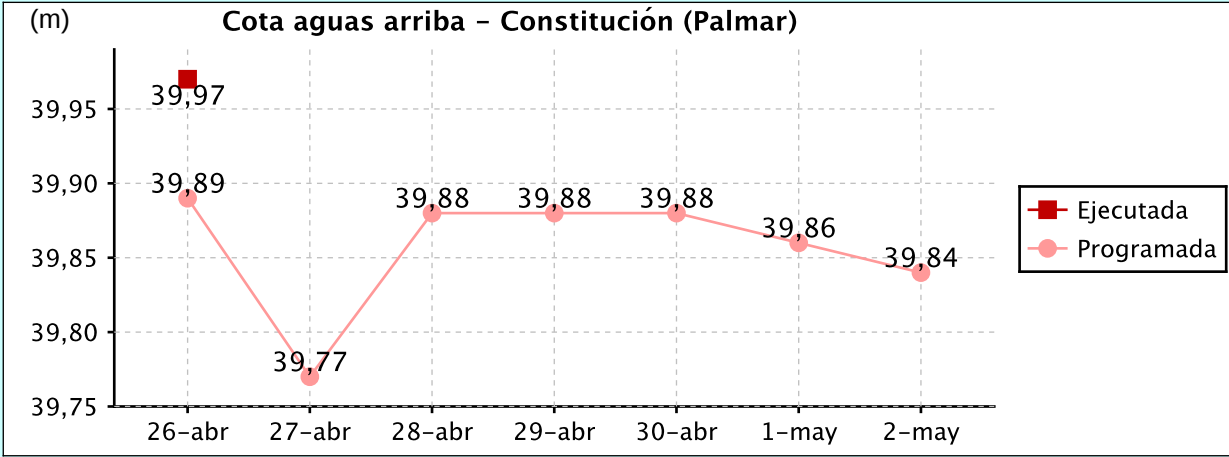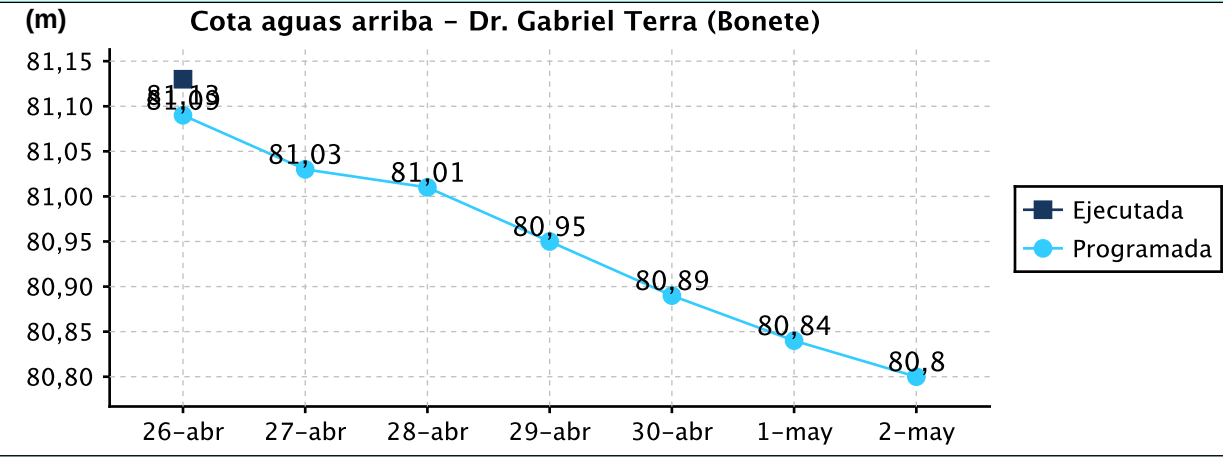

COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,09	81,13
Baygorria	54,04	54,07
Palmar	39,89	39,97
SGU	35,18	35,22
Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

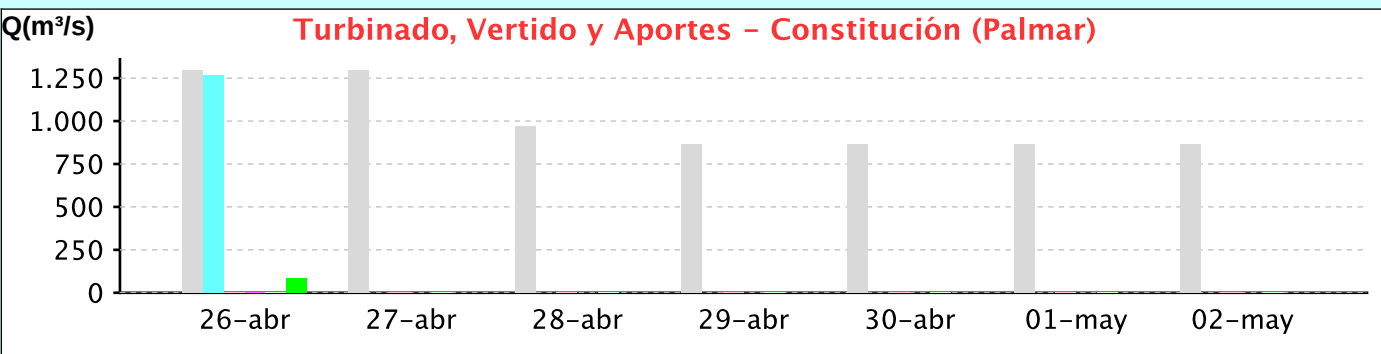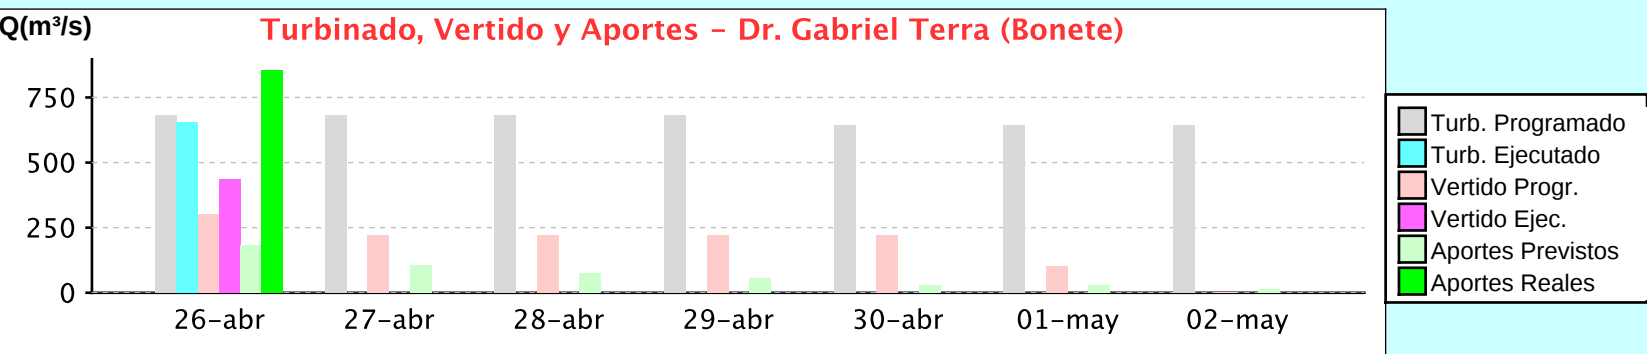

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

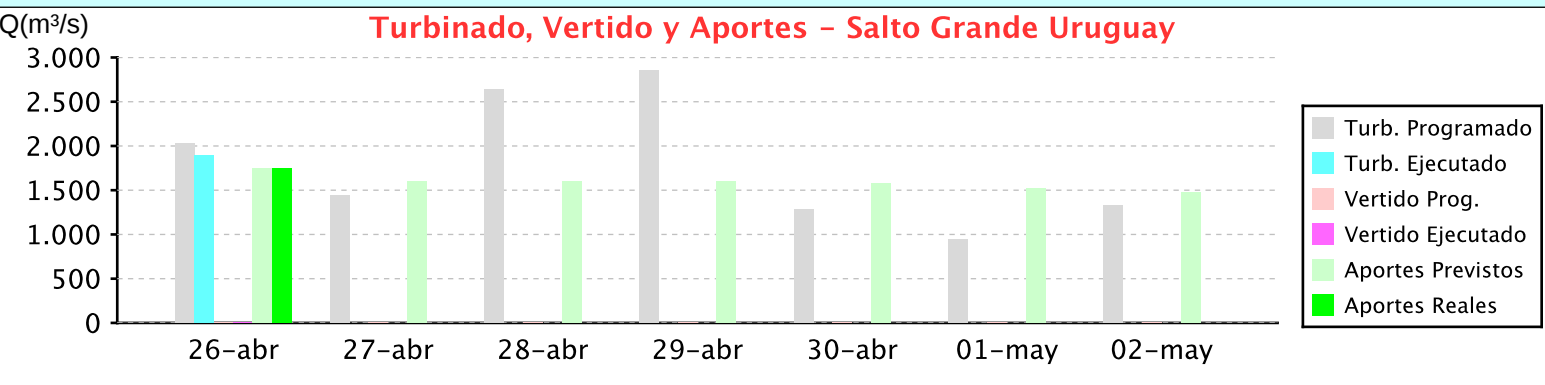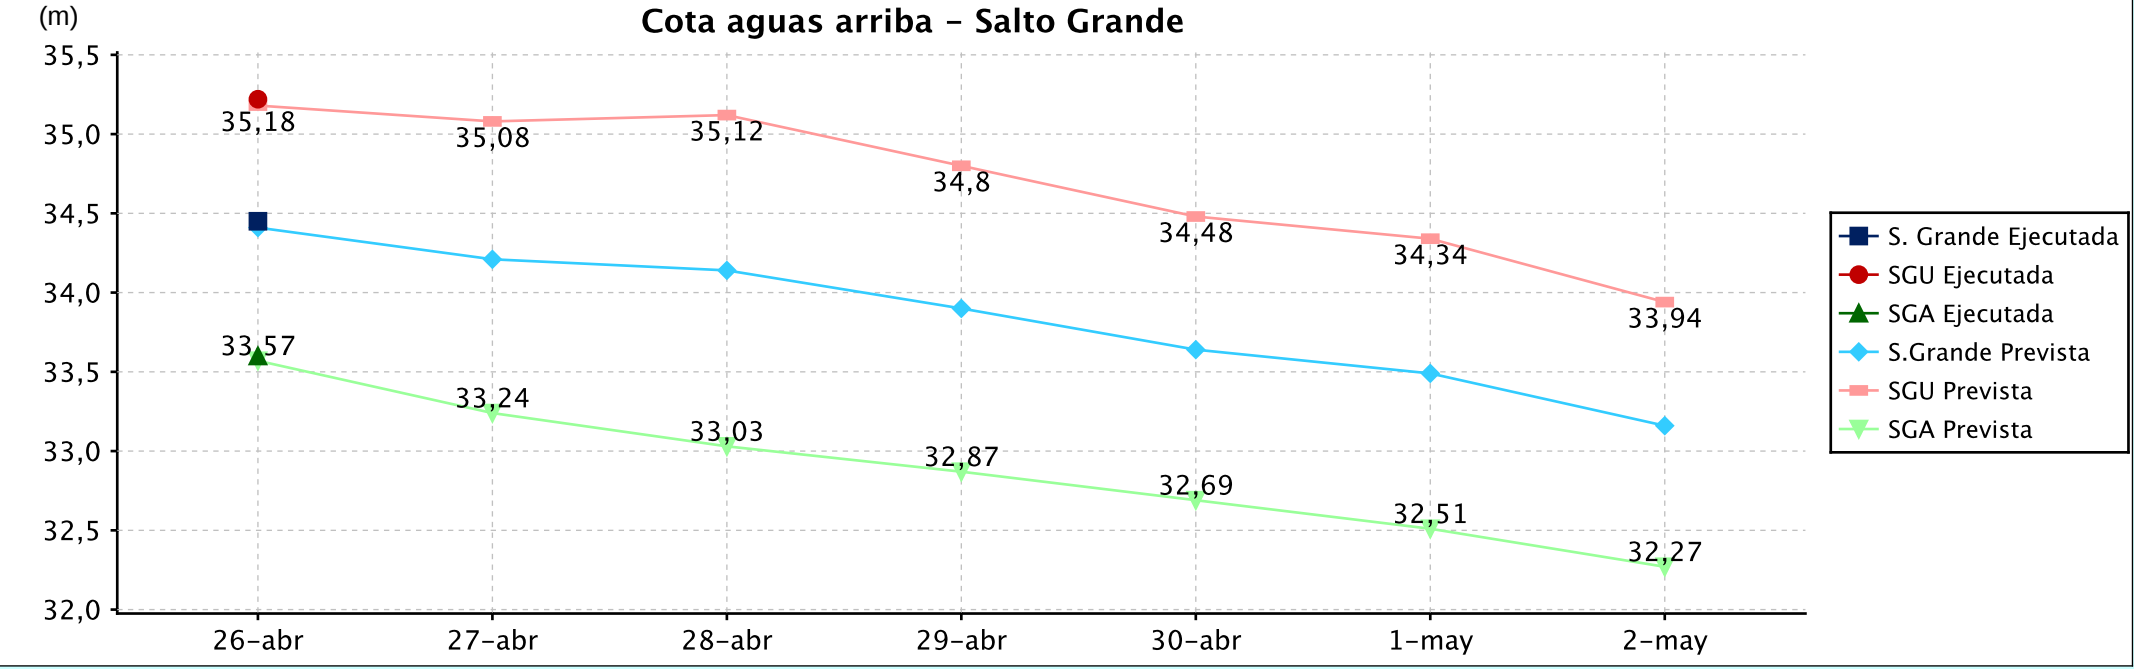

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,22
Cota Vista Arg	33,60
Cota real	34,45
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	35.647

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	682	653
Baygorria	856	845
Palmar	1.295	1.265
SGU	2.028	1.891

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	182	854
Baygorria	0	-972
Palmar	0	84
SGU	1.750	1.748

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	300	437
Baygorria	150	276
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
