



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 27 de abril de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-3
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1
Central La Tablada	-50
Central P. del Tigre	-2
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.375
C. Baygorria	2.292
C. Palmar	7.876
C. Salto Grande	6.857
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.703
TOTAL Generación	24.043

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	24.043
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	23.790
Diferencia (MWh)	253
Ejecutada - Programada	1,06 %

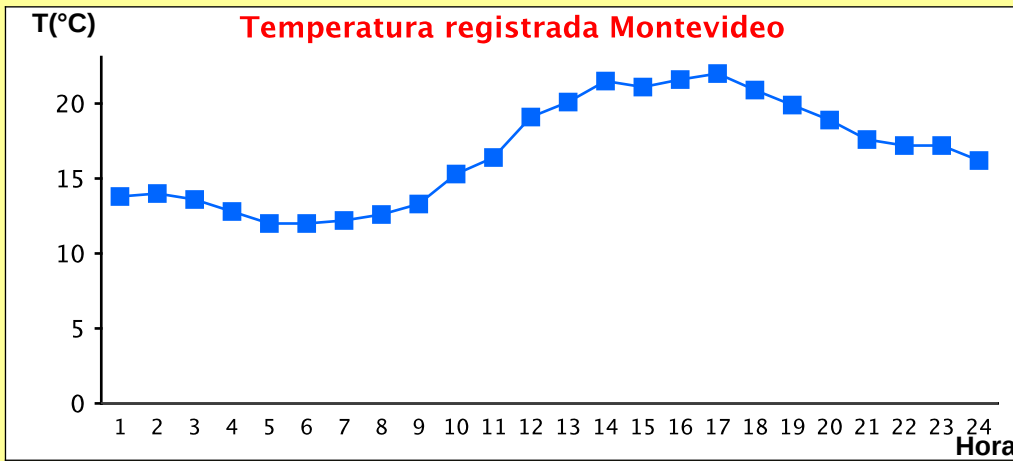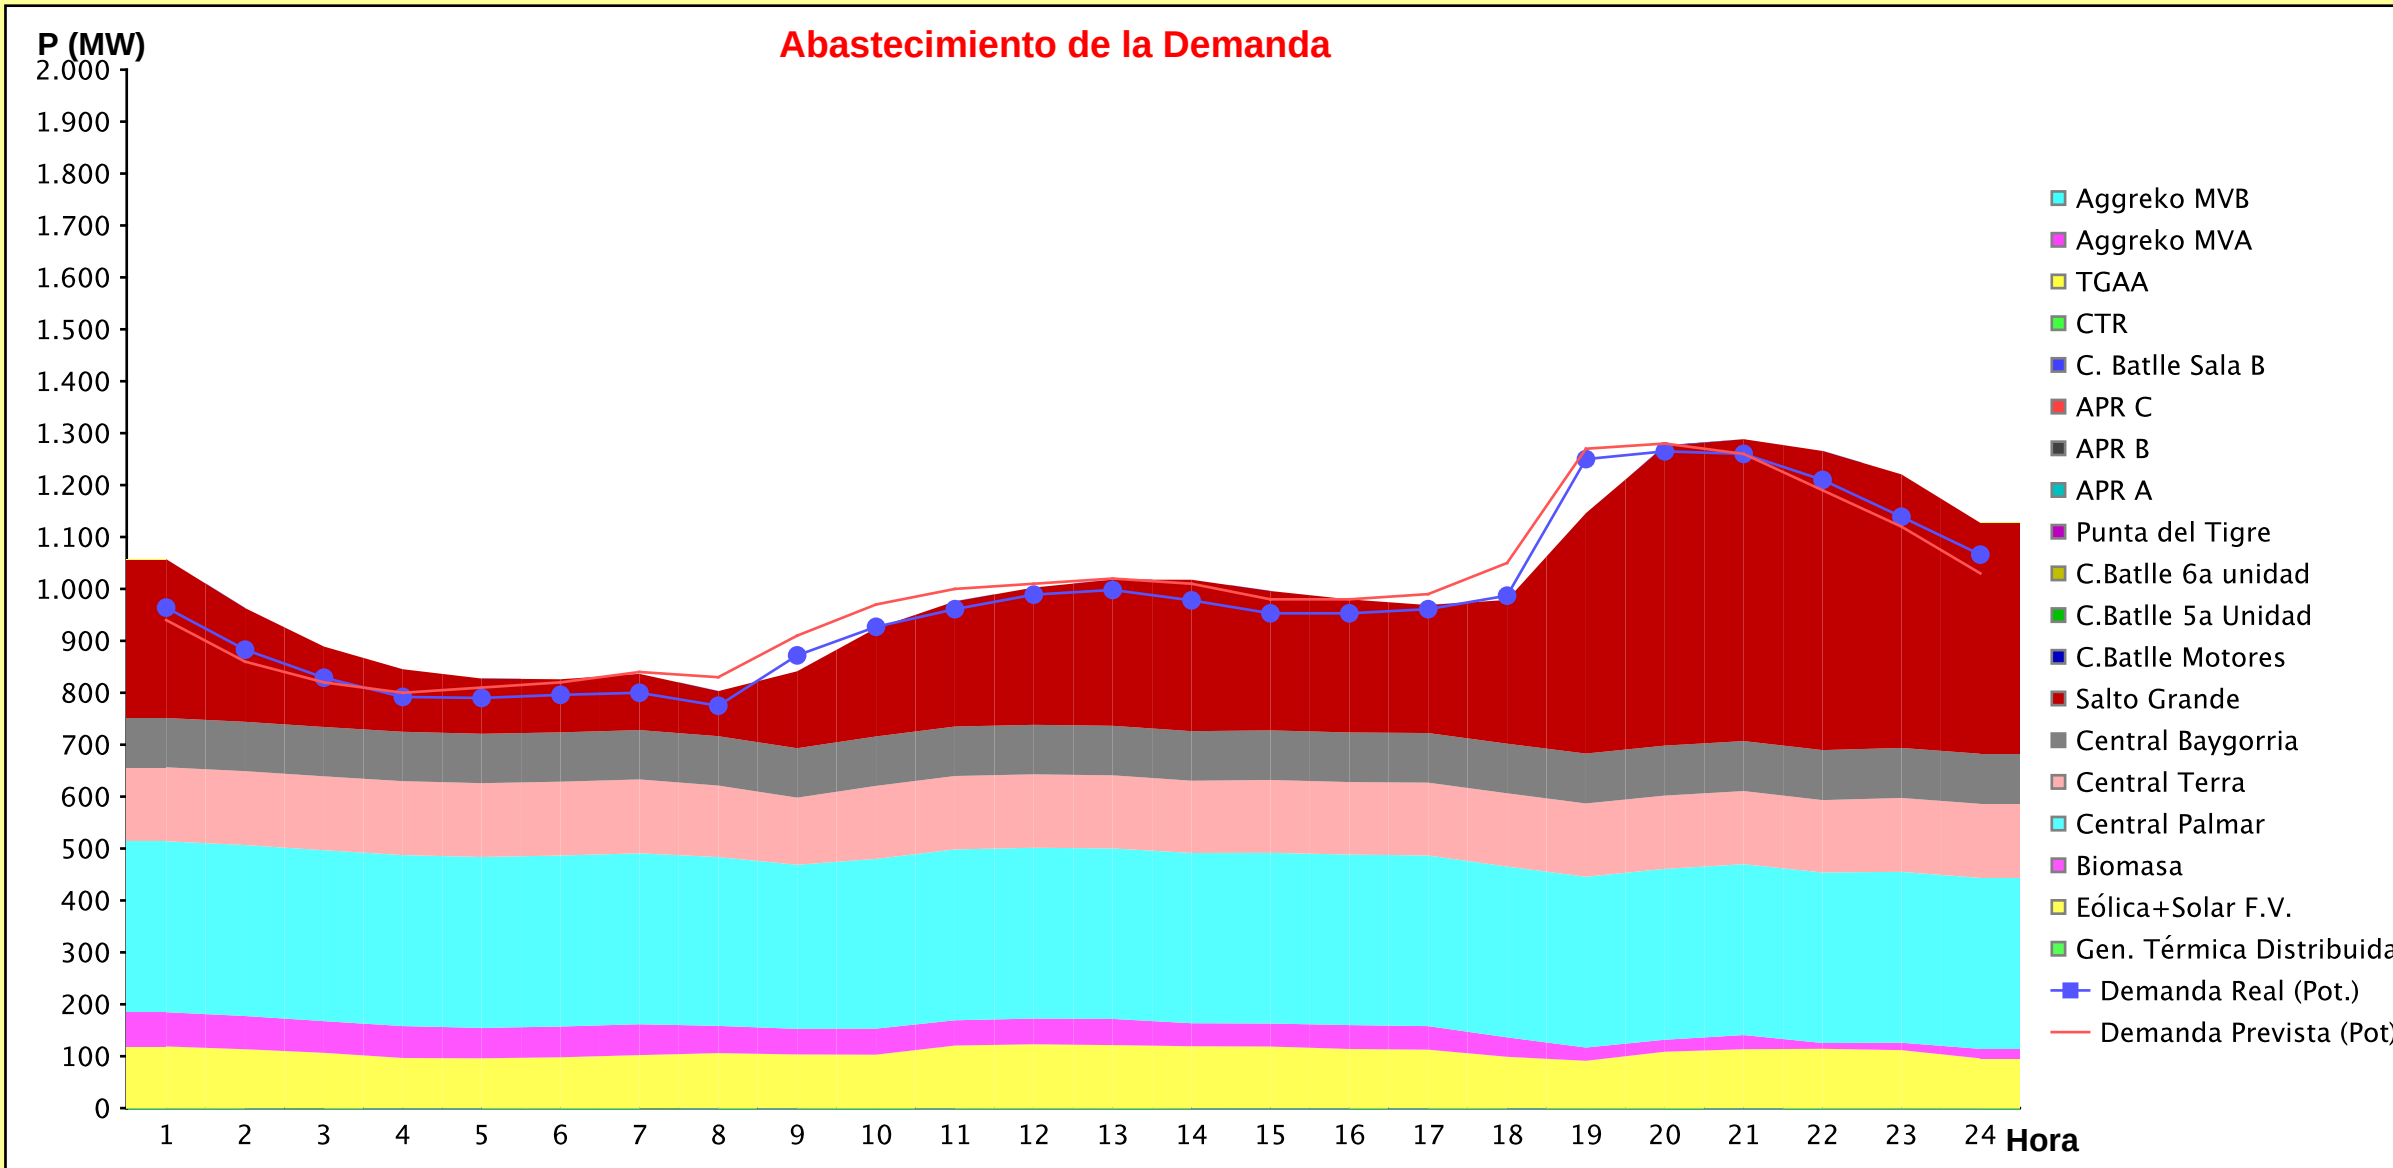



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1010,72 Hora 13:09
Potencia mínima:	752,9 Hora 07:26
Pico noche:	1278,31 Hora 20:49

Generación Media (MW)	
Eólica	108,7
Biomasa	54,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

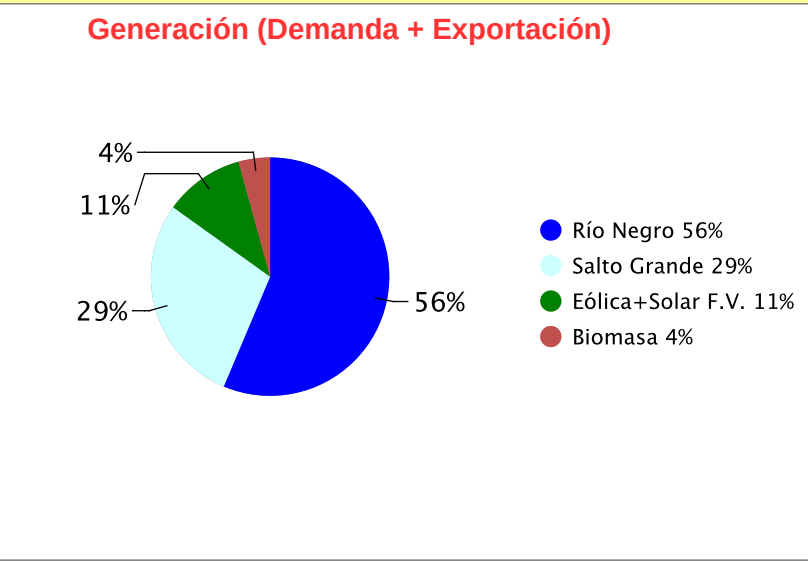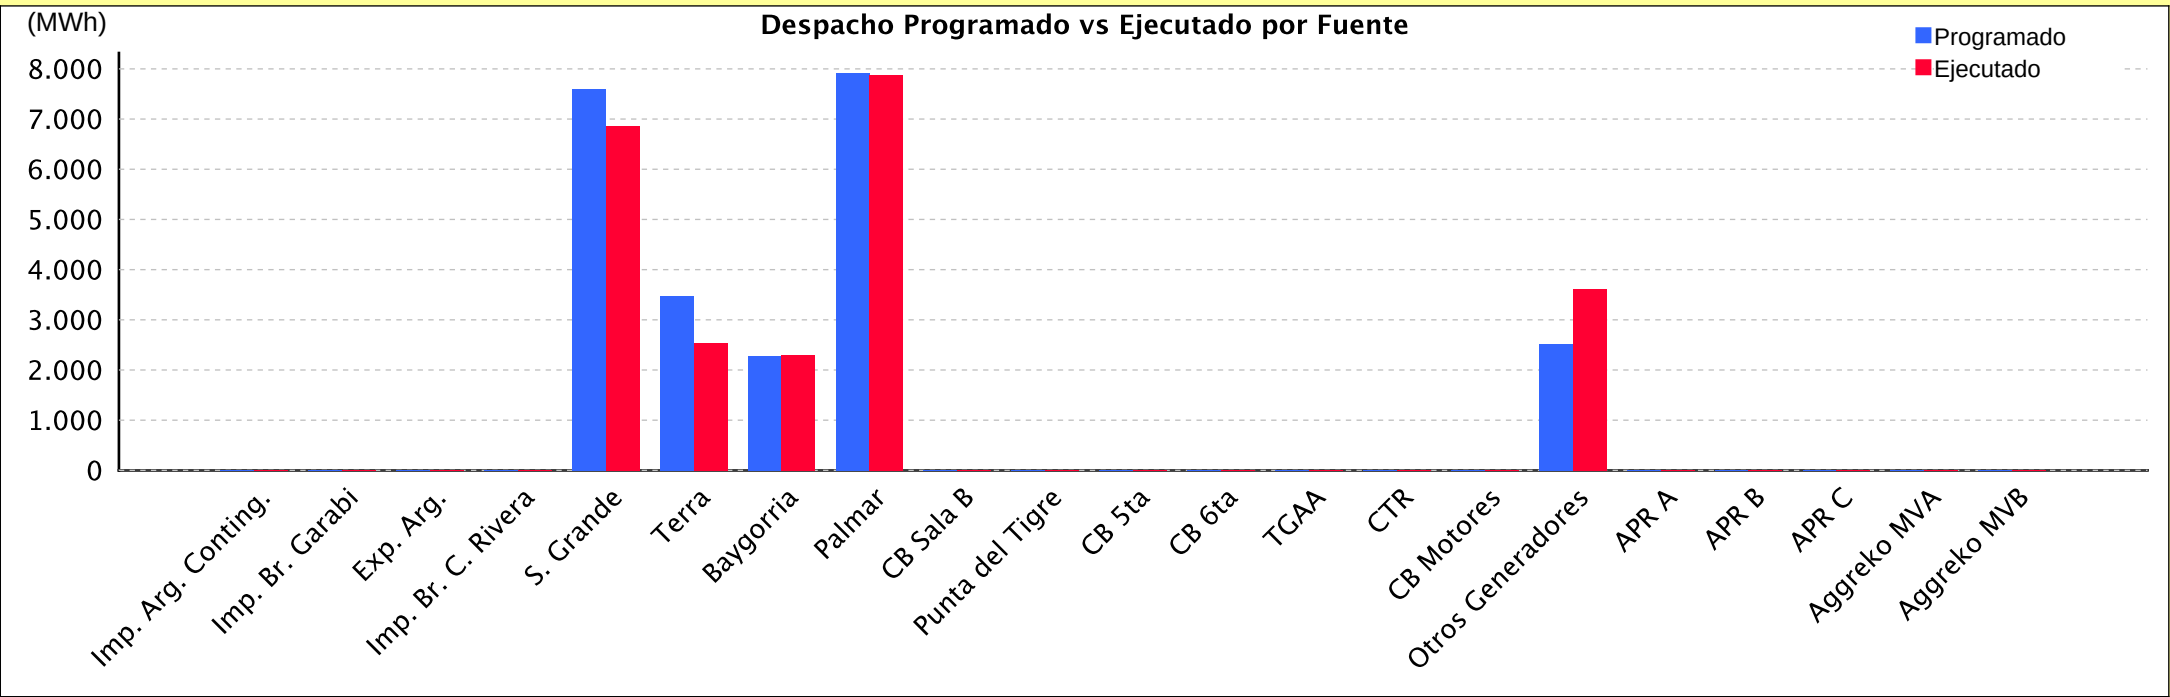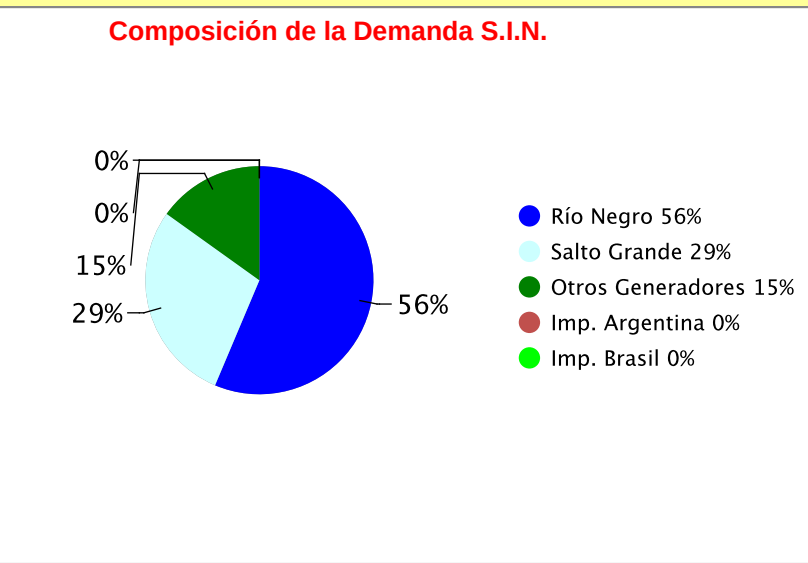



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

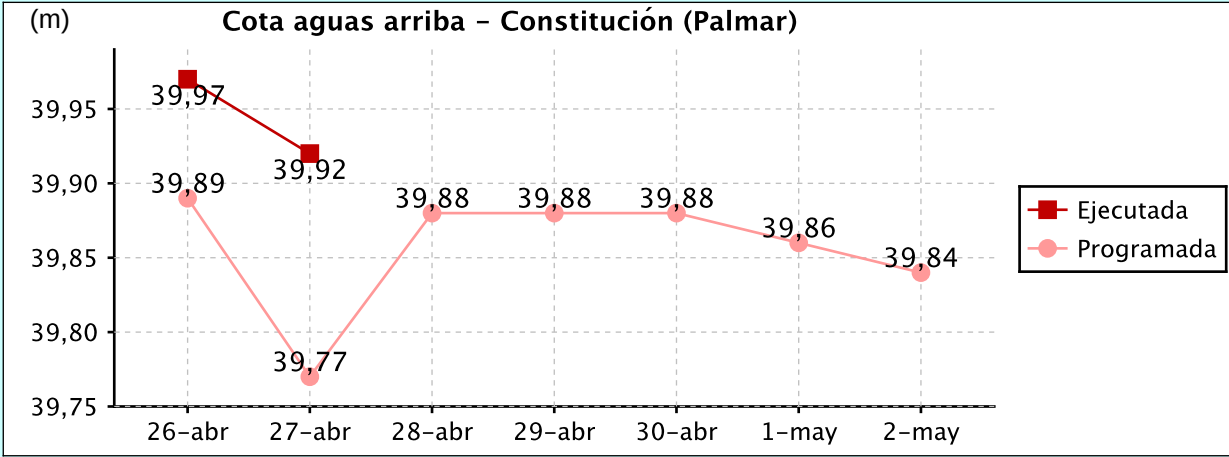
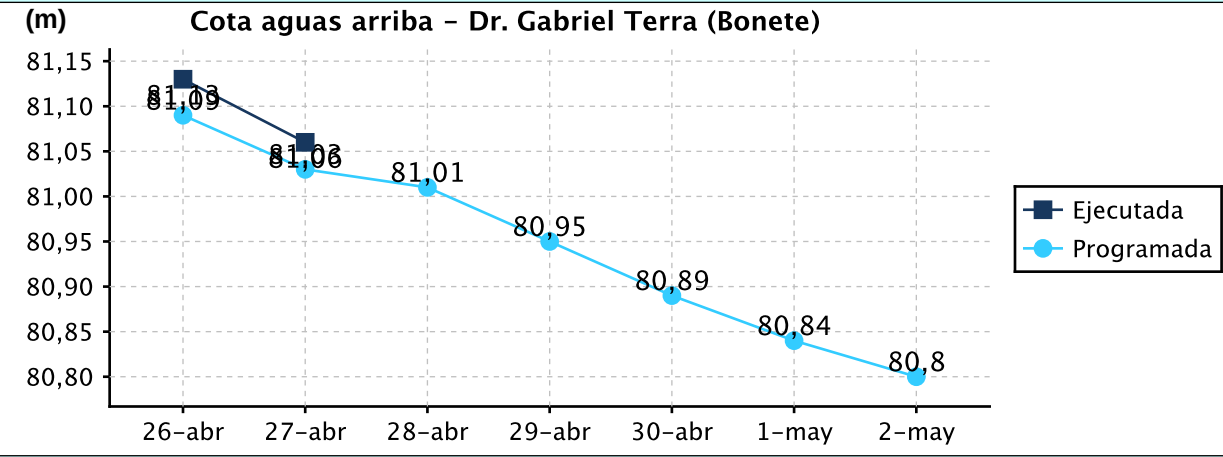


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,03	81,06
Baygorria	54,05	54,08
Palmar	39,77	39,92
SGU	35,08	35,26

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

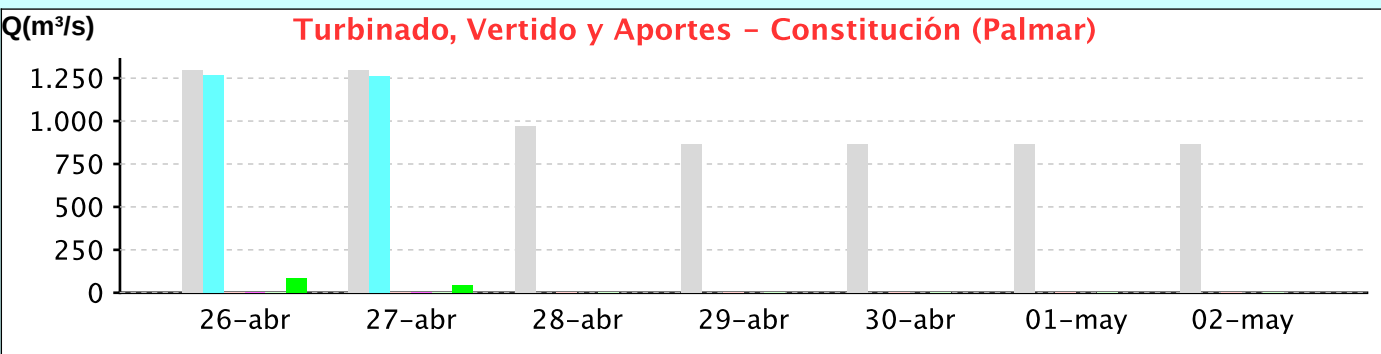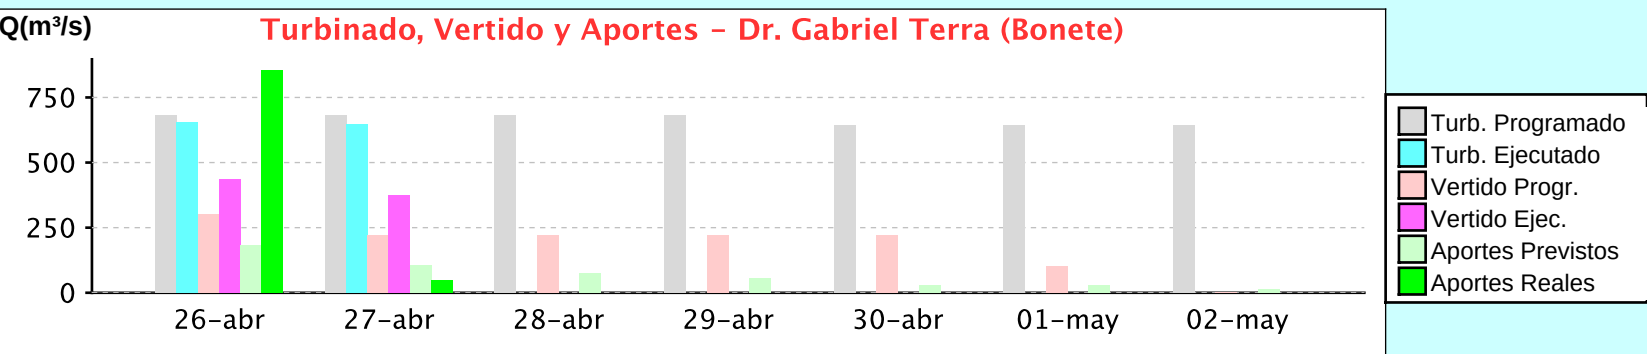

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

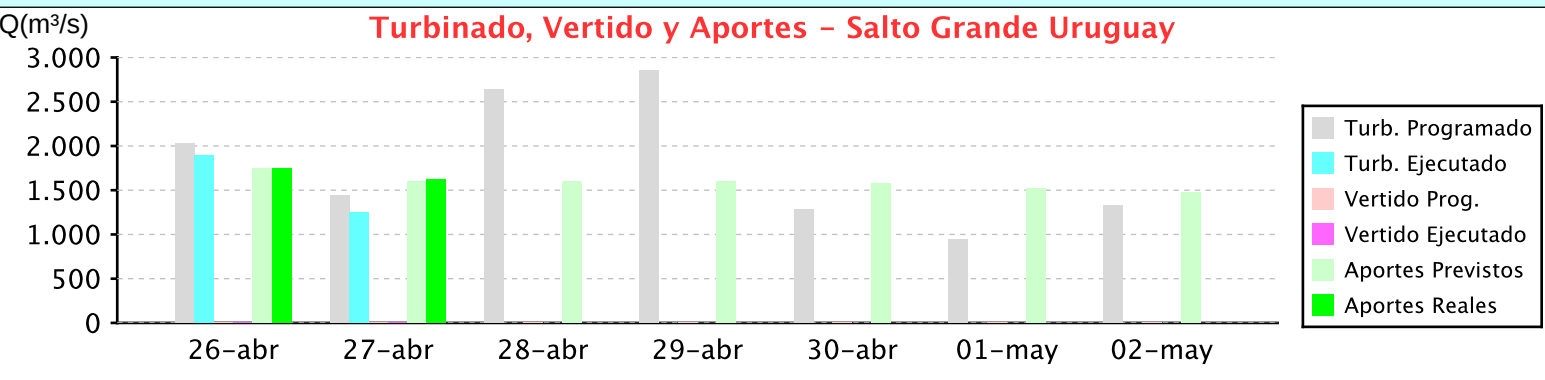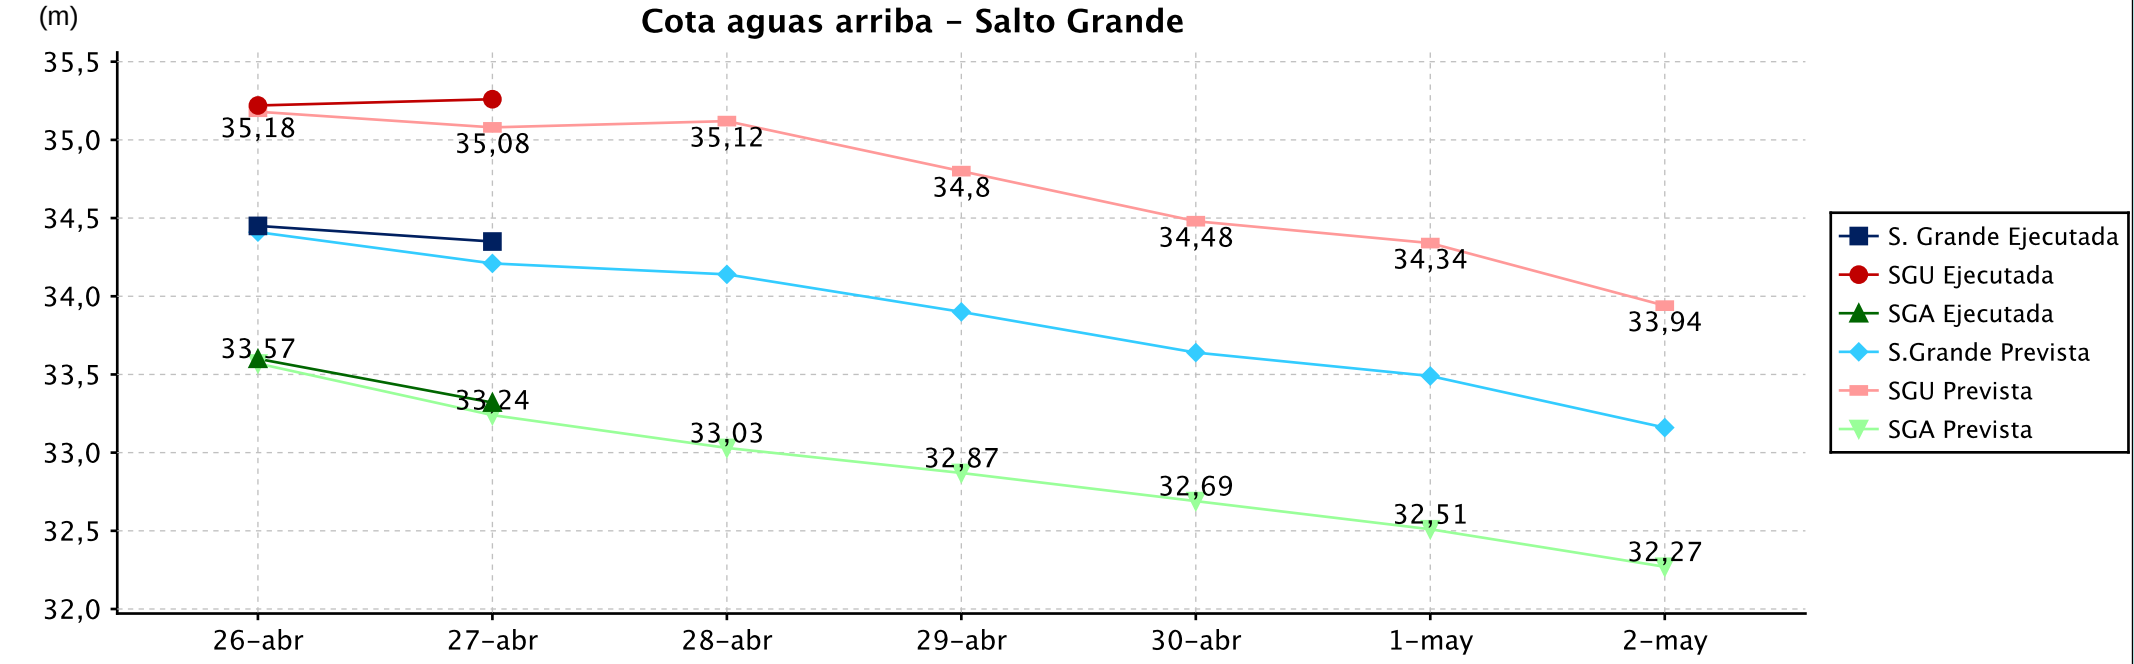

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,26
Cota Vista Arg	33,32
Cota real	34,35
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	41.778

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	682	648
Baygorria	856	845
Palmar	1.295	1.258
SGU	1.444	1.253

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	104	47
Baygorria	0	46
Palmar	0	46
SGU	1.600	1.618

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	376
Baygorria	50	204
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
