




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 29 de abril de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	286
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	290
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	377
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.372
C. Baygorria	2.313
C. Palmar	5.266
C. Salto Grande	15.036
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	1.329
TOTAL Generación	27.933

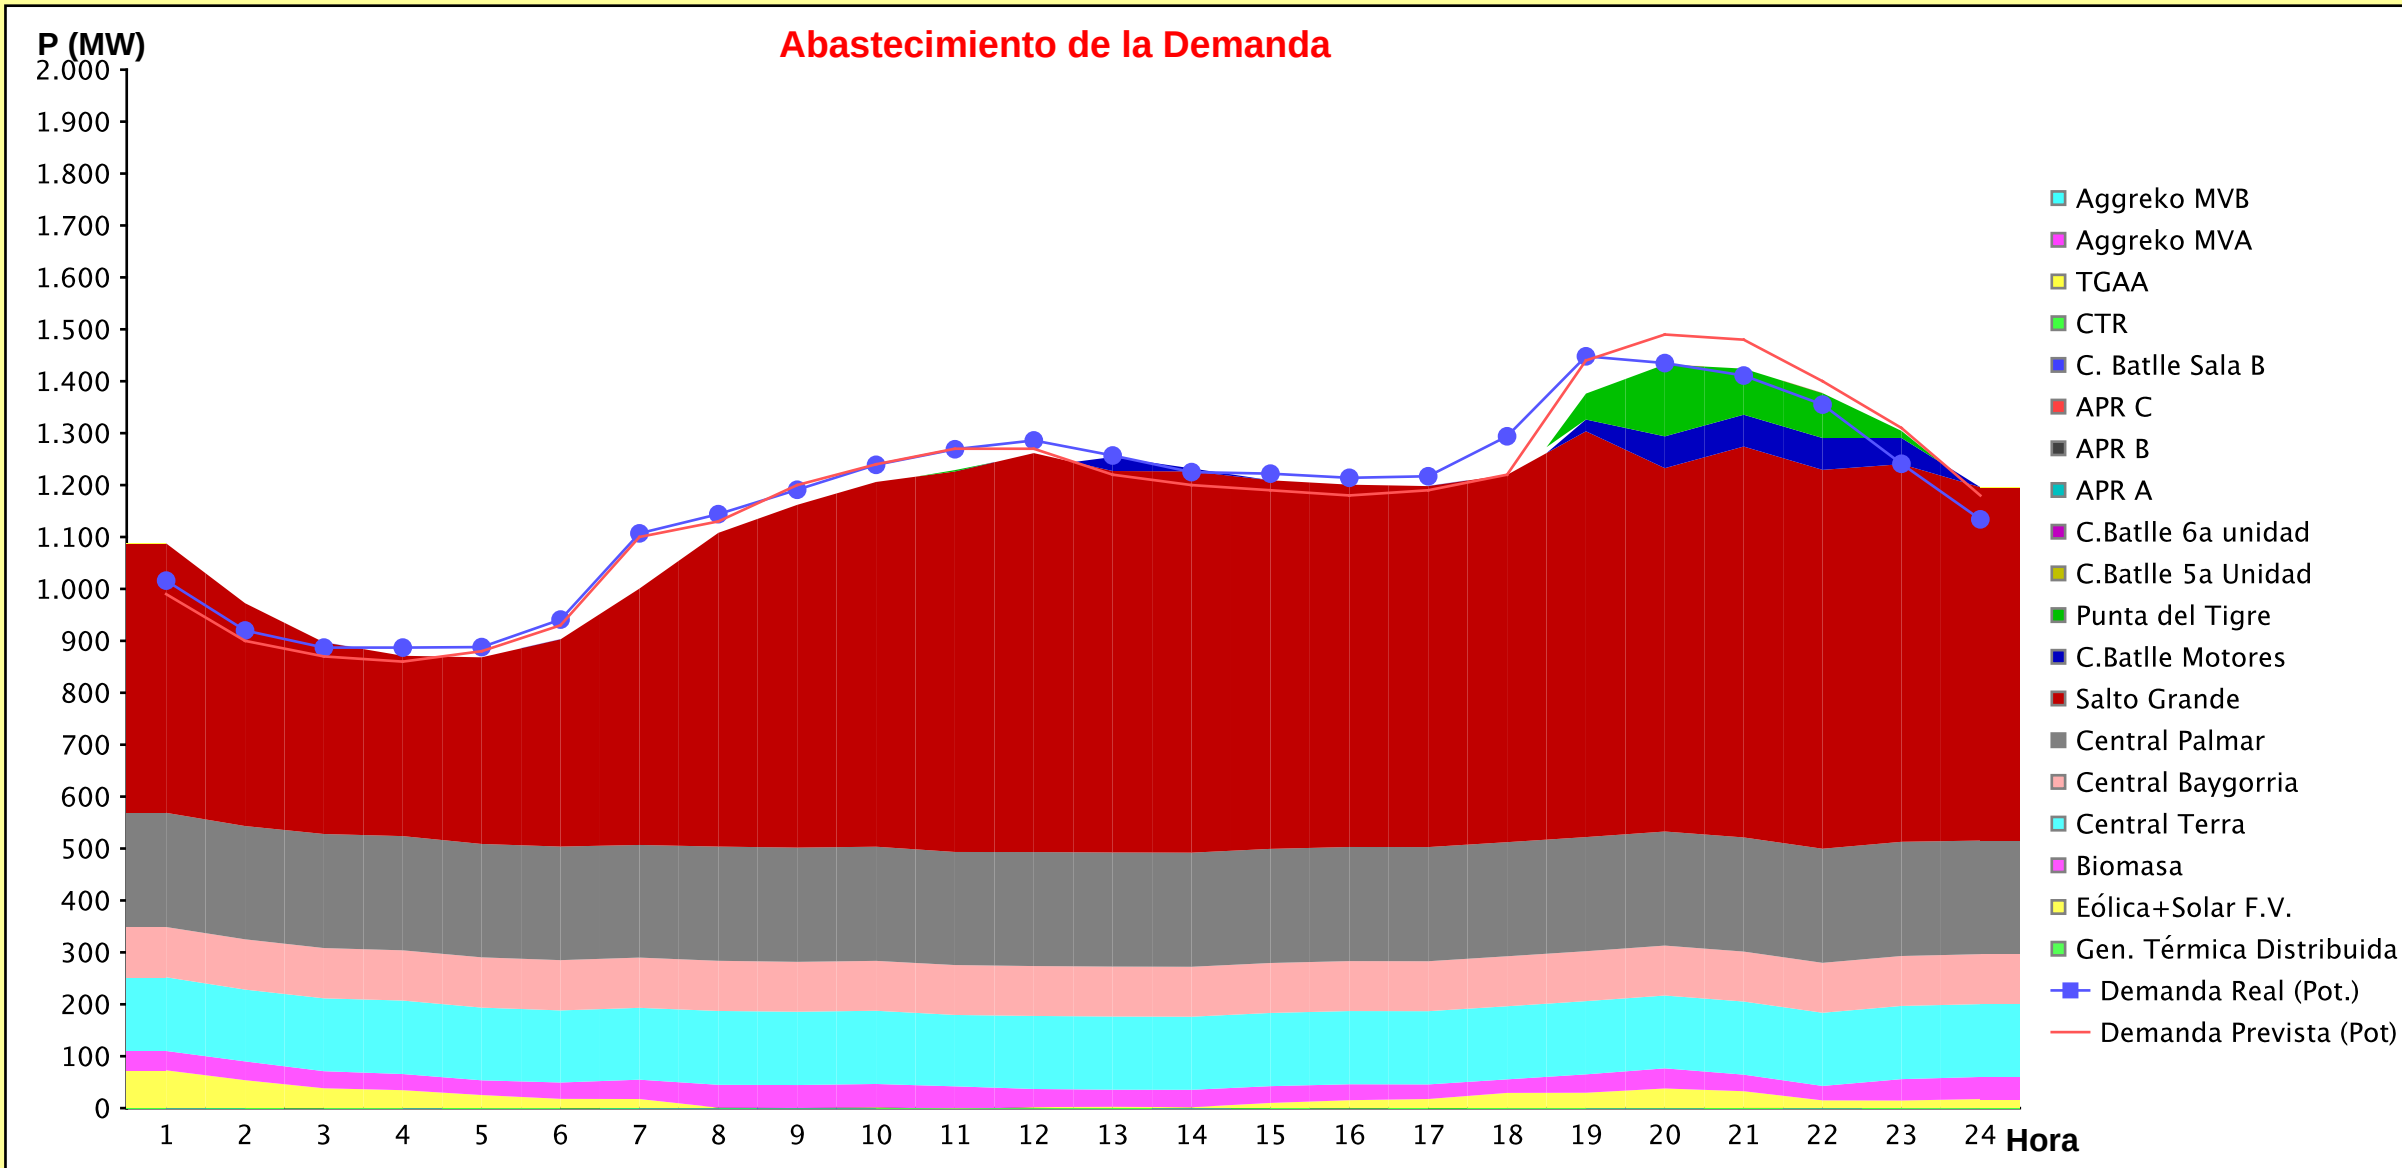

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.933
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.140
Diferencia (MWh)	-207
Ejecutada - Programada	-0,74 %

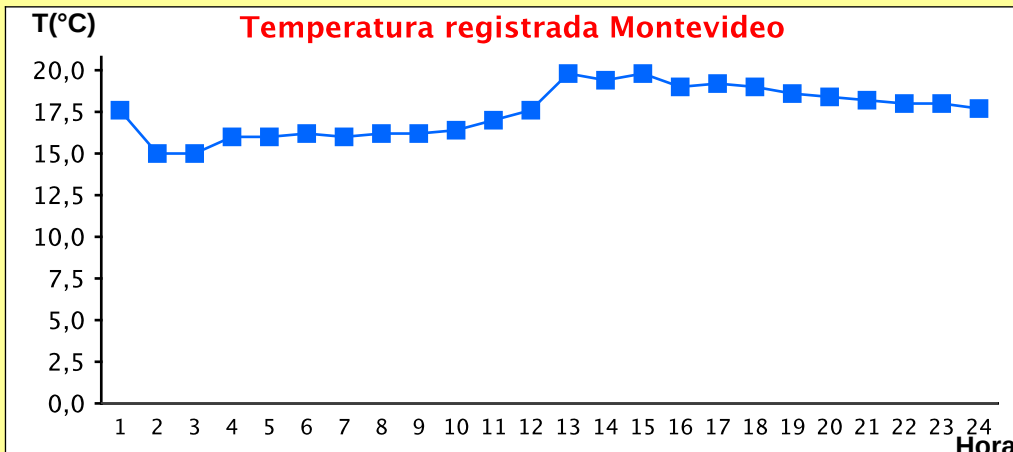


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1302,63 Hora 11:49
Potencia mínima:	868,83 Hora 04:09
Pico noche:	1467,38 Hora 19:28

Generación Media (MW)	
Eólica	21,3
Biomasa	45,4
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

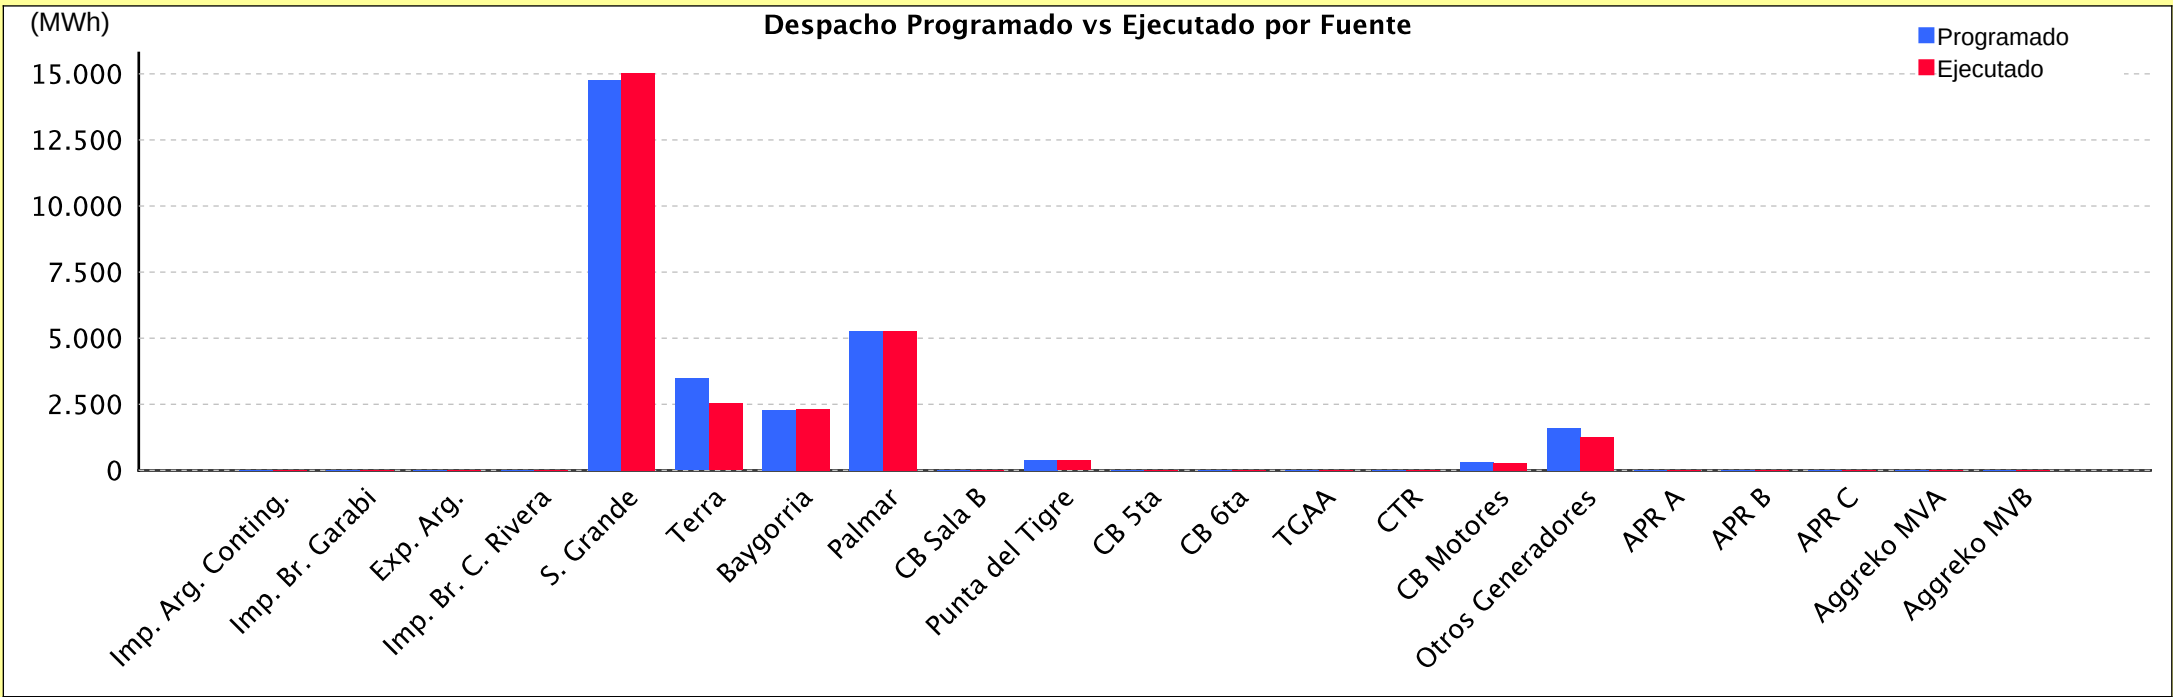
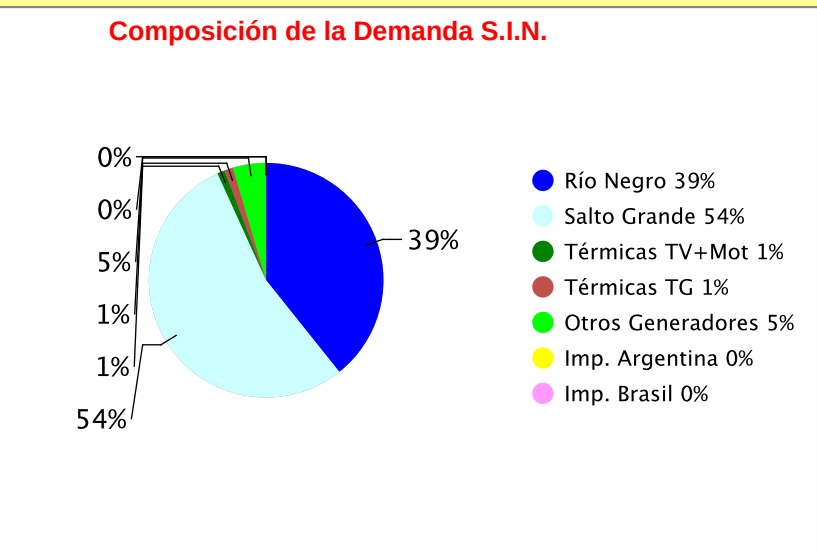


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

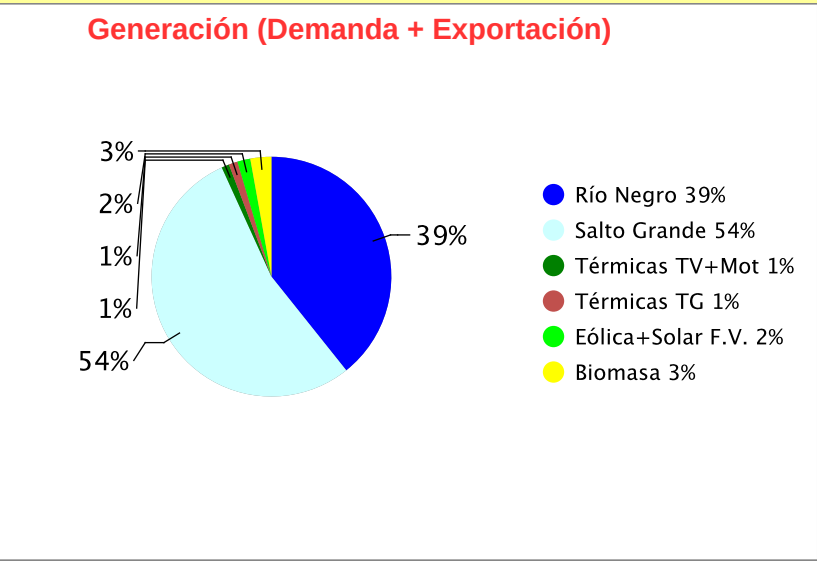



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

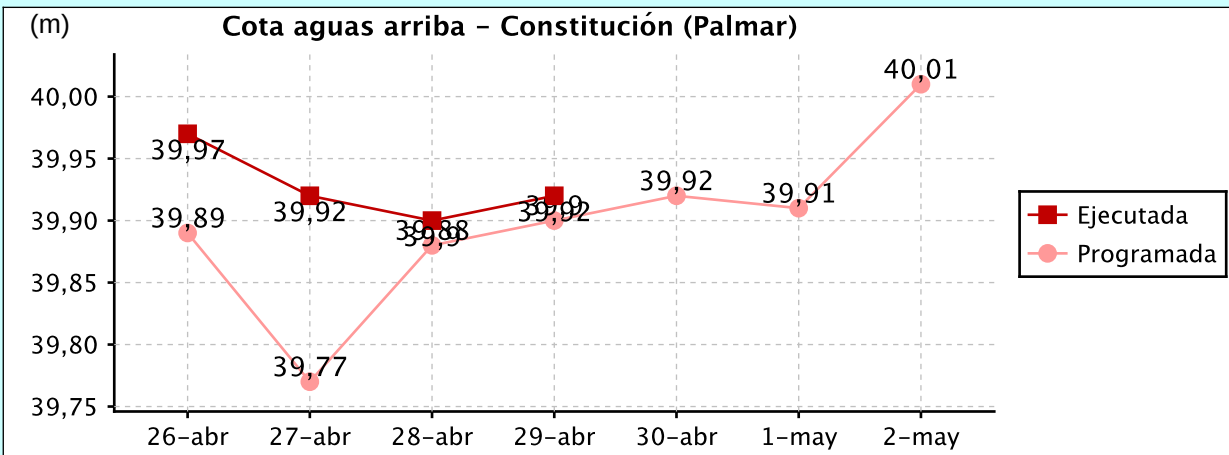
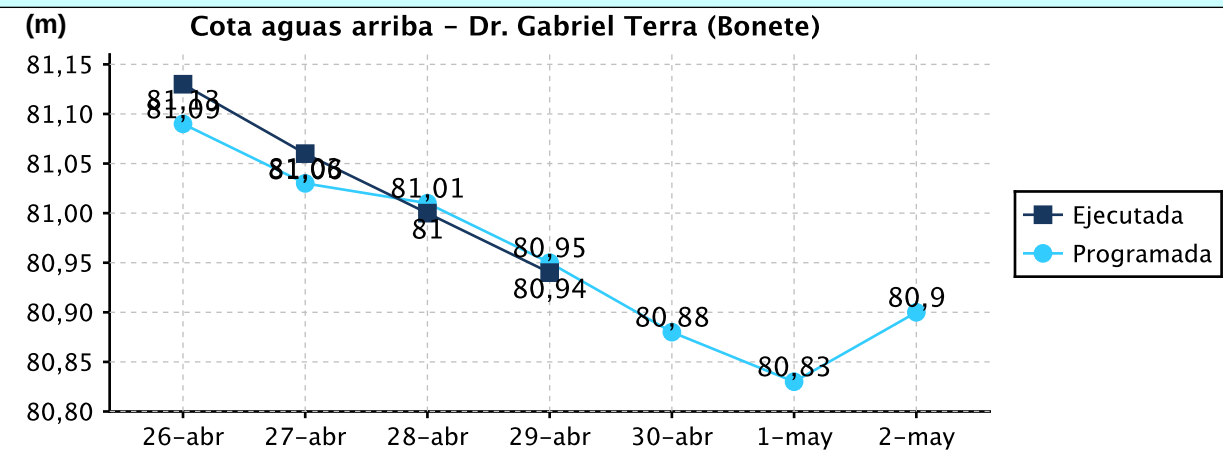


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,95	80,94
Baygorria	54,11	54,11
Palmar	39,90	39,92
SGU	34,97	34,86

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

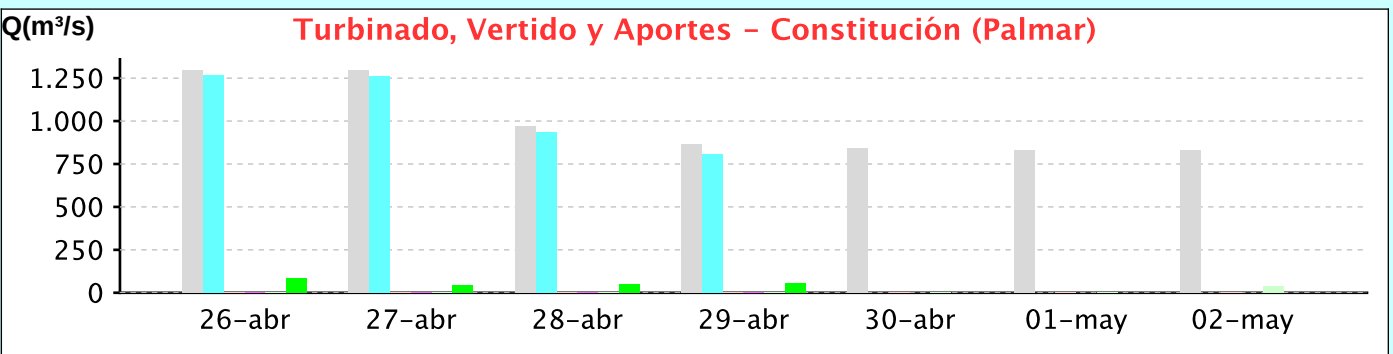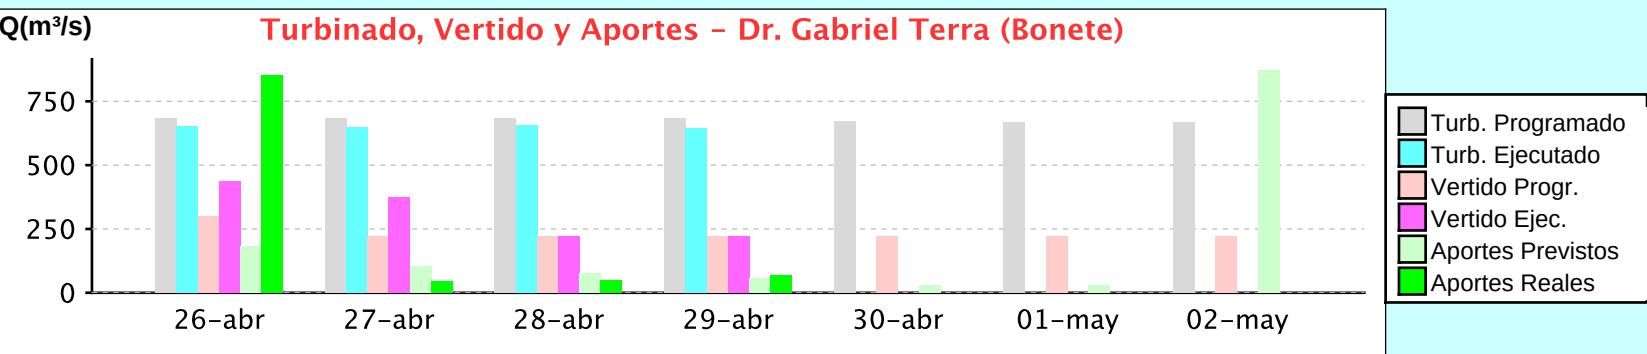

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

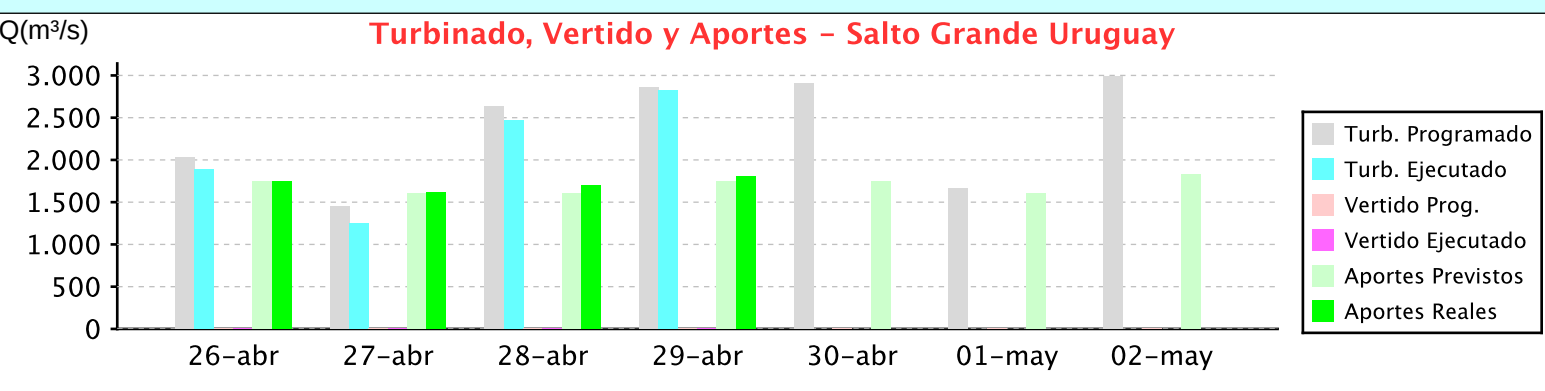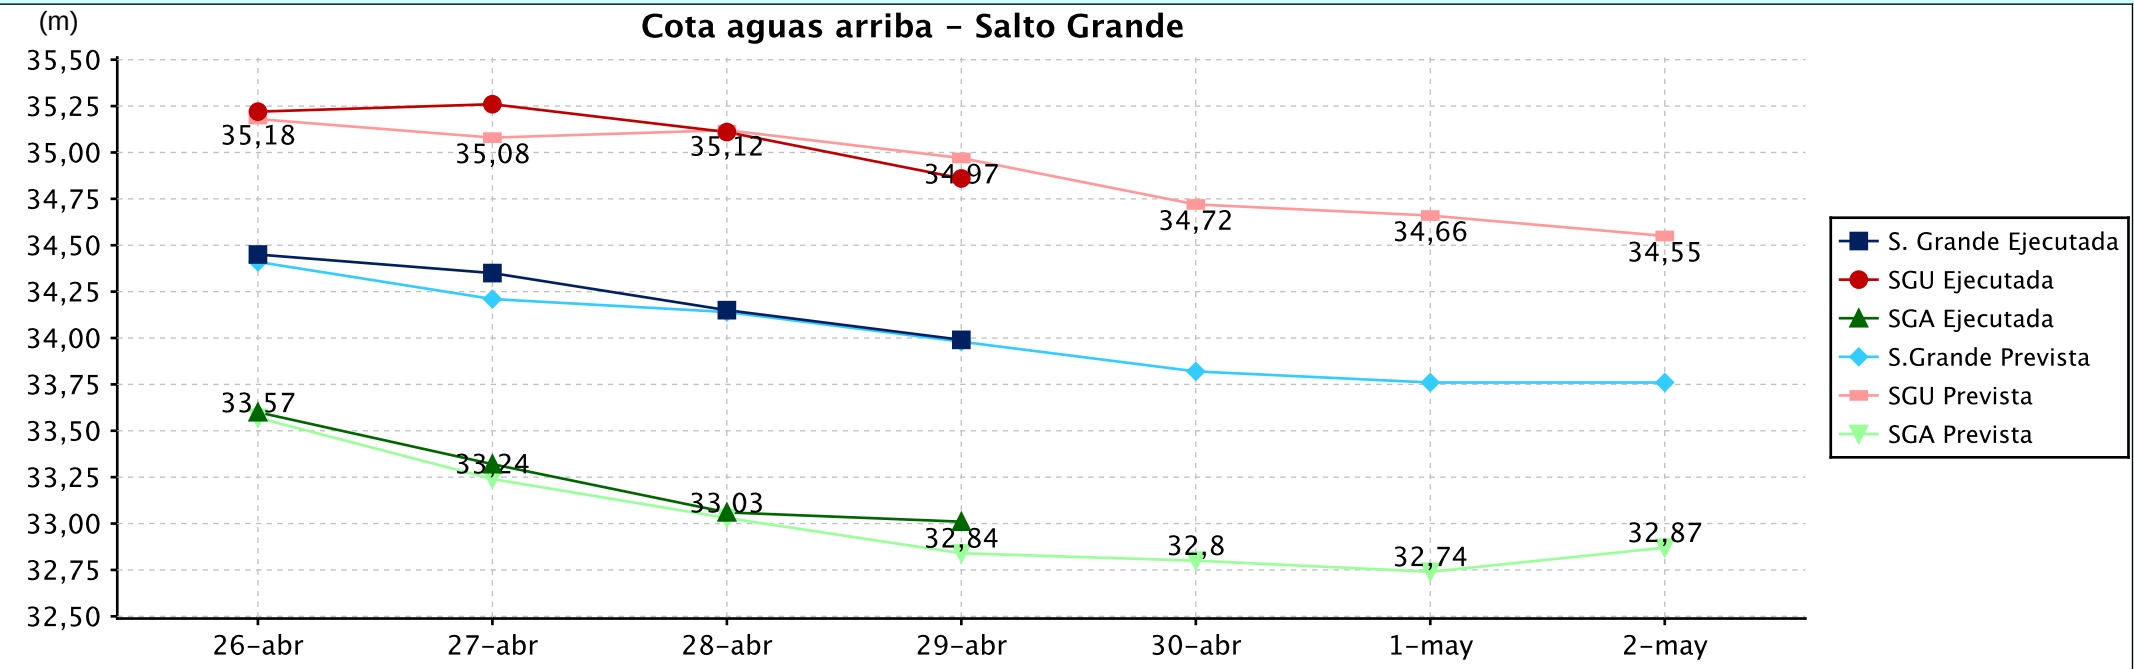

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,86
Cota Vista Arg	33,01
Cota real	33,99

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	37.913
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	682	643
Baygorria	856	839
Palmar	863	806
SGU	2.858	2.827

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	56	70
Baygorria	0	-4
Palmar	0	57
SGU	1.750	1.806

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	220
Baygorria	50	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
