



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 01 de mayo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-52
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.344
C. Baygorria	2.295
C. Palmar	5.219
C. Salto Grande	9.427
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.713
TOTAL Generación	22.932

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	22.932
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	22.210
Diferencia (MWh)	722
Ejecutada - Programada	3,25 %

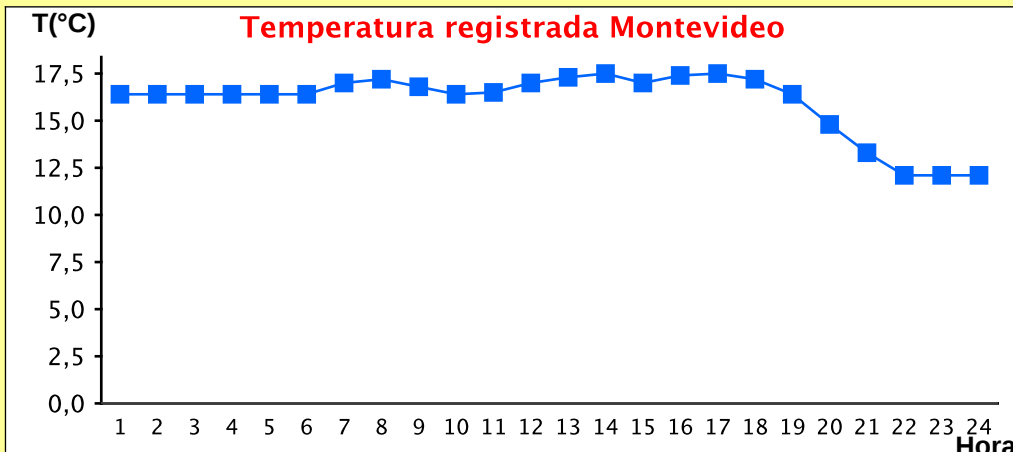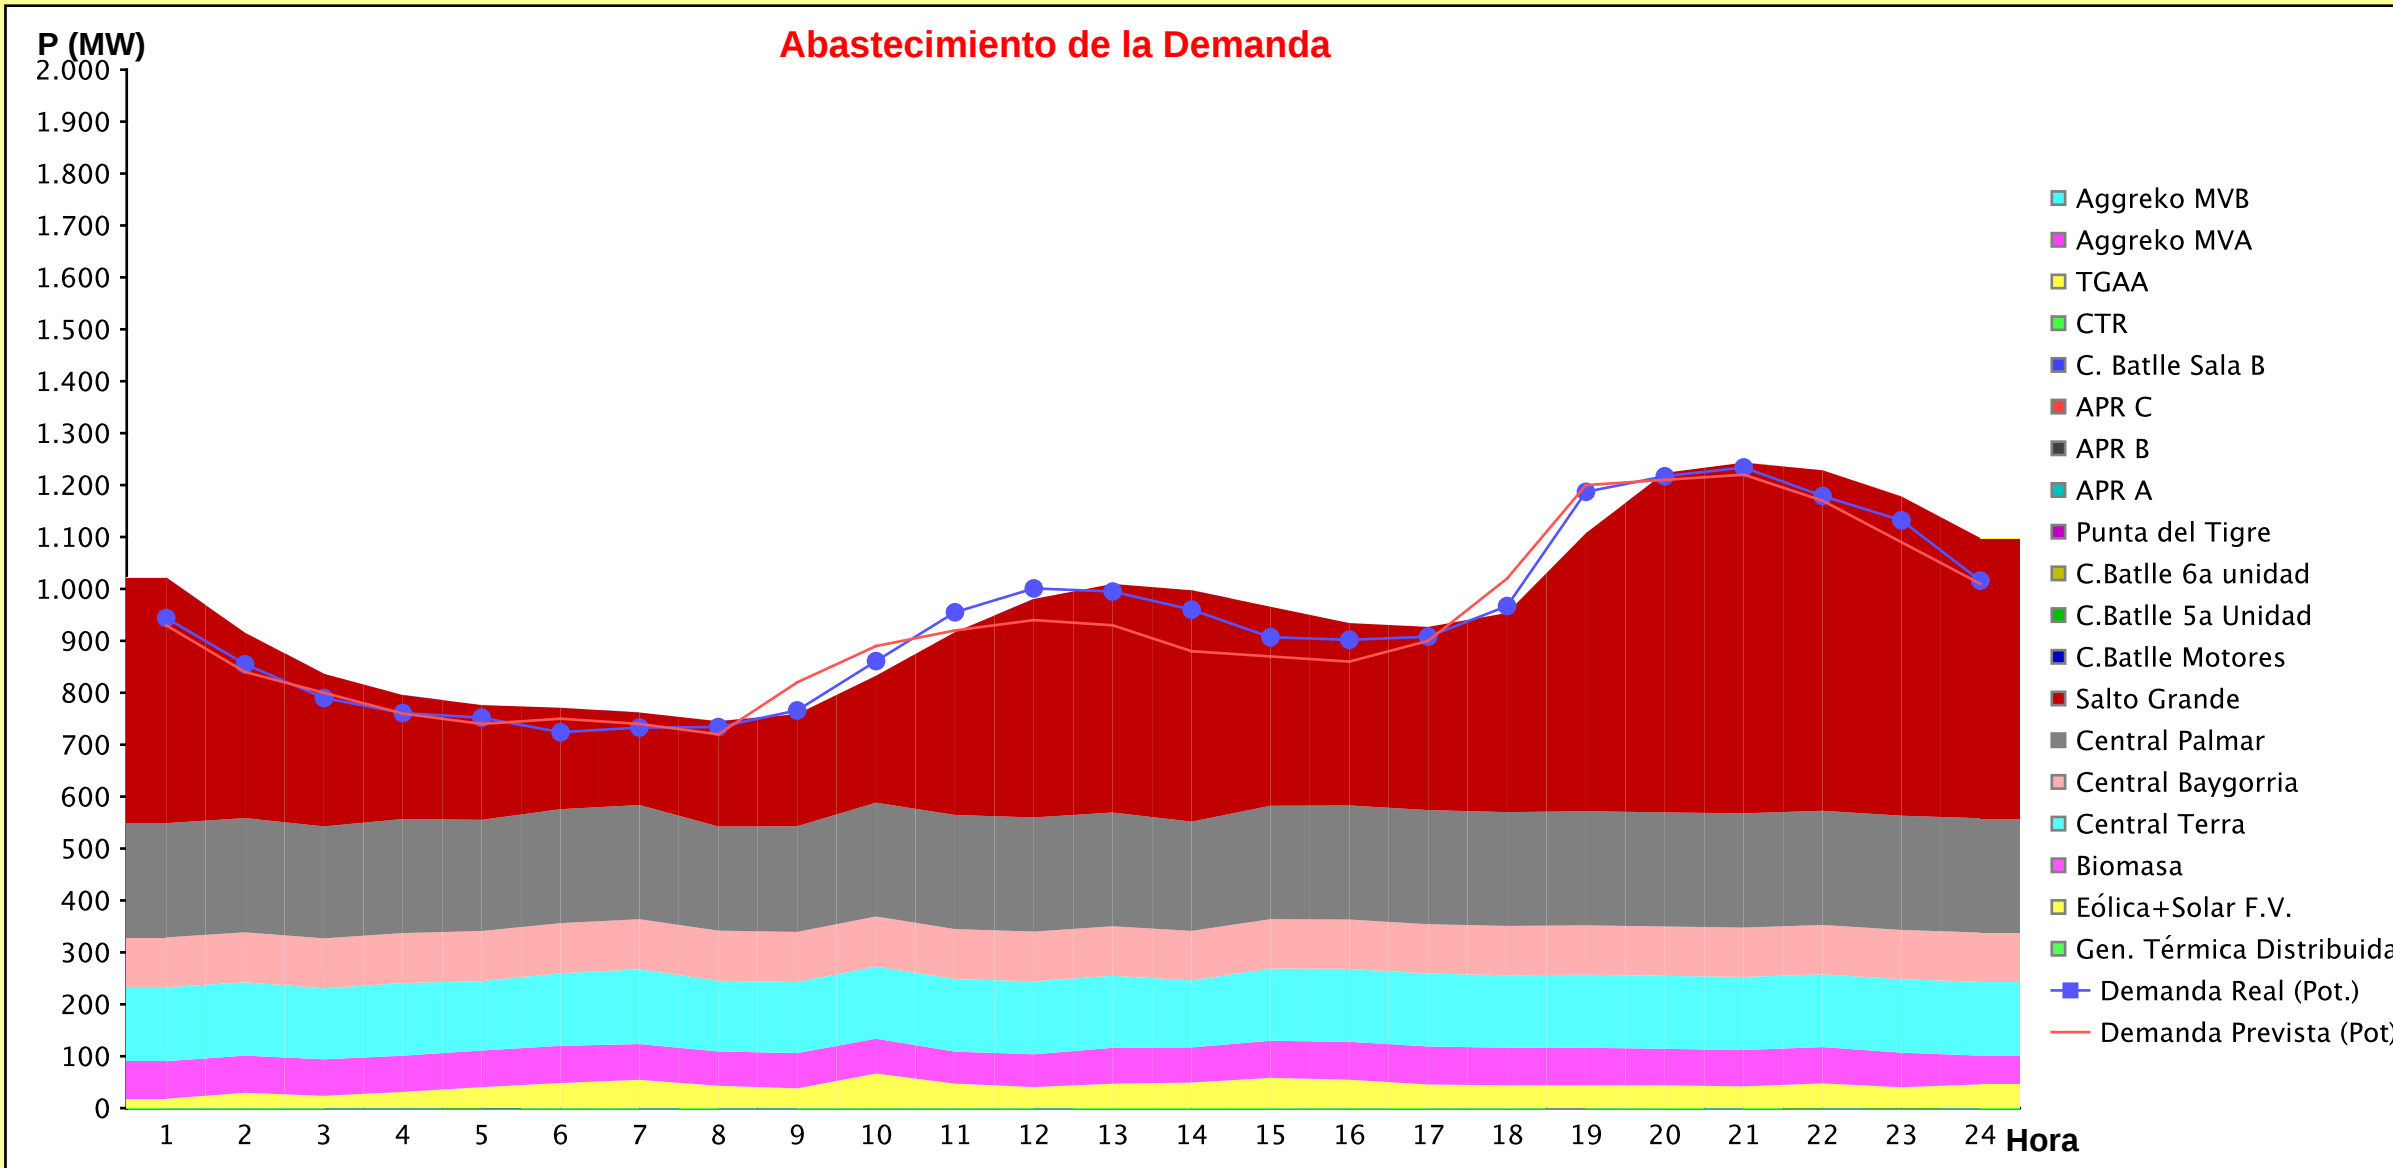



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1006,82 Hora 12:51
Potencia mínima:	726,97 Hora 07:42
Pico noche:	1244,24 Hora 20:52

Generación Media (MW)	
Eólica	43,6
Biomasa	77,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

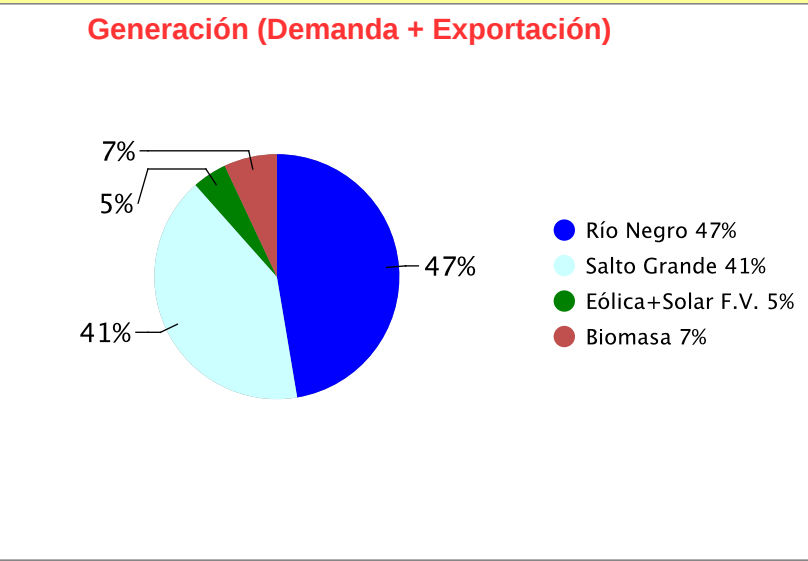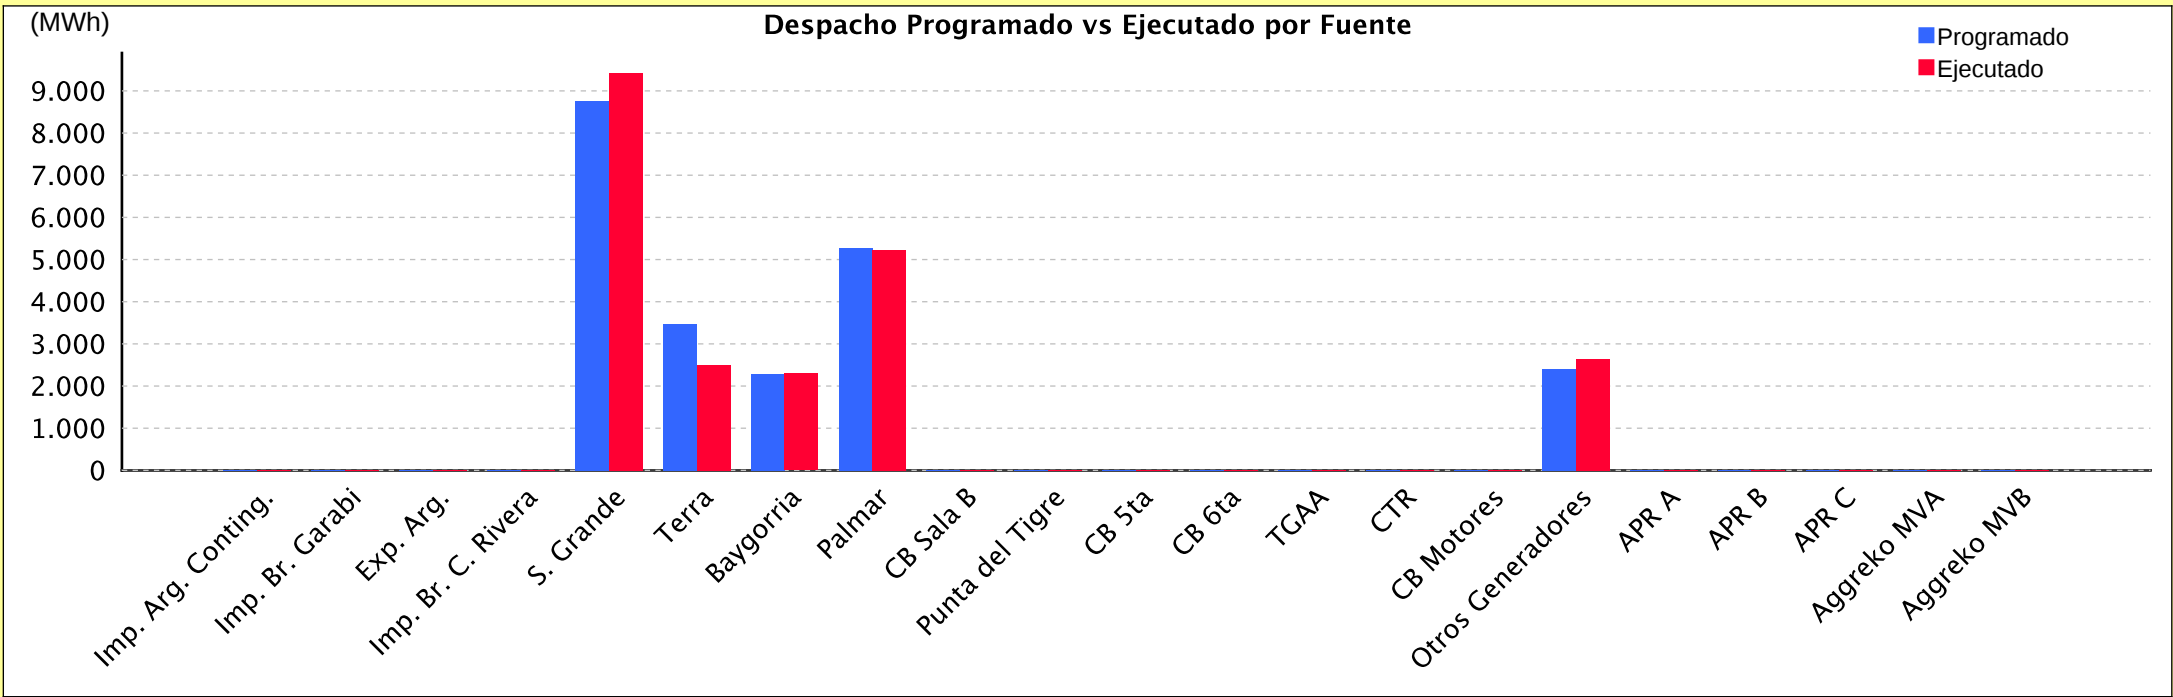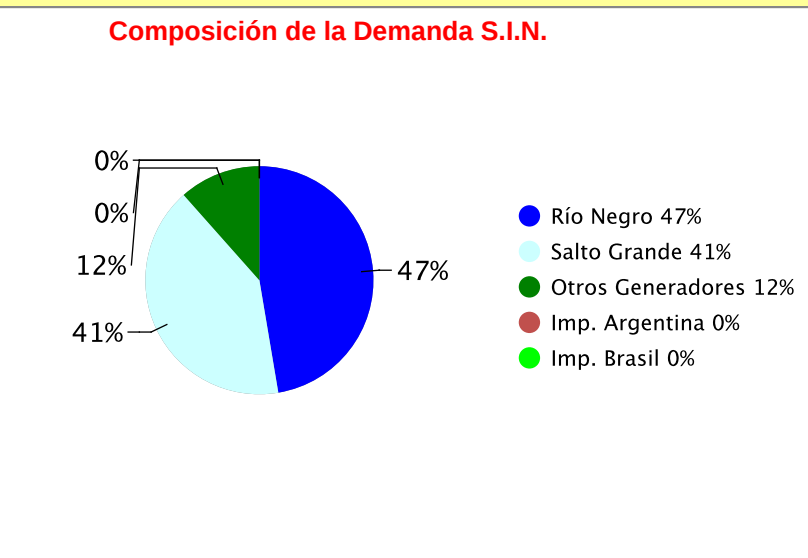



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

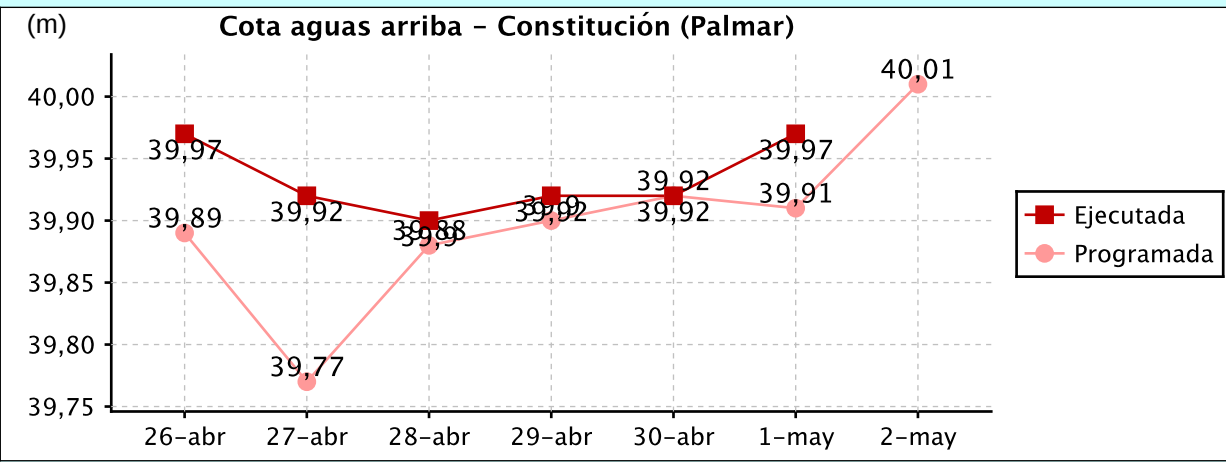
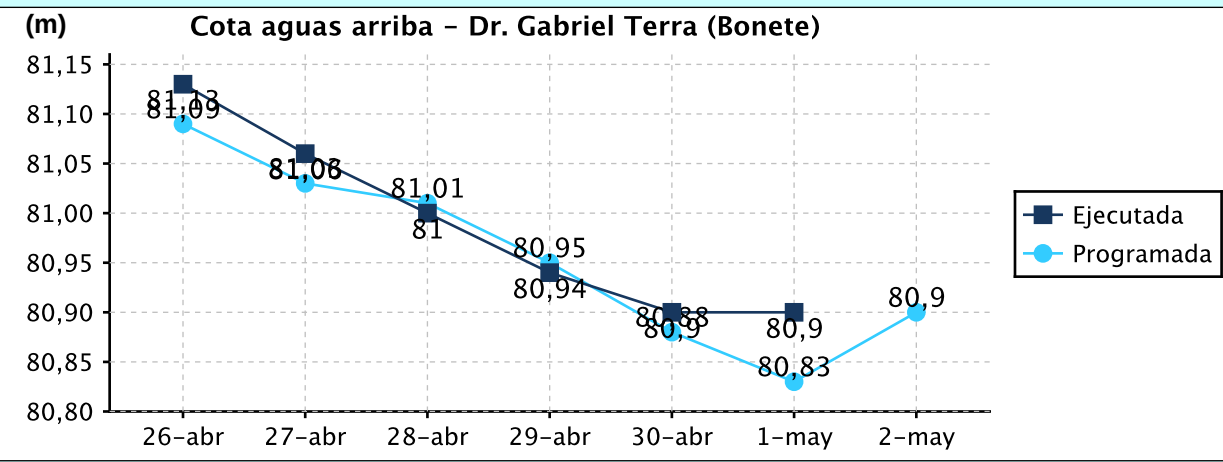


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,83	80,9
Baygorria	54,17	54,19
Palmar	39,91	39,97
SGU	34,66	34,72

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

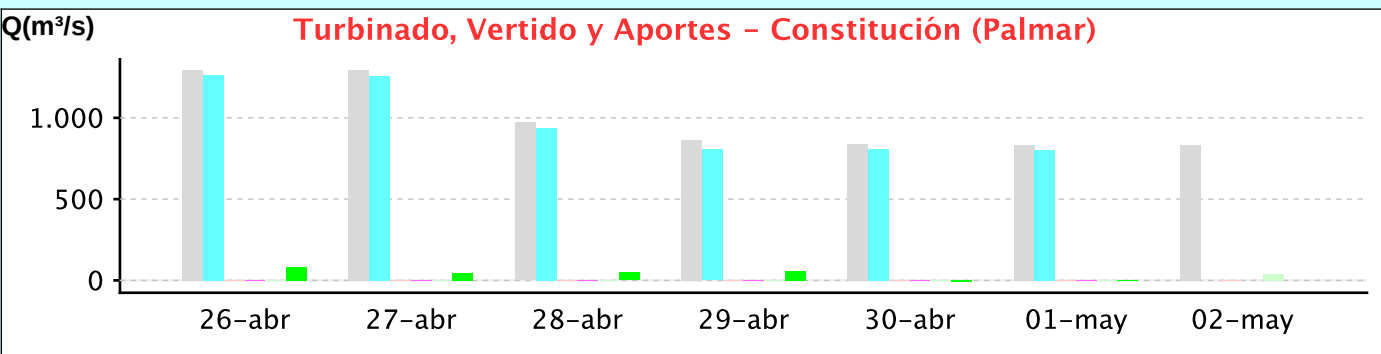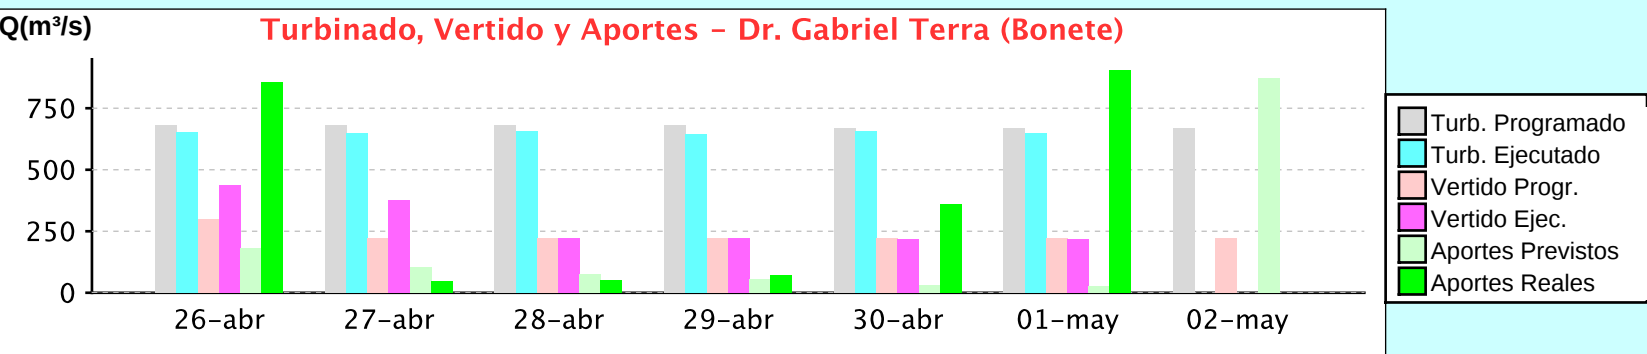

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

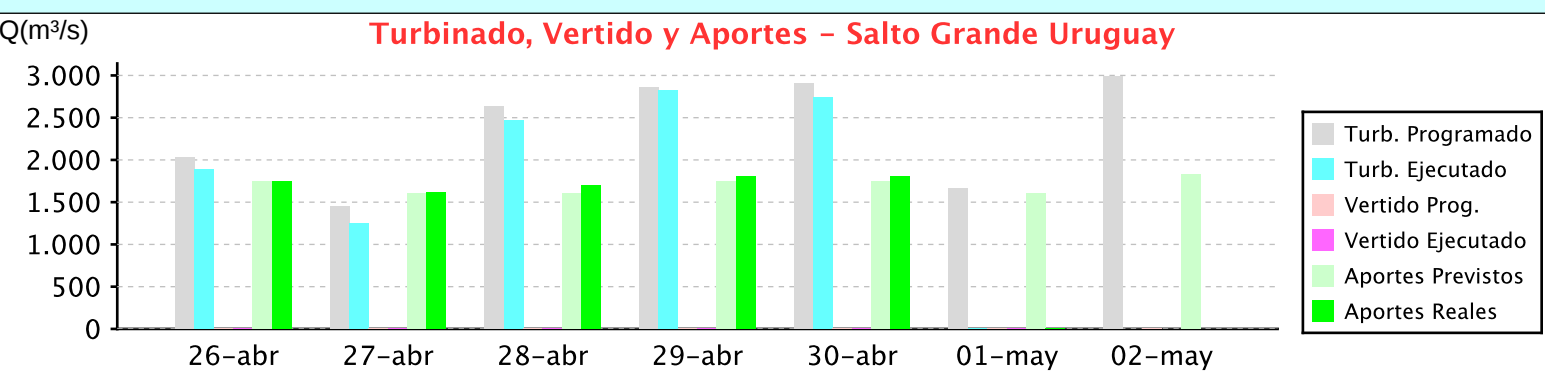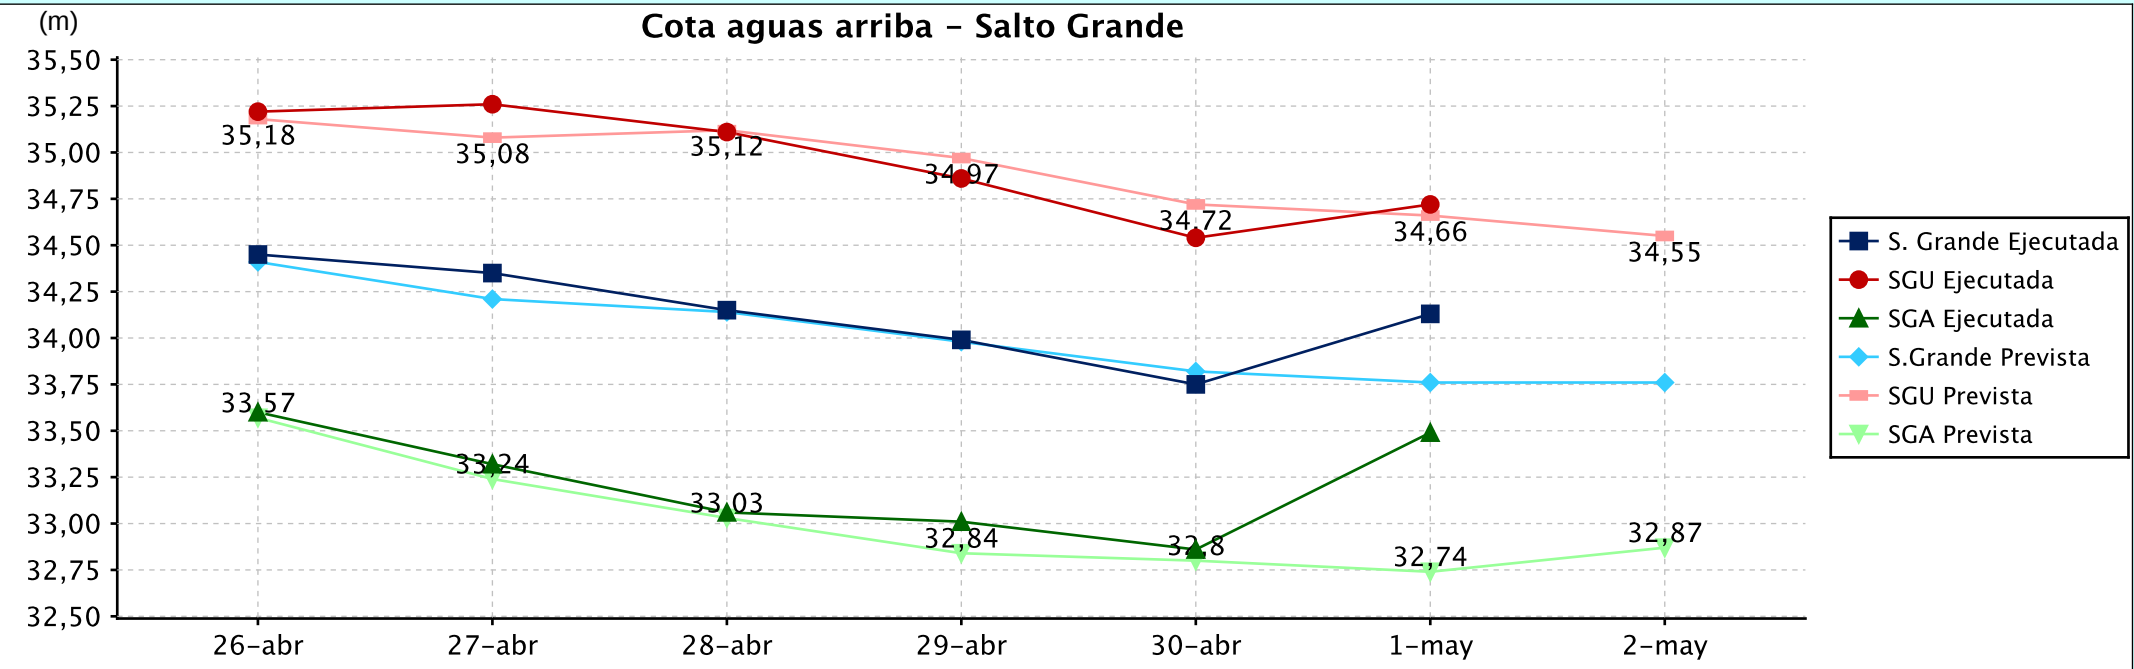

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,72
Cota Vista Arg	33,49
Cota real	34,13
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
25.868	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	669	647
Baygorria	849	844
Palmar	832	800
SGU	1.661	0

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	28	904
Baygorria	0	192
Palmar	0	1
SGU	1.600	0

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	217
Baygorria	0	158
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
