



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 02 de mayo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	120
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	124
Central La Tablada	-44
Central P. del Tigre	-1
APR A	-2
APR B	97
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.383
C. Baygorria	2.291
C. Palmar	5.270
C. Salto Grande	13.728
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.044
TOTAL Generación	26.884

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	629
Hidráulica	629
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	629




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.255
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.470
Diferencia (MWh)	-2.215
Ejecutada - Programada	-7,78 %

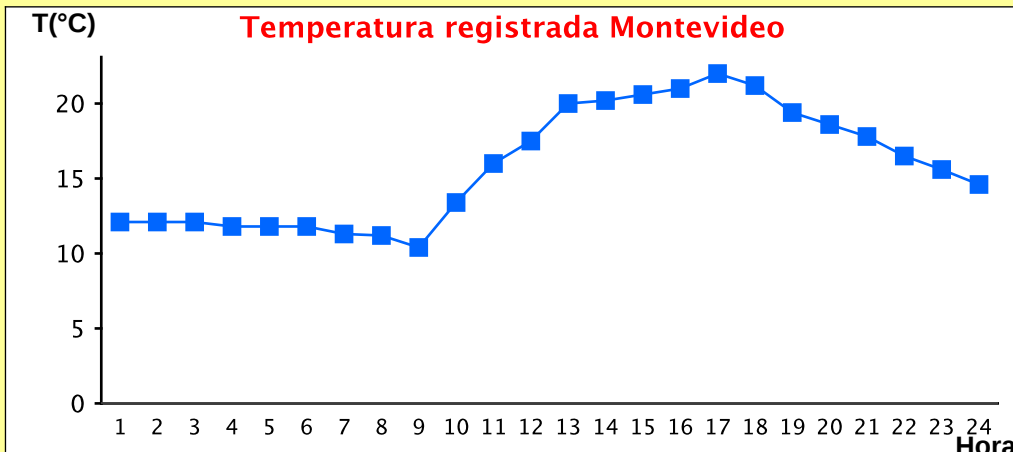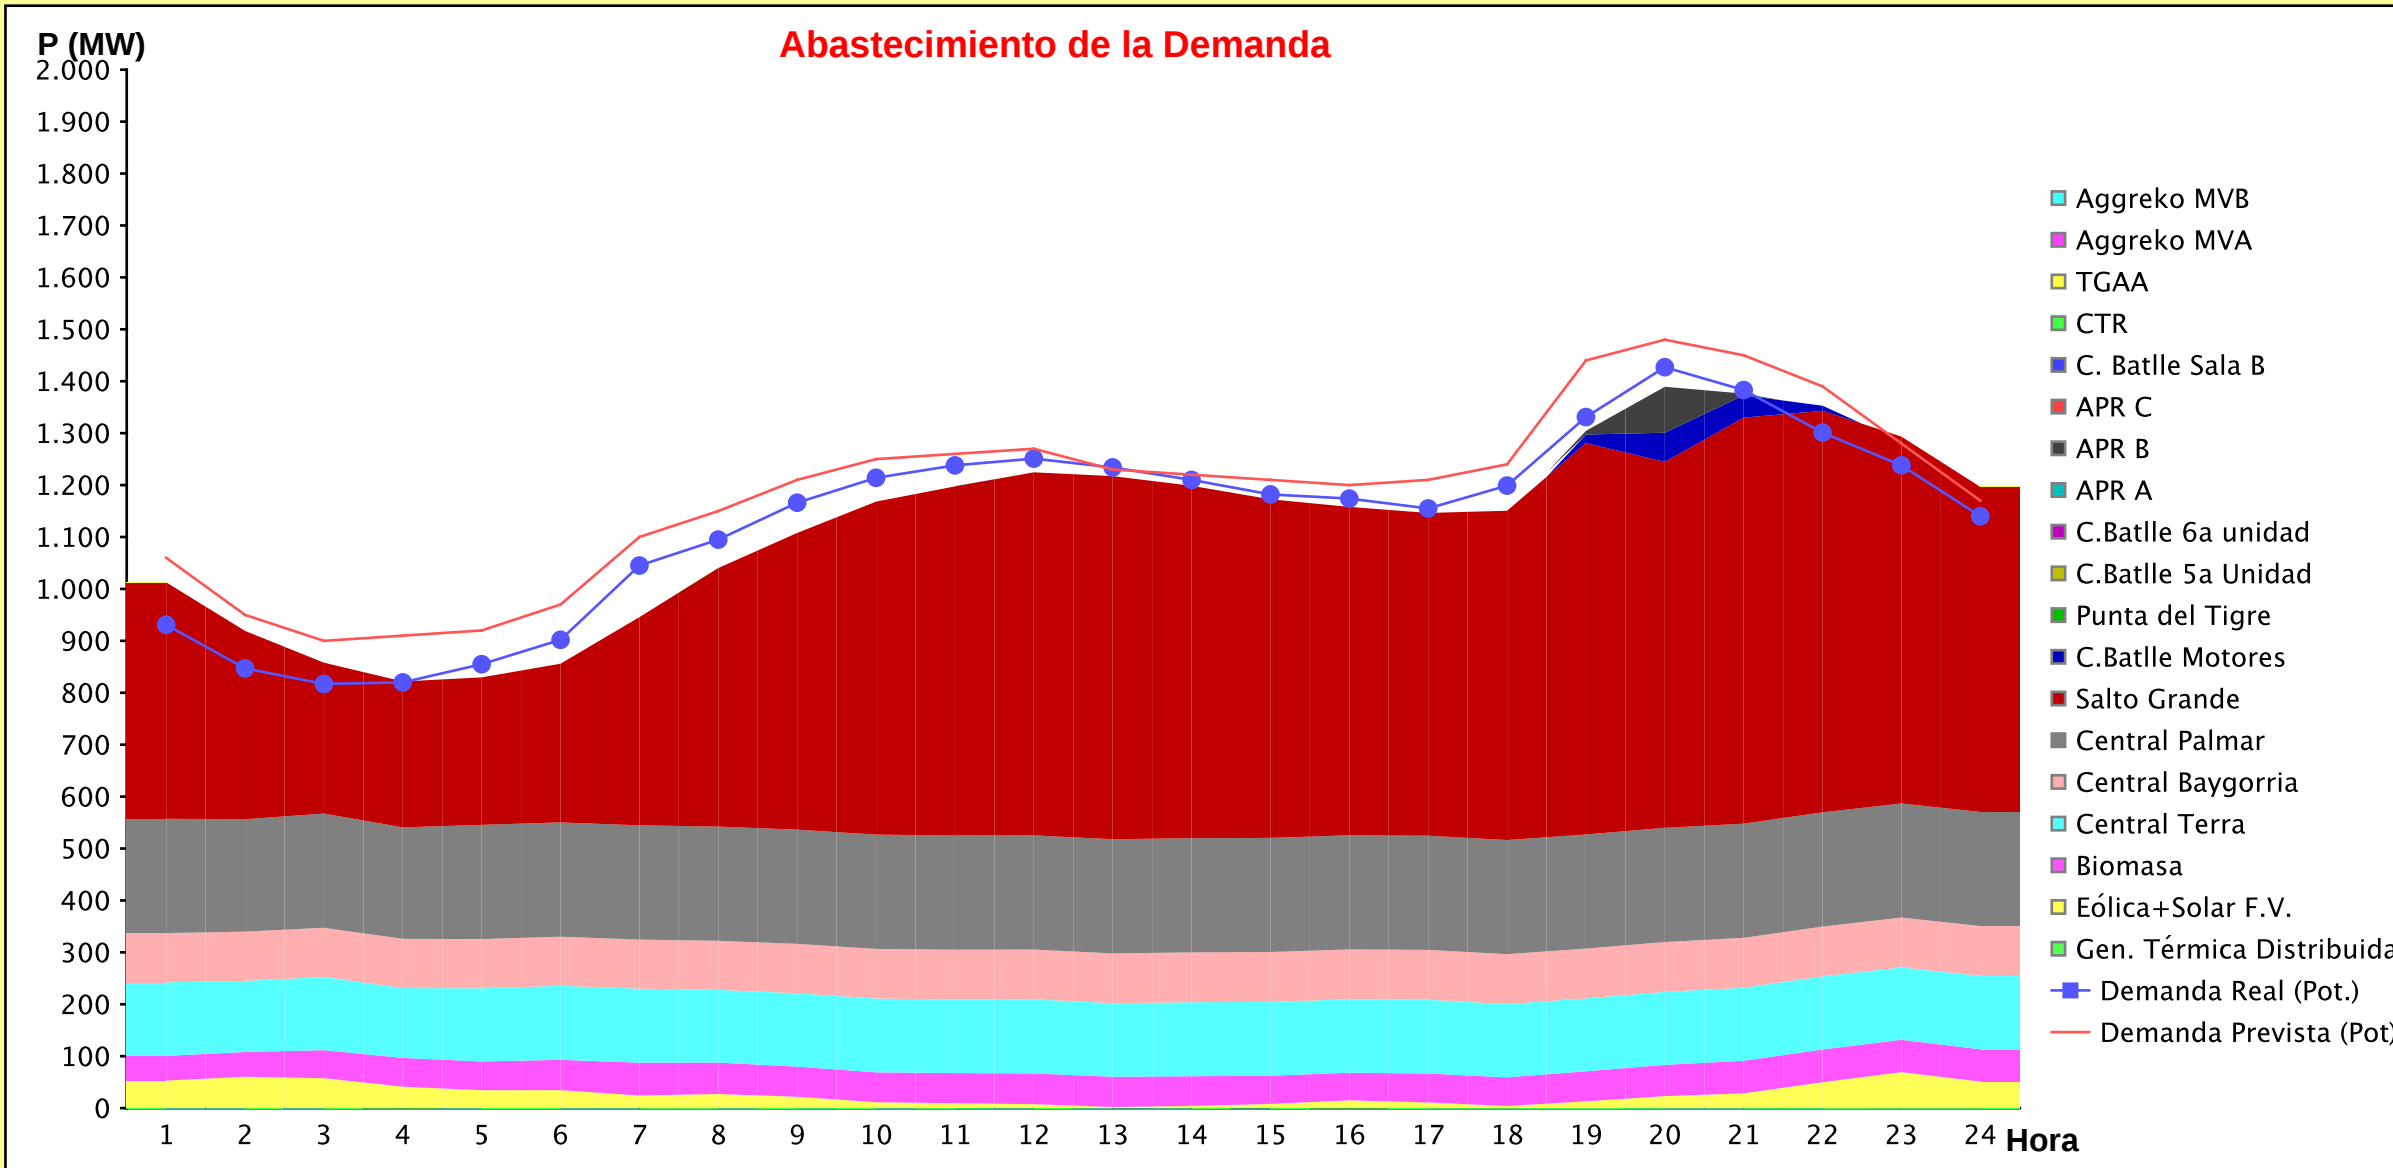



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1271,76 Hora 11:49
Potencia mínima:	795,89 Hora 03:29
Pico noche:	1434,58 Hora 19:53

Generación Media (MW)	
Eólica	28,0
Biomasa	66,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

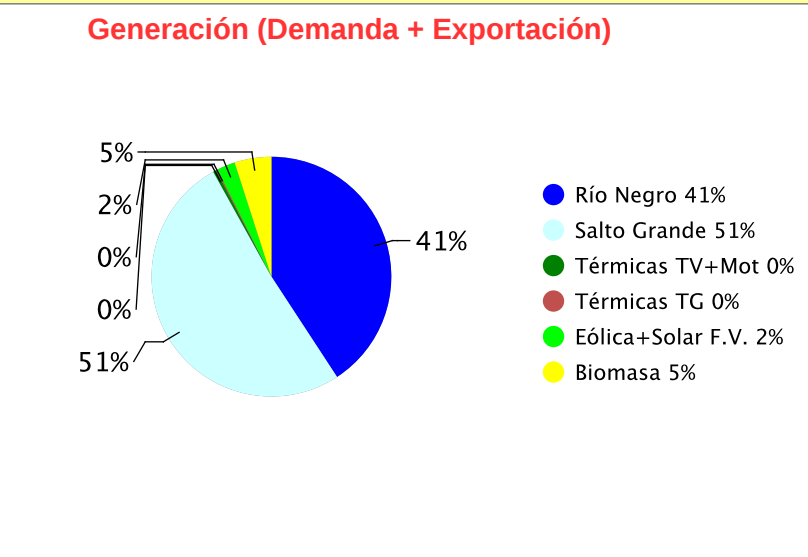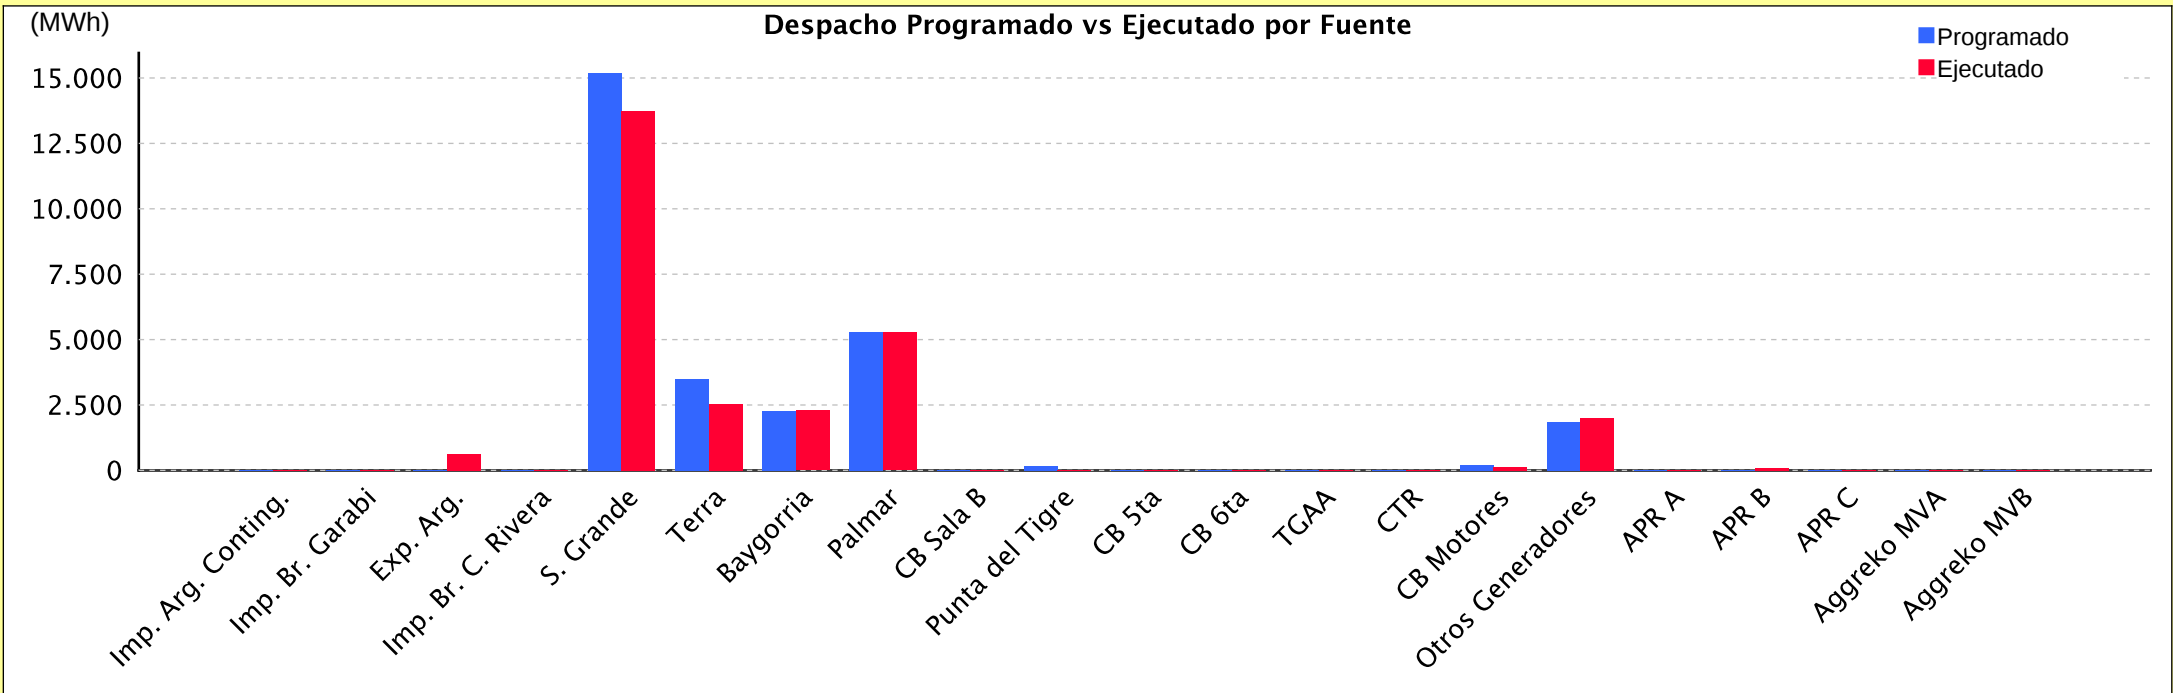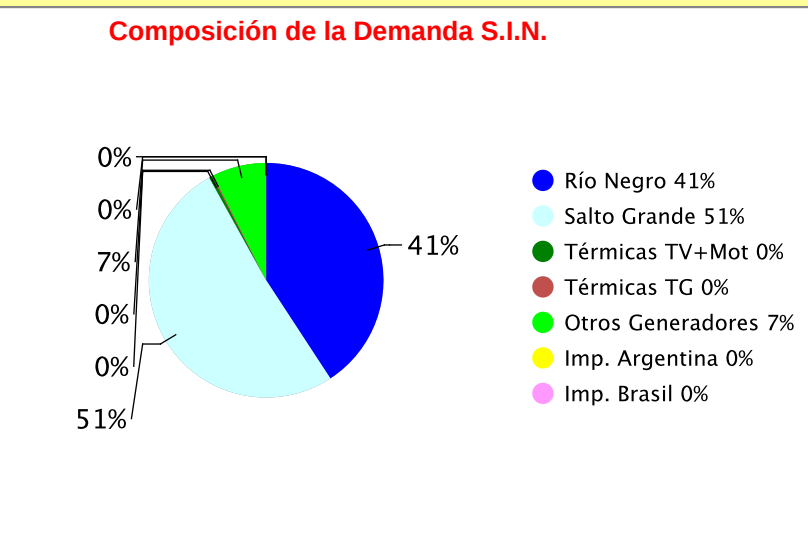



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

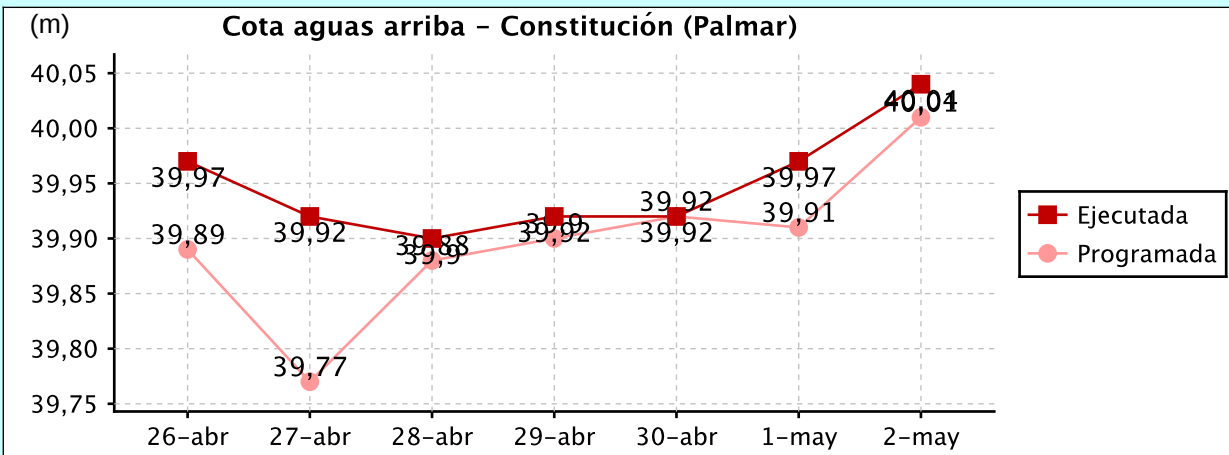
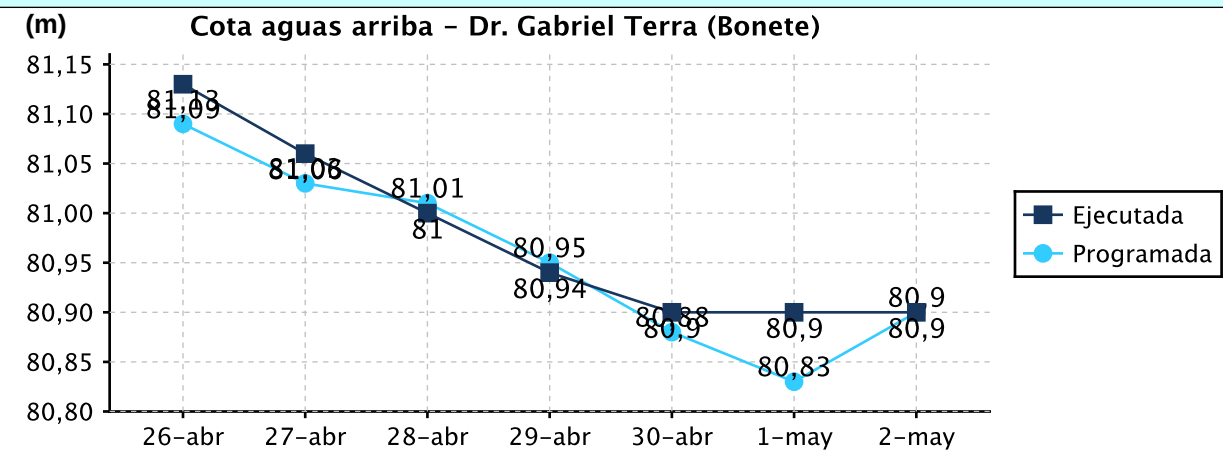


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,90	80,9
Baygorria	54,18	54,2
Palmar	40,01	40,04
SGU	34,55	34,35

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

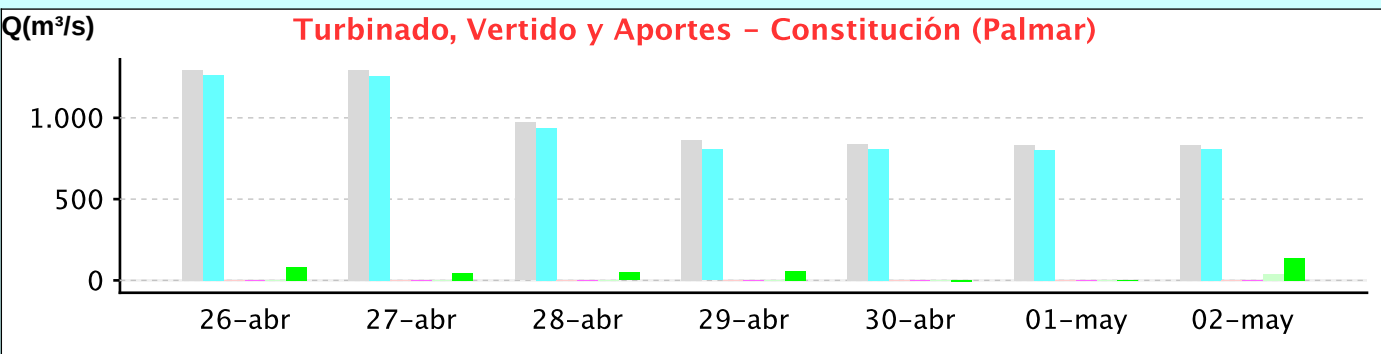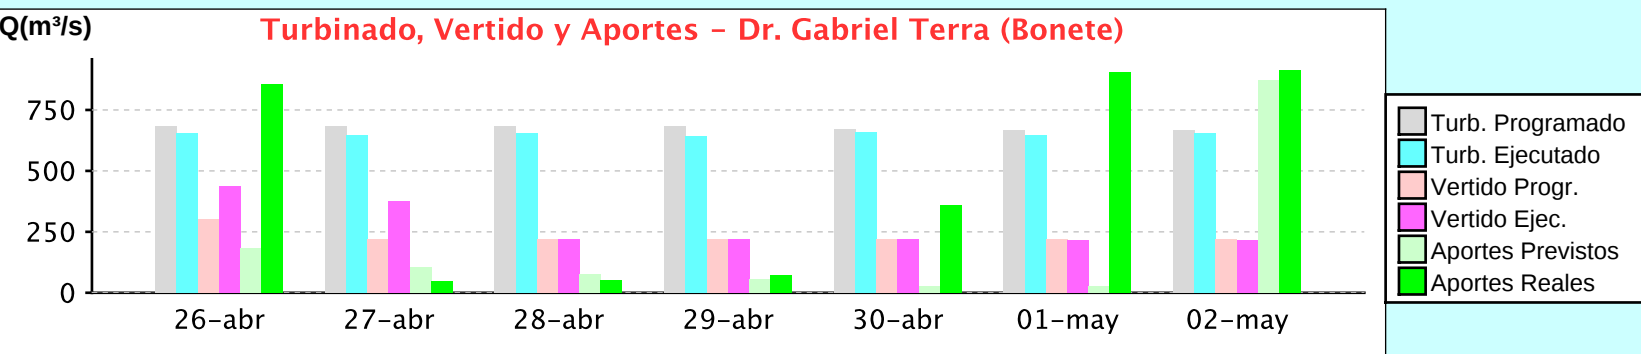

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

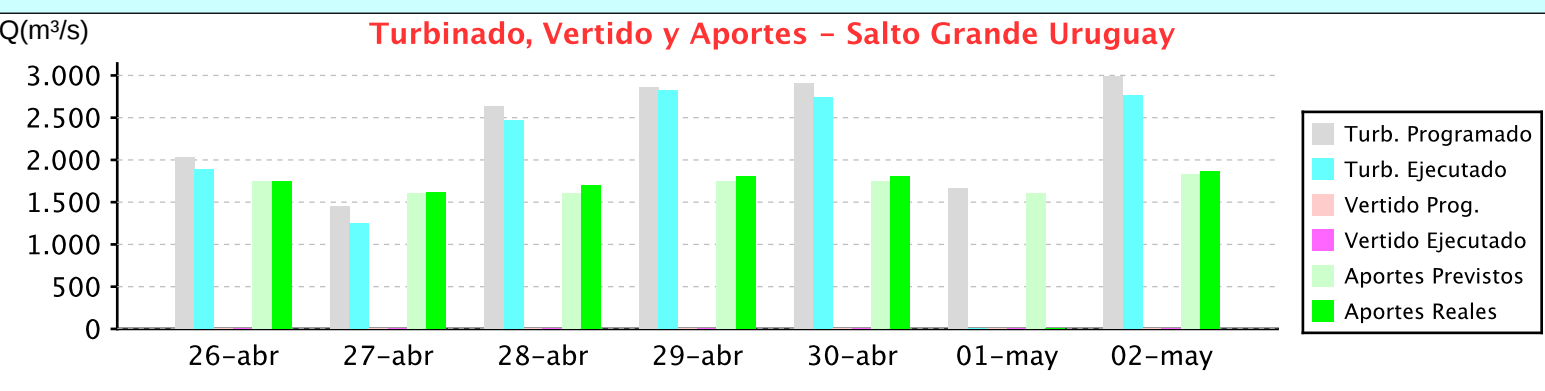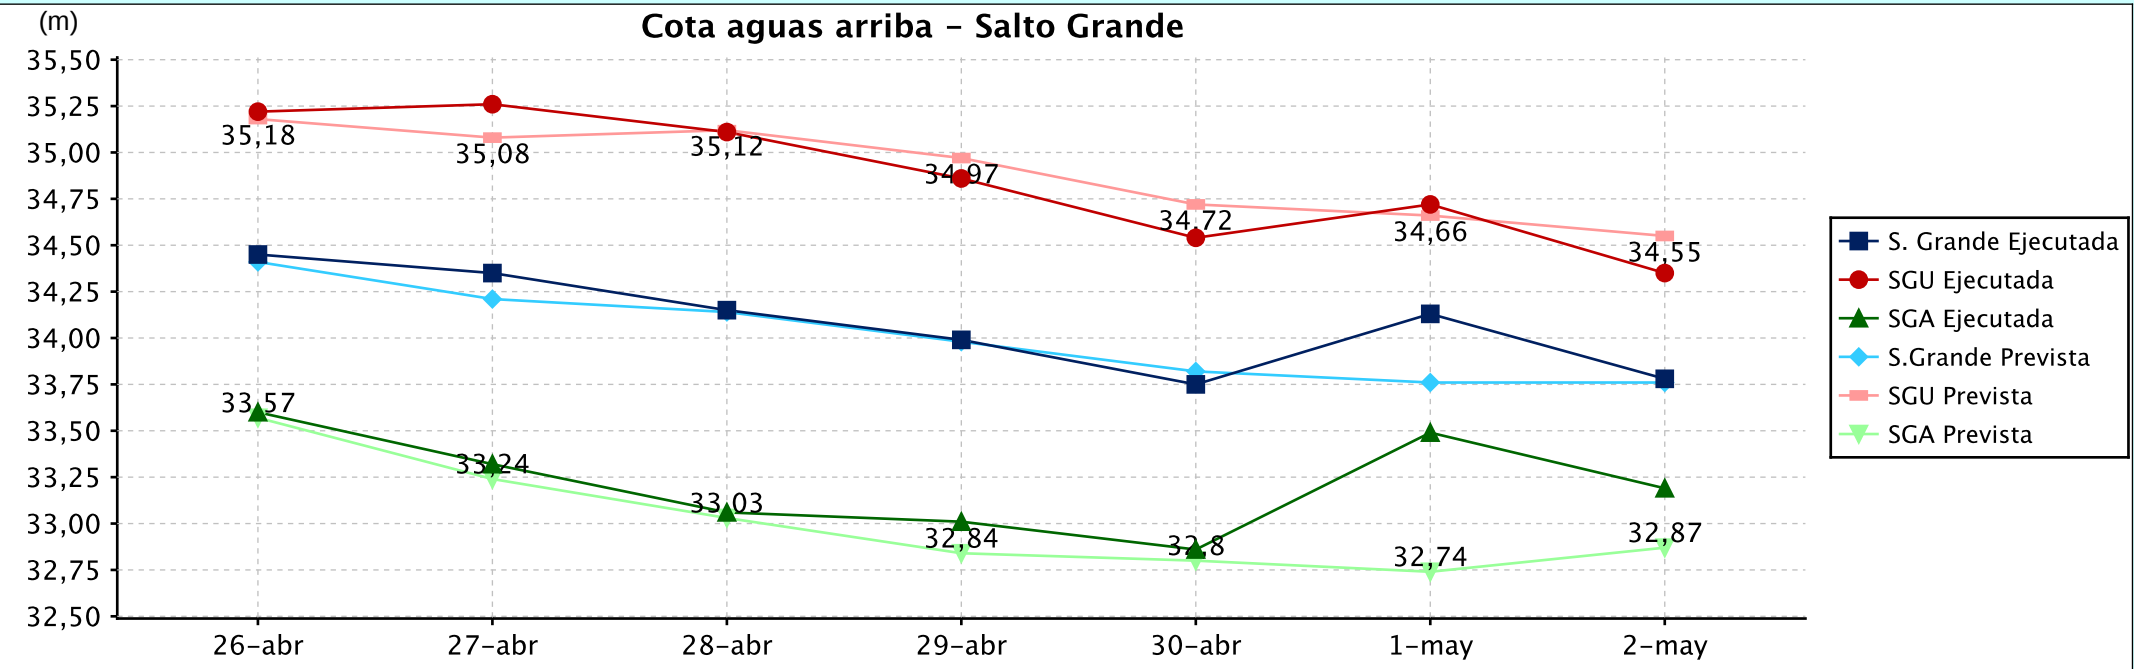

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,35
Cota Vista Arg	33,19
Cota real	33,78
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	23.447

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	669	656
Baygorria	849	839
Palmar	832	807
SGU	2.992	2.762

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	871	912
Baygorria	63	75
Palmar	37	139
SGU	1.825	1.866

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	217
Baygorria	150	90
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
