



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 11 de mayo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-47
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.352
C. Baygorria	2.315
C. Palmar	5.254
C. Salto Grande	20.124
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.168
TOTAL Generación	33.147

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	9.286
Hidráulica	9.286
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	9.286




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.861
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	24.160
Diferencia (MWh)	-299
Ejecutada - Programada	-1,24 %

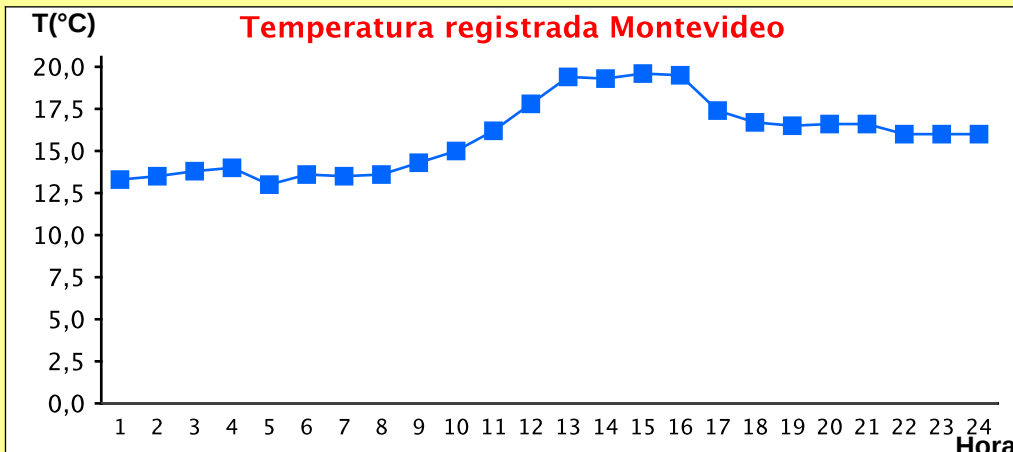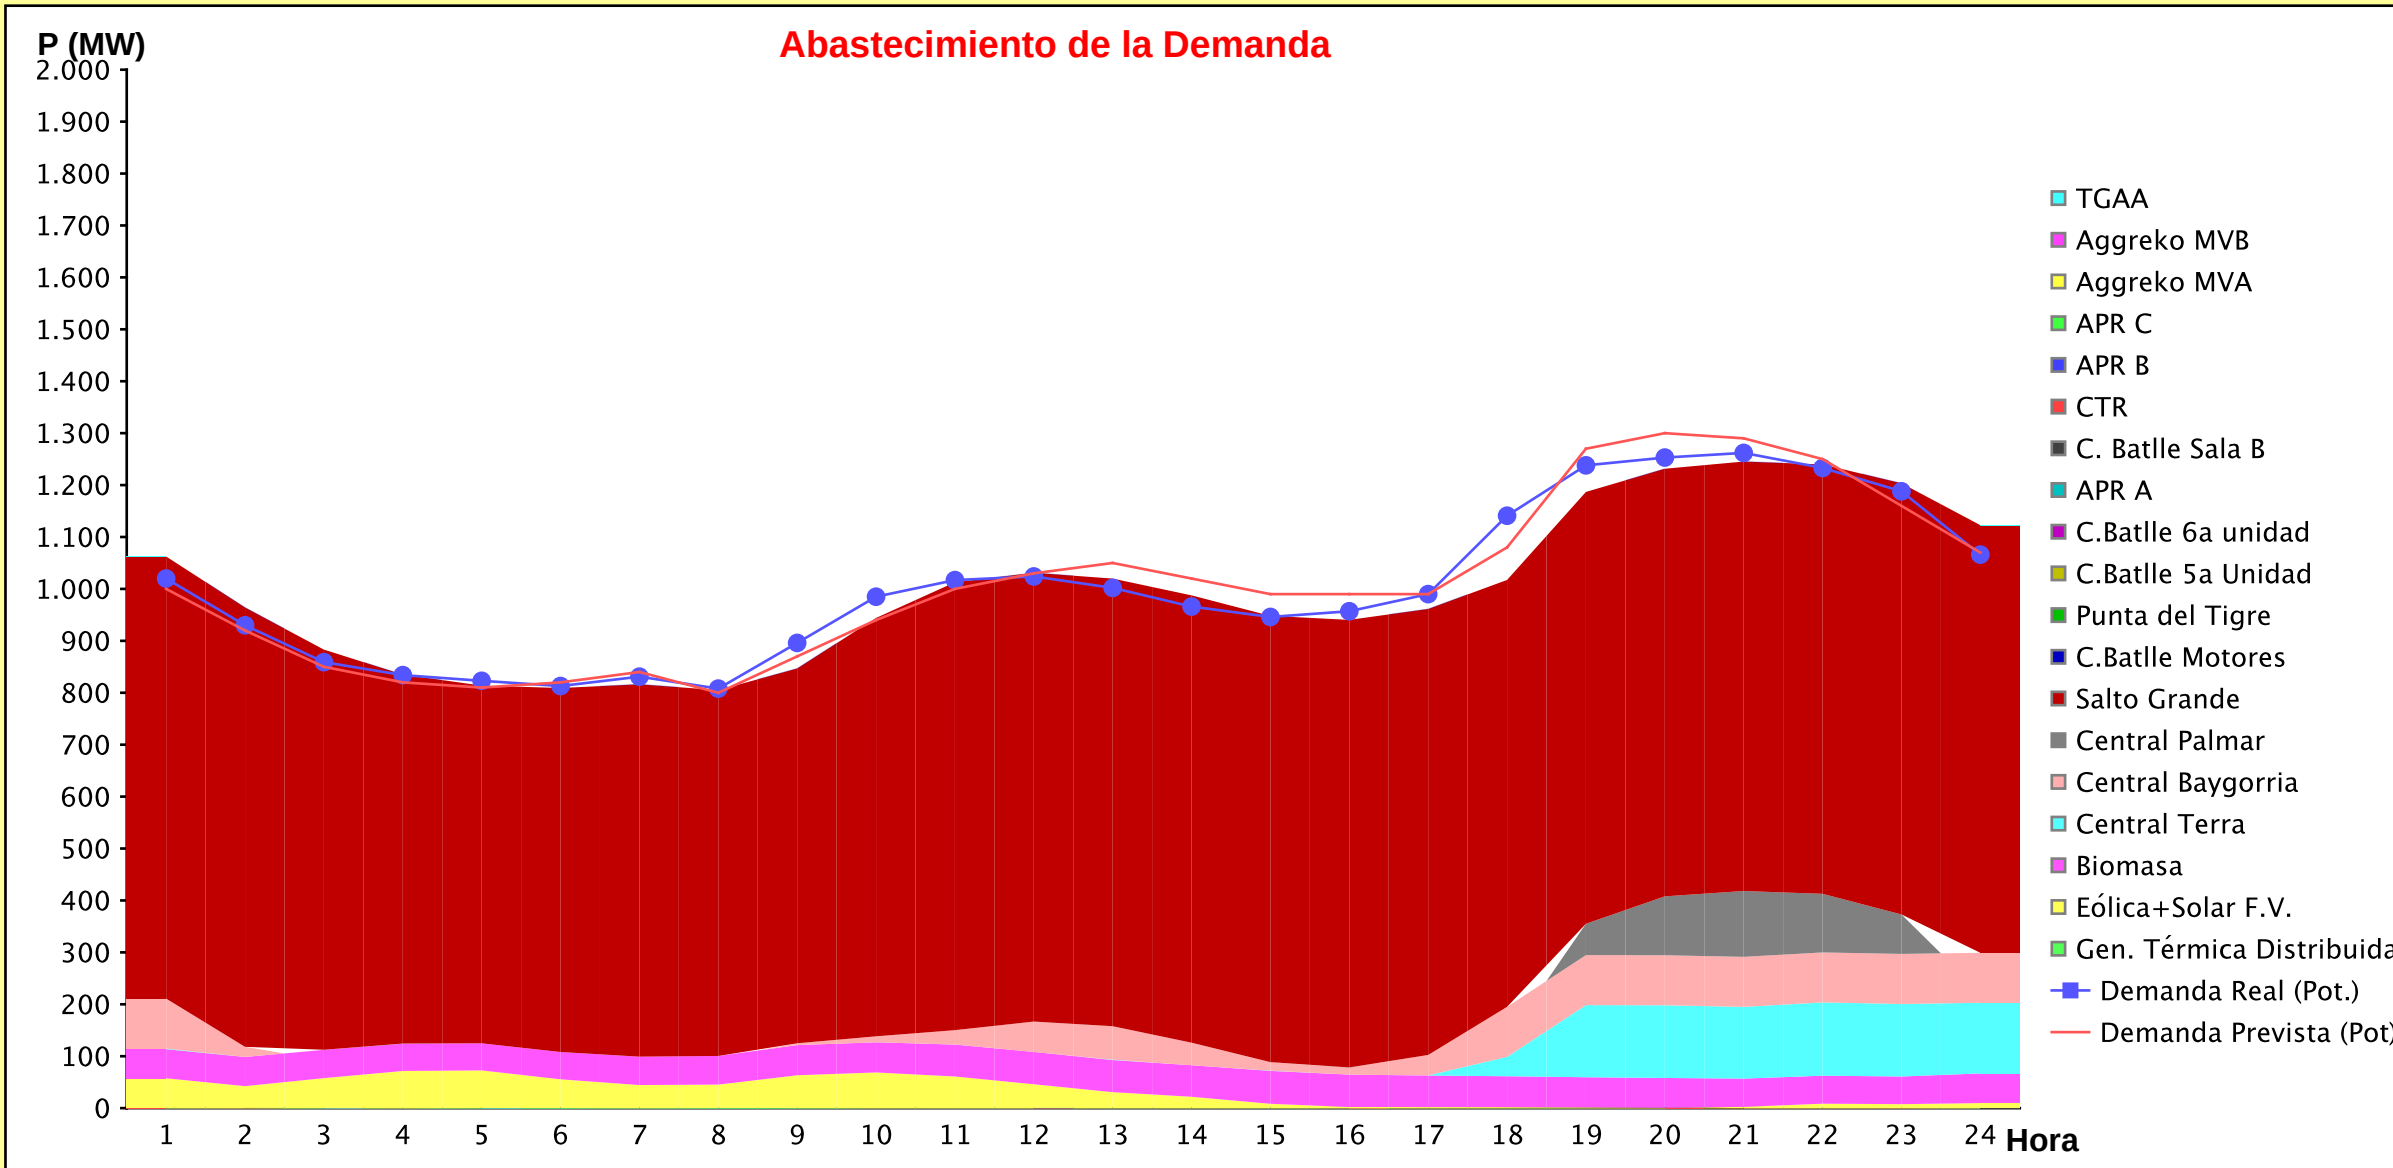



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1059,67 Hora 10:45
Potencia mínima:	794,17 Hora 07:46
Pico noche:	1280,22 Hora 20:43

Generación Media (MW)	
Eólica	33,0
Biomasa	65,9
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

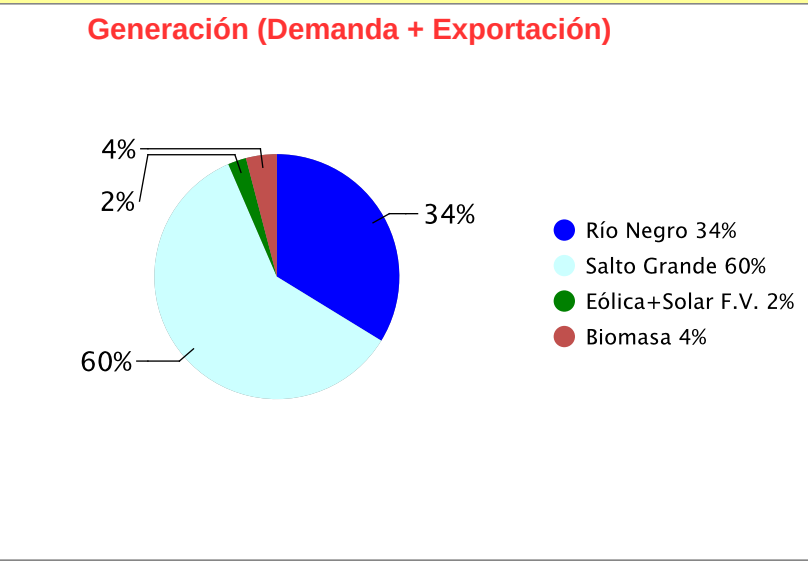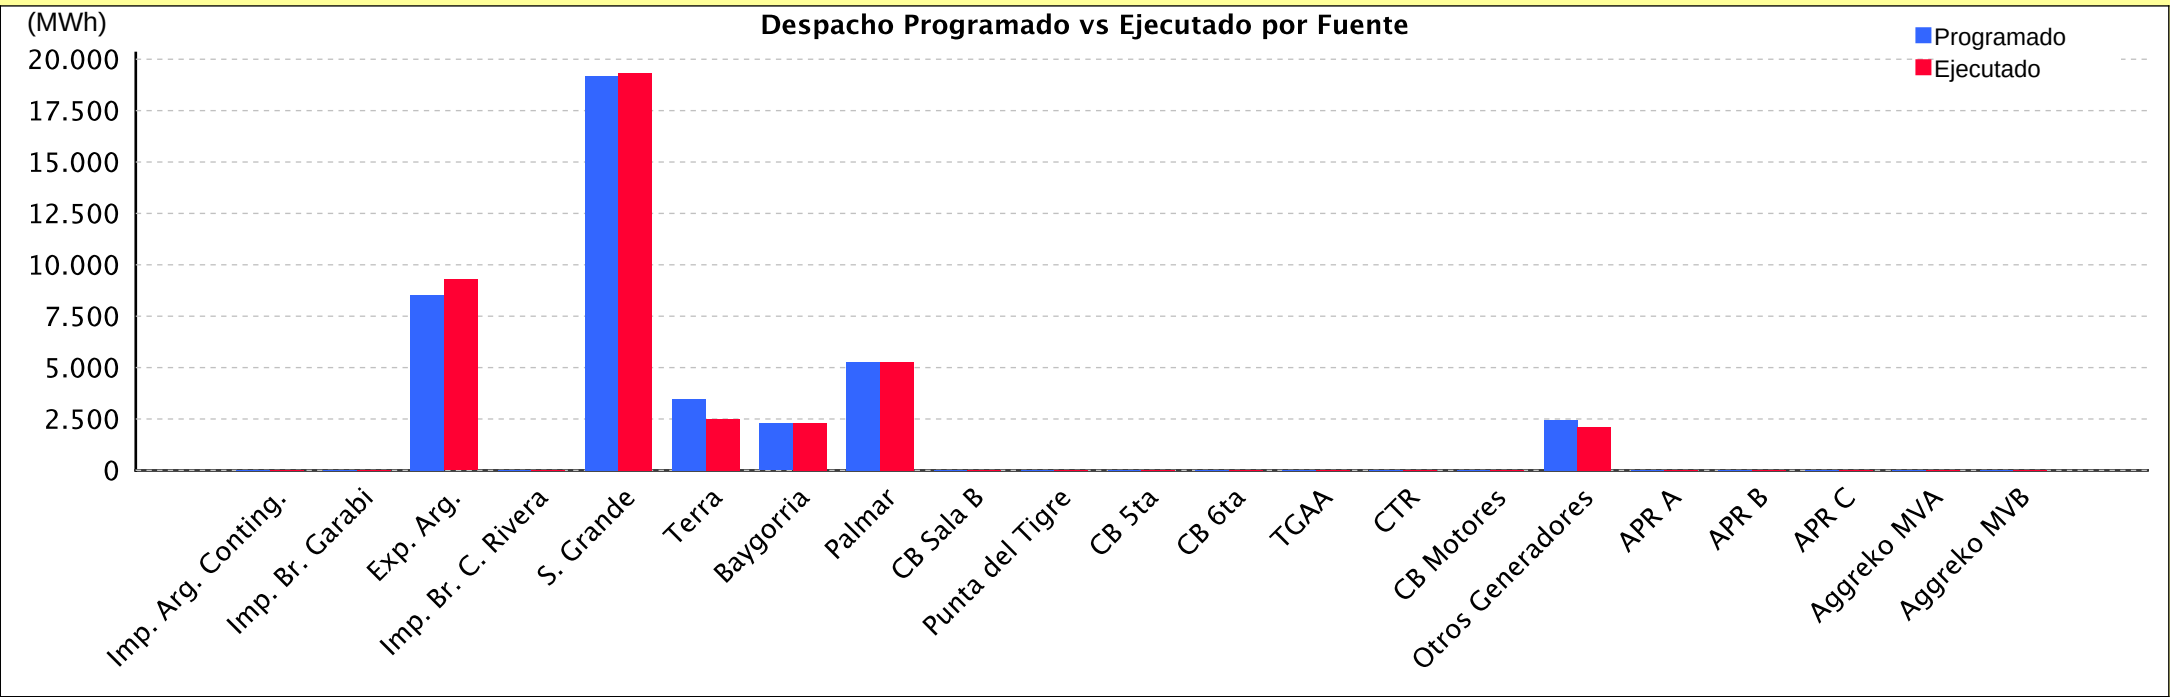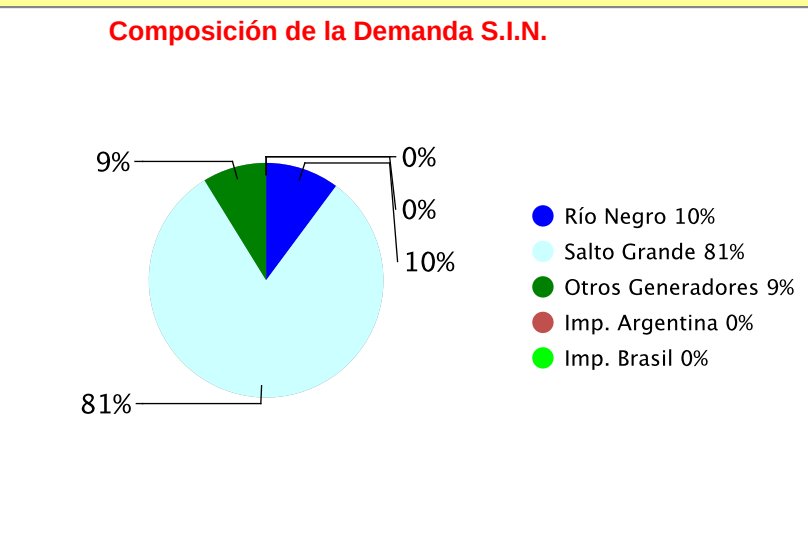



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

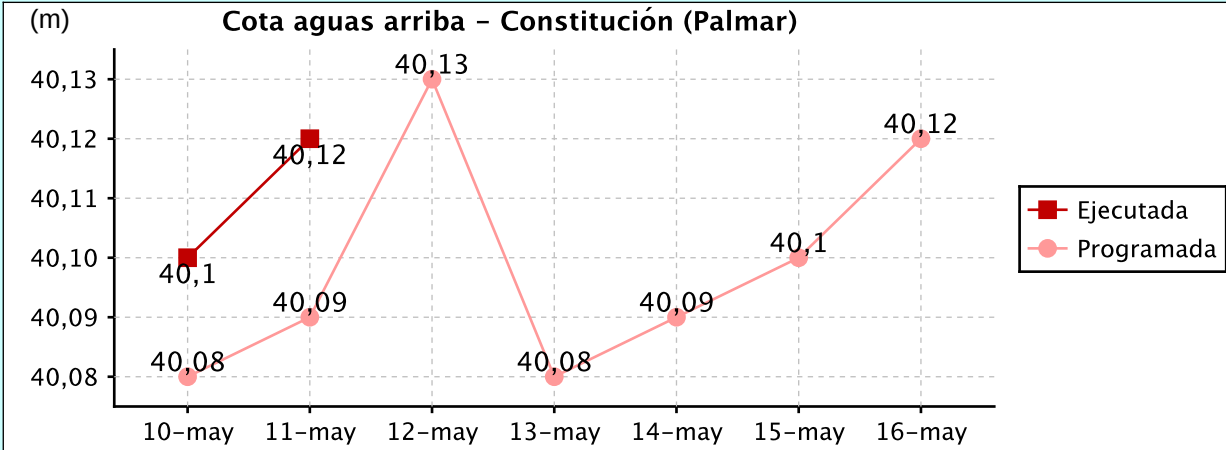
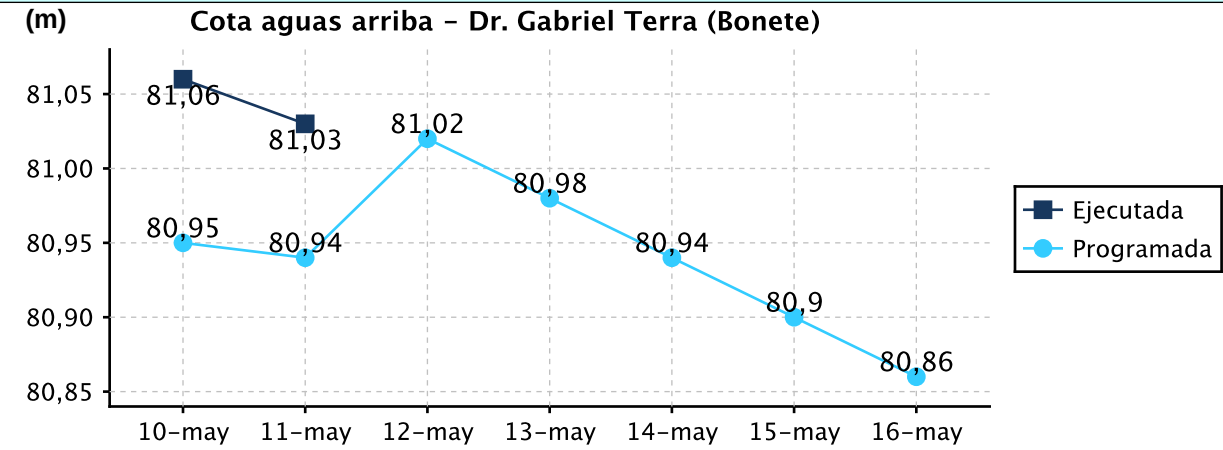


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,94	81,03
Baygorria	54,06	54,21
Palmar	40,09	40,12
SGU	35,47	35,45

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

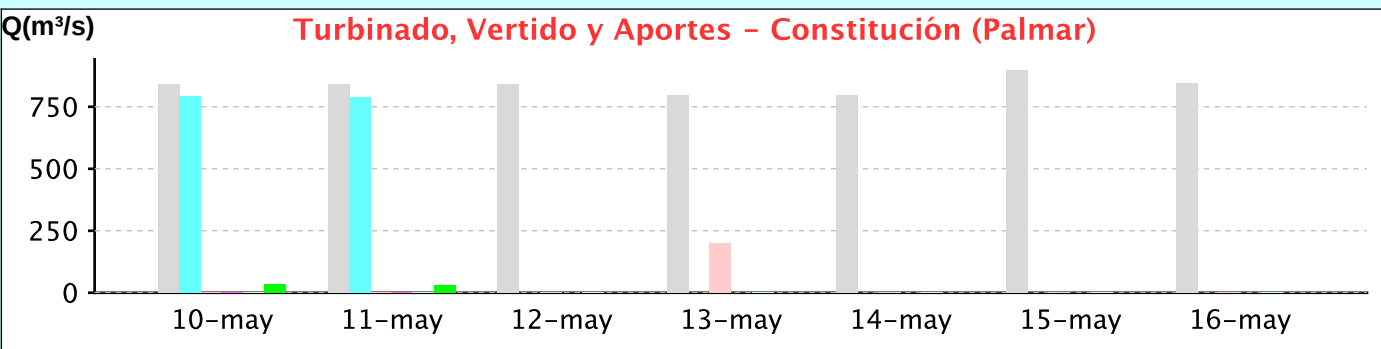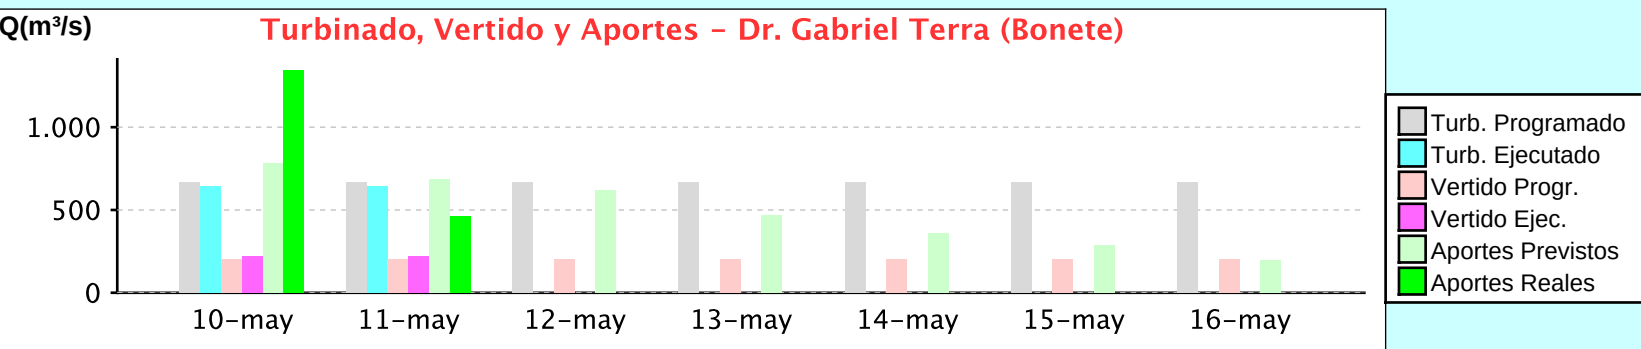

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

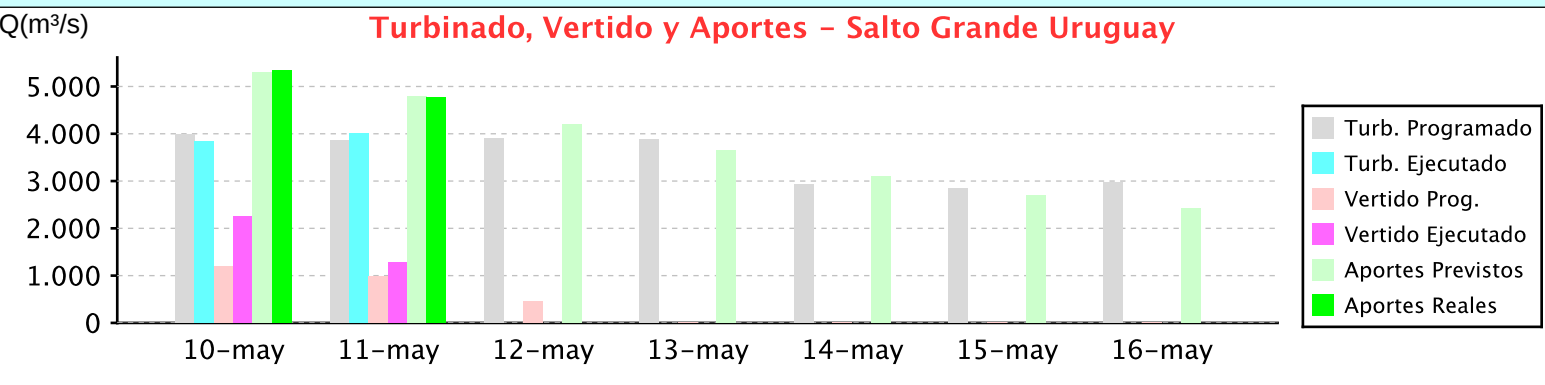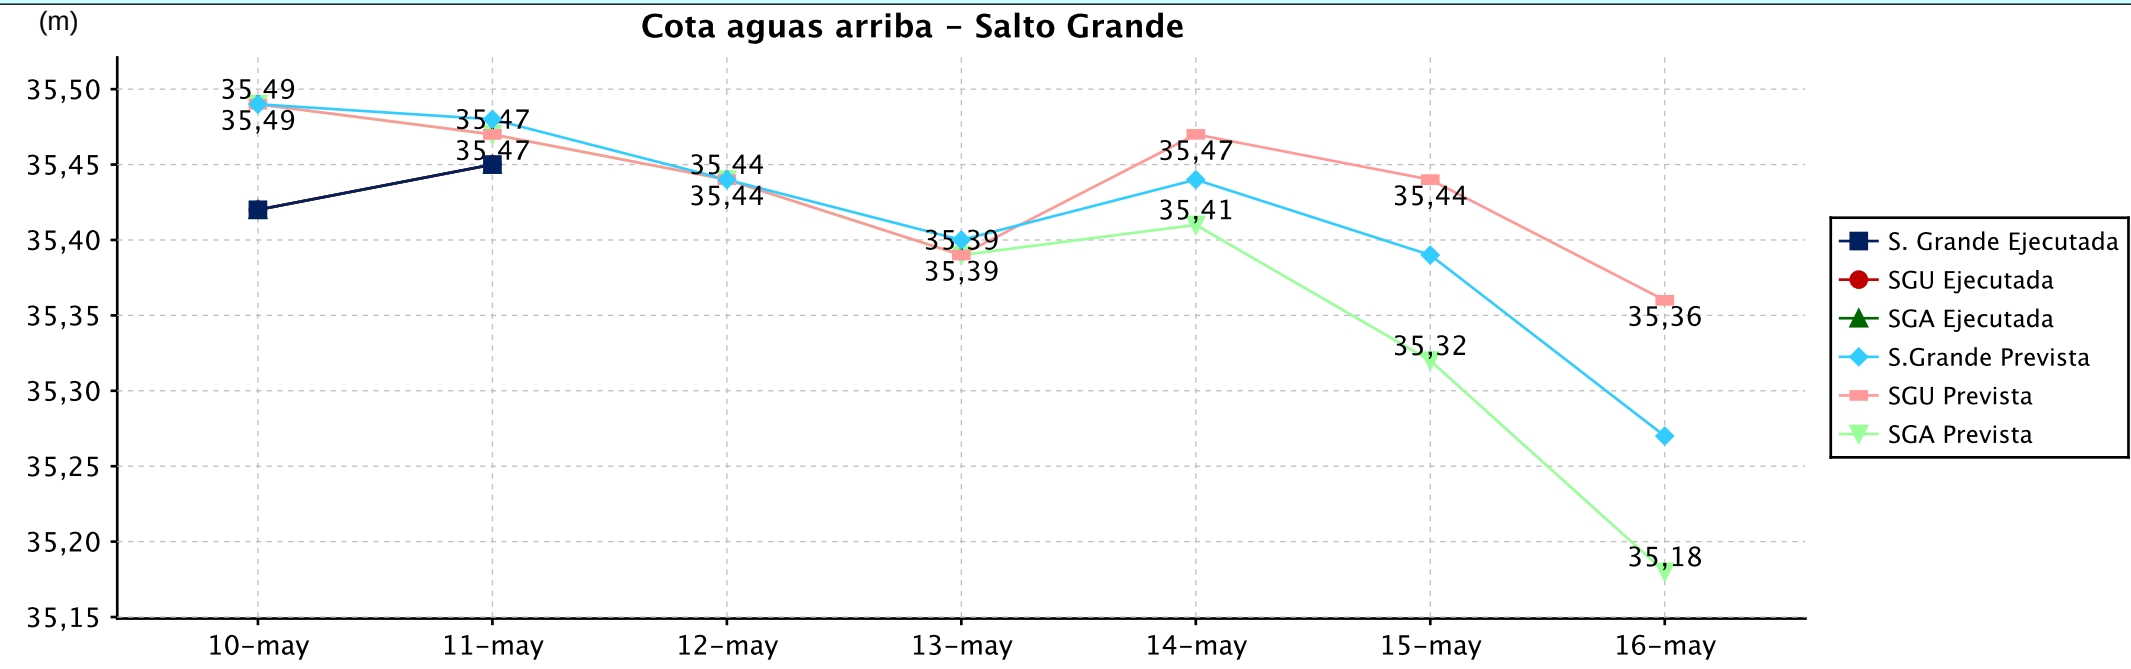

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,45
Cota Vista Arg	35,45
Cota real	35,45
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	642
Baygorria	856	849
Palmar	840	790
SGU	3.865	4.017

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	688	464
Baygorria	0	16
Palmar	0	29
SGU	4.800	4.762

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	200	222
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	988	1.275

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
