




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 12 de mayo de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	157
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	160
Central La Tablada	-45
Central P. del Tigre	-5
APR A	123
APR B	-2
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.362
C. Baygorria	2.311
C. Palmar	5.254
C. Salto Grande	20.248
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	1.518
TOTAL Generación	32.921

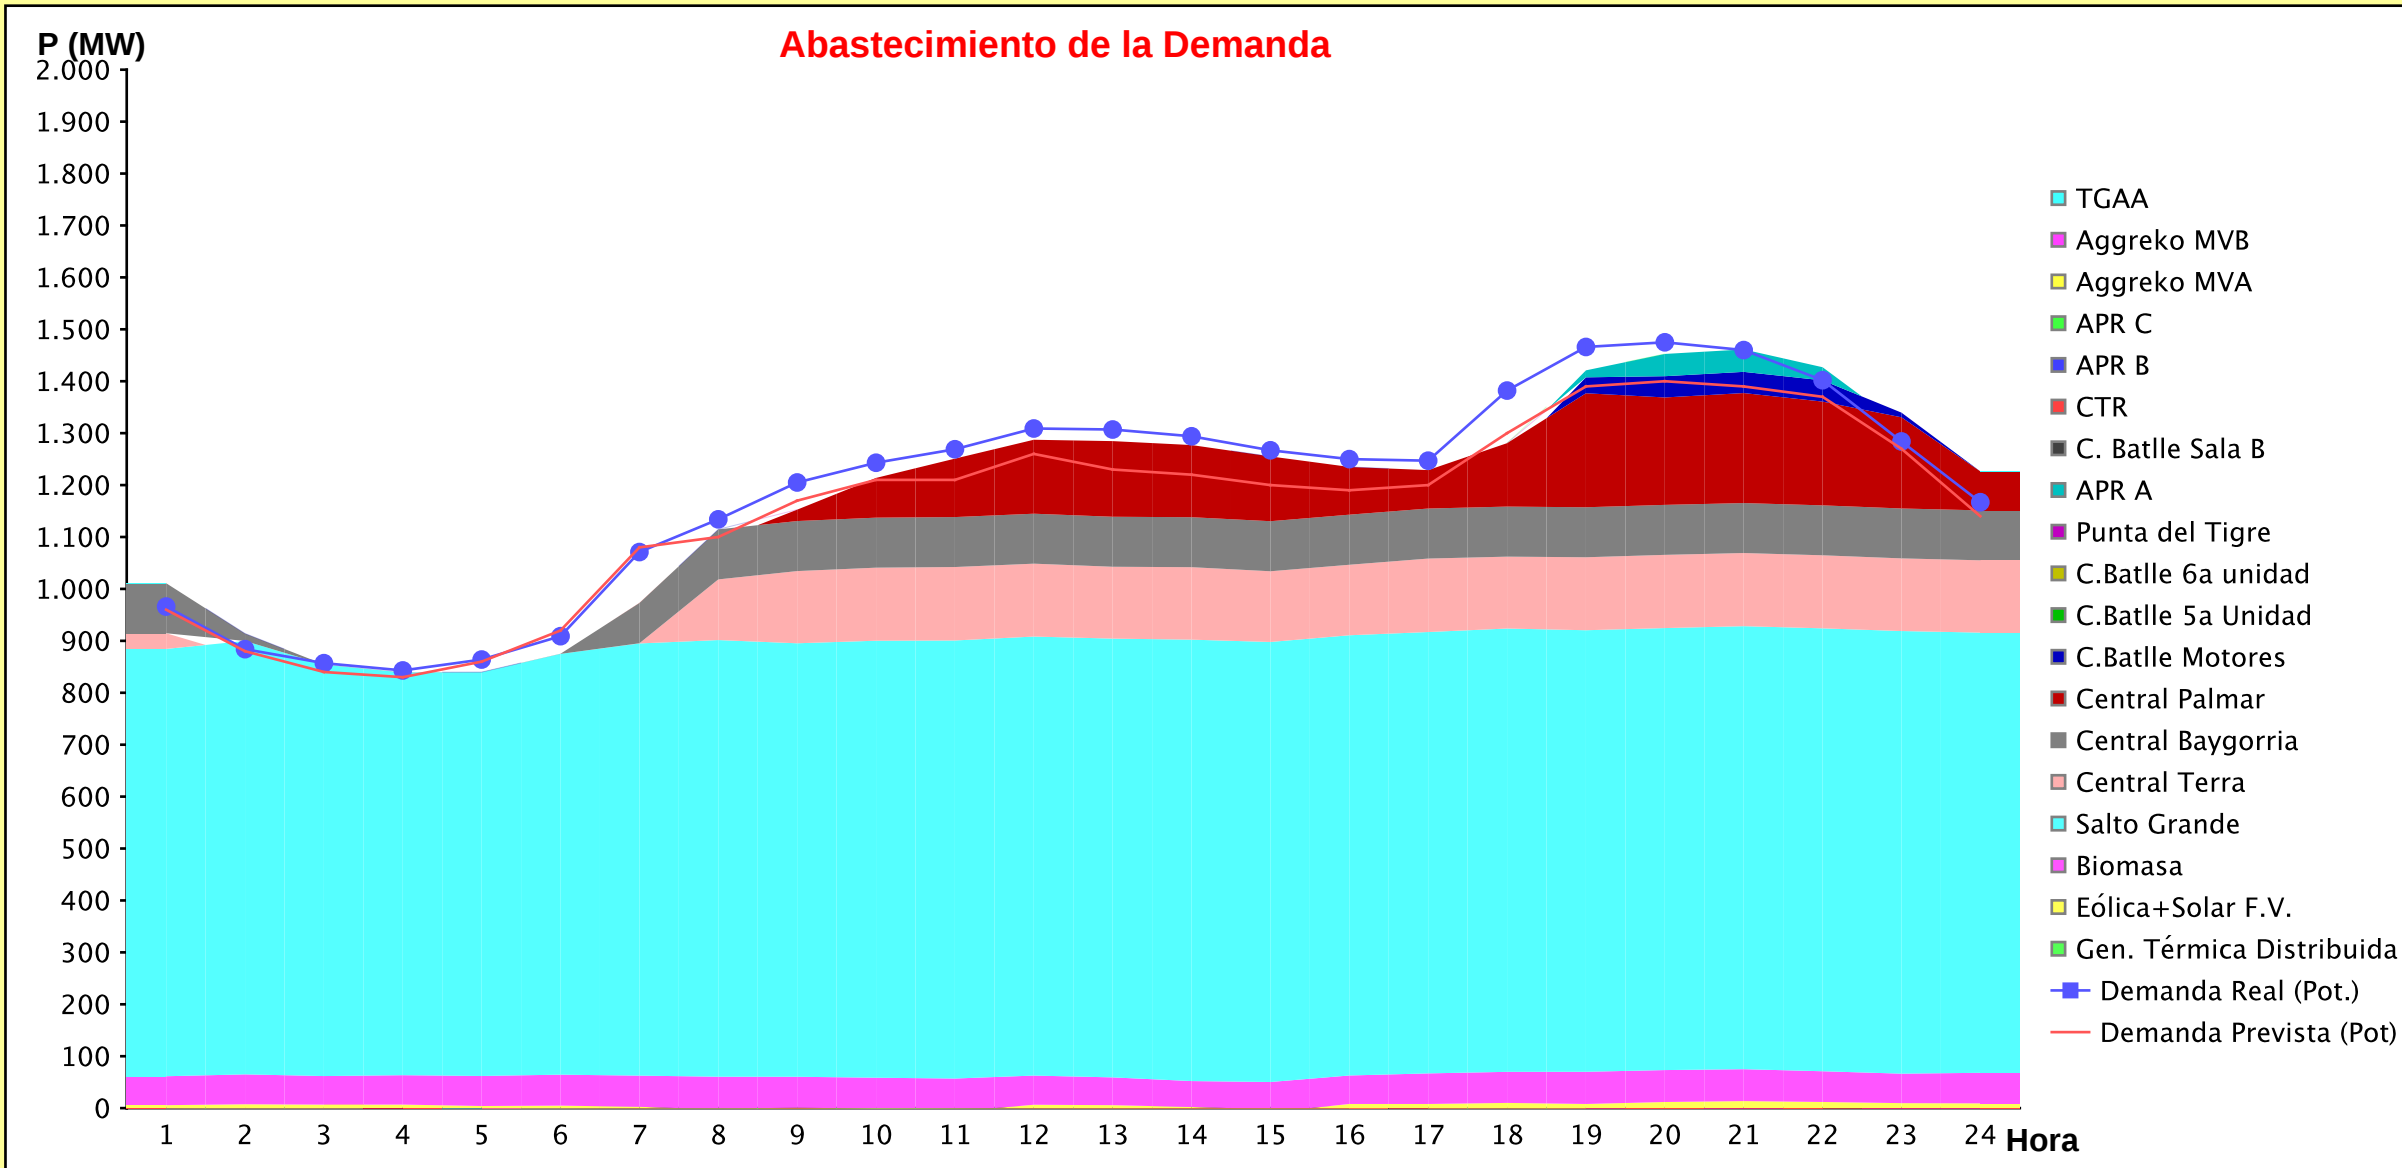

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	4.775
Hidráulica	4.775
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	4.775




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.146
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.620
Diferencia (MWh)	526
Ejecutada - Programada	1,90 %

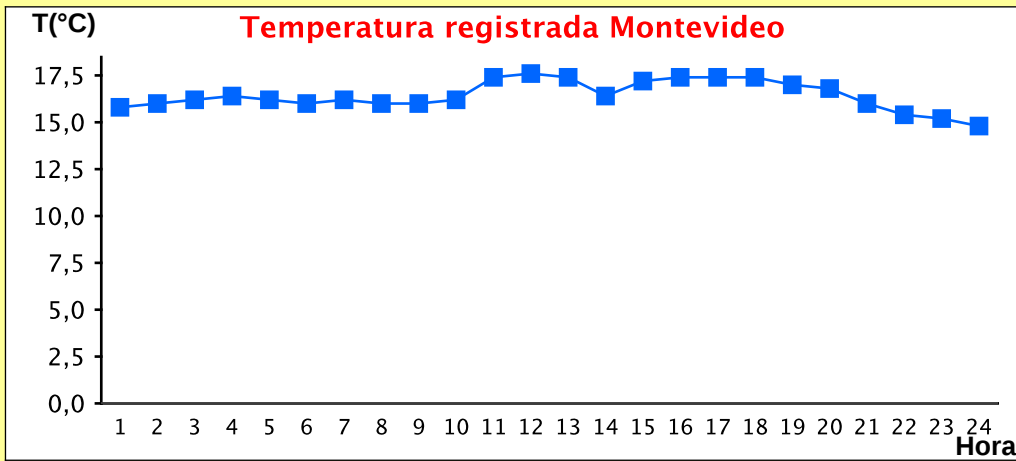



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1326,2 Hora 11:53
Potencia mínima:	840,57 Hora 03:45
Pico noche:	1499,67 Hora 19:55

Generación Media (MW)	
Eólica	6,5
Biomasa	67,6
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

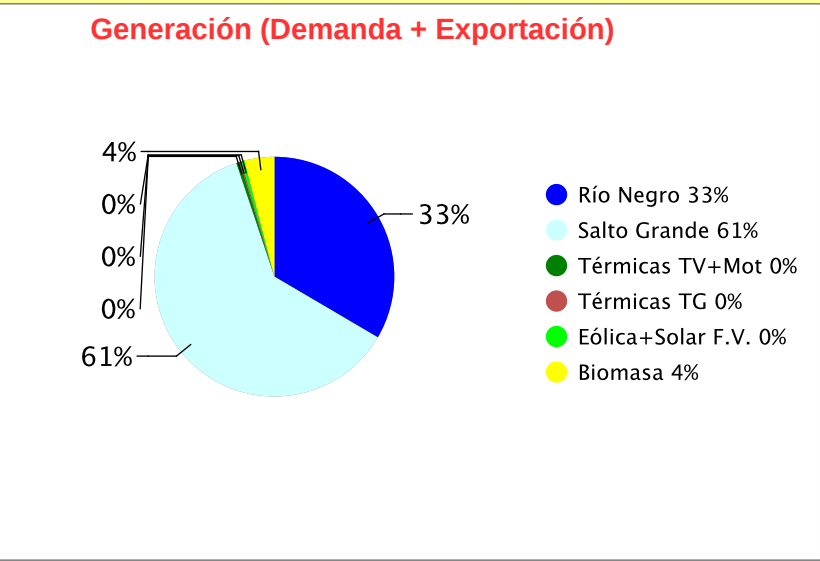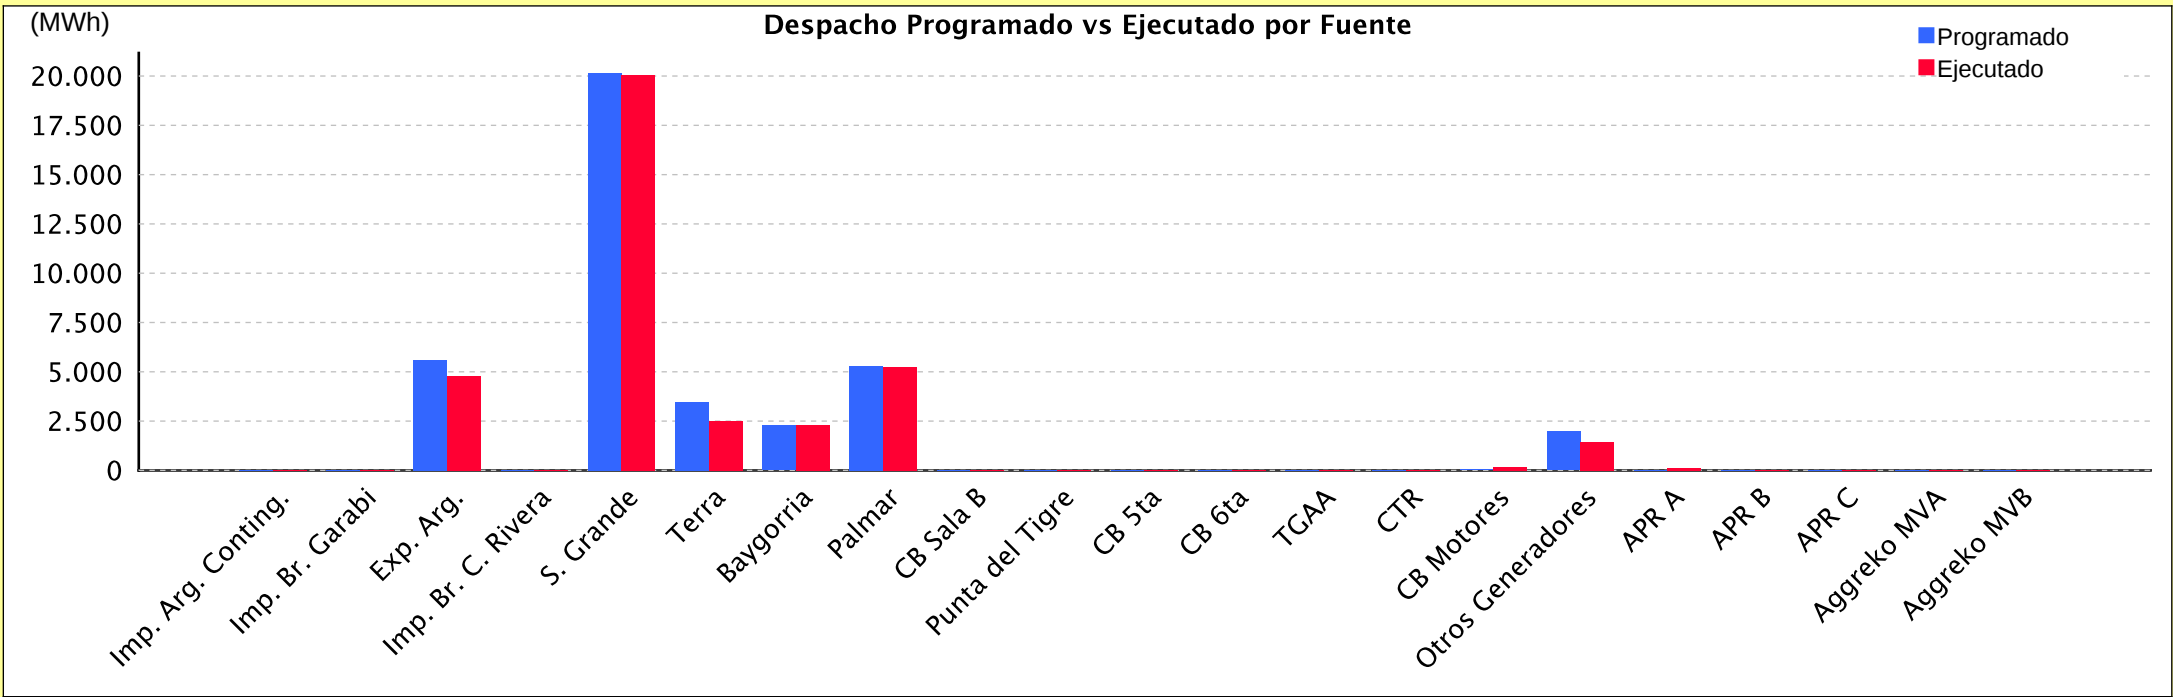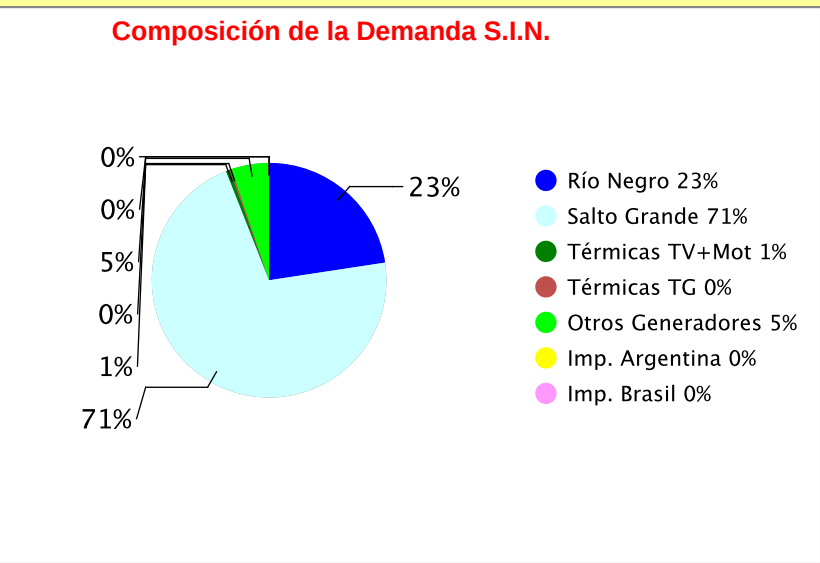



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

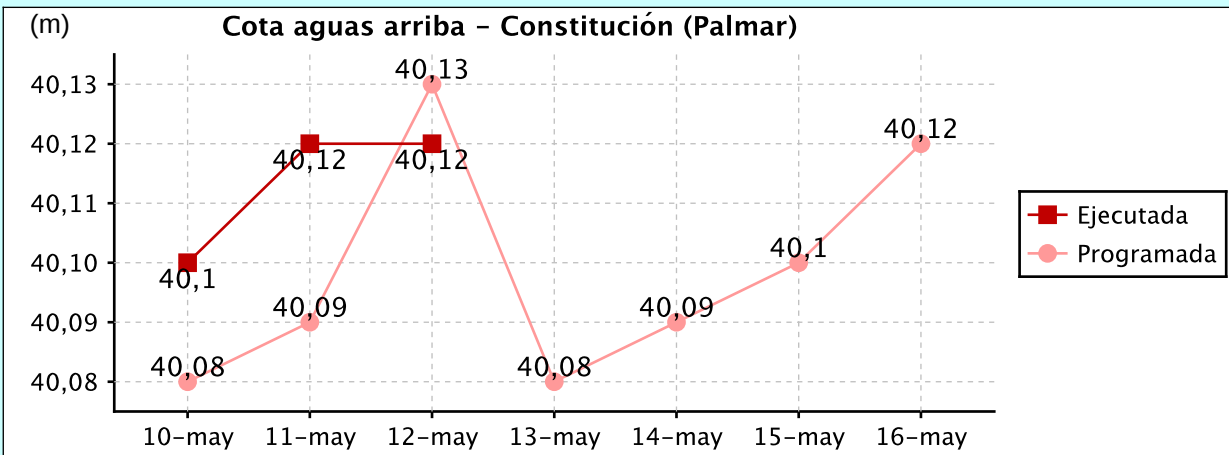
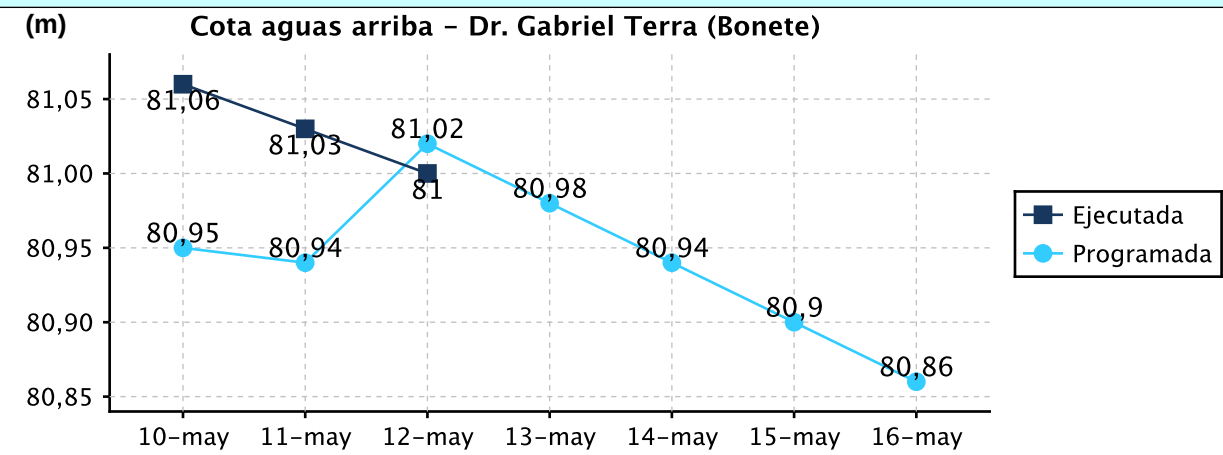


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,02	81
Baygorria	54,21	54,22
Palmar	40,13	40,12
SGU	35,44	35,48

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

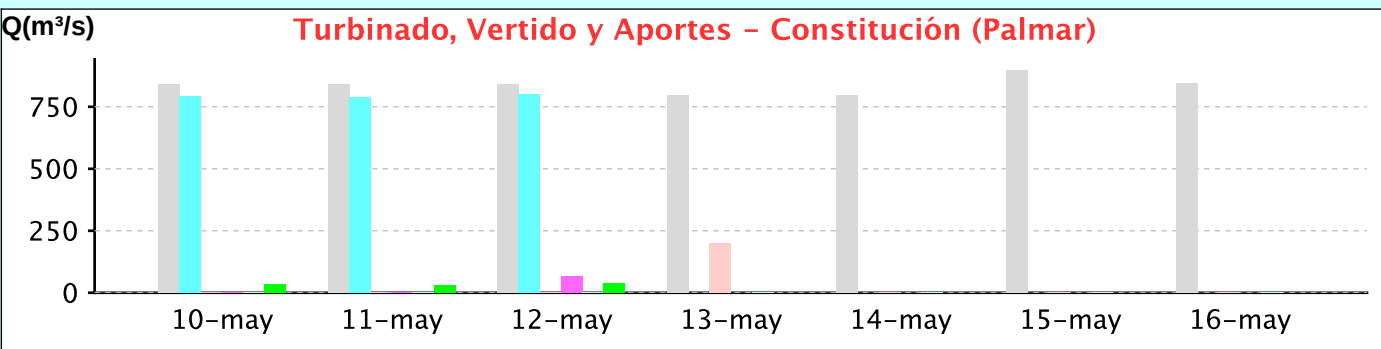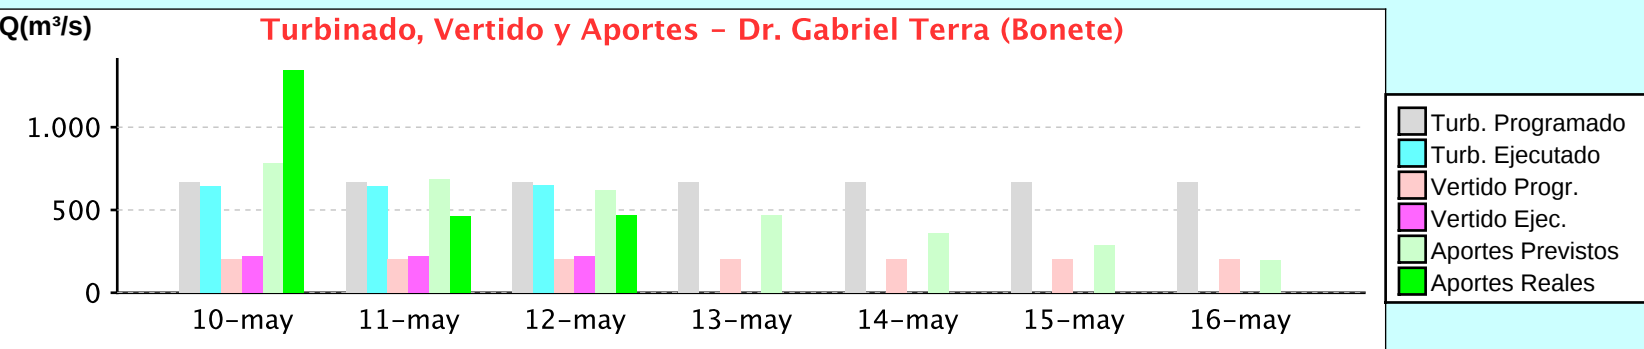

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

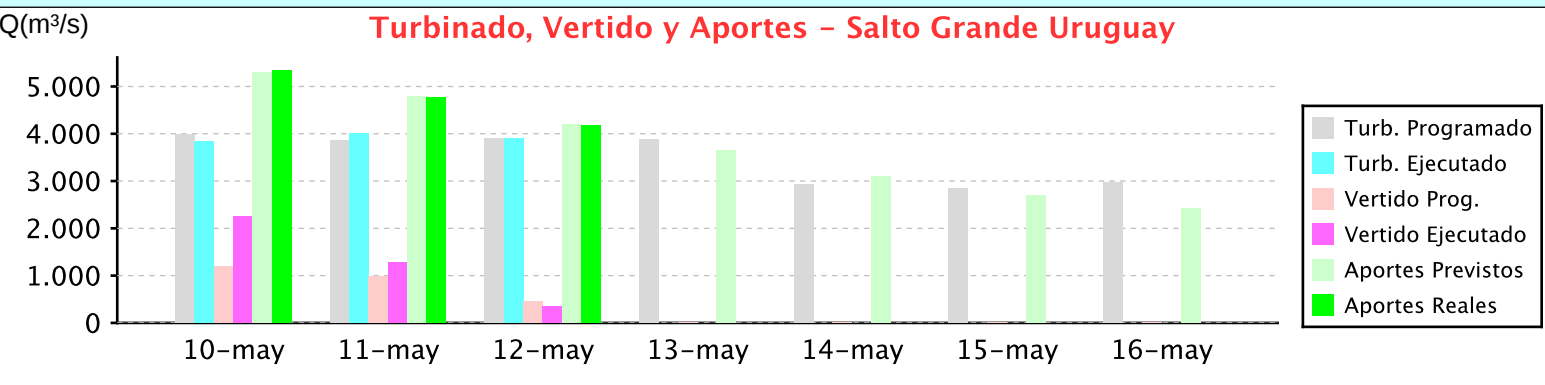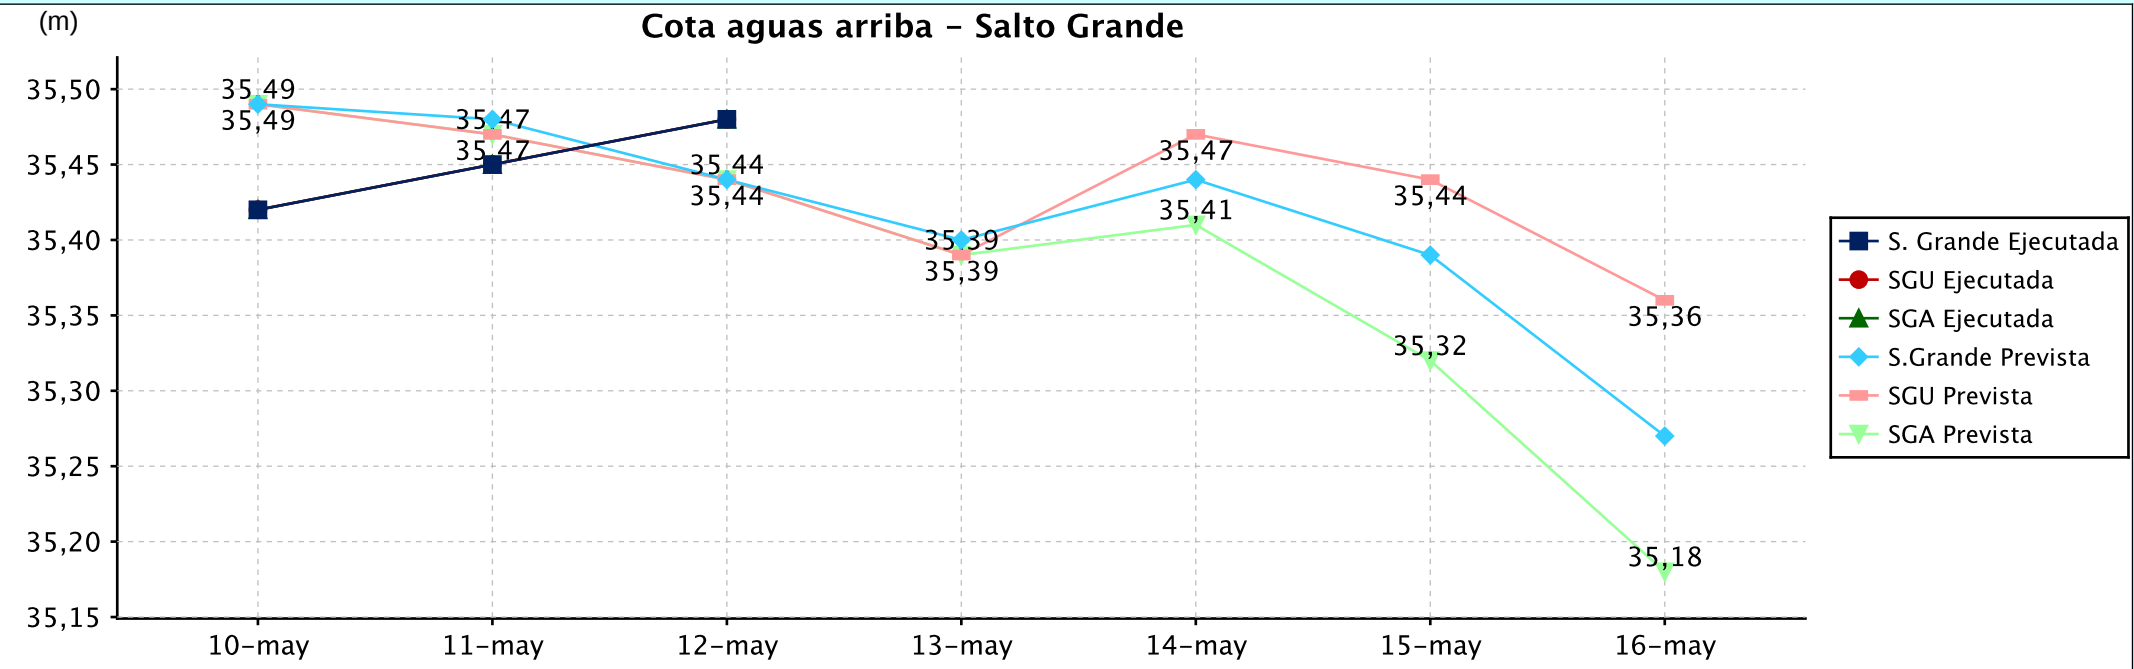

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,48
Cota Vista Arg	35,48
Cota real	35,48

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	647
Baygorria	856	850
Palmar	840	803
SGU	3.905	3.904

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	617	469
Baygorria	0	1
Palmar	0	38
SGU	4.200	4.187

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	200	221
Baygorria	0	0
Palmar	0	66
SGU	458	350

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
