



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 18 de mayo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-55
Central P. del Tigre	-7
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.370
C. Baygorria	2.231
C. Palmar	7.888
C. Salto Grande	9.677
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.167
TOTAL Generación	25.263

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.263
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	24.560
Diferencia (MWh)	703
Ejecutada - Programada	2,86 %

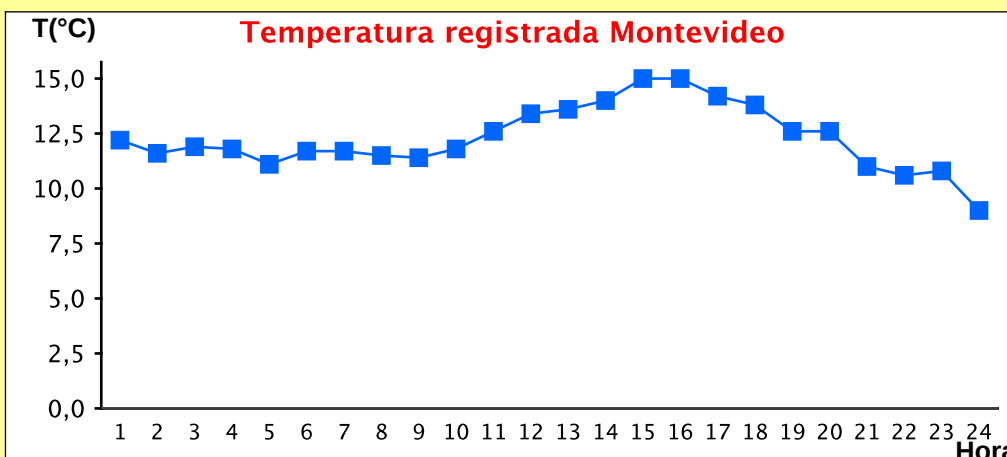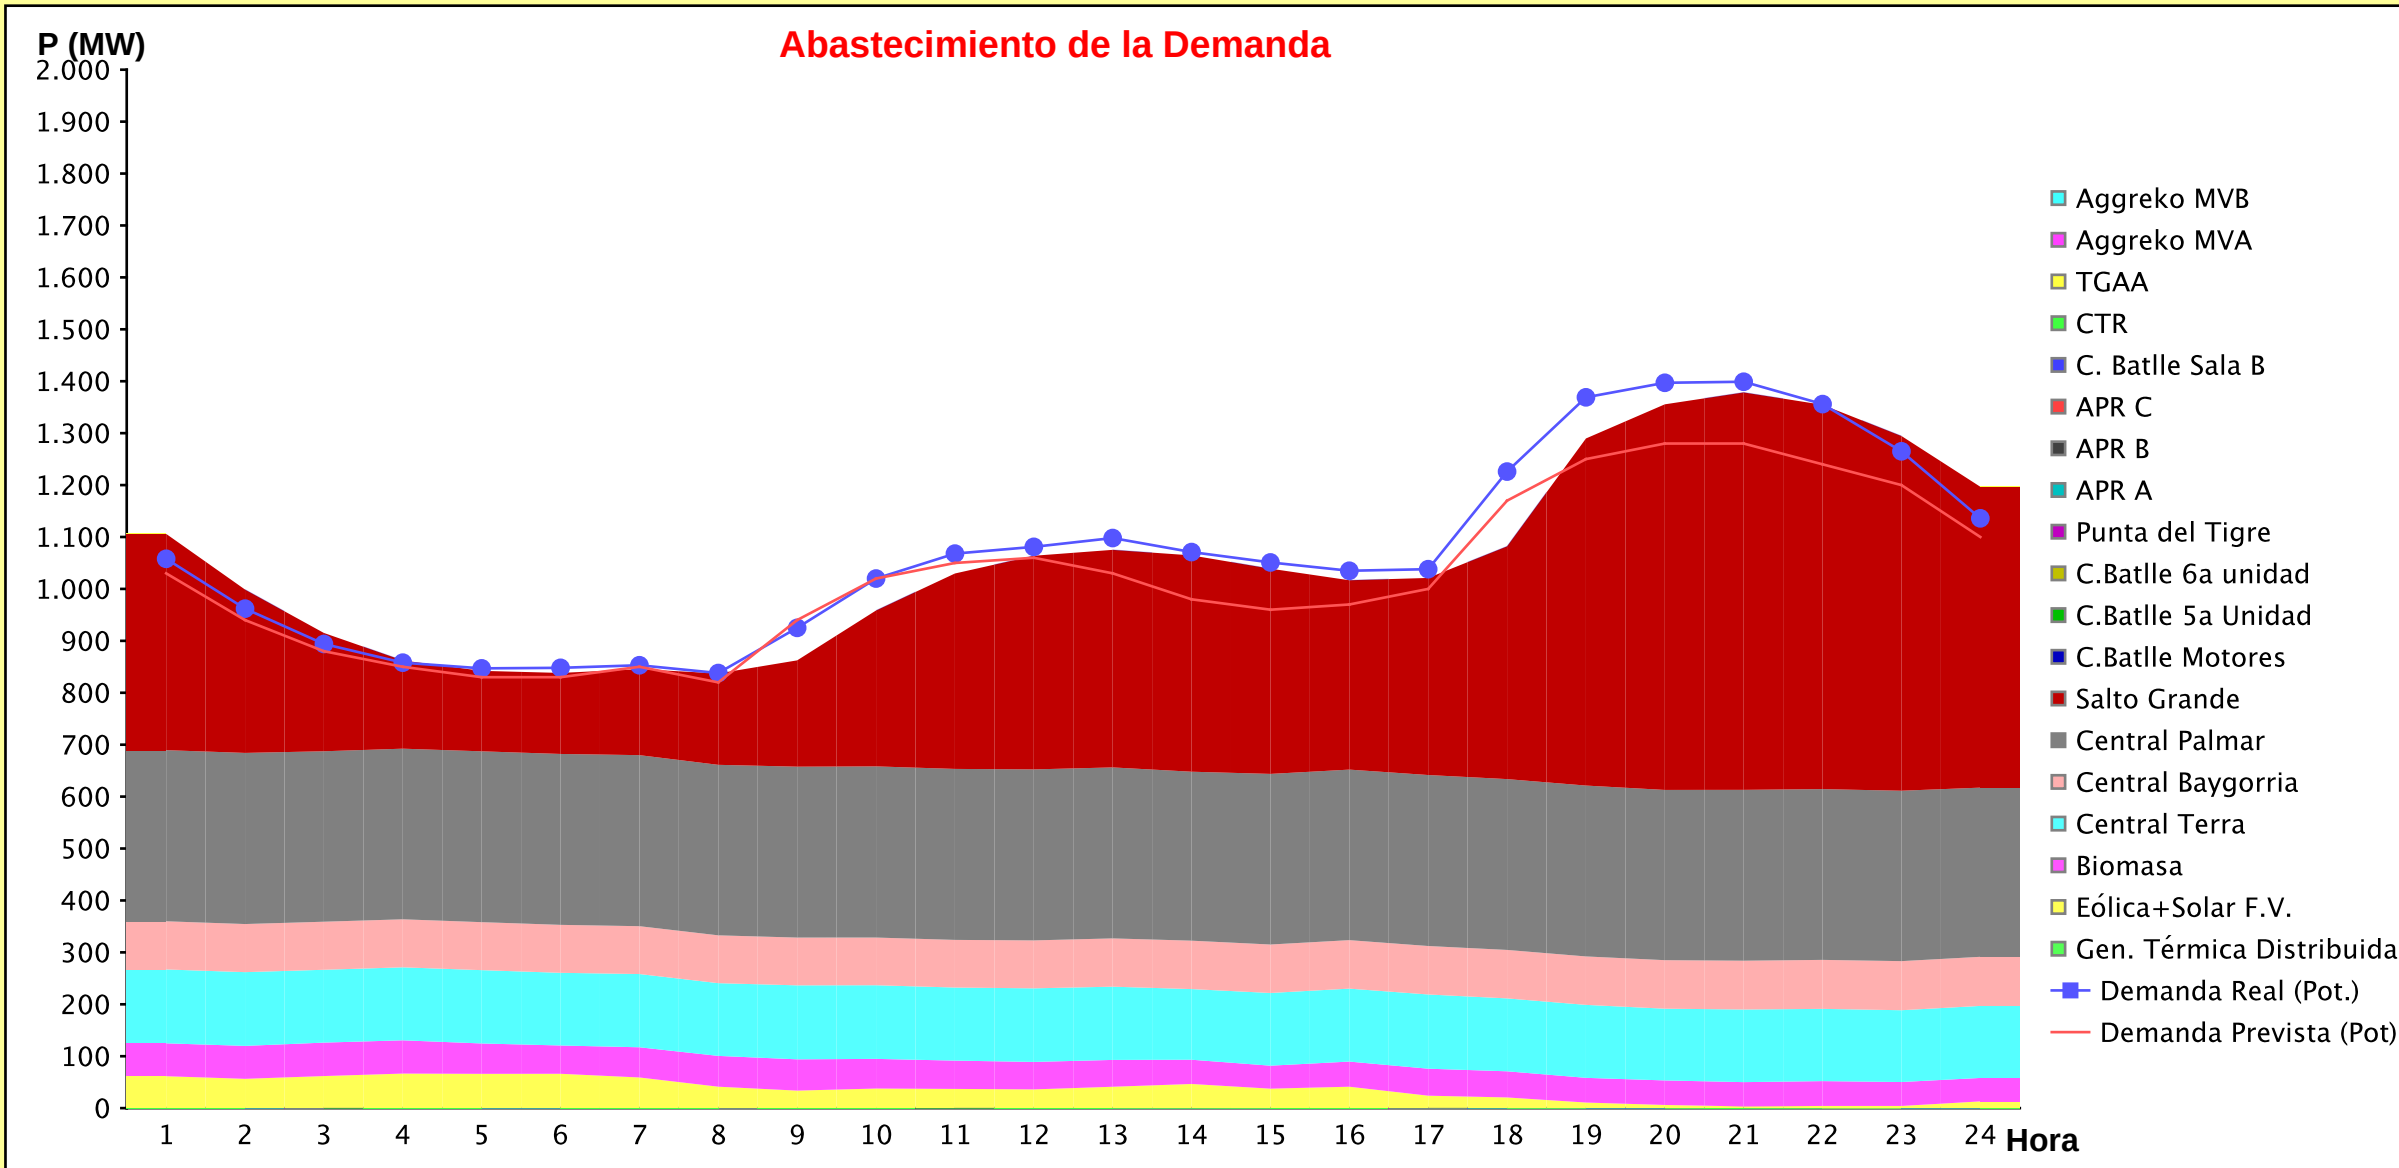



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1110,23 Hora 12:31
Potencia mínima:	825,48 Hora 07:43
Pico noche:	1414,26 Hora 20:32

Generación Media (MW)	
Eólica	36,8
Biomasa	65,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

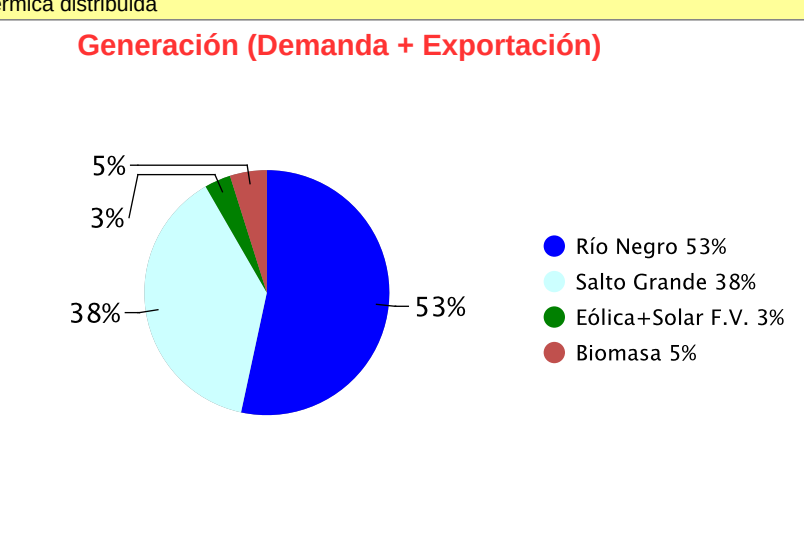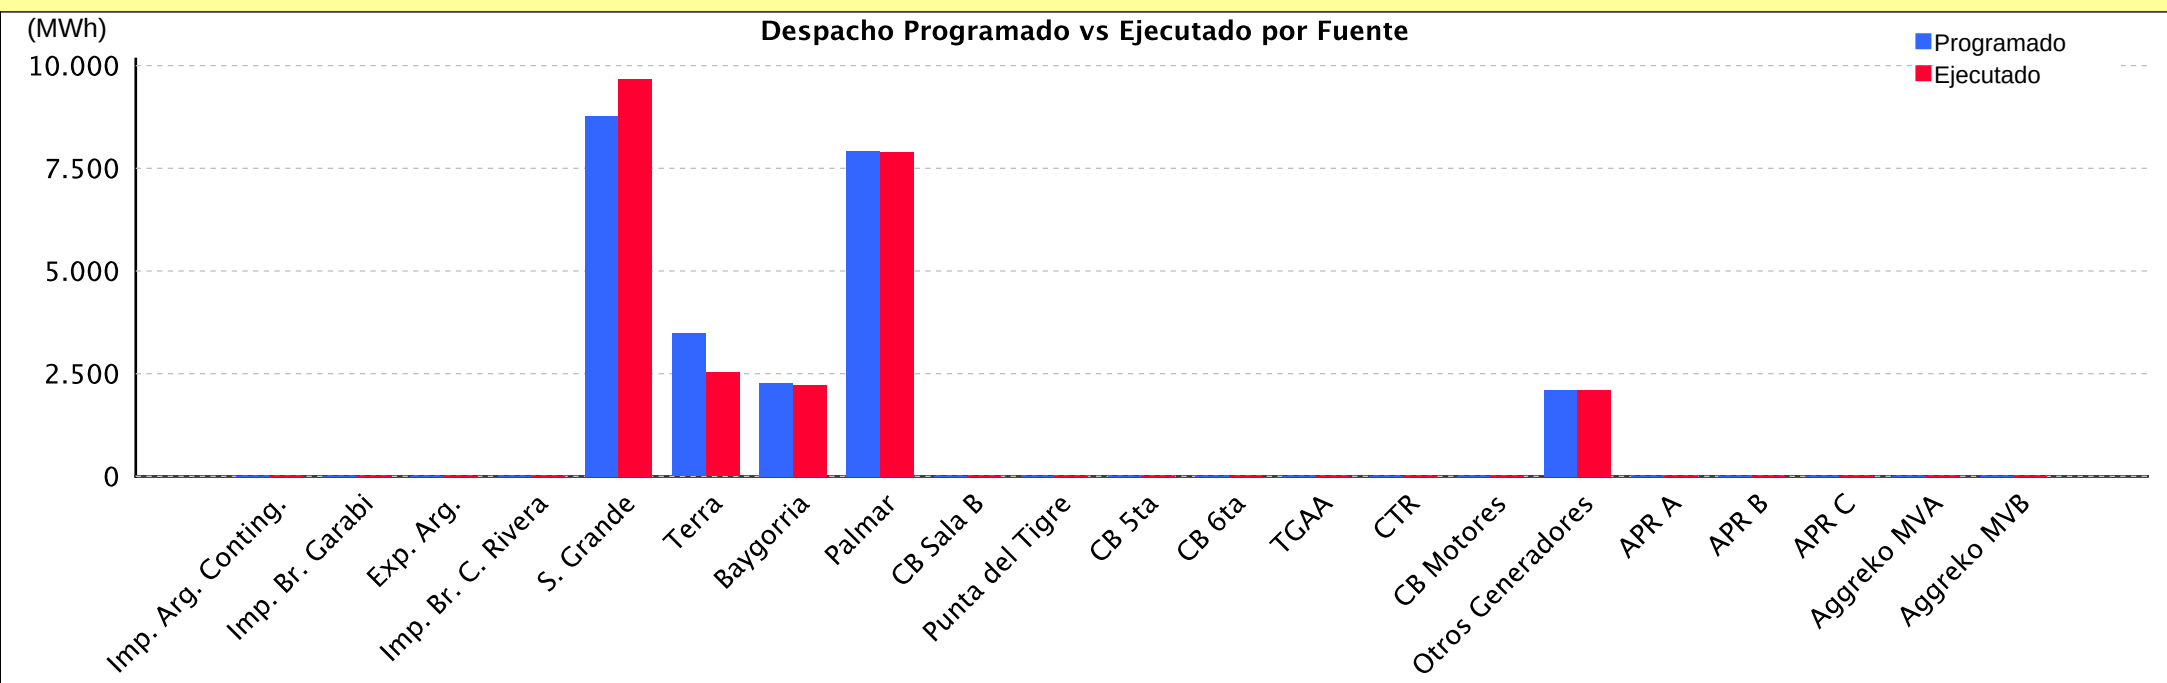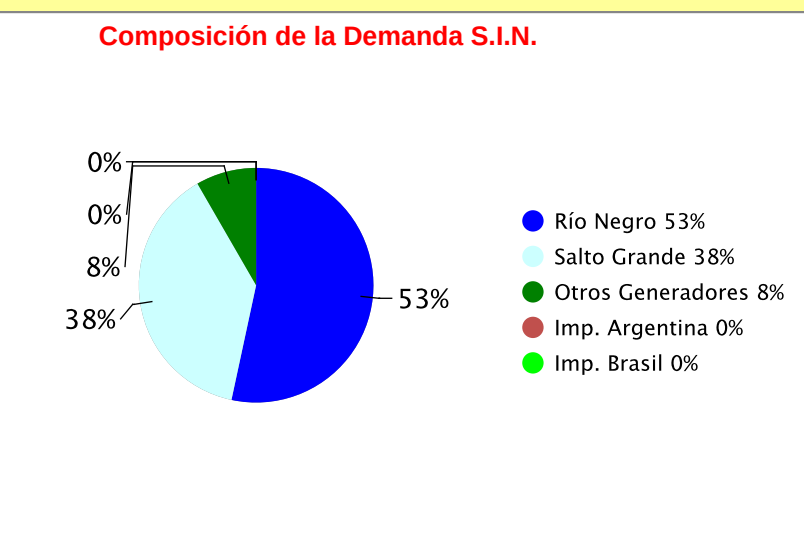



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

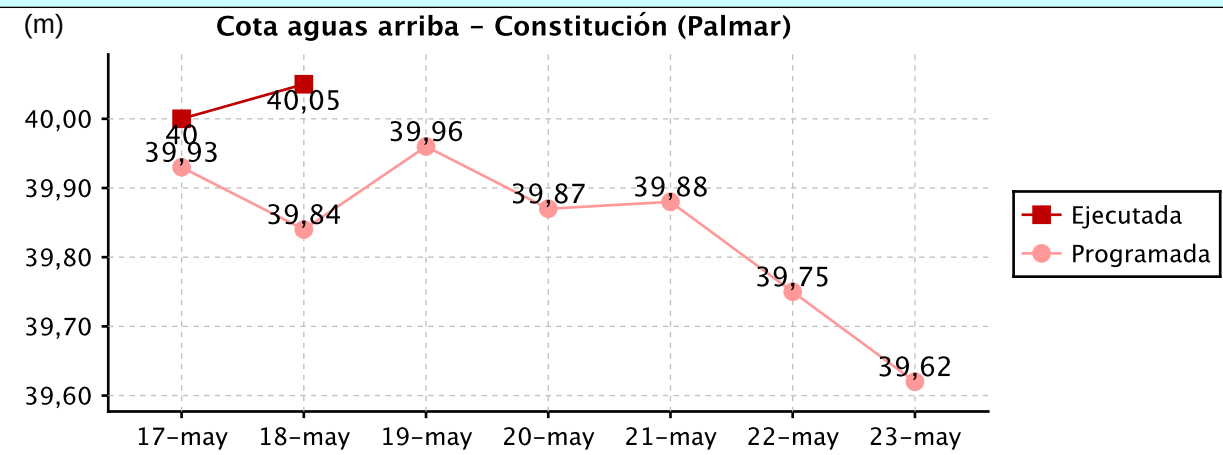
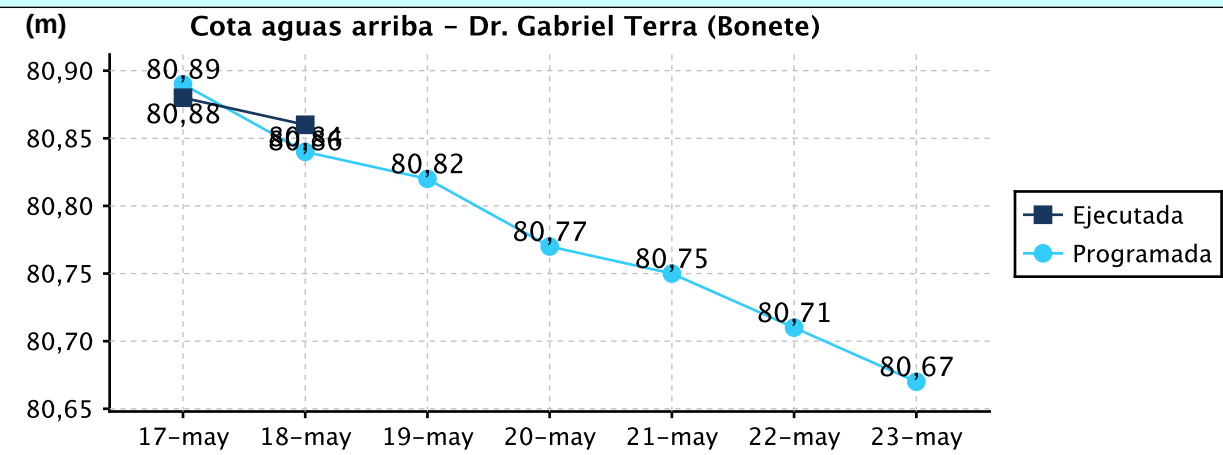


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,84	80,86
Baygorria	54,08	54,14
Palmar	39,84	40,05
SGU	35,23	35,17

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

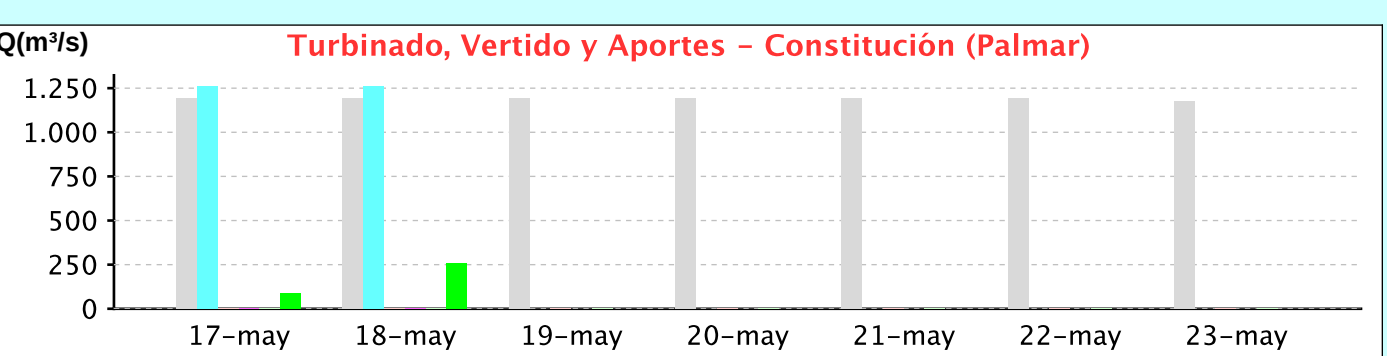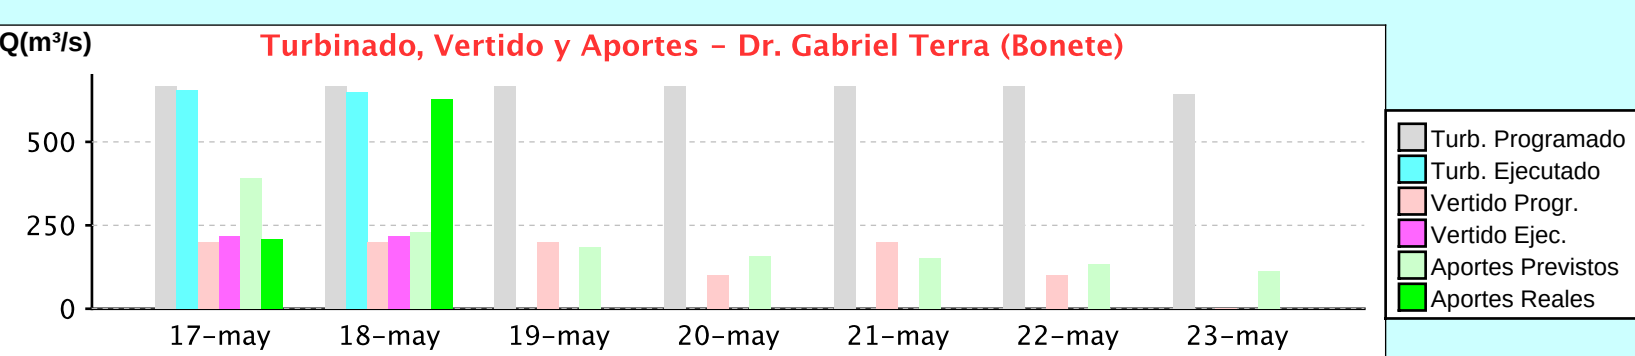

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

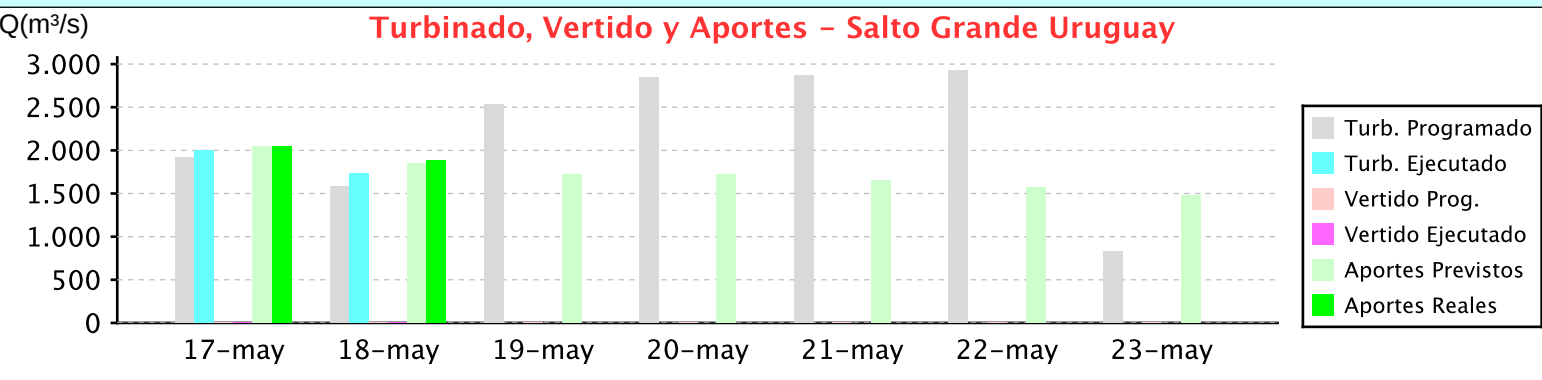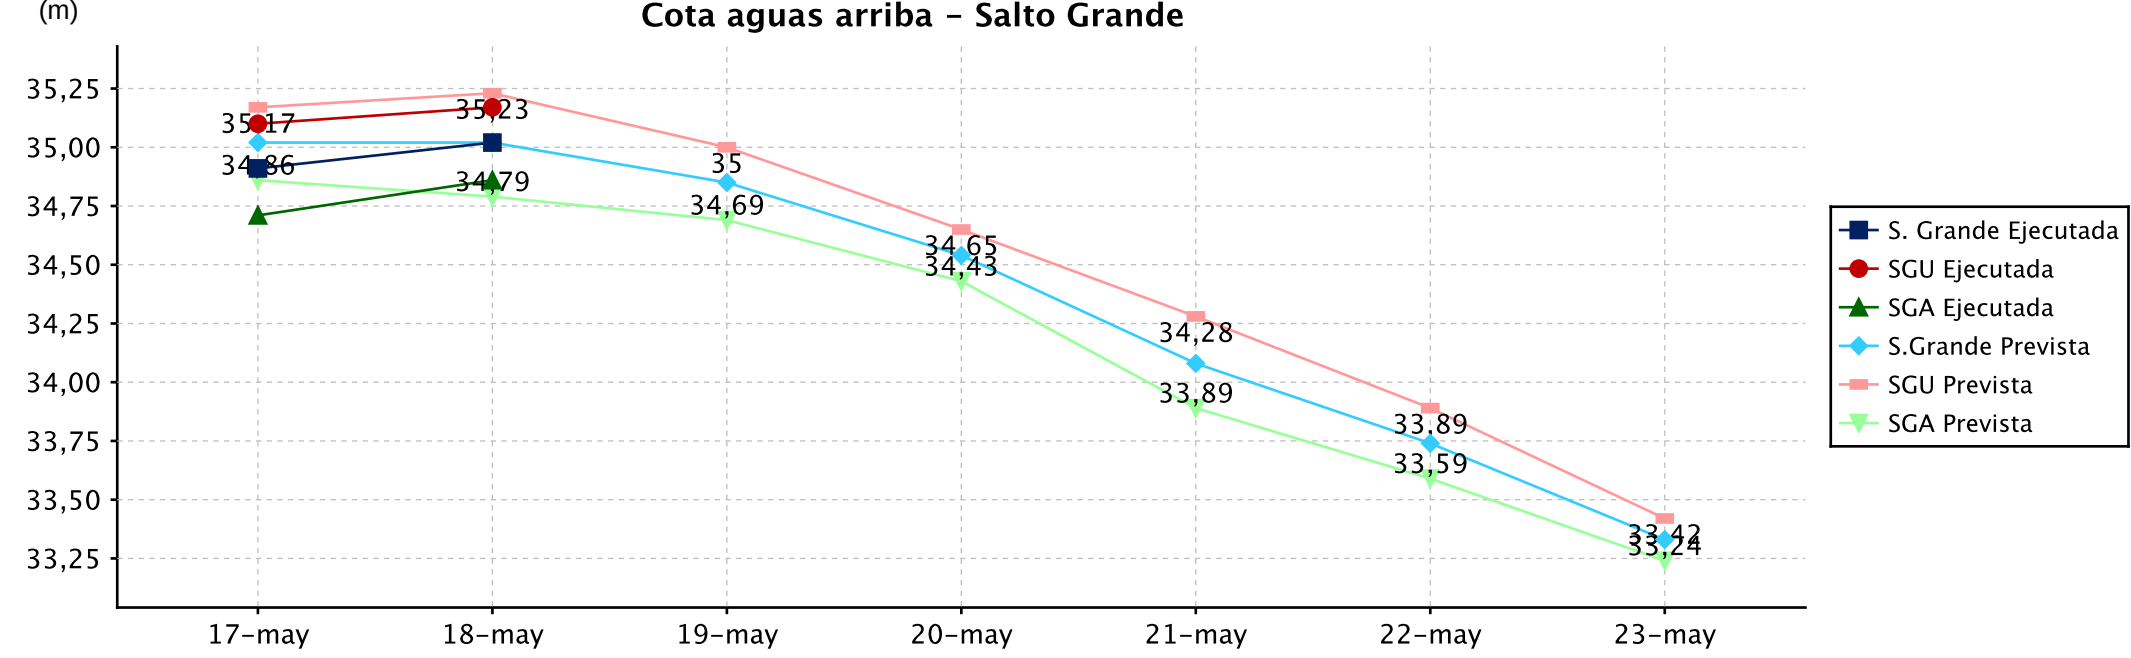

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,17
Cota Vista Arg	34,86
Cota real	35,02

Dif. Energ. (U-A)	7.372
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	666	649
Baygorria	835	822
Palmar	1.196	1.259
SGU	1.581	1.737

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	228	627
Baygorria	0	172
Palmar	0	259
SGU	1.850	1.883

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	200	217
Baygorria	0	359
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
