



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 22 de mayo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	267
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	271
Central La Tablada	-45
Central P. del Tigre	96
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.378
C. Baygorria	2.298
C. Palmar	7.899
C. Salto Grande	14.451
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.721
TOTAL Generación	32.060

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	32.060
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.590
Diferencia (MWh)	470
Ejecutada - Programada	1,49 %

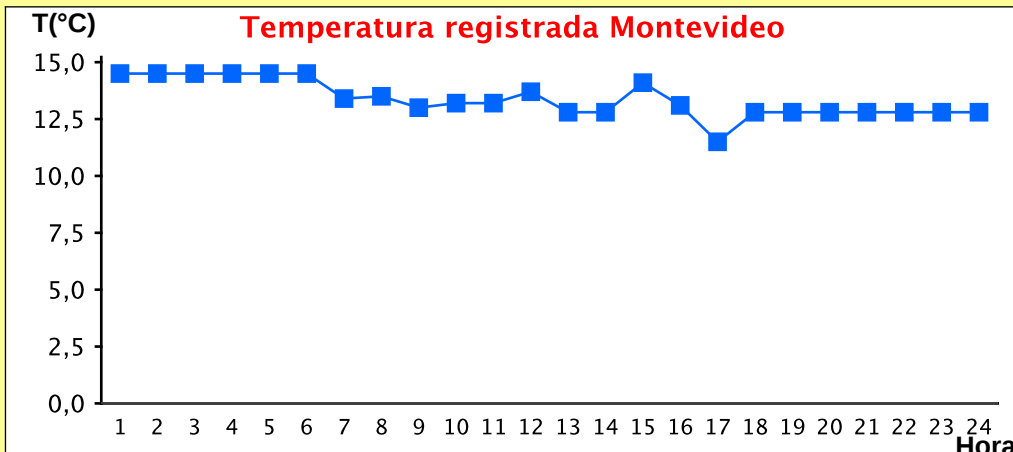
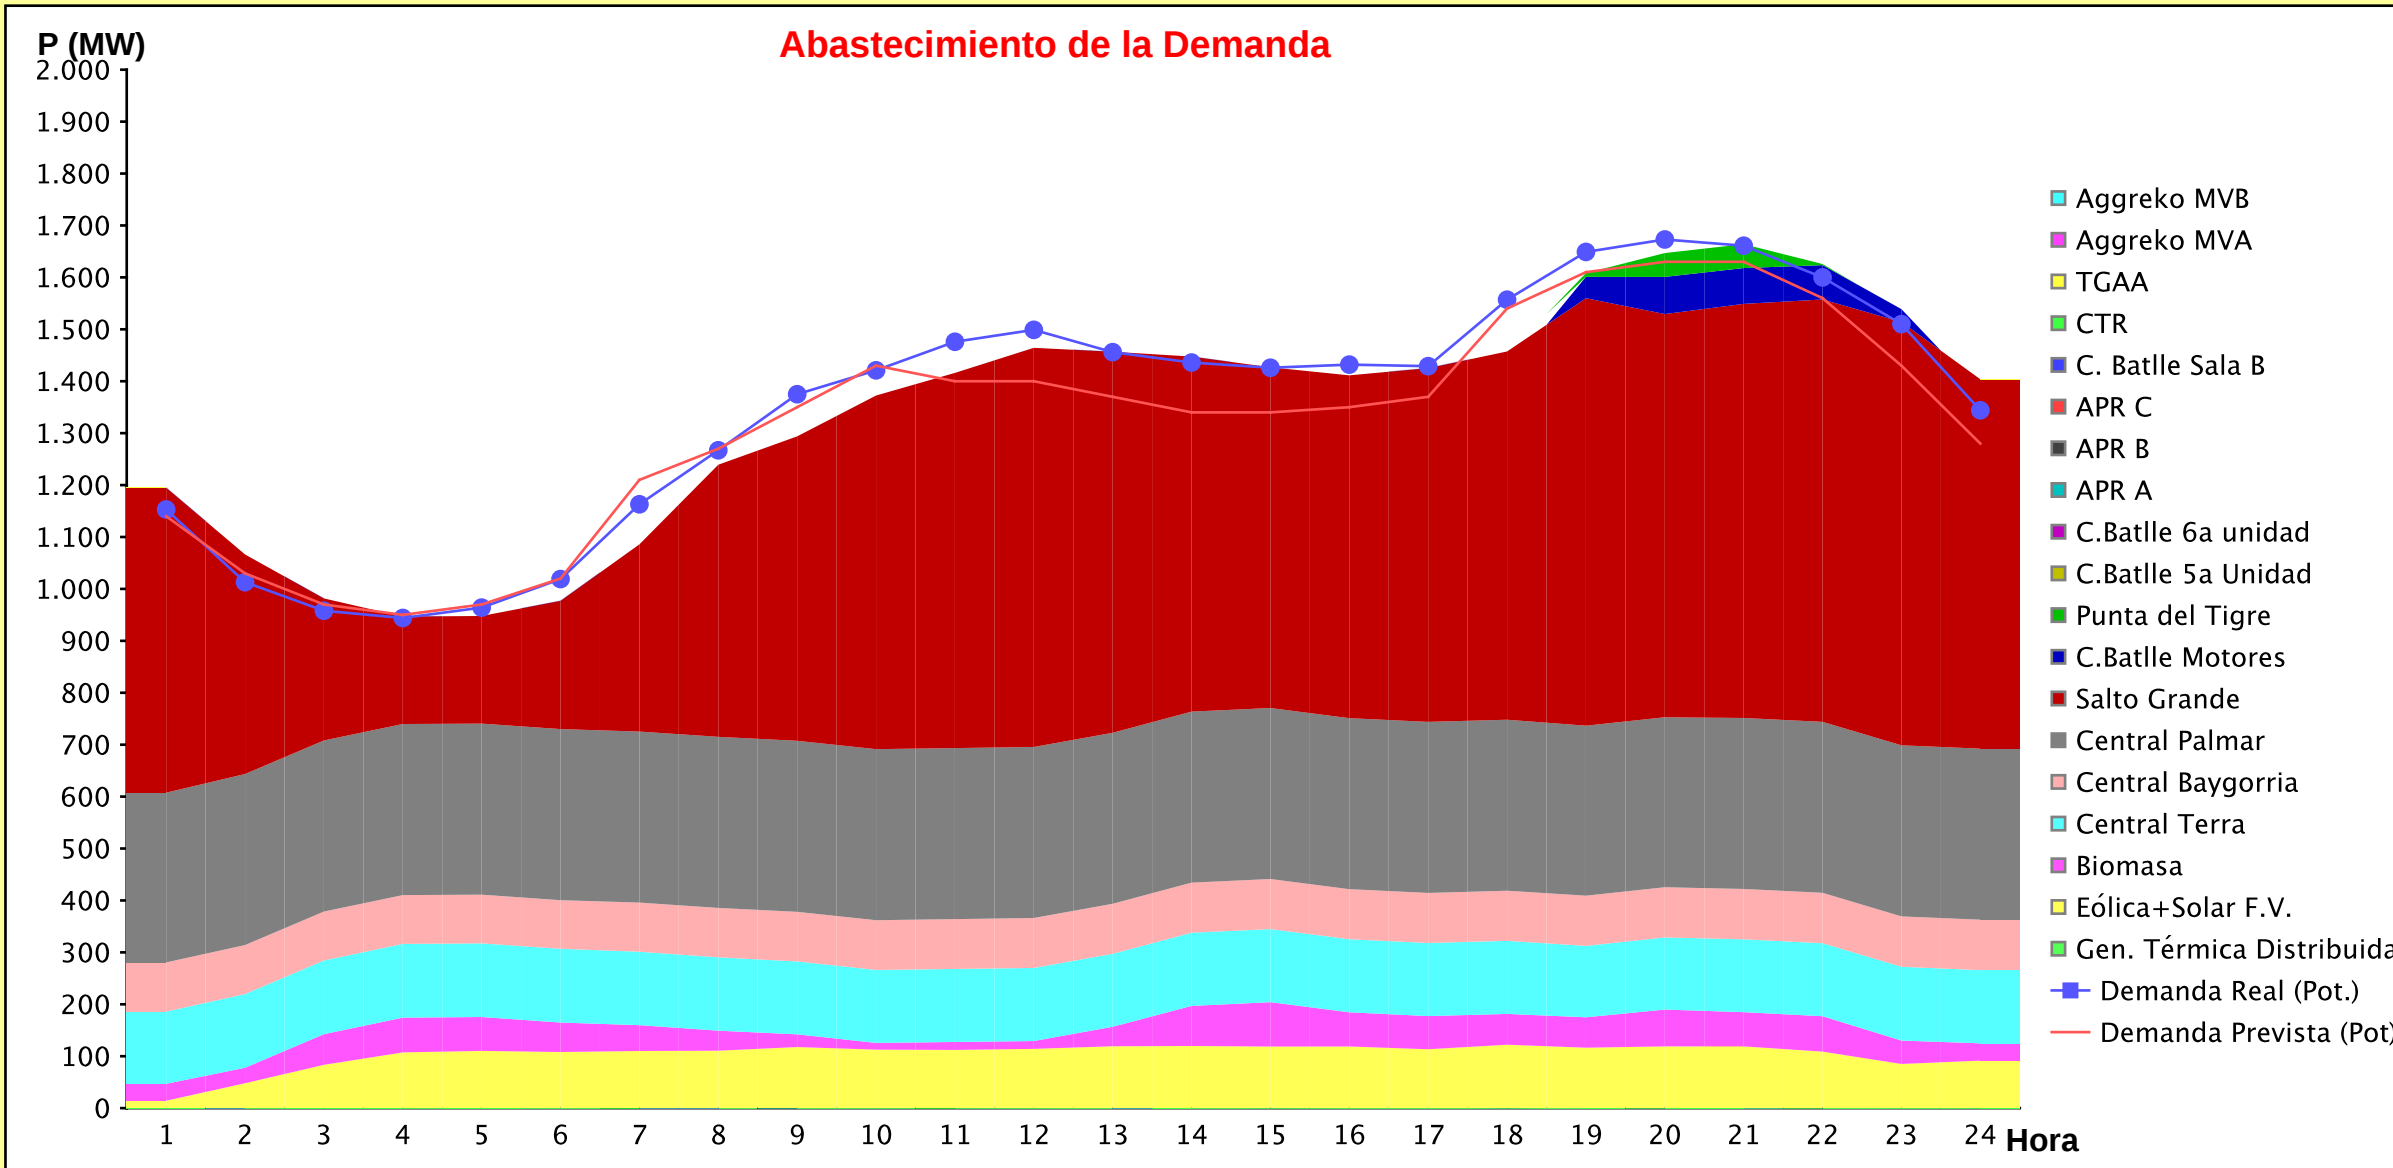


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1519,51 Hora 11:46
Potencia mínima:	933,03 Hora 03:49
Pico noche:	1685,67 Hora 20:39

Generación Media (MW)	
Eólica	104,3
Biomasa	58,3
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


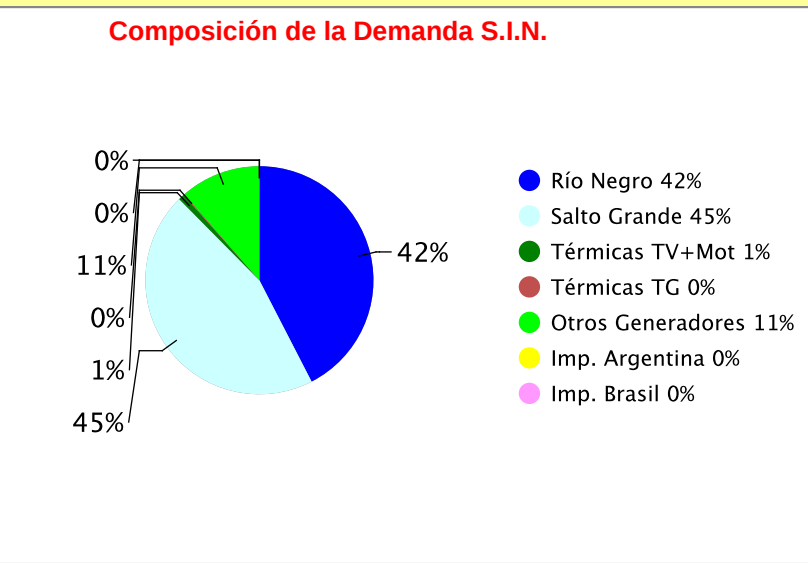


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

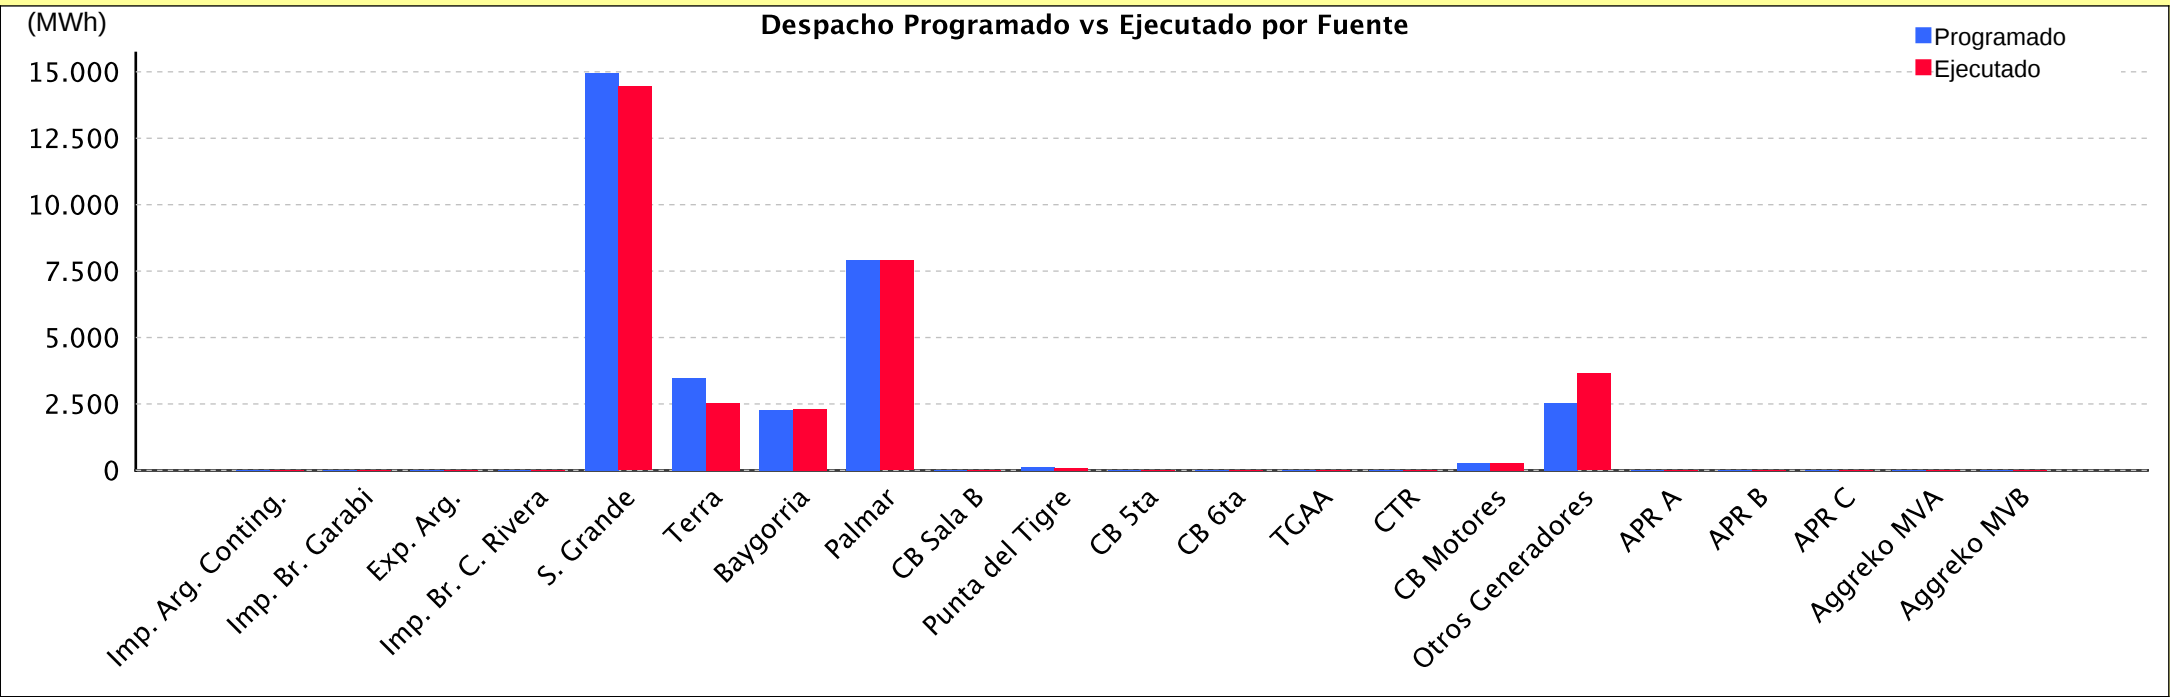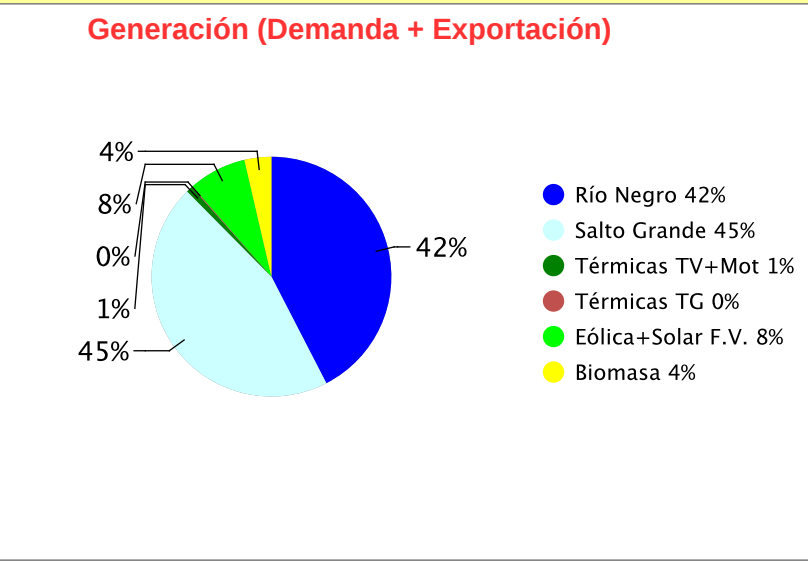



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

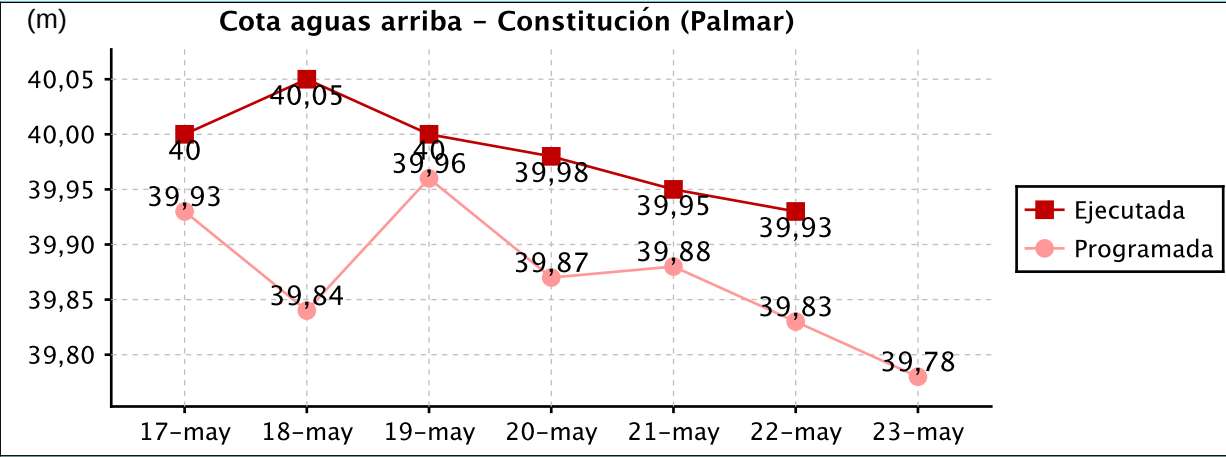
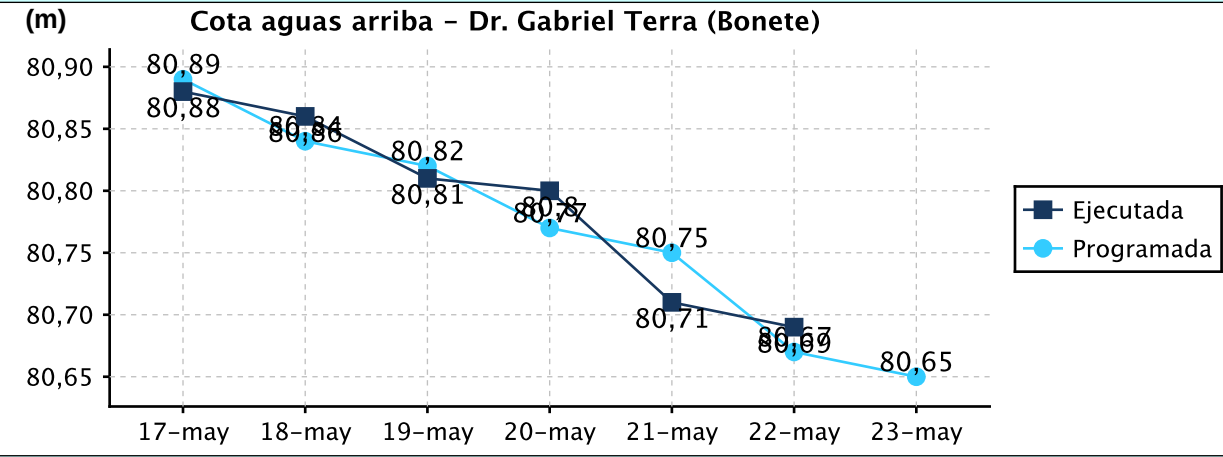


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,67	80,69
Baygorria	54,08	54,23
Palmar	39,83	39,93
SGU	33,88	33,89

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

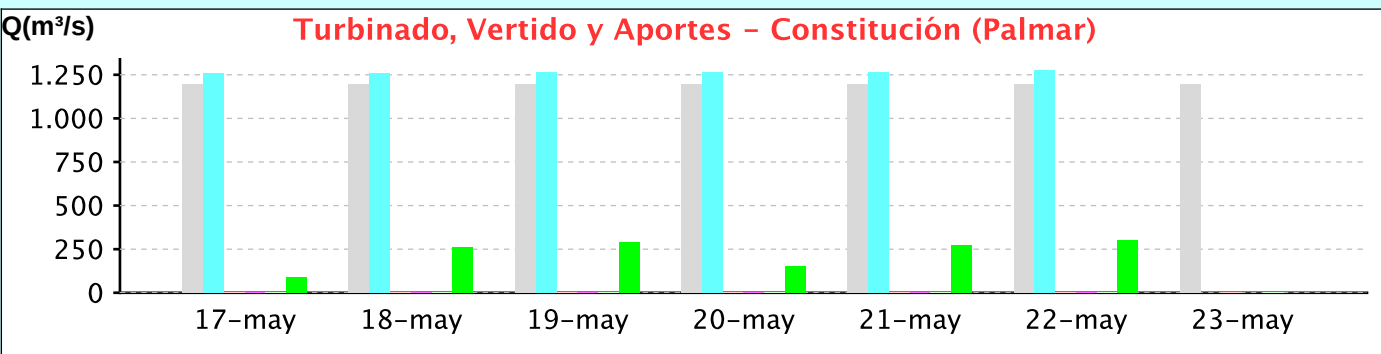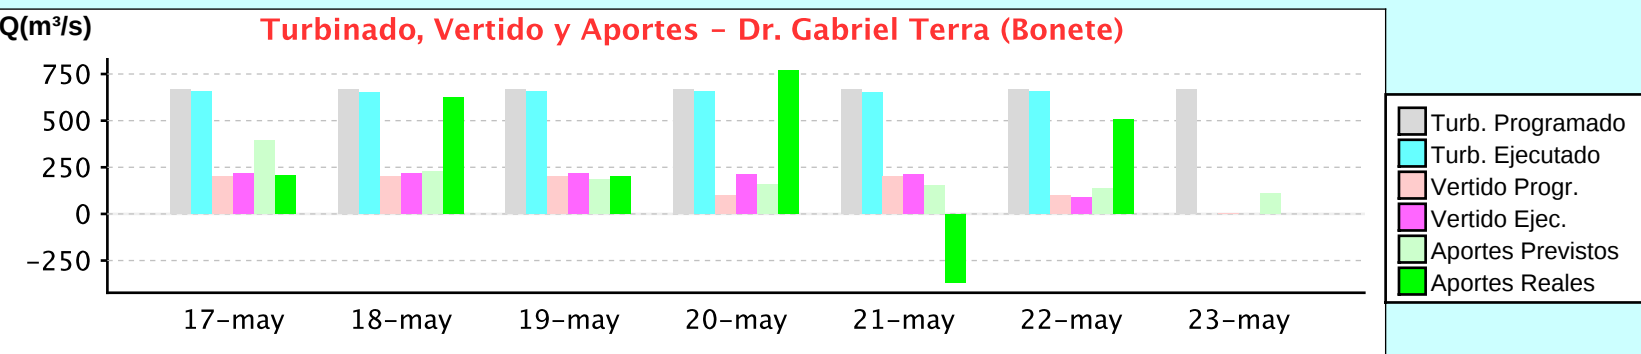

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

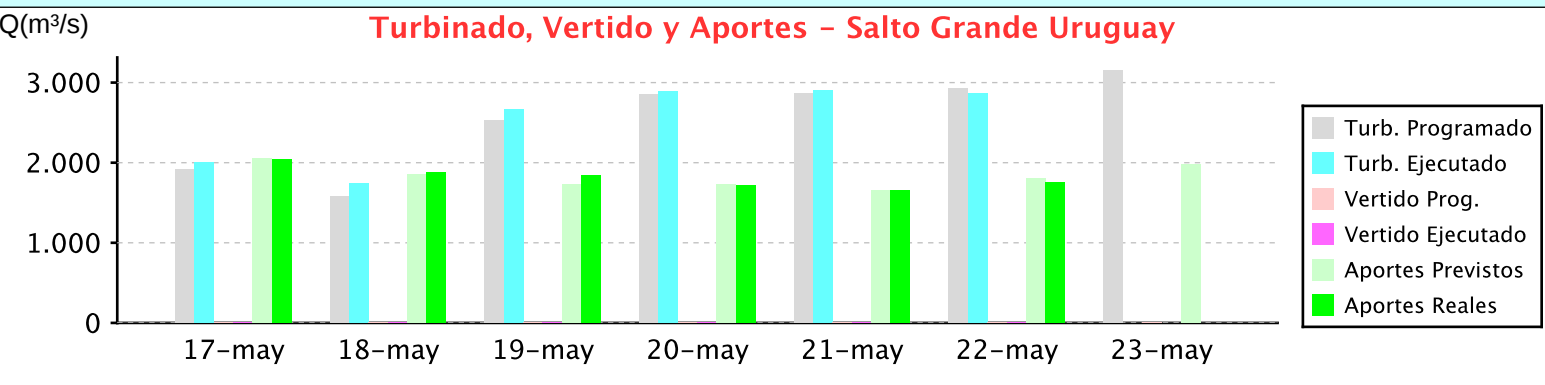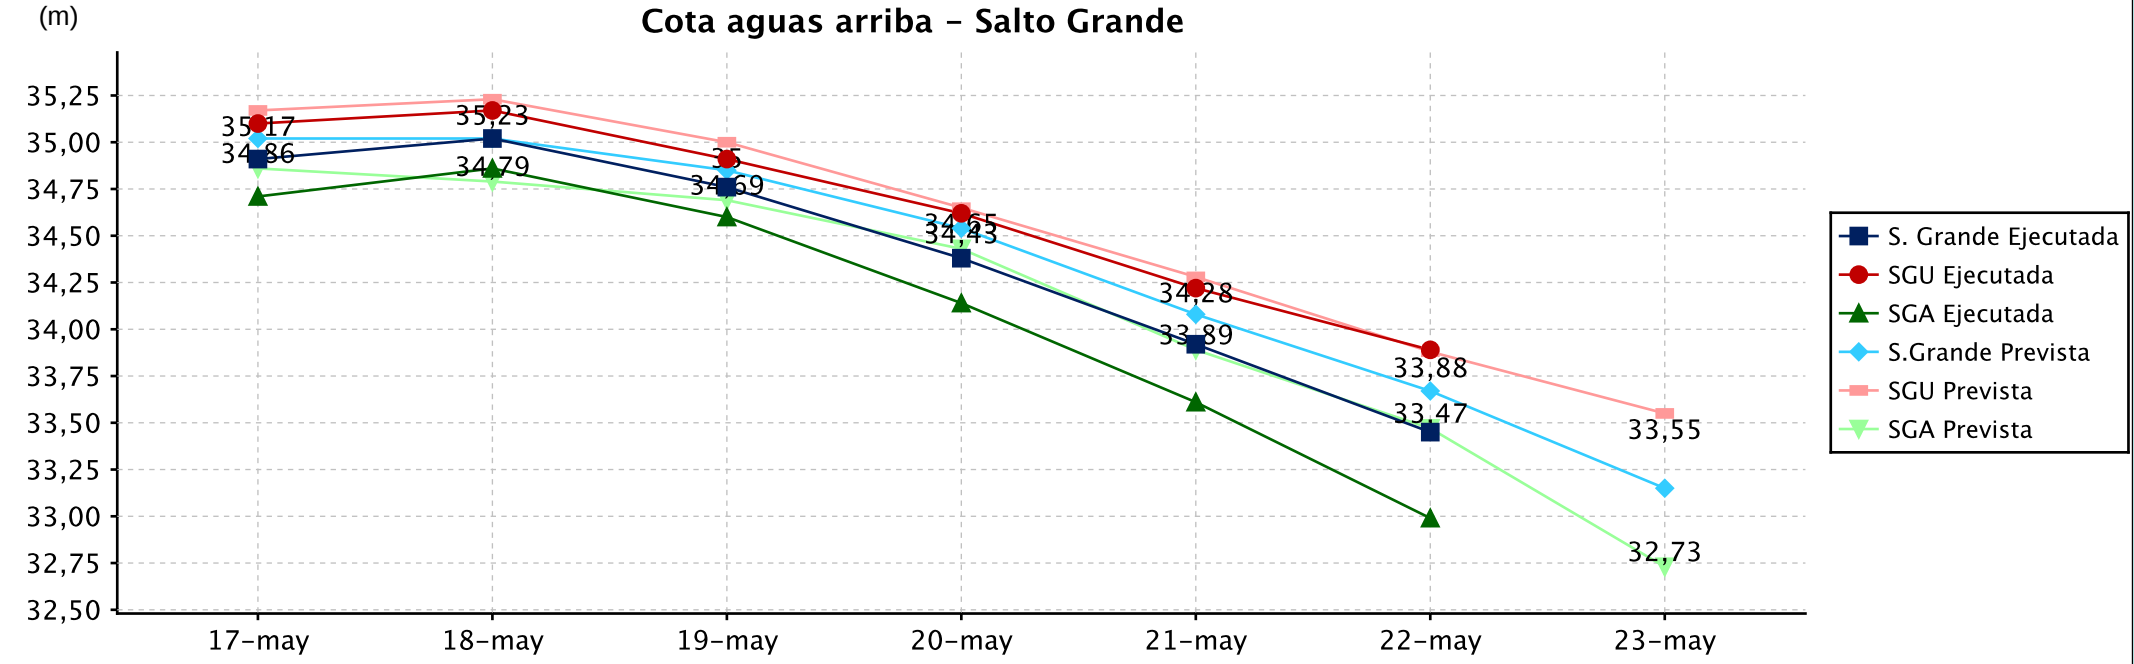

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,89
Cota Vista Arg	32,99
Cota real	33,45
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	17.162

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	666	655
Baygorria	835	844
Palmar	1.196	1.275
SGU	2.931	2.870

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	134	505
Baygorria	0	312
Palmar	0	304
SGU	1.800	1.758

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	100	88
Baygorria	0	77
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
