




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 27 de mayo de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	585
Sala B	-4
5ta.	-0
6ta.	0
Motores	589
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	733
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.405
C. Baygorria	1.825
C. Palmar	7.906
C. Salto Grande	17.051
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	1.251
TOTAL Generación	32.708

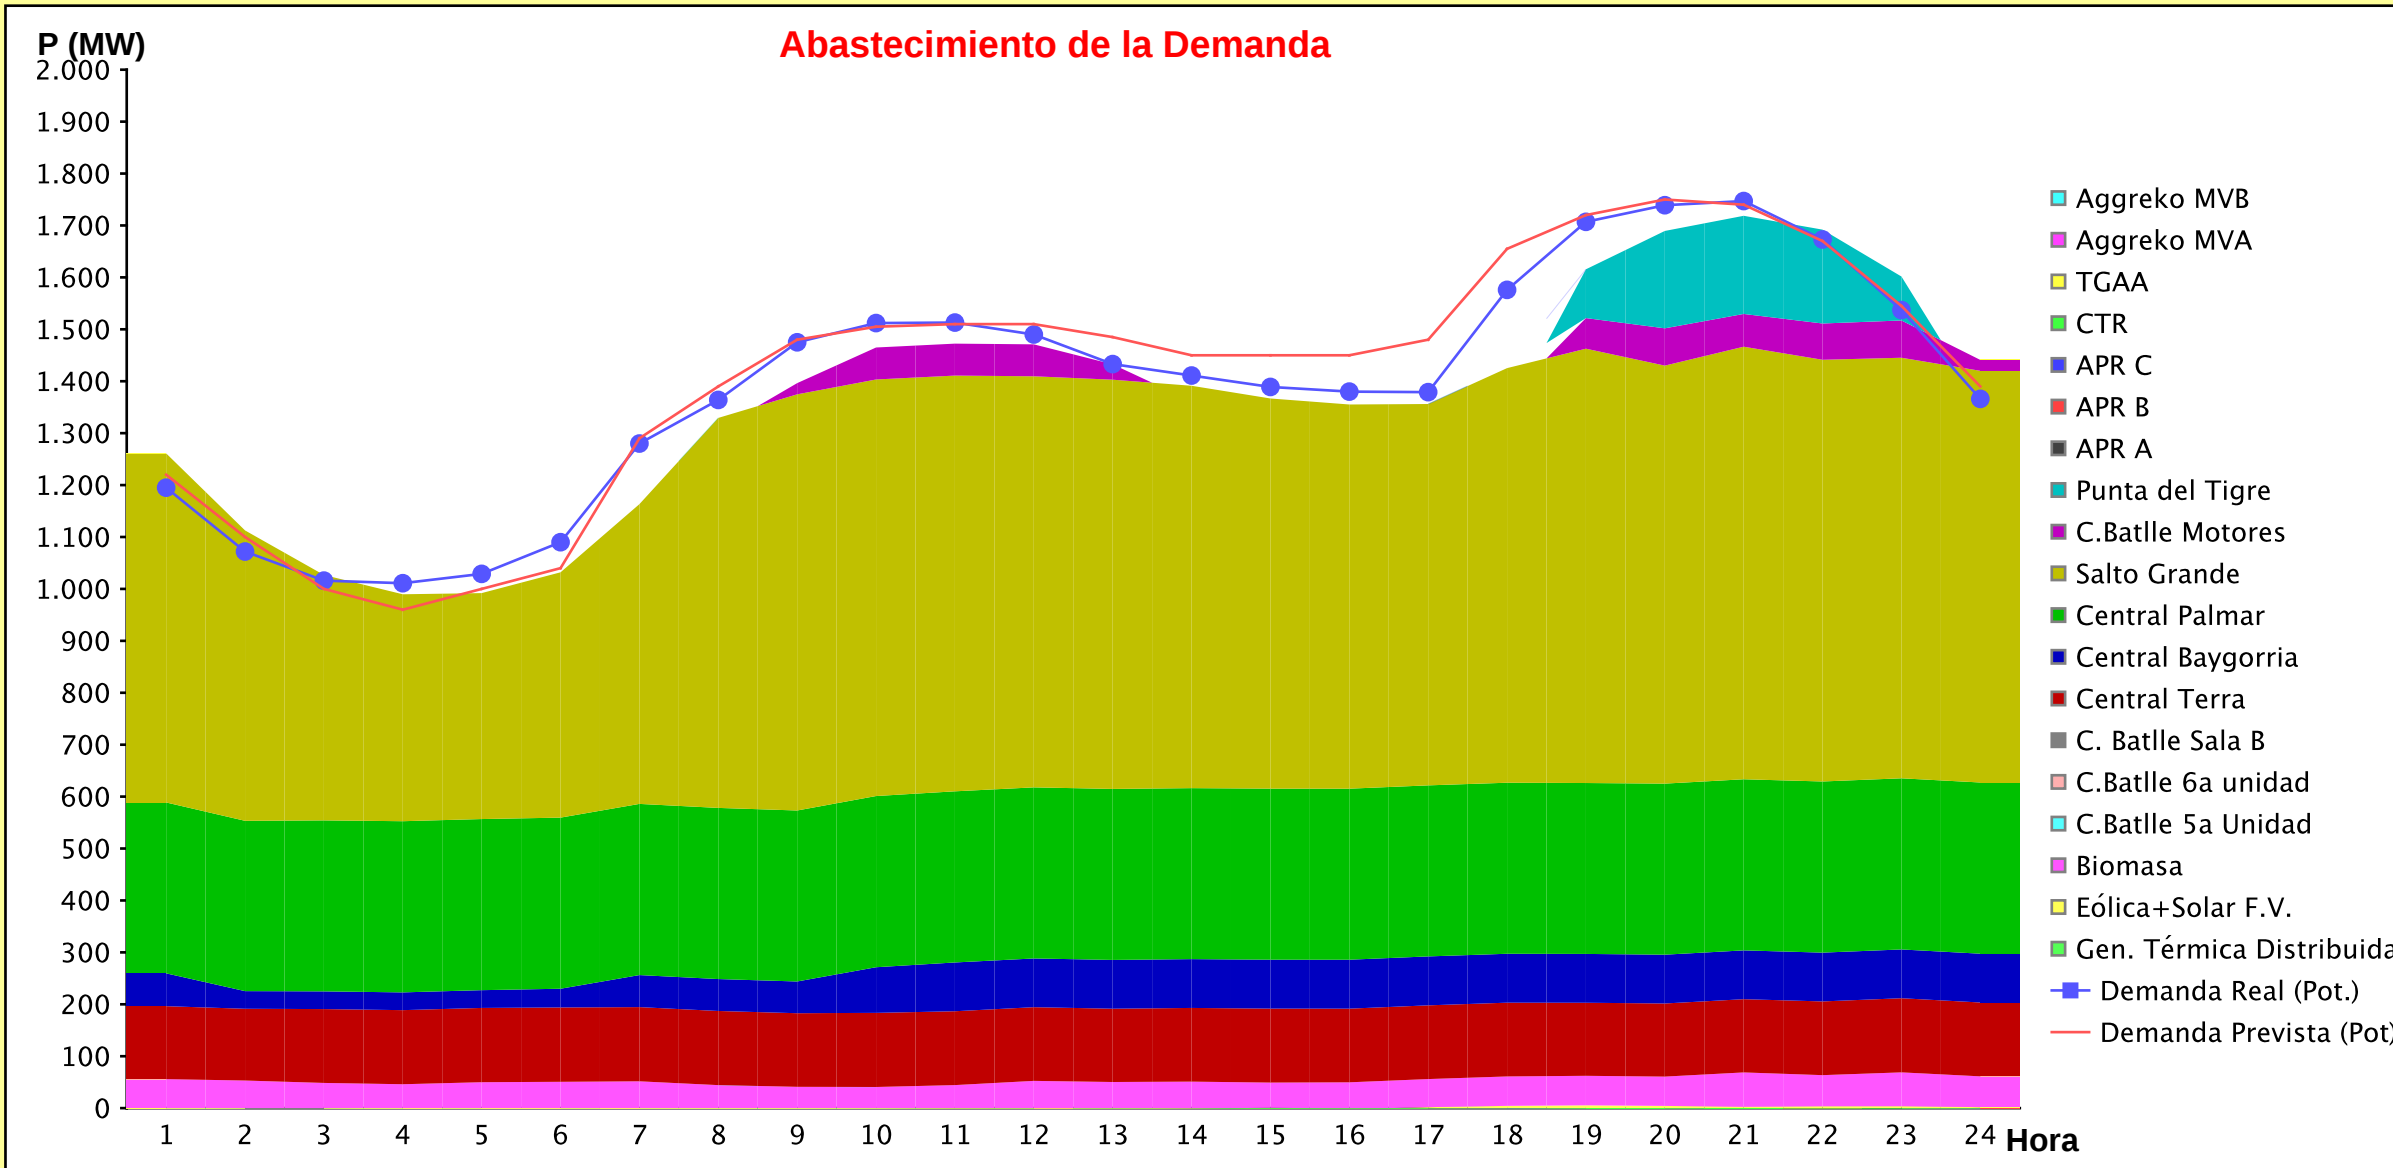

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	32.708
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	33.790
Diferencia (MWh)	-1.082
Ejecutada - Programada	-3,20 %

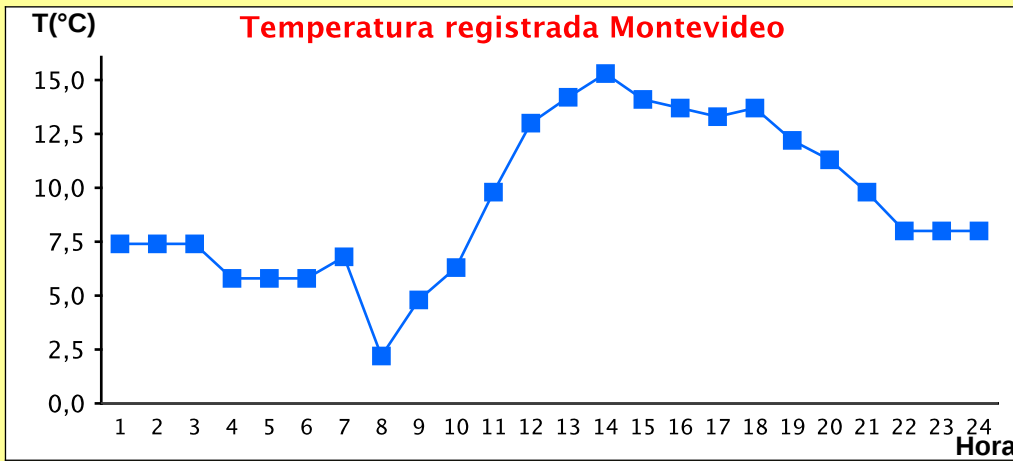


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1522,27 Hora 10:40
Potencia mínima:	993,66 Hora 03:39
Pico noche:	1753,7 Hora 20:57

Generación Media (MW)	
Eólica	1,6
Biomasa	67,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

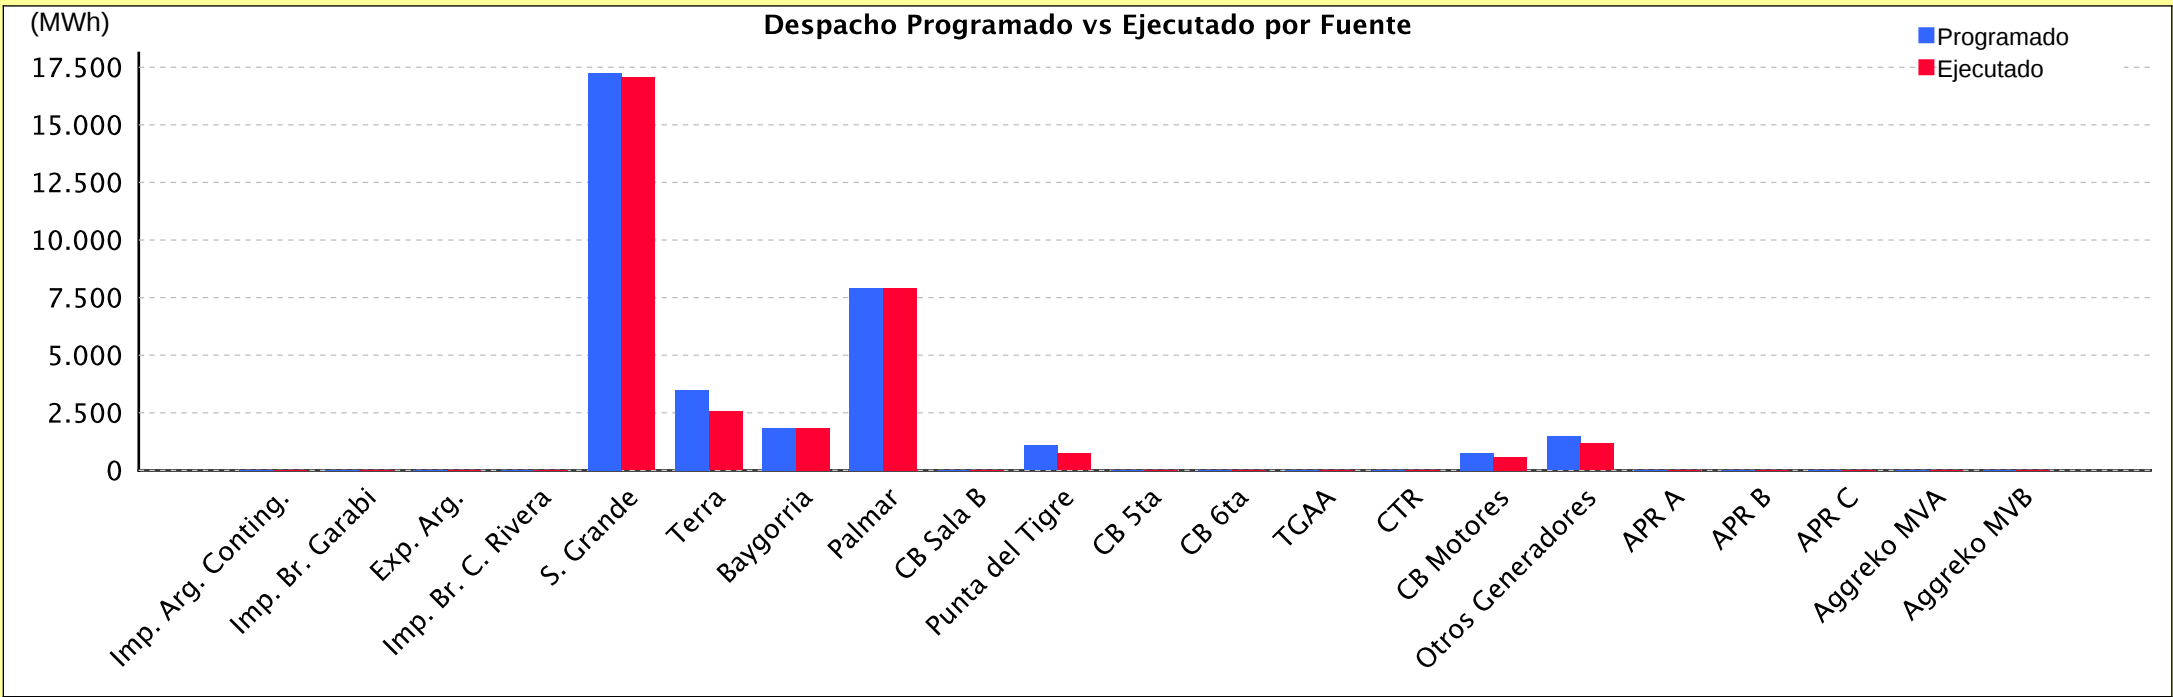
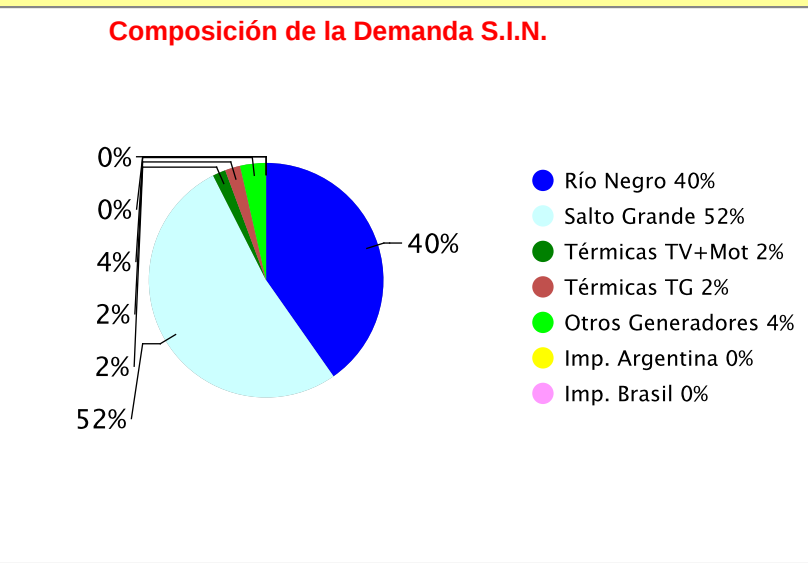


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

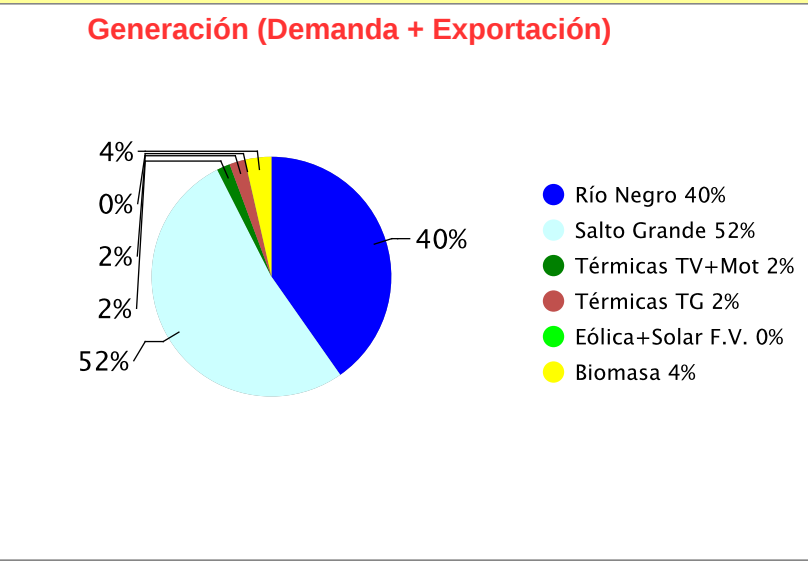



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

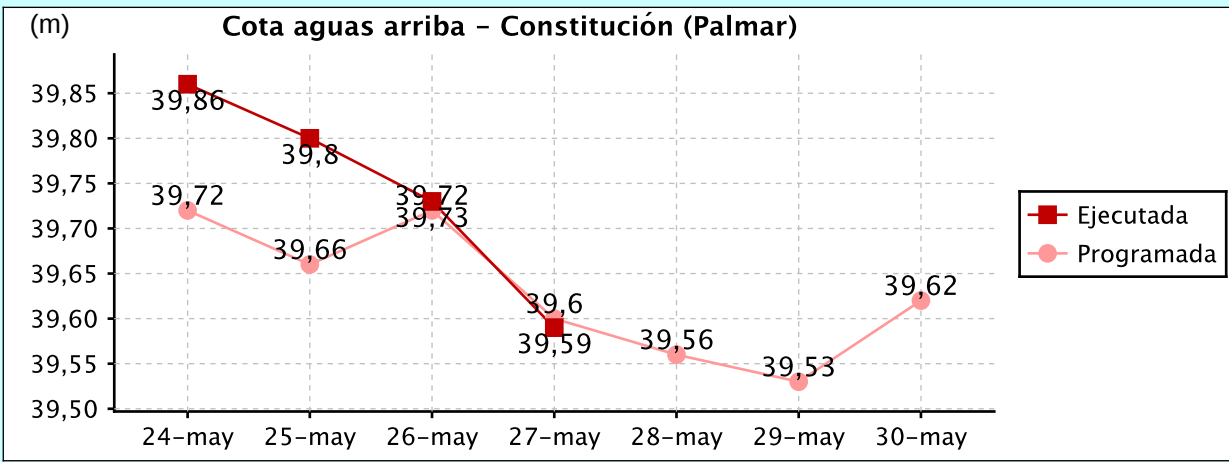
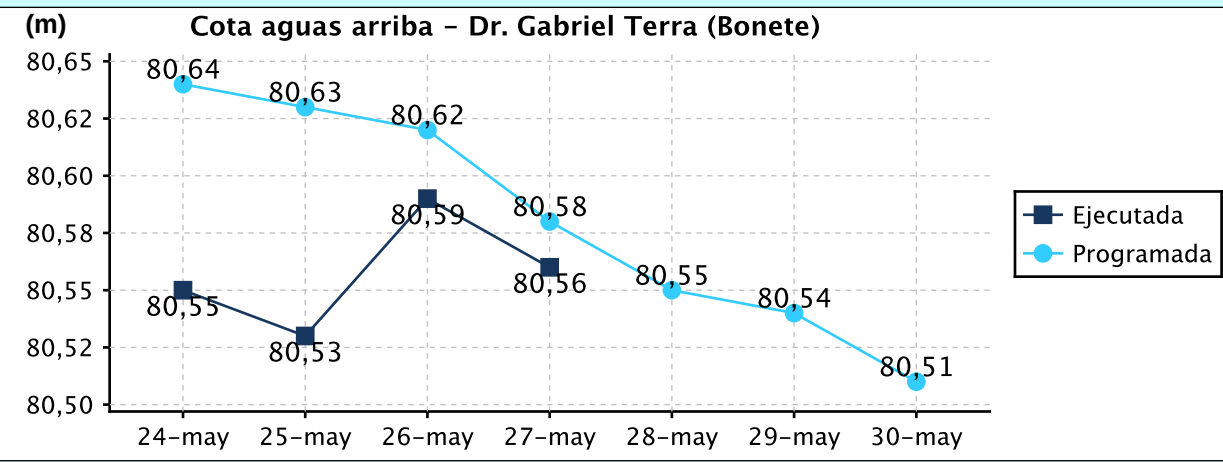


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,58	80,56
Baygorria	53,83	53,87
Palmar	39,60	39,59
SGU	34,29	34,31

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

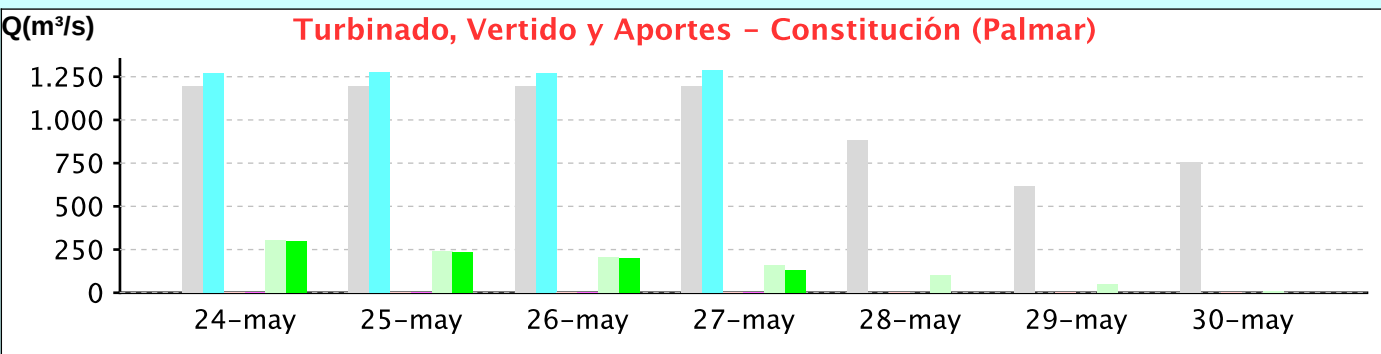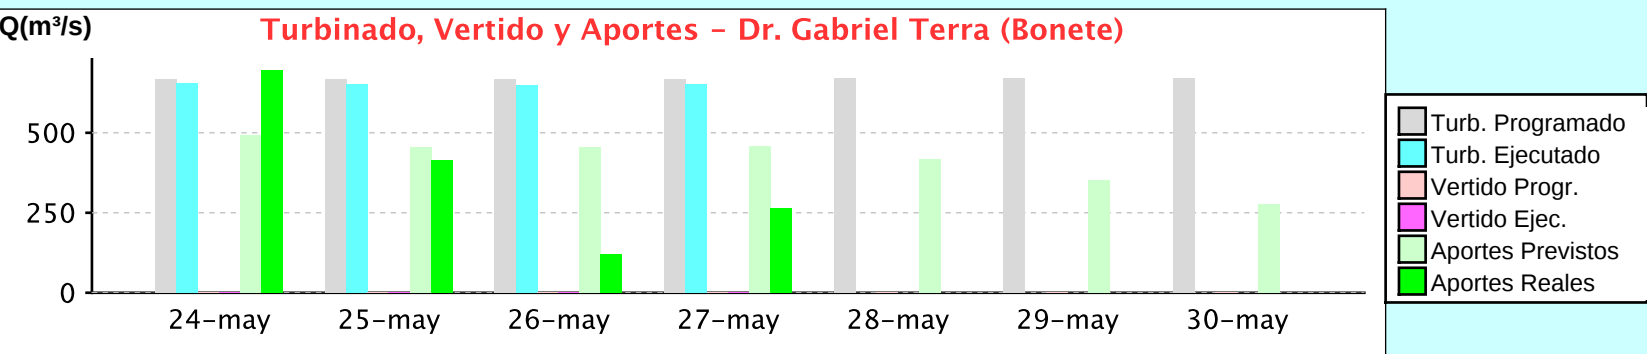

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

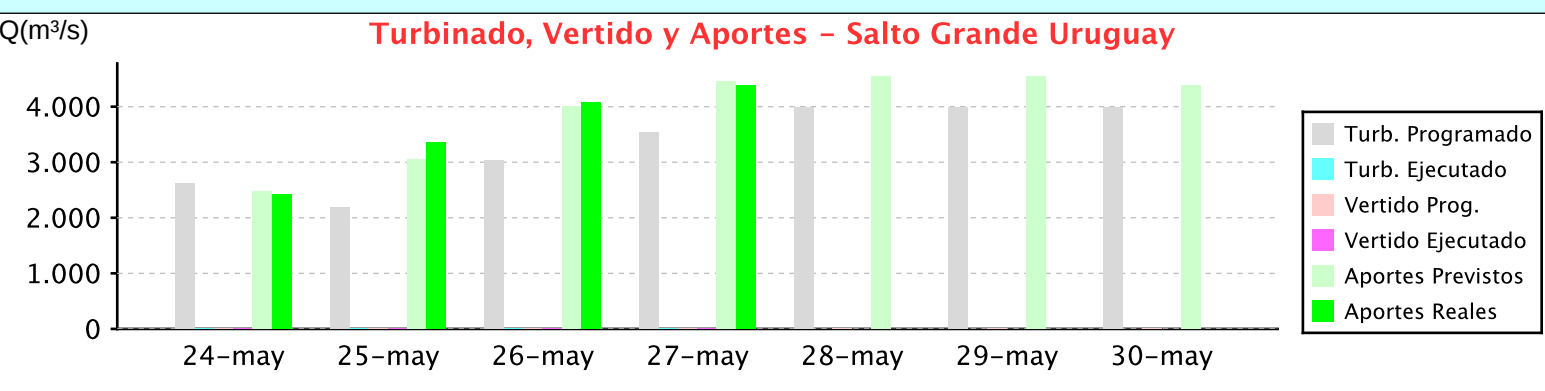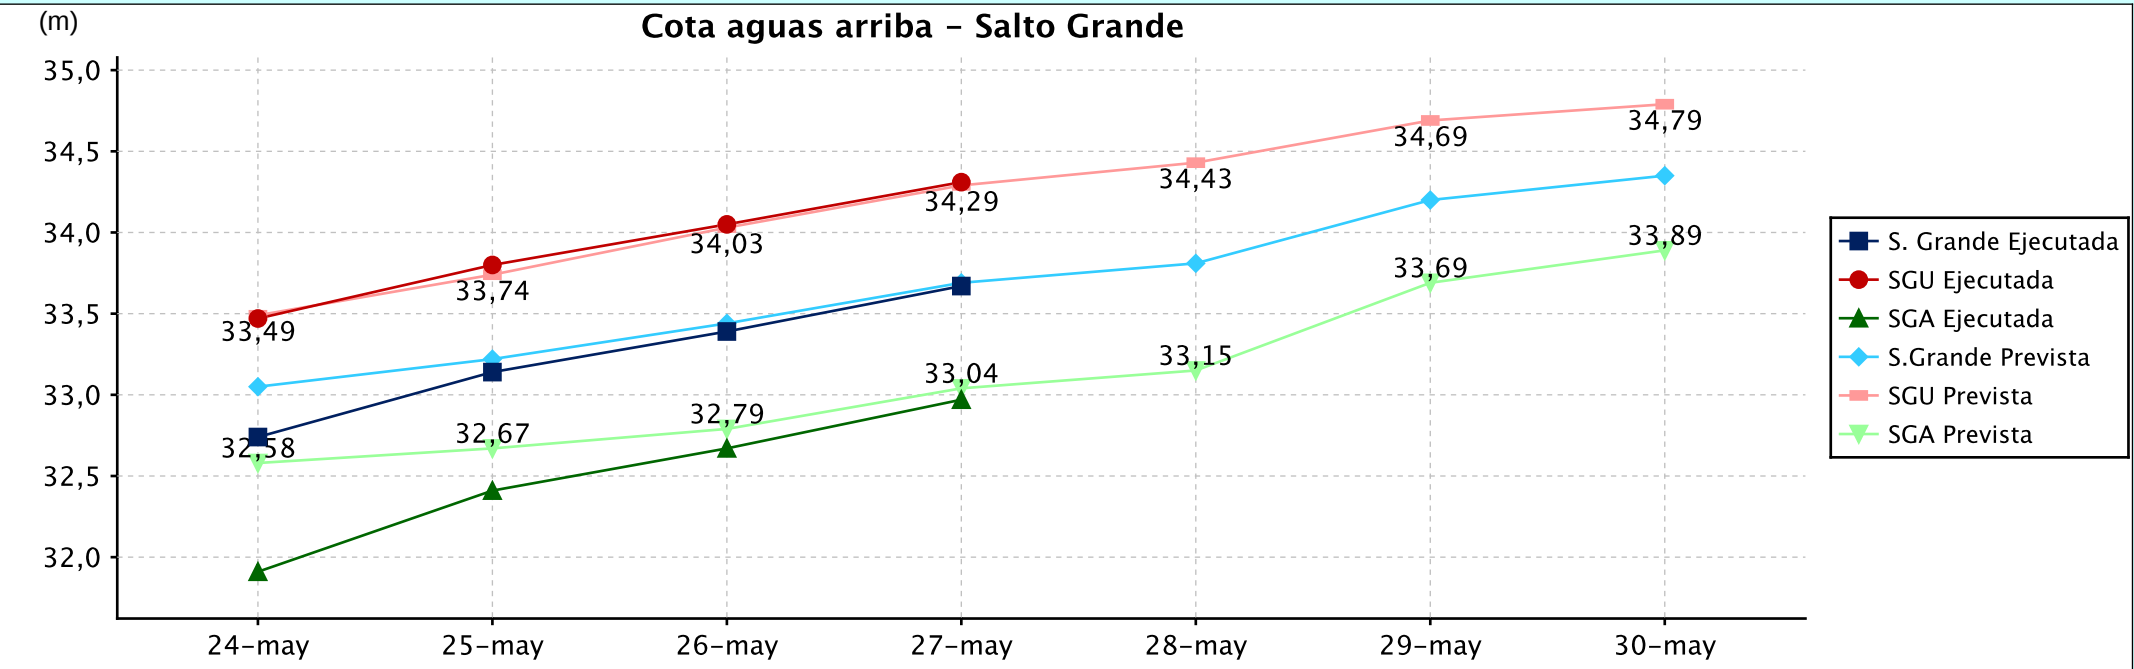

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,31
Cota Vista Arg	32,97
Cota real	33,67
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	26.378

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	666	652
Baygorria	670	654
Palmar	1.196	1.287
SGU	3.543	0

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	457	263
Baygorria	0	33
Palmar	159	129
SGU	4.450	4.391

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
