



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 31 de mayo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	98
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	102
Central La Tablada	-46
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.213
C. Baygorria	1.941
C. Palmar	3.136
C. Salto Grande	19.275
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	1.718
TOTAL Generación	29.321

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.321
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.485
Diferencia (MWh)	-2.164
Ejecutada - Programada	-6,87 %

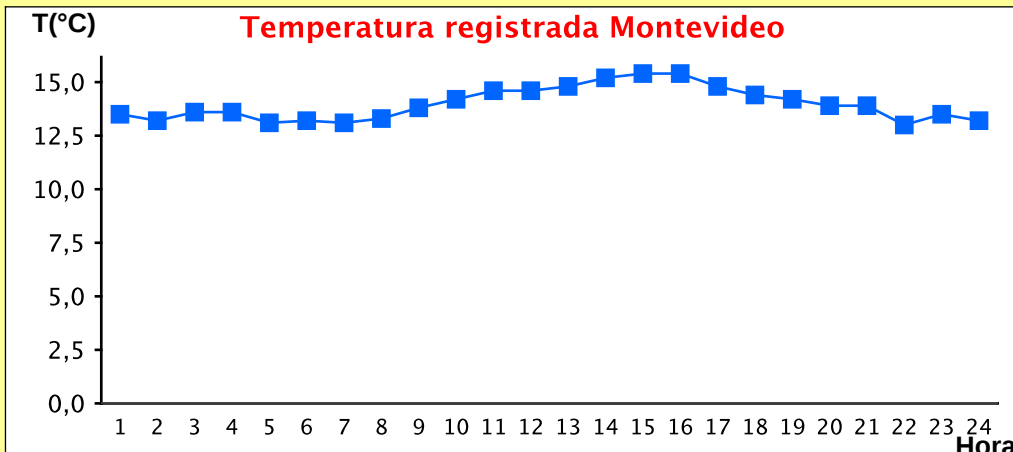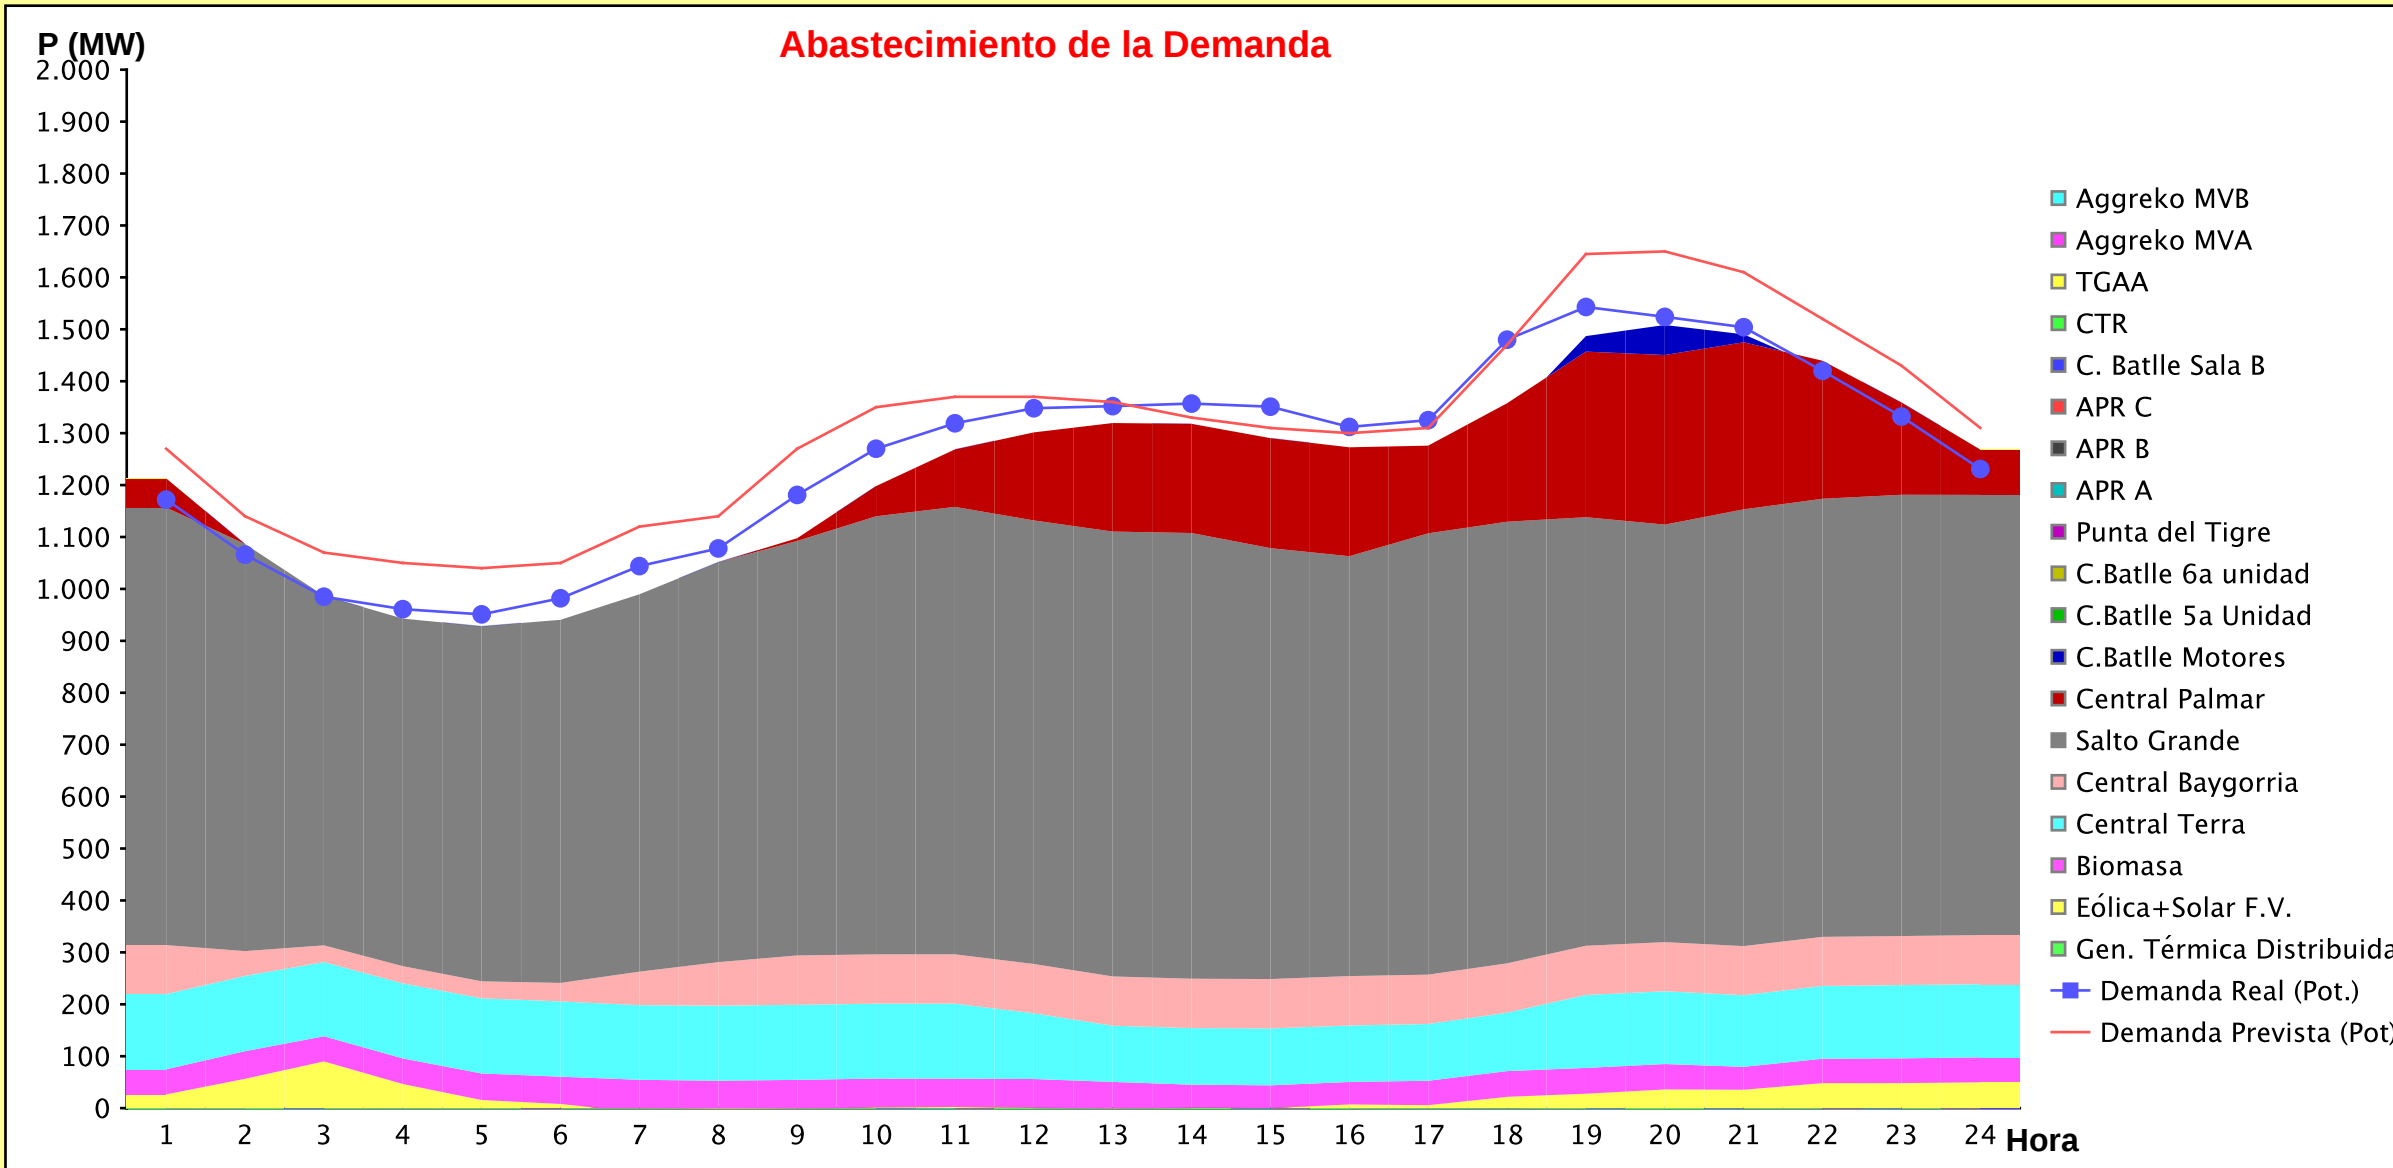



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1379,04 Hora 15:46
Potencia mínima:	949,17 Hora 05:53
Pico noche:	1550,59 Hora 18:57

Generación Media (MW)	
Eólica	22,7
Biomasa	59,2
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

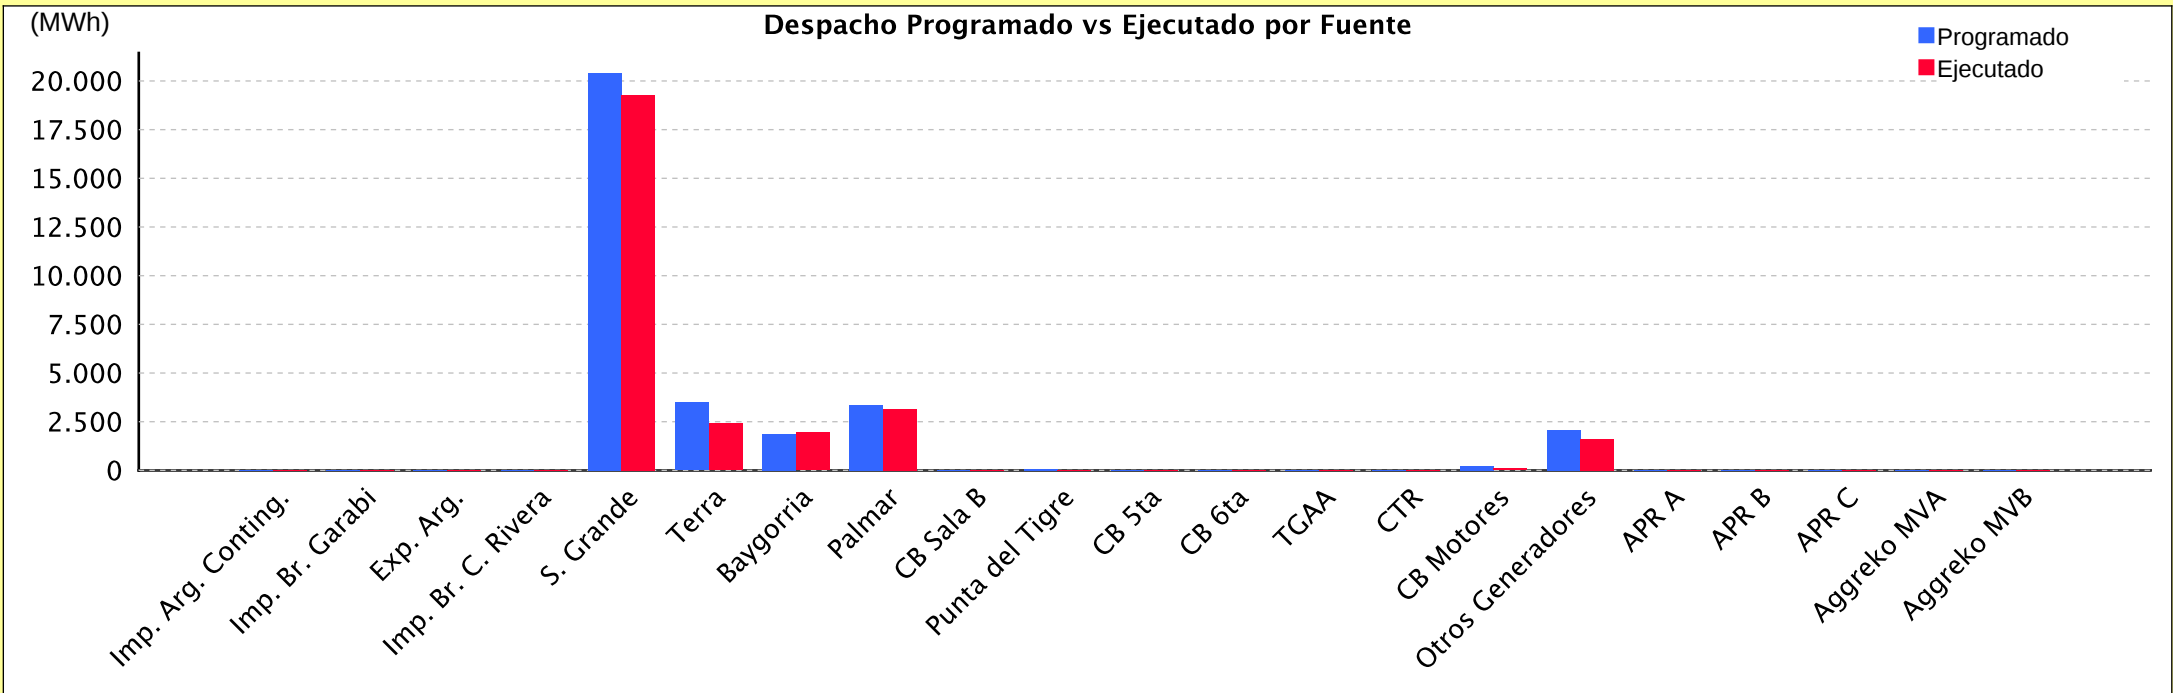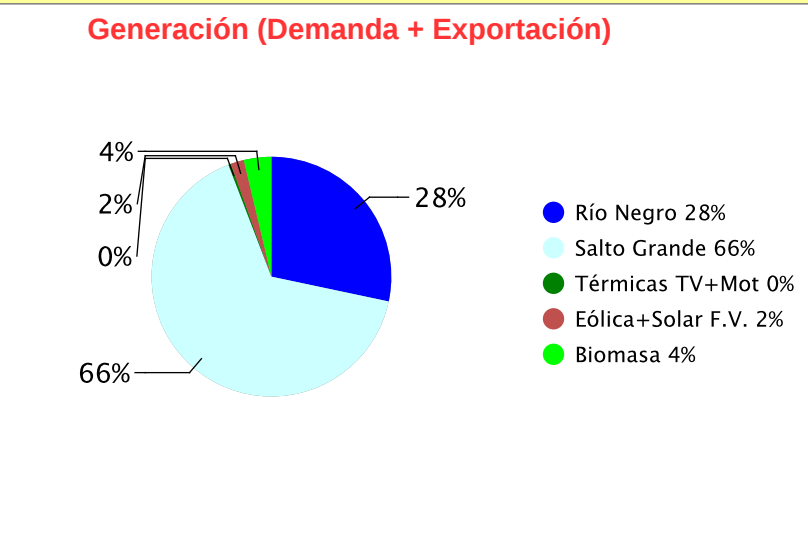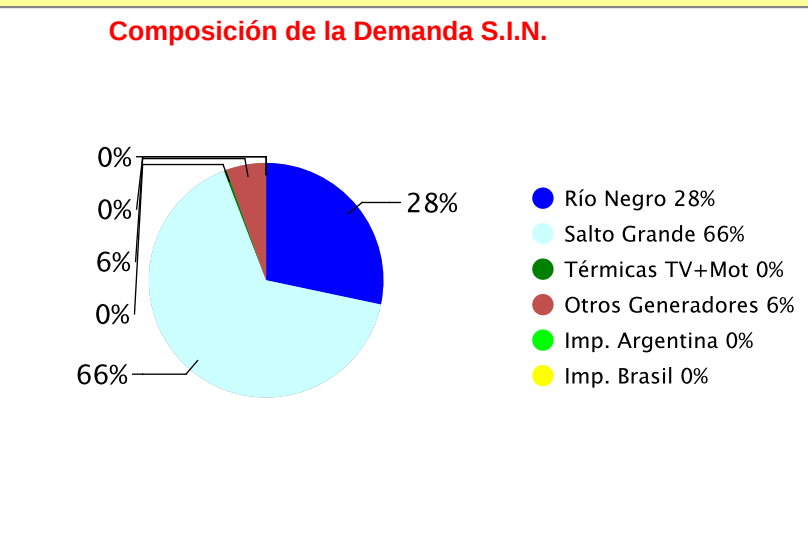



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

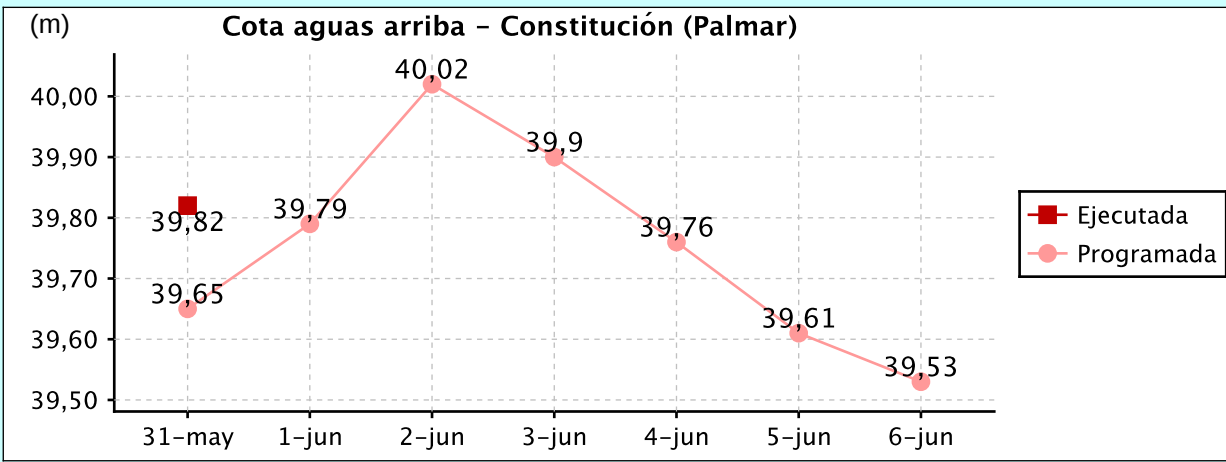
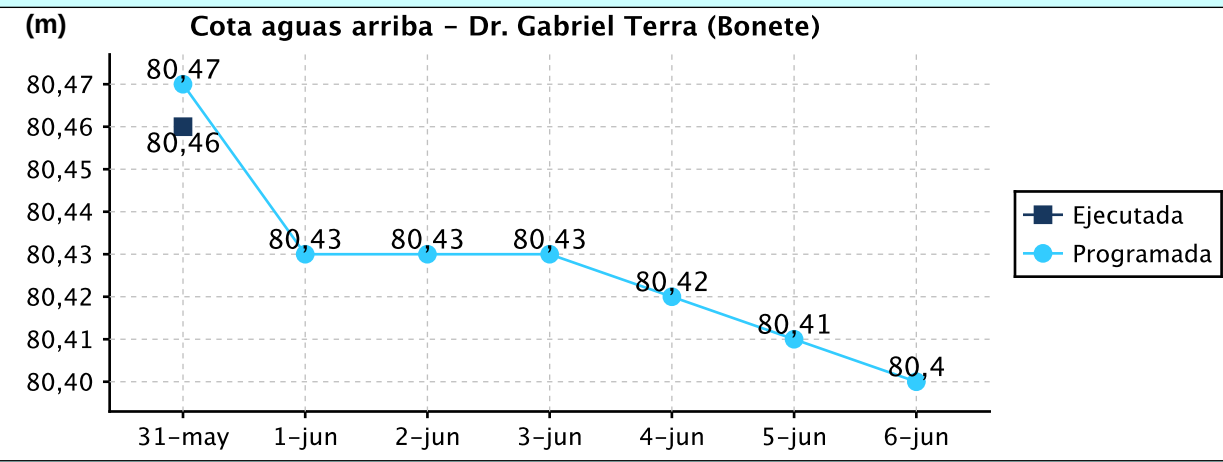


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,47	80,46
Baygorria	53,86	54,02
Palmar	39,65	39,82
SGU	34,88	34,89

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

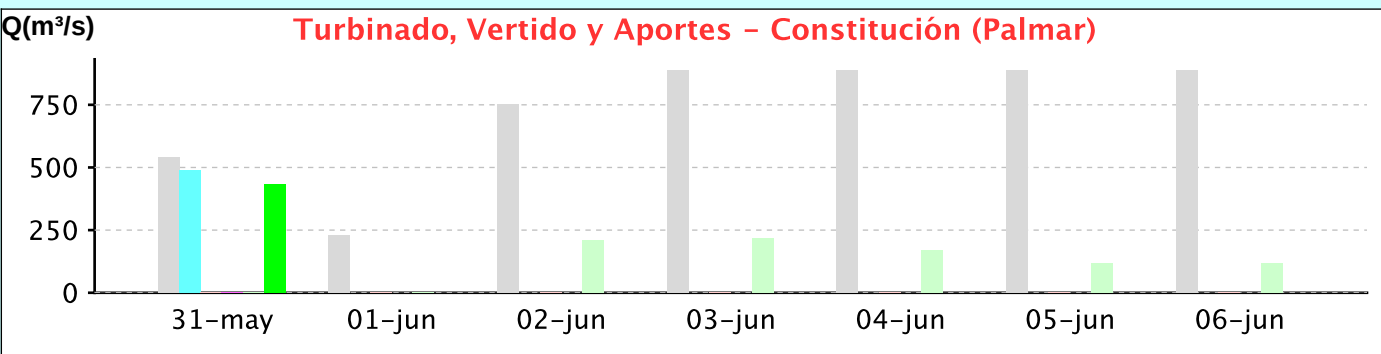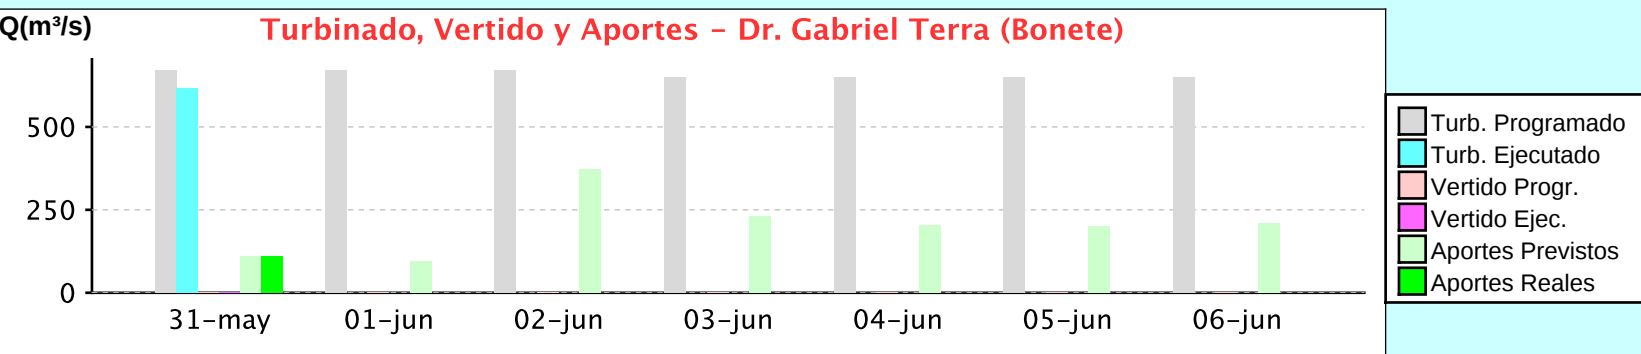

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

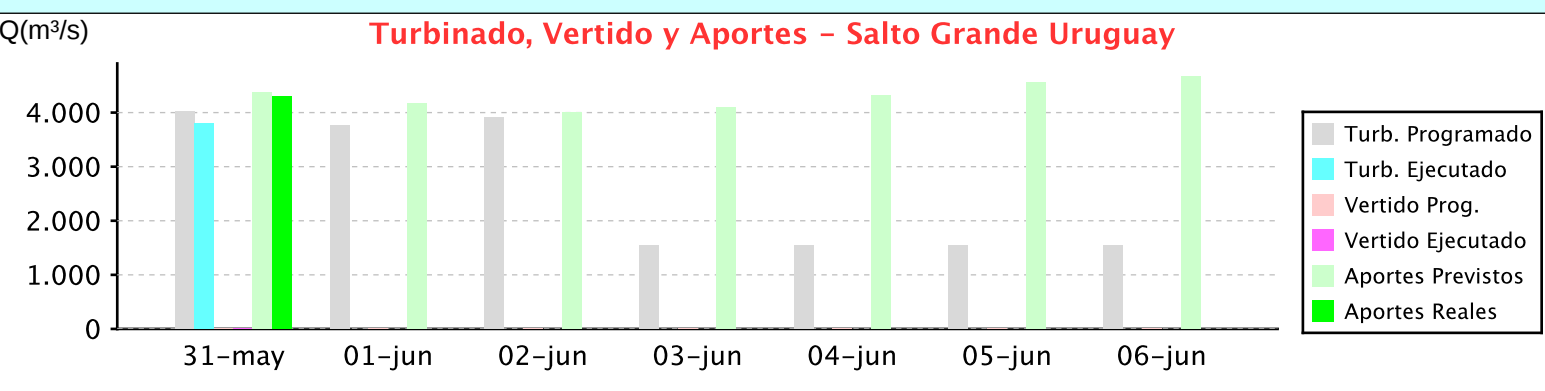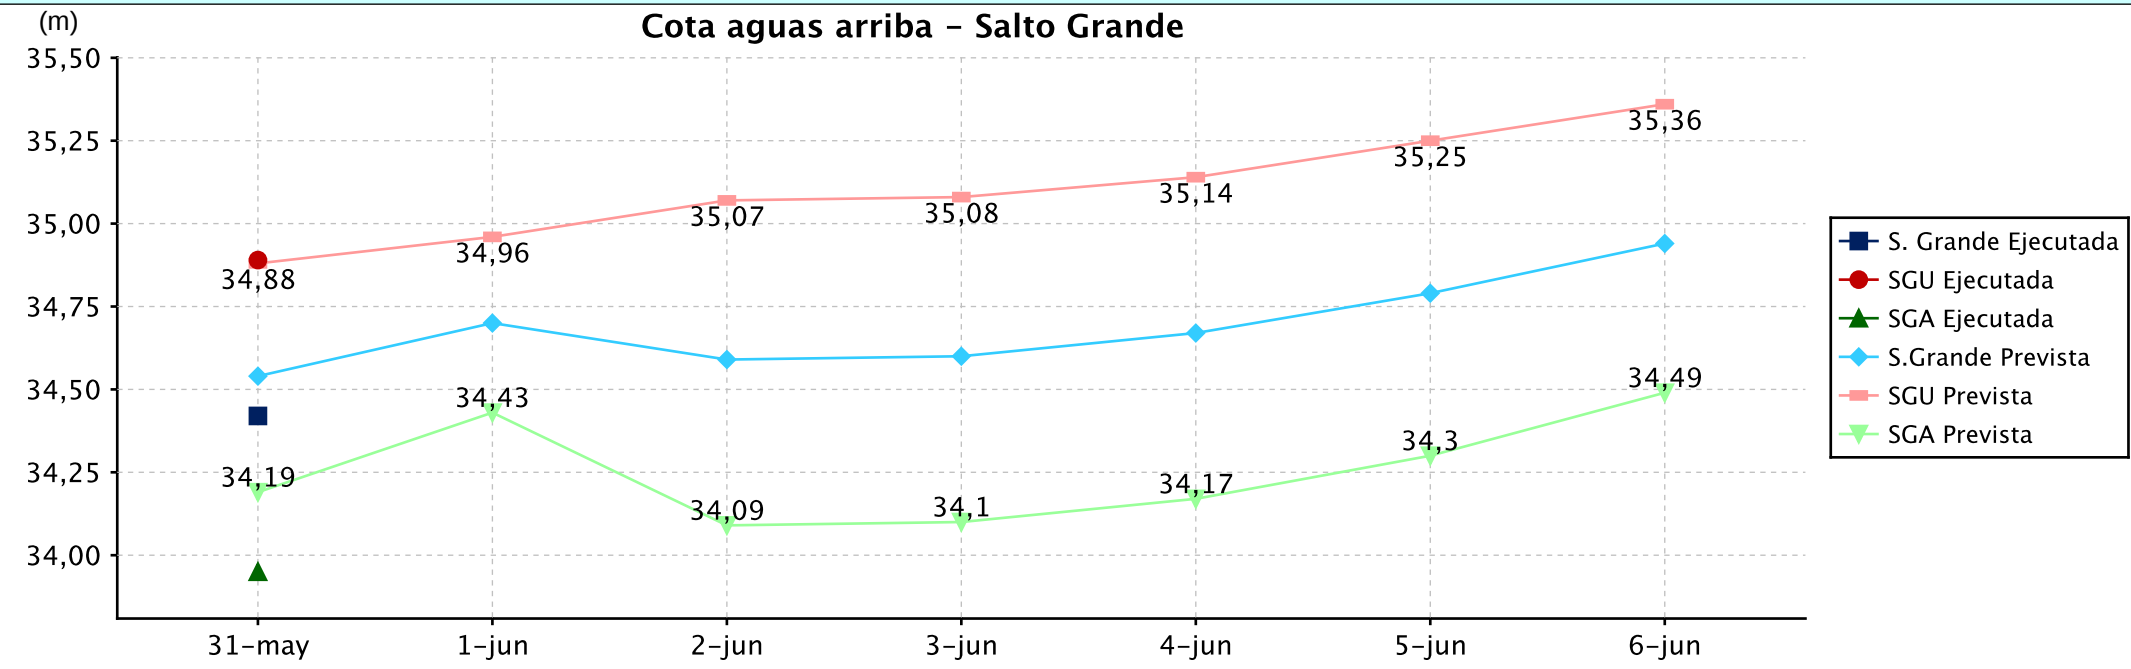

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,89
Cota Vista Arg	33,95
Cota real	34,42

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	20.537
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	615
Baygorria	680	697
Palmar	539	488
SGU	4.031	3.801

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	111	110
Baygorria	0	193
Palmar	0	434
SGU	4.375	4.298

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
