



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 02 de junio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	269
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	272
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	279
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.136
C. Baygorria	1.097
C. Palmar	5.507
C. Salto Grande	20.278
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.351
TOTAL Generación	30.871

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.871
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	33.495
Diferencia (MWh)	-2.624
Ejecutada - Programada	-7,83 %

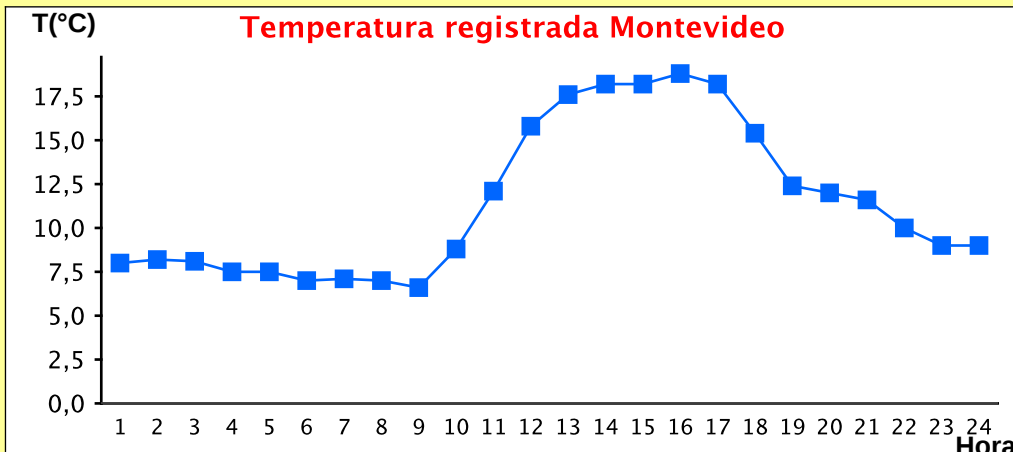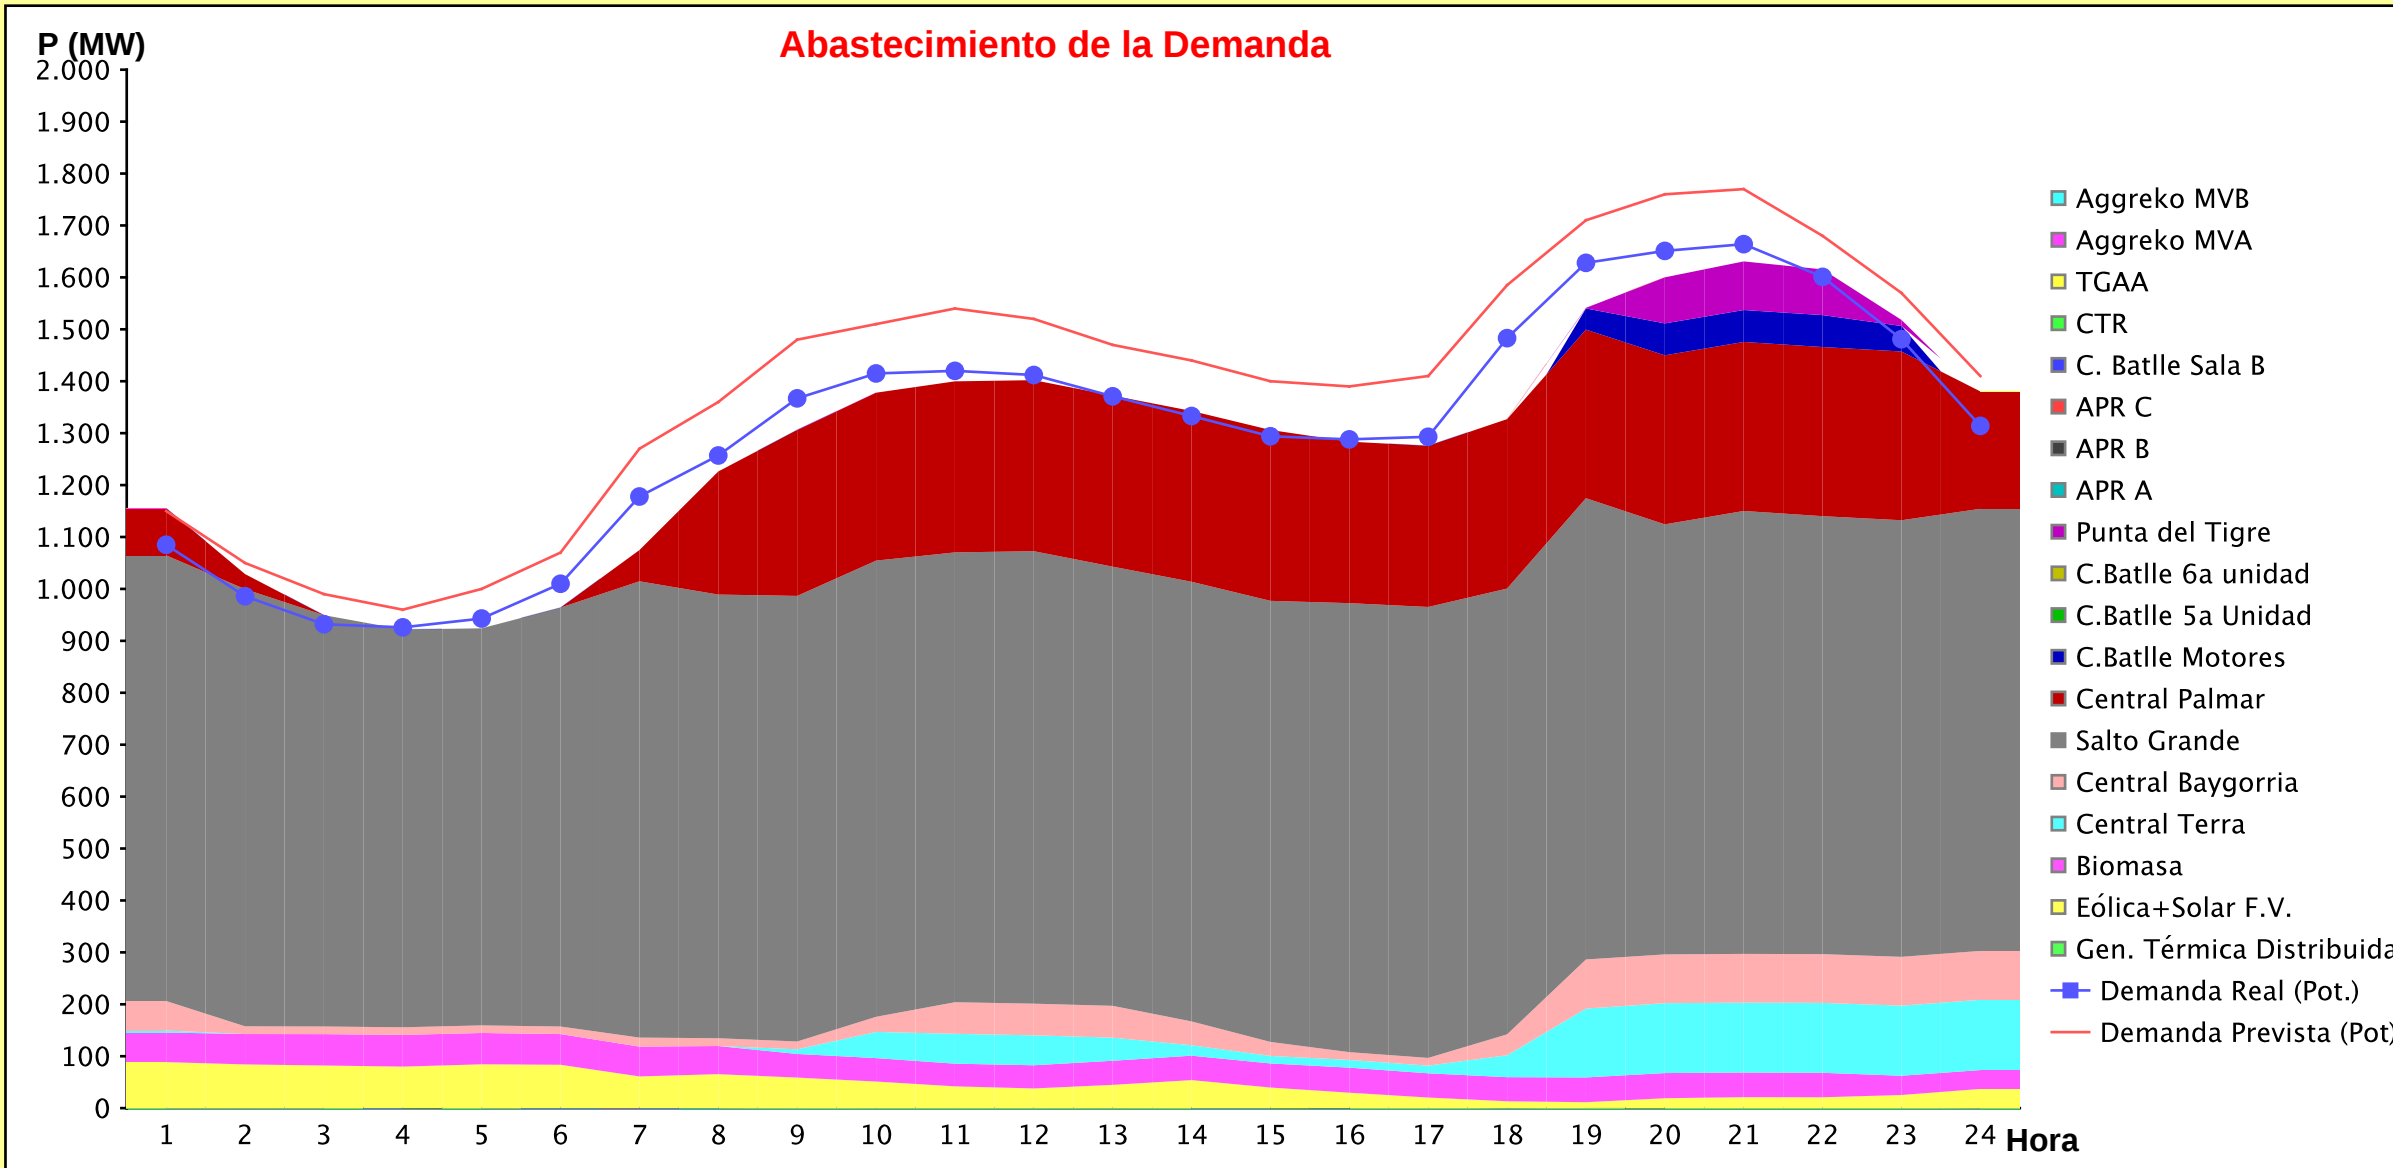



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	0 Hora 00:00
Potencia mínima:	0 Hora 00:00
Pico noche:	0 Hora 00:00

Generación Media (MW)	
Eólica	48,6
Biomasa	59,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

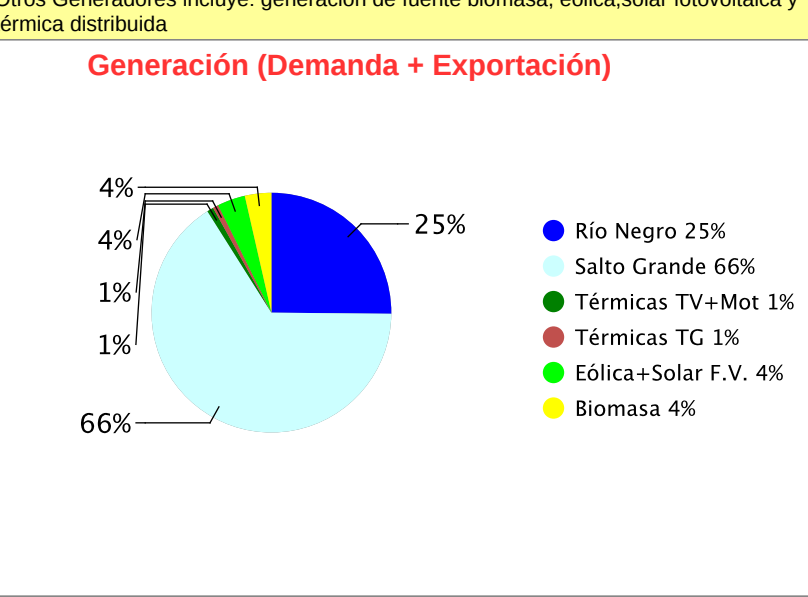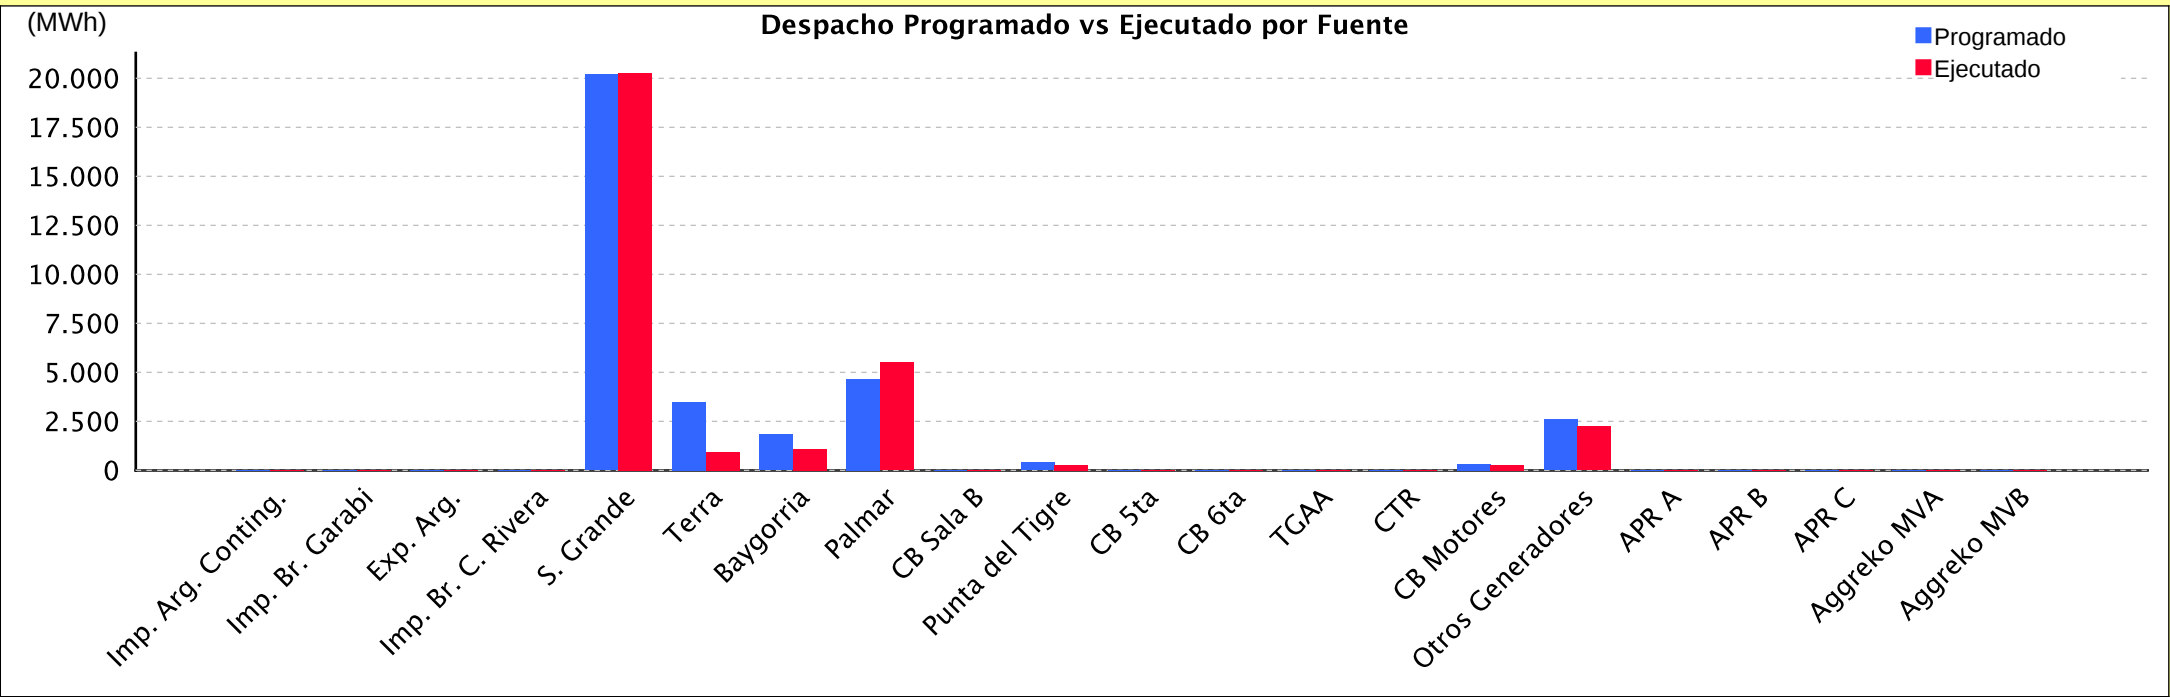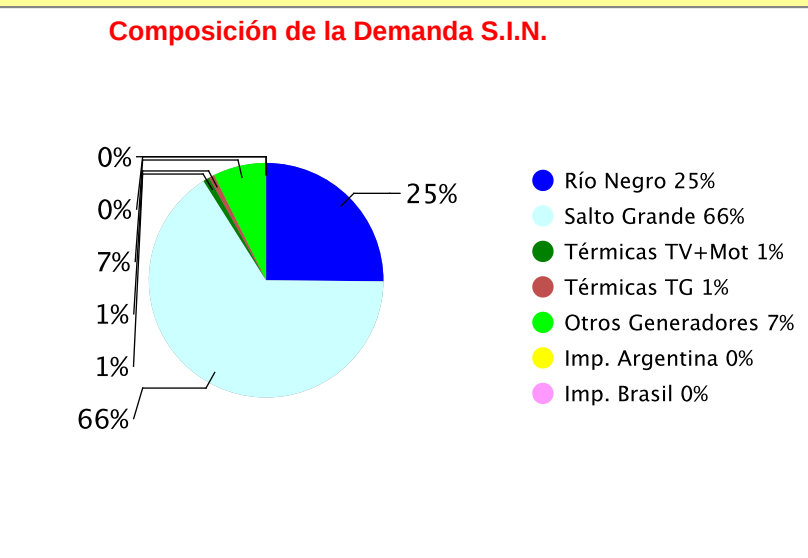



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

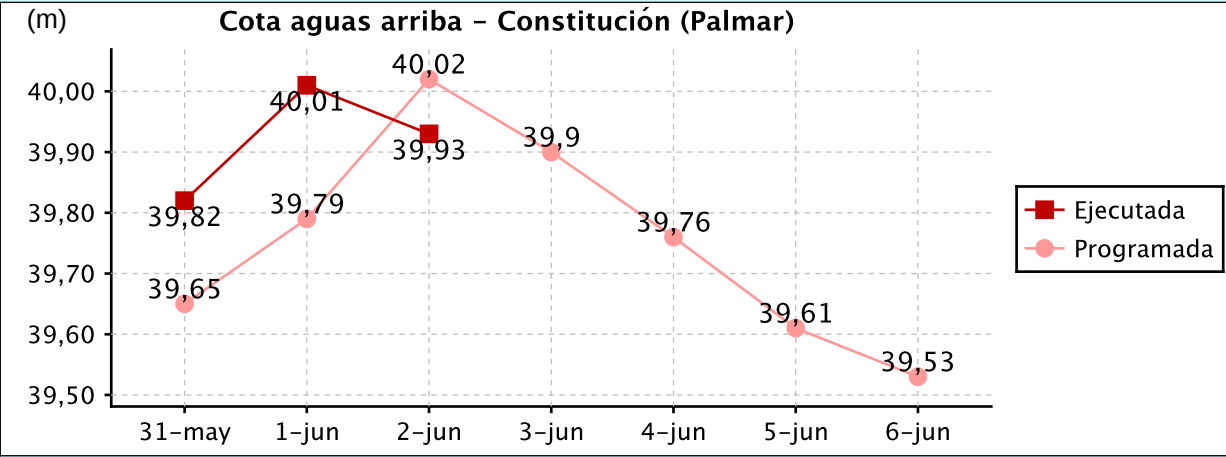
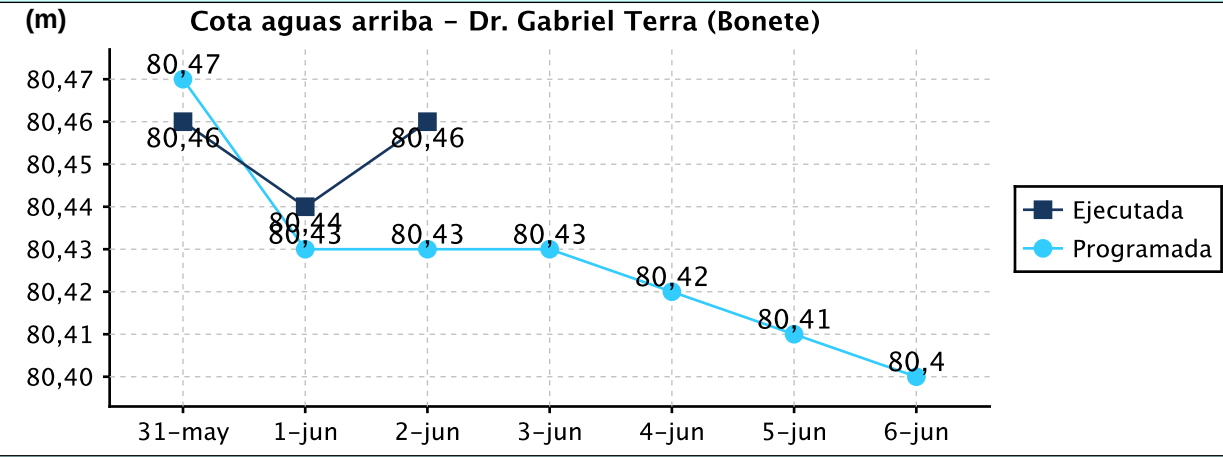


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,43	80,46
Baygorria	54,13	53,93
Palmar	40,02	39,93
SGU	35,07	35,04

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

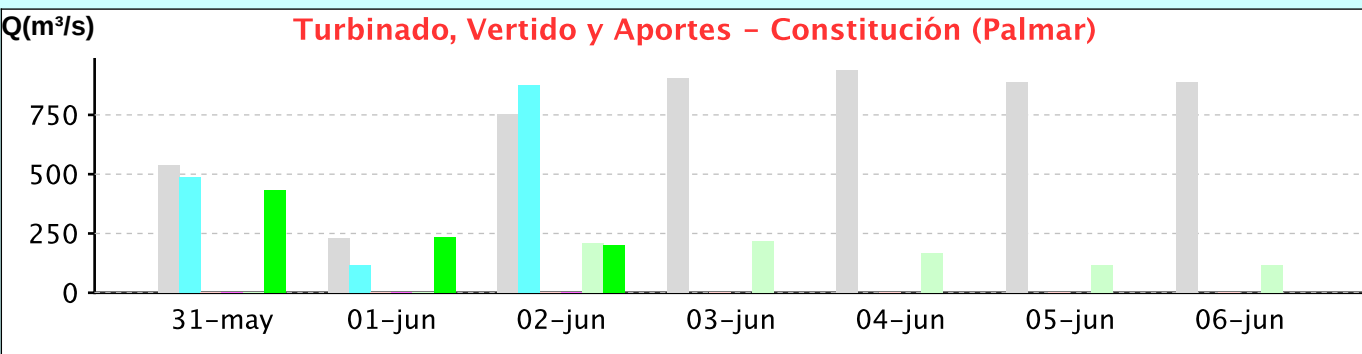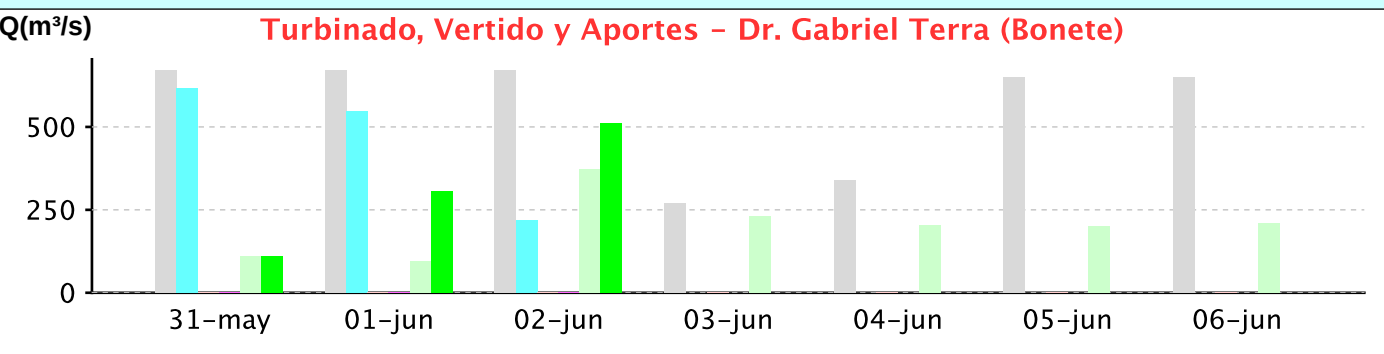

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

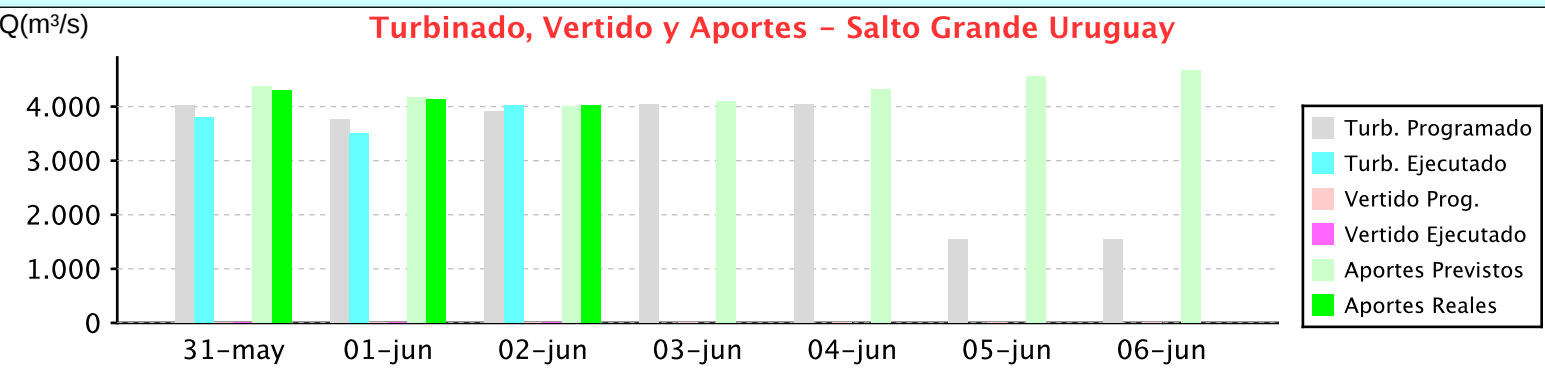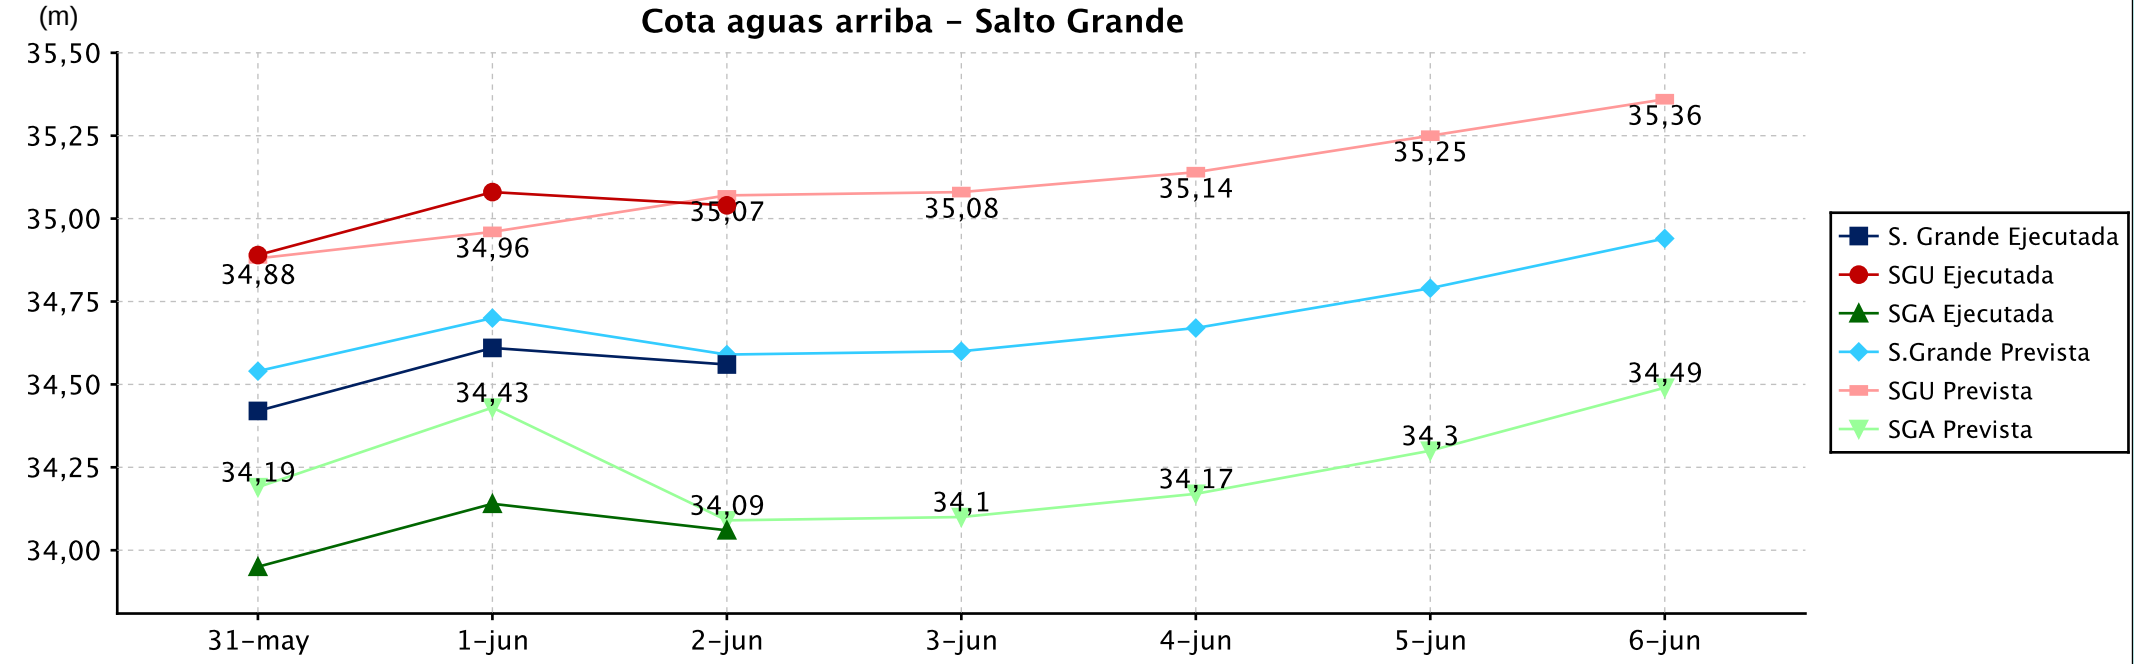

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,04
Cota Vista Arg	34,06
Cota real	34,56

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	21.916
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	218
Baygorria	669	400
Palmar	752	873
SGU	3.913	4.022

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	373	511
Baygorria	57	37
Palmar	208	199
SGU	4.000	4.022

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
