



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 04 de junio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	101
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	105
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	-5
APR A	-2
APR B	145
APR C	157
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.100
C. Baygorria	956
C. Palmar	5.606
C. Salto Grande	20.106
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.927
TOTAL Generación	32.049

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	32.049
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	33.385
Diferencia (MWh)	-1.336
Ejecutada - Programada	-4,00 %

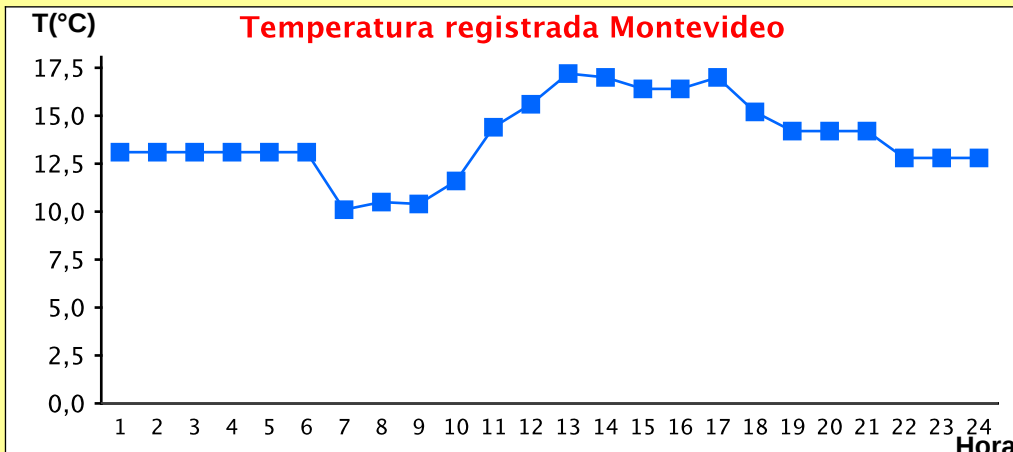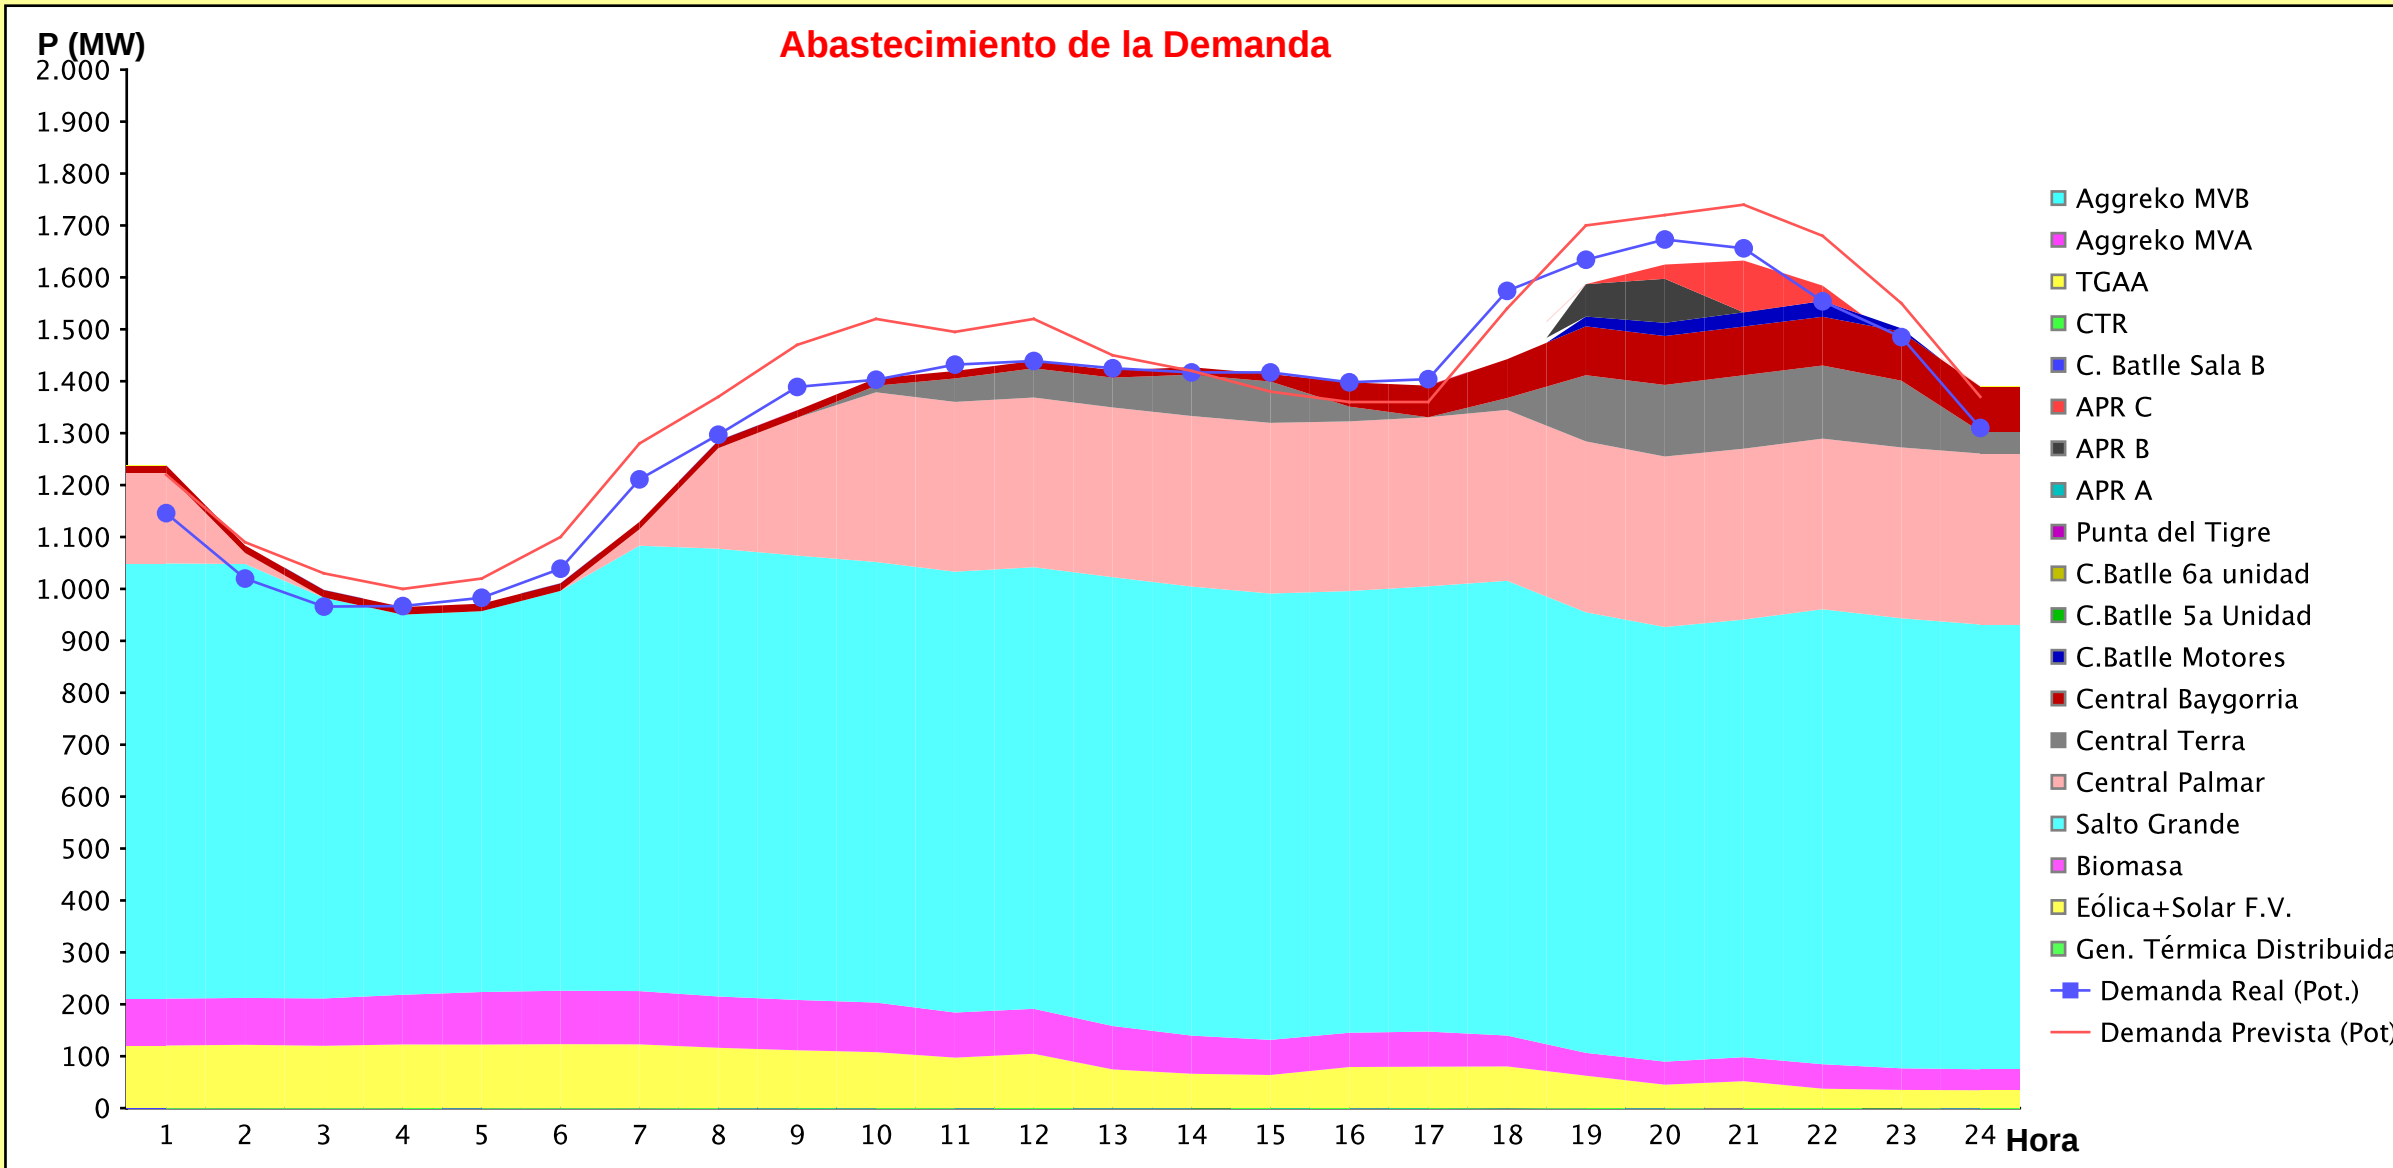



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1465,54 Hora 11:46
Potencia mínima:	957,57 Hora 03:30
Pico noche:	1684,98 Hora 19:54

Generación Media (MW)	
Eólica	88,1
Biomasa	79,9
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

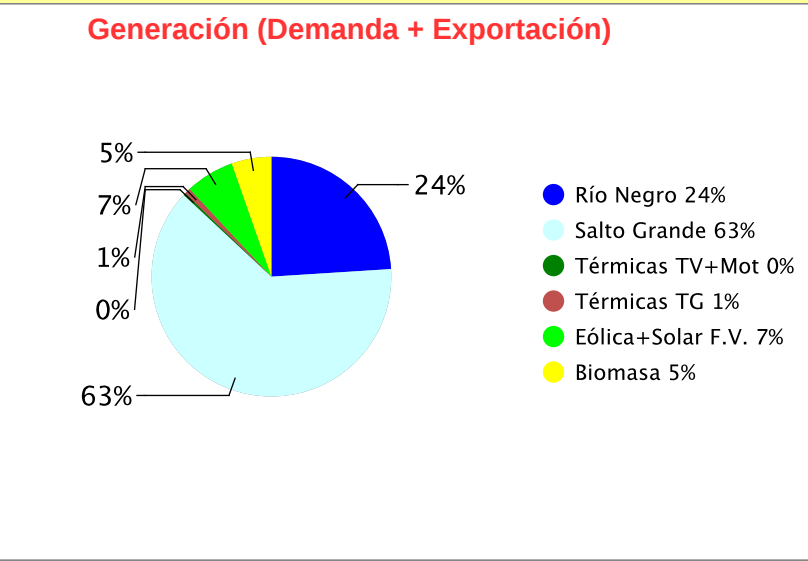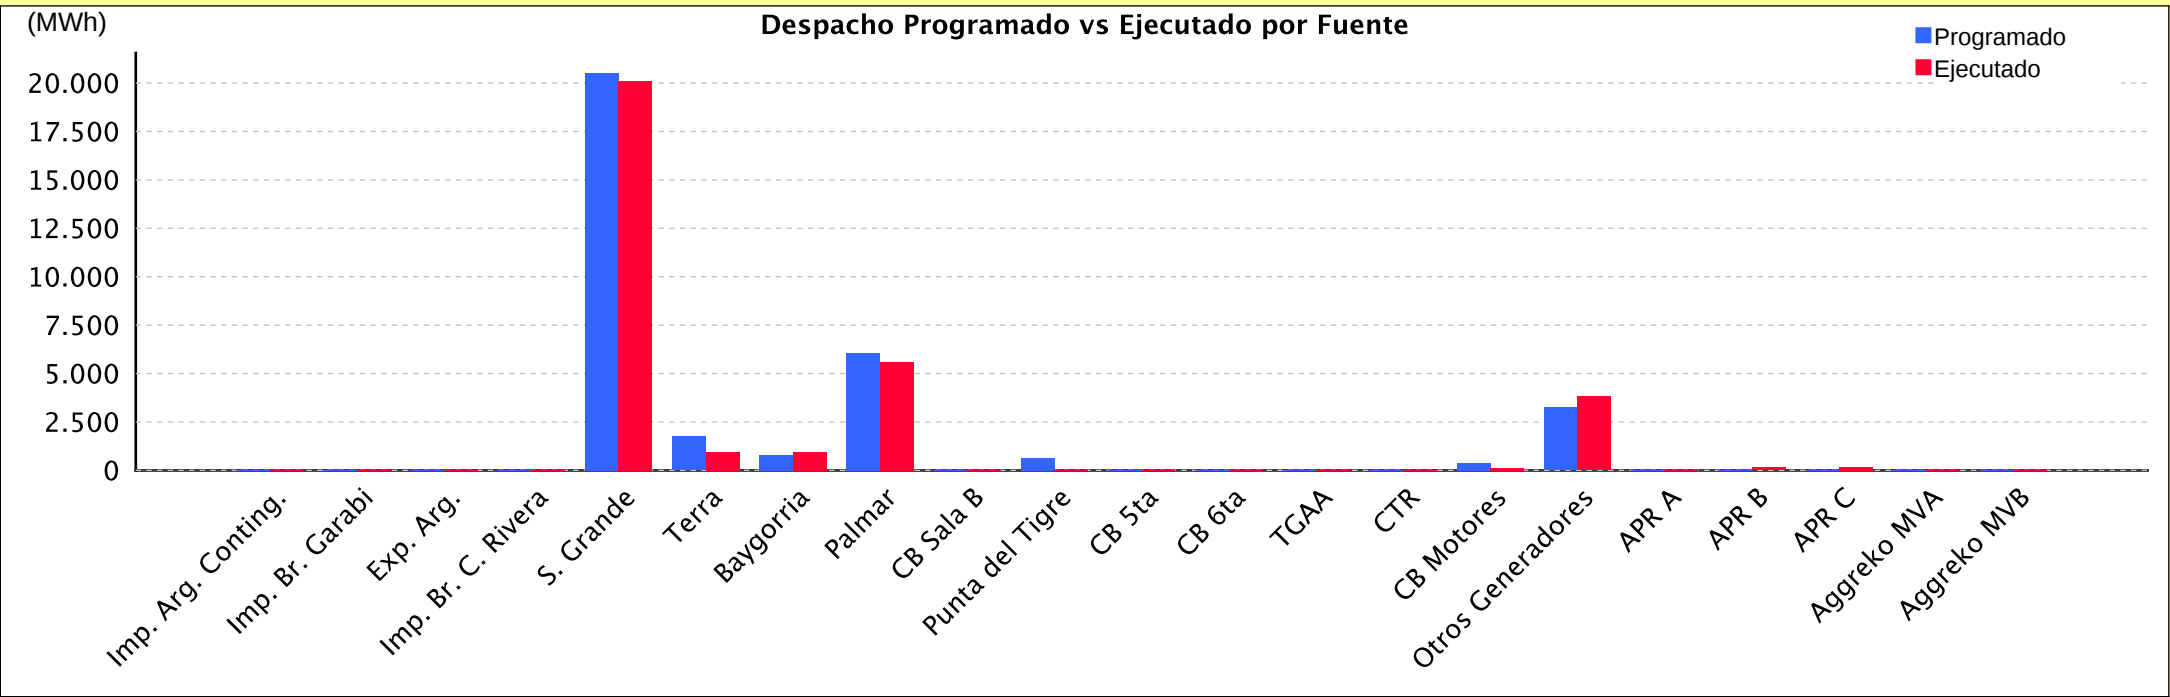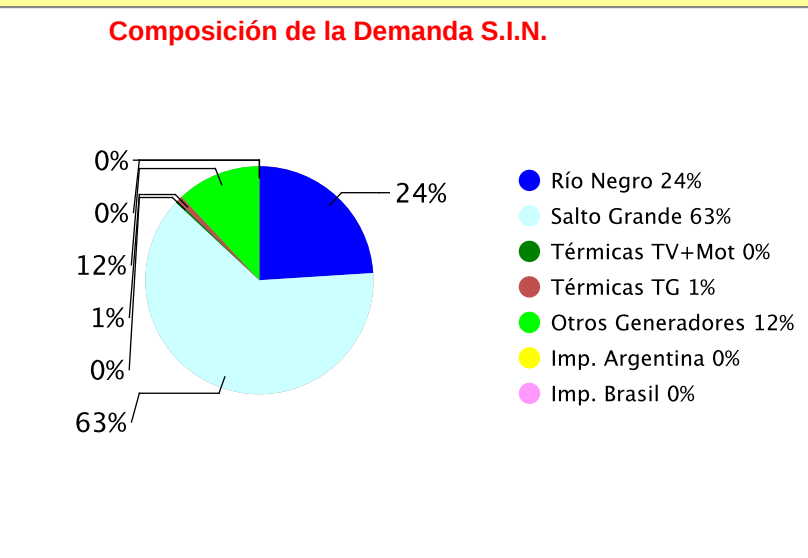



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

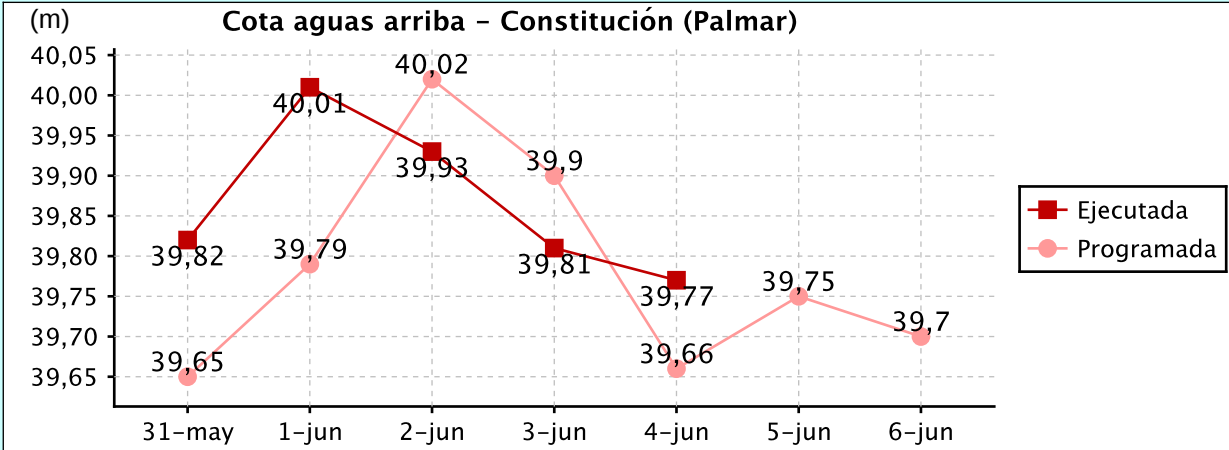
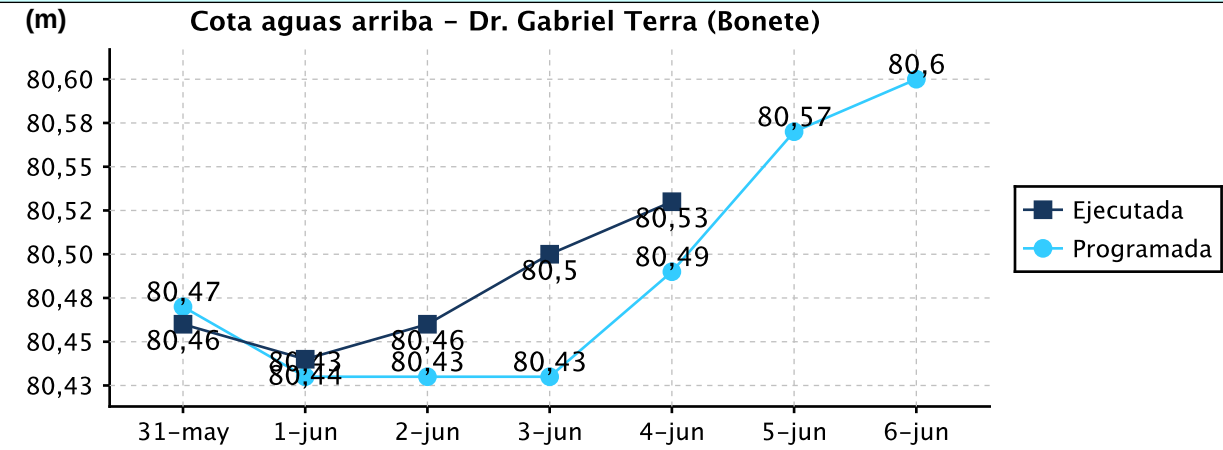


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,49	80,53
Baygorria	54,13	54,03
Palmar	39,66	39,77
SGU	35,09	35,11

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

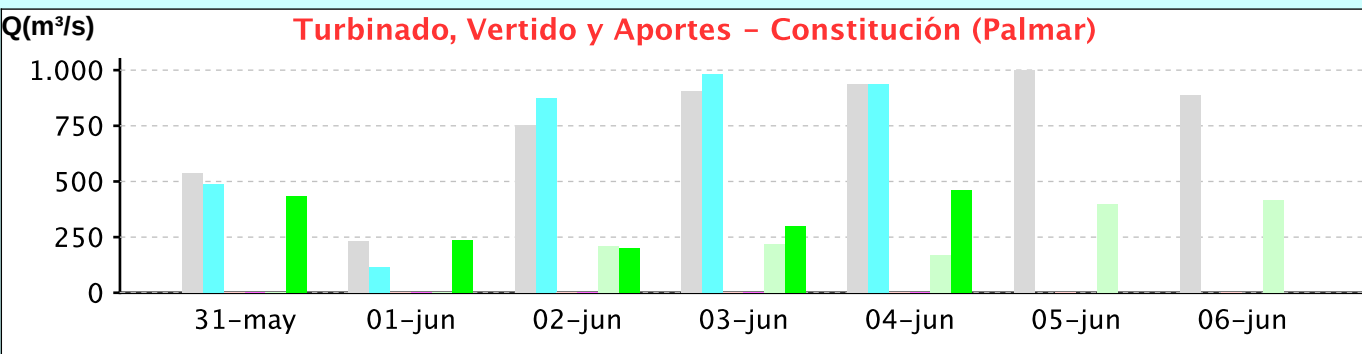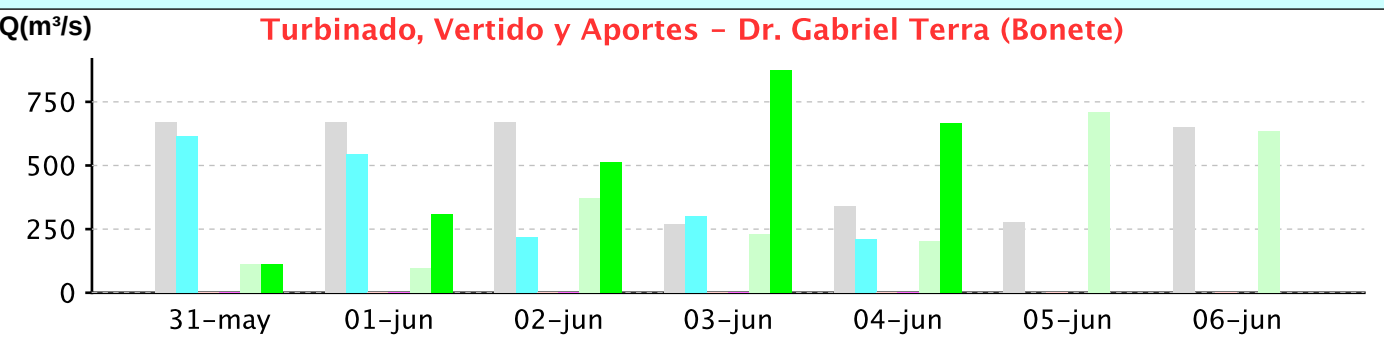

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

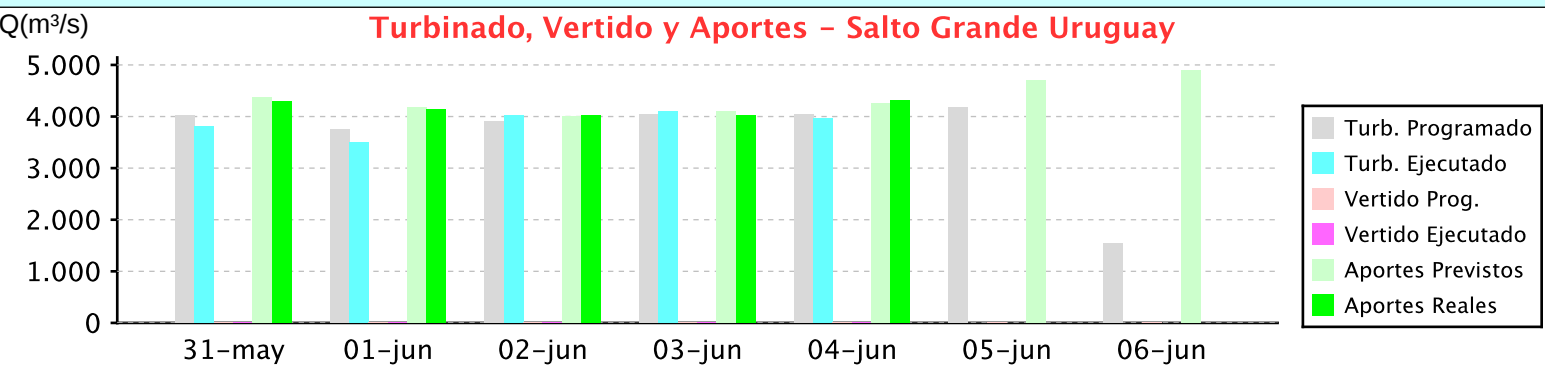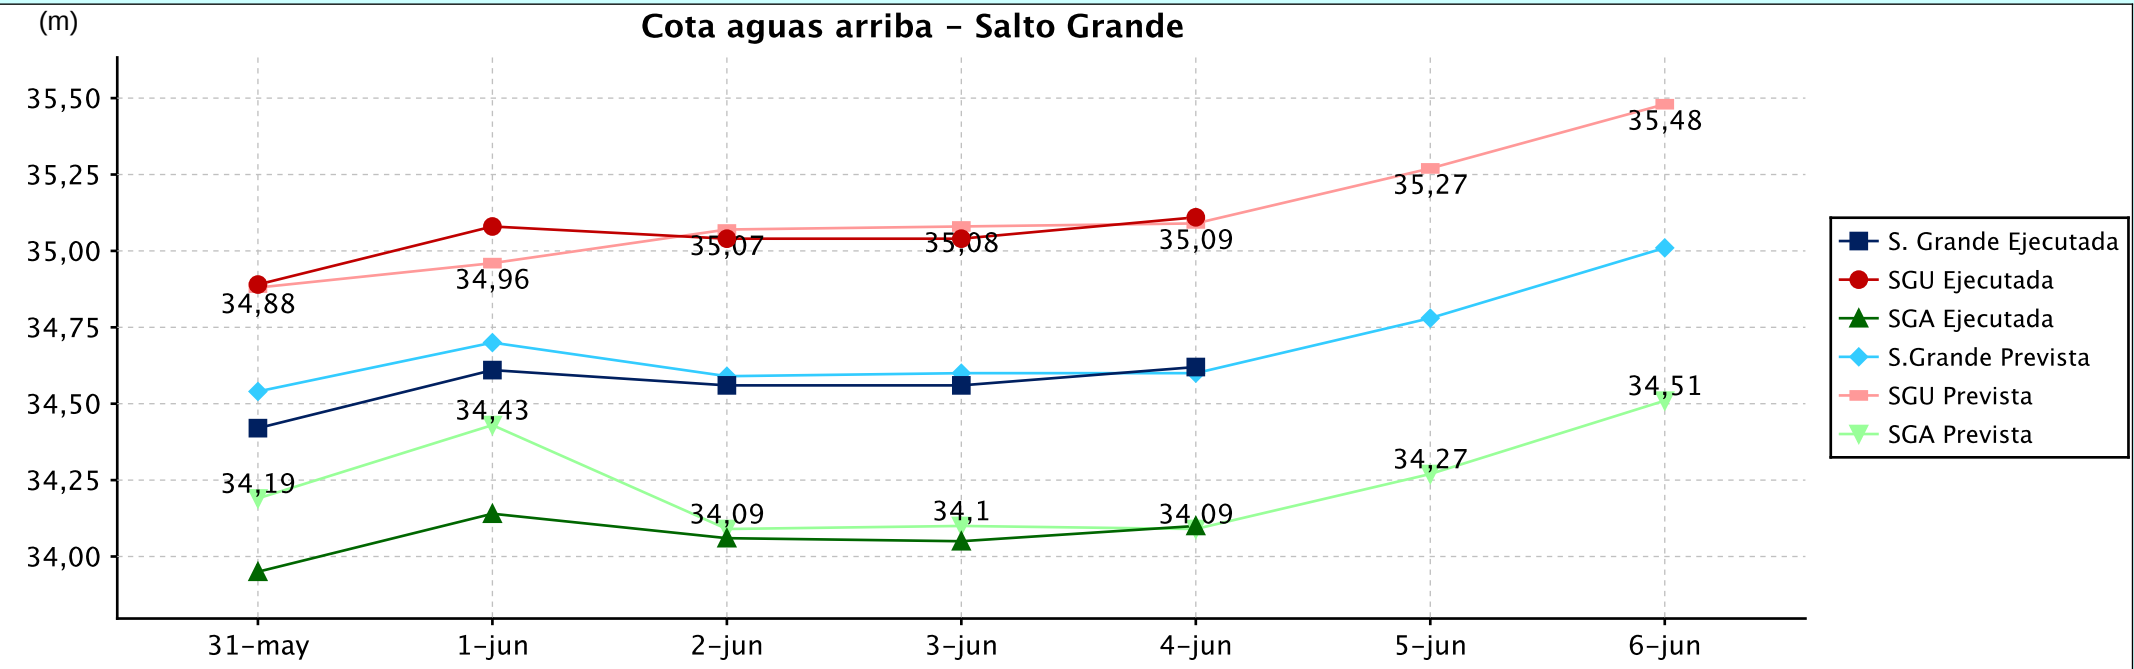

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,11
Cota Vista Arg	34,10
Cota real	34,62

Dif. Energ. (U-A)	22.885
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	339	211
Baygorria	286	339
Palmar	938	935
SGU	4.043	3.971

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	202	666
Baygorria	0	65
Palmar	168	461
SGU	4.250	4.318

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
