



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 05 de junio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	168
Sala B	-4
5ta.	-0
6ta.	0
Motores	172
Central La Tablada	-40
Central P. del Tigre	-6
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.126
C. Baygorria	1.079
C. Palmar	5.946
C. Salto Grande	20.544
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.633
TOTAL Generación	31.445

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.445
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	32.225
Diferencia (MWh)	-780
Ejecutada - Programada	-2,42 %

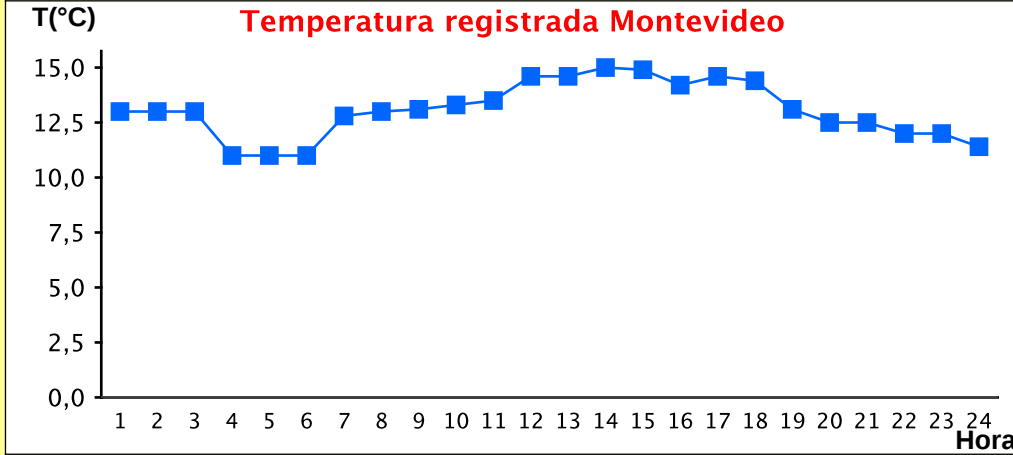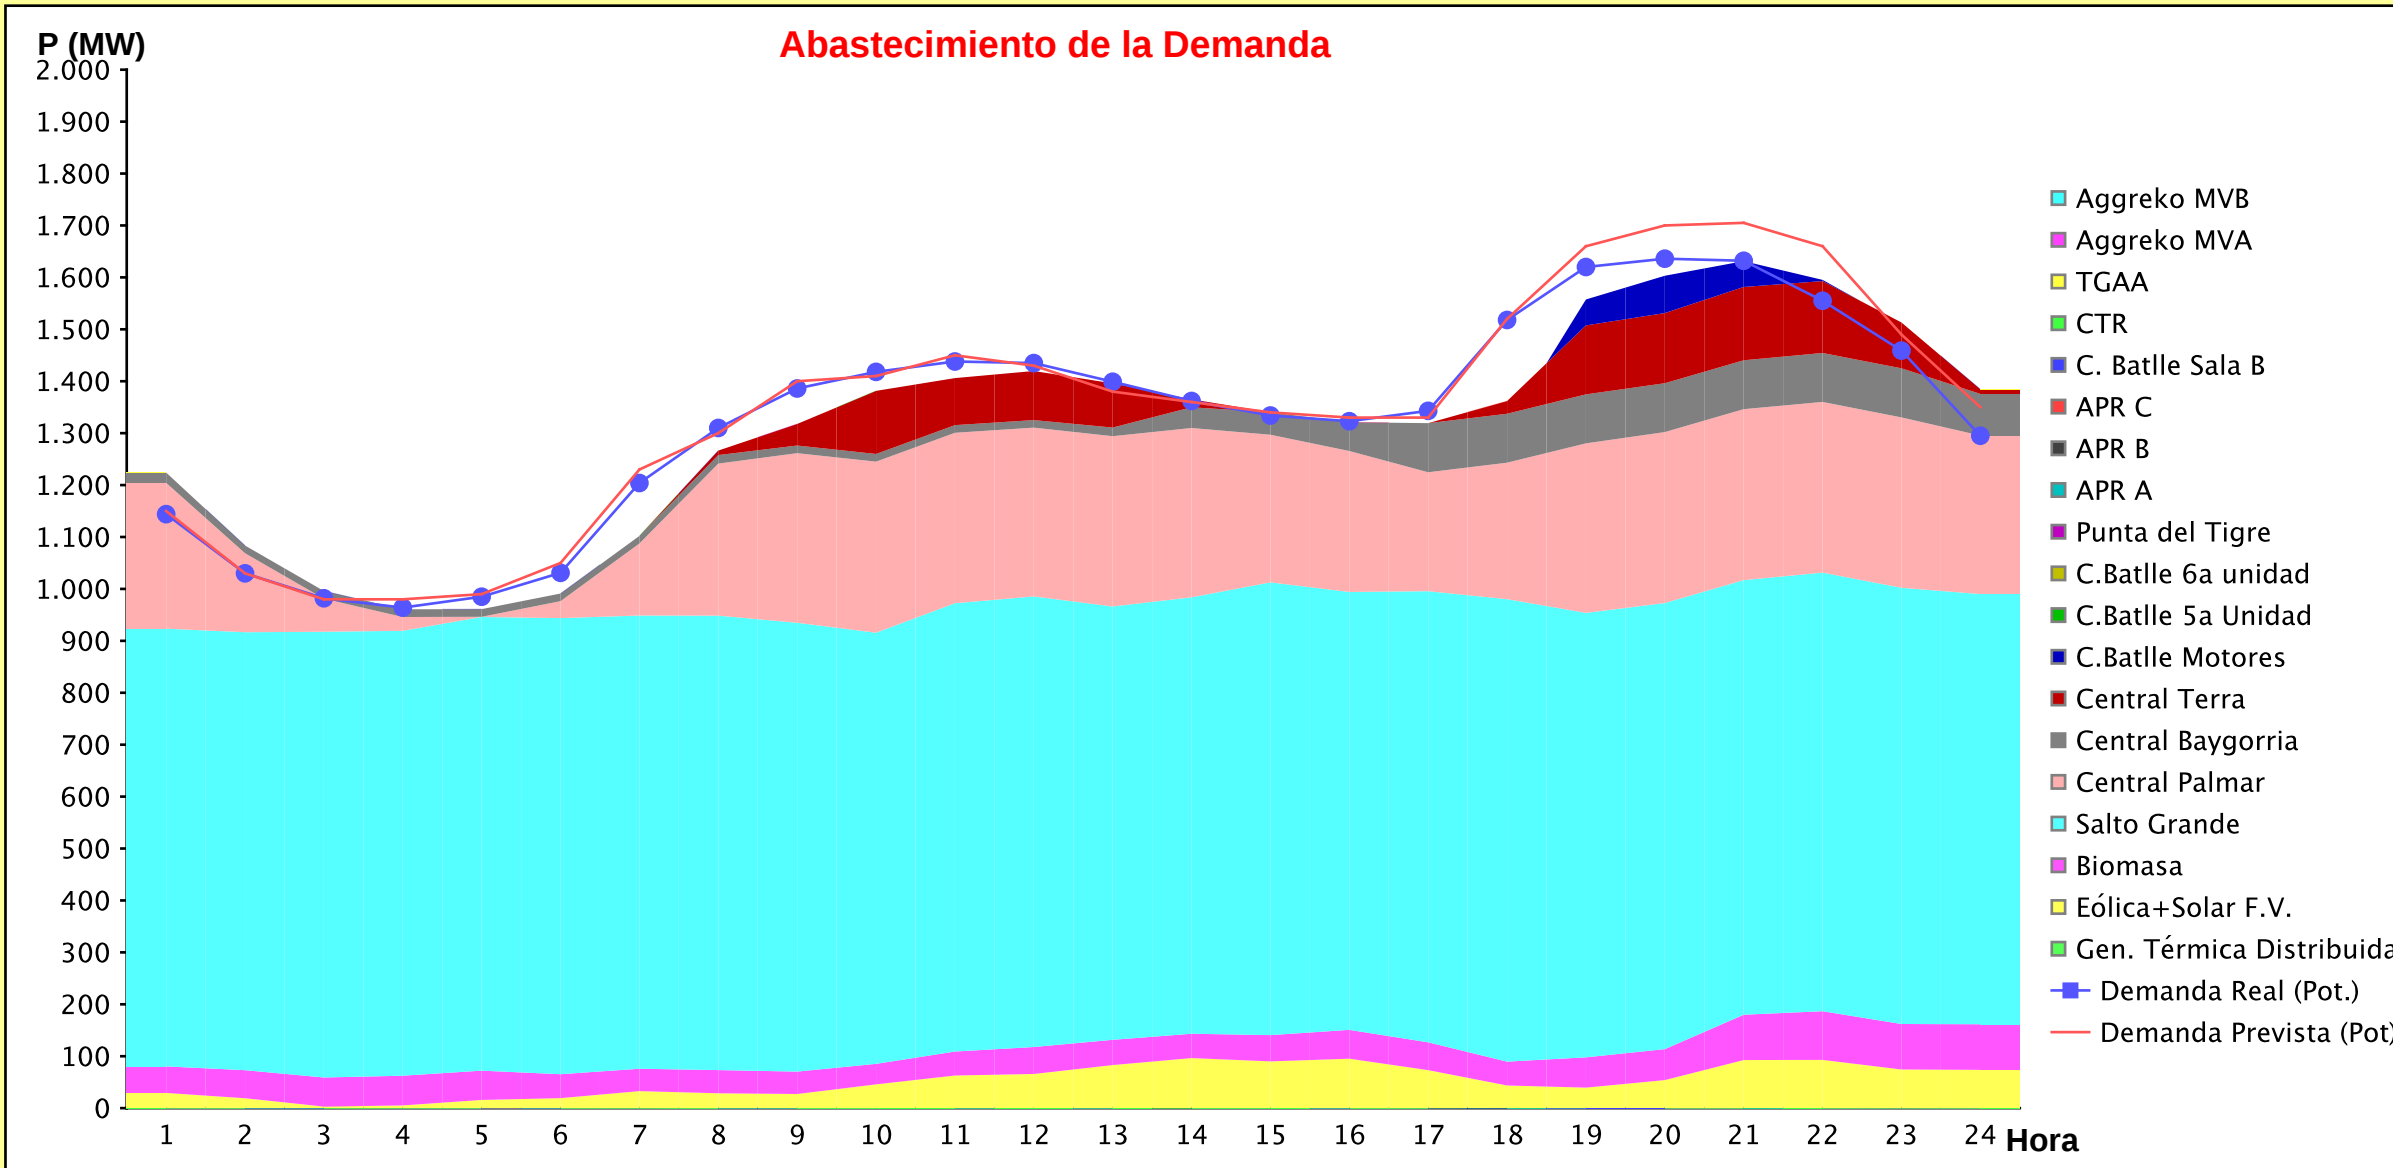



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1458,21 Hora 11:38
Potencia mínima:	958,83 Hora 04:10
Pico noche:	1674,15 Hora 20:36

Generación Media (MW)	
Eólica	53,2
Biomasa	65,8
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

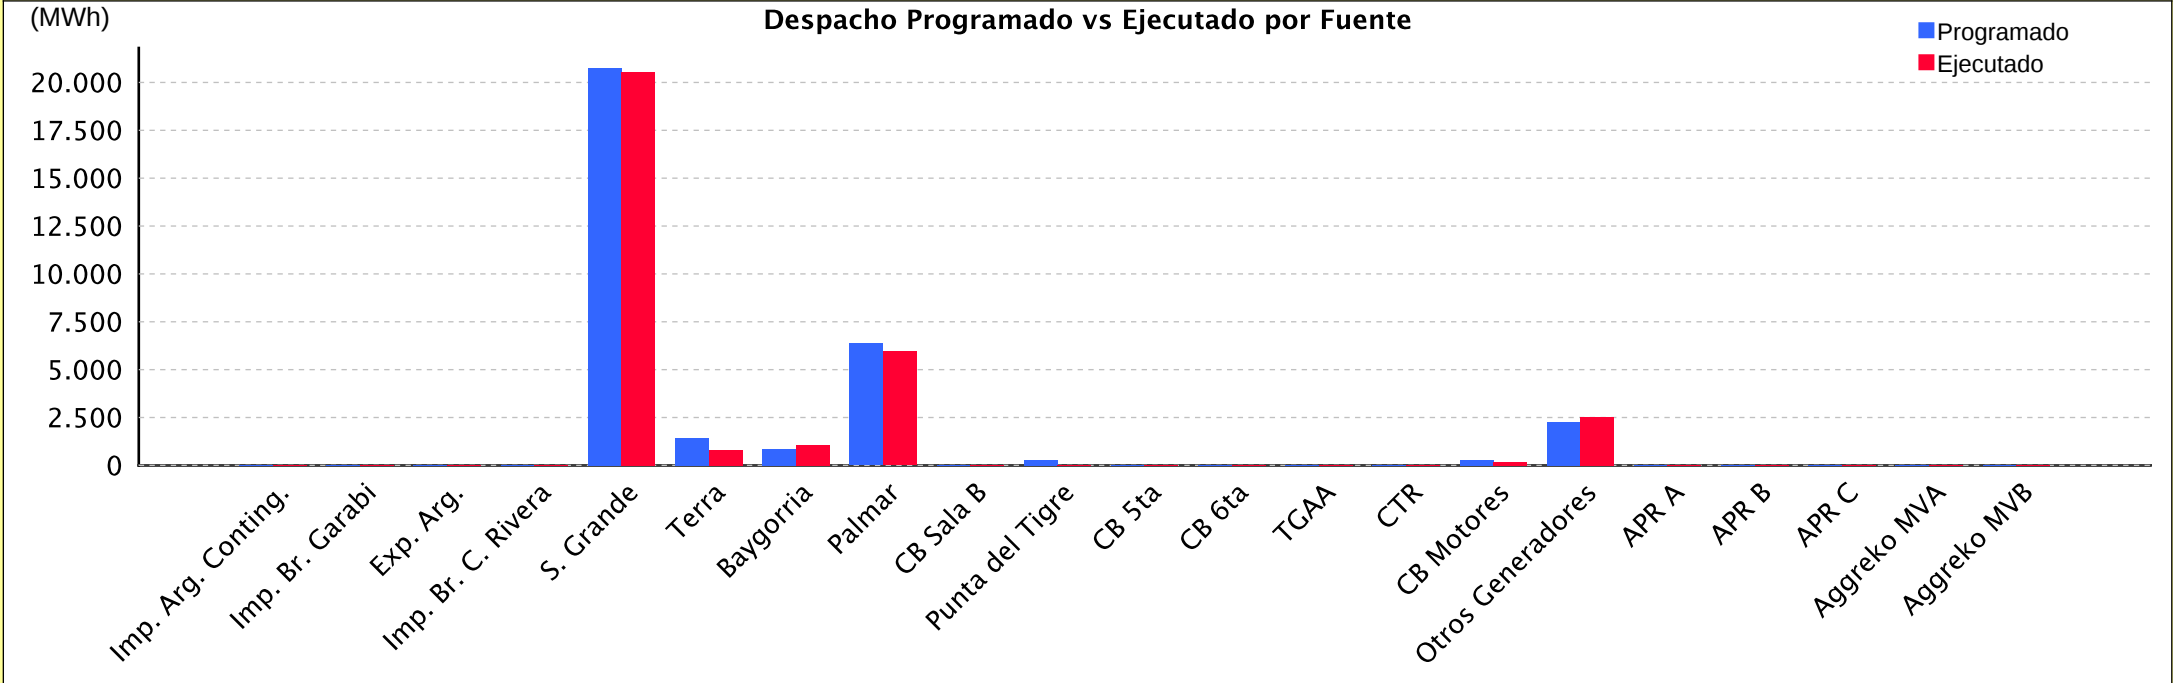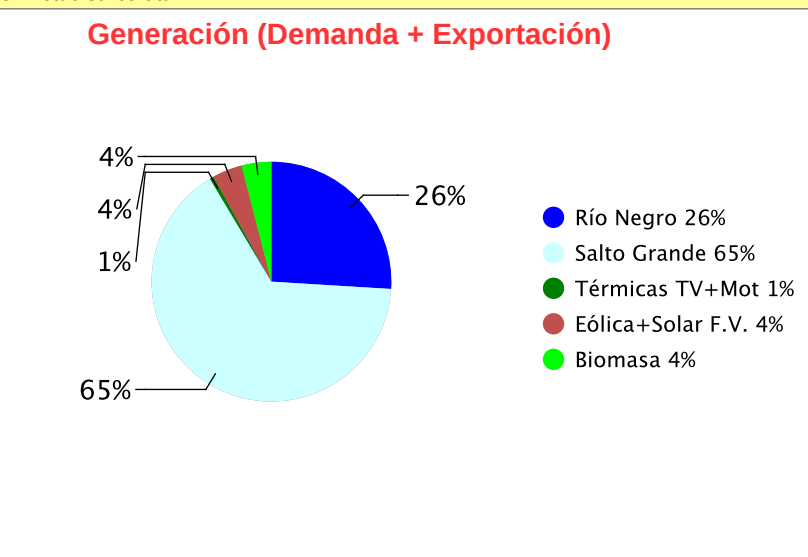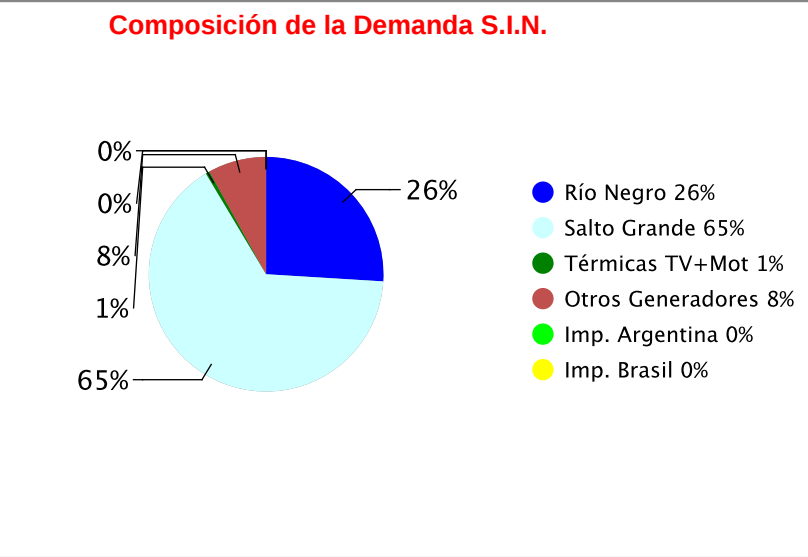



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

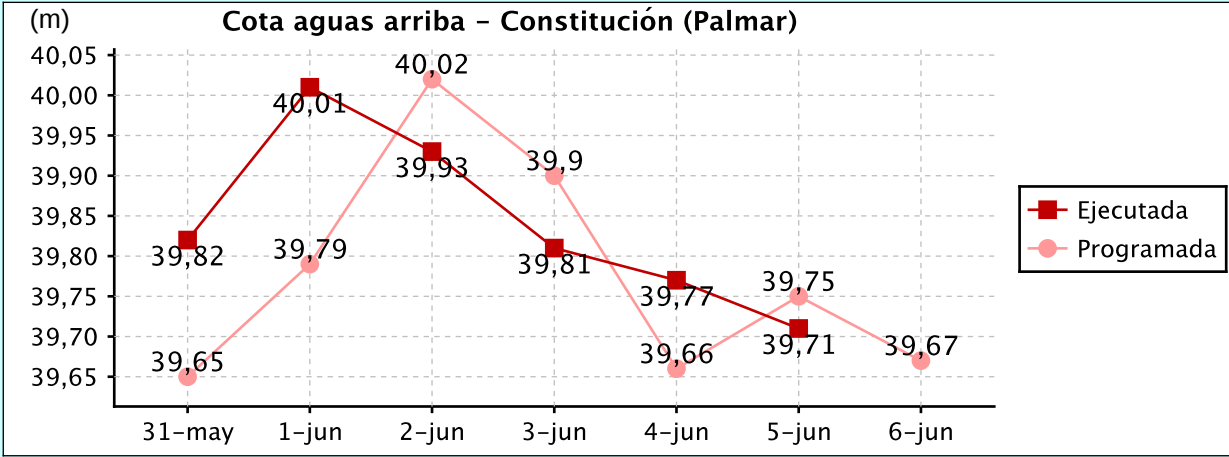
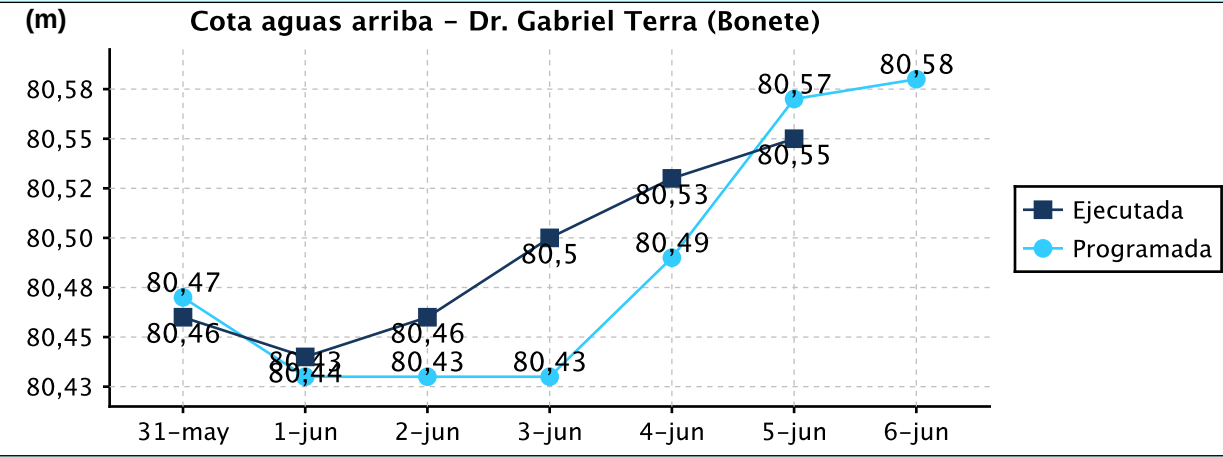


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,57	80,55
Baygorria	54,07	54,1
Palmar	39,75	39,71
SGU	35,27	35,23

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

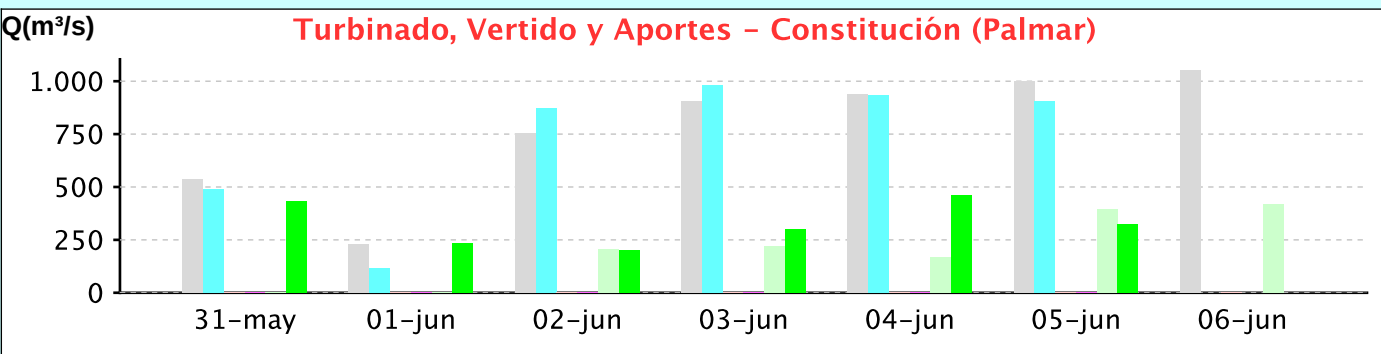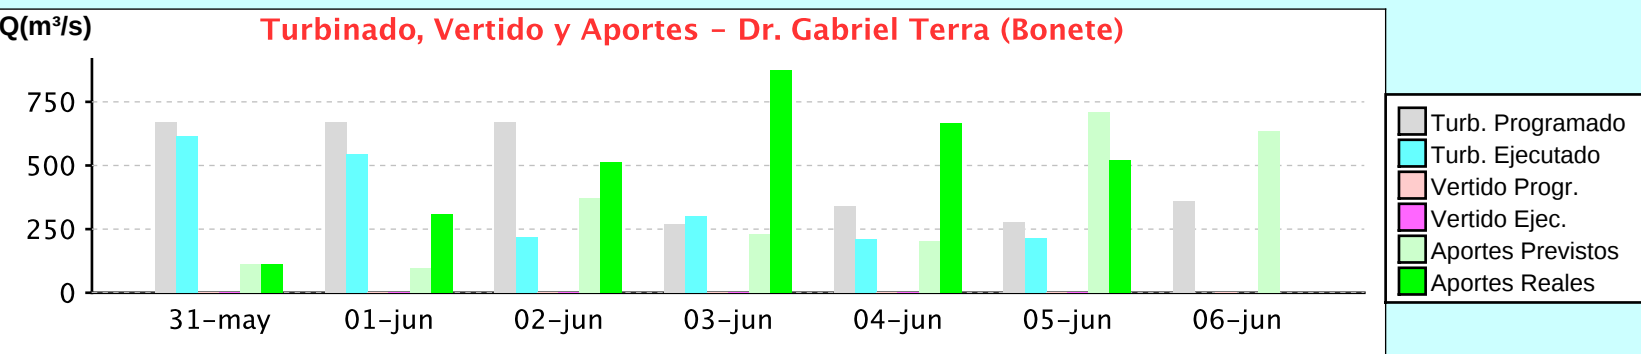

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

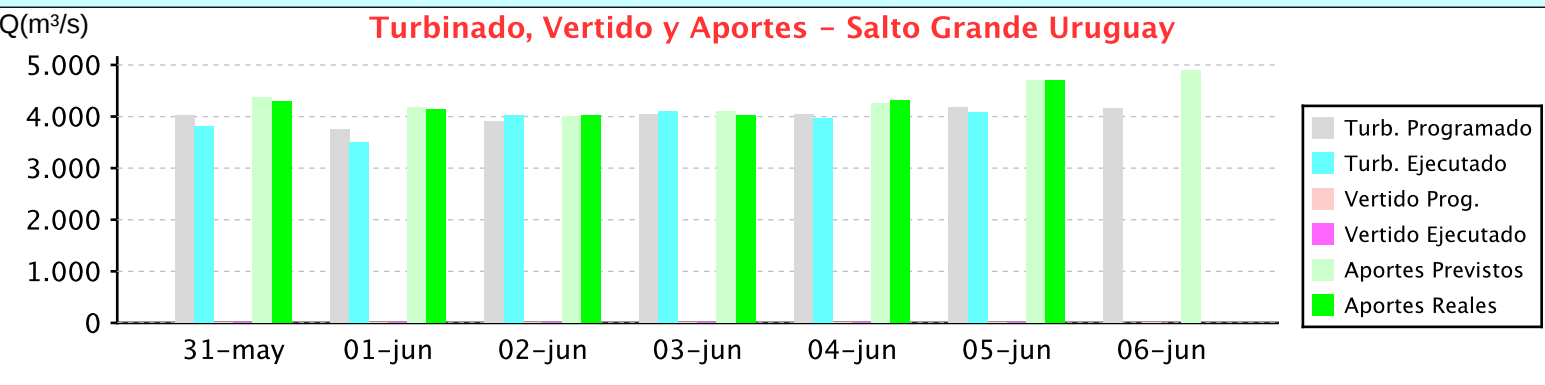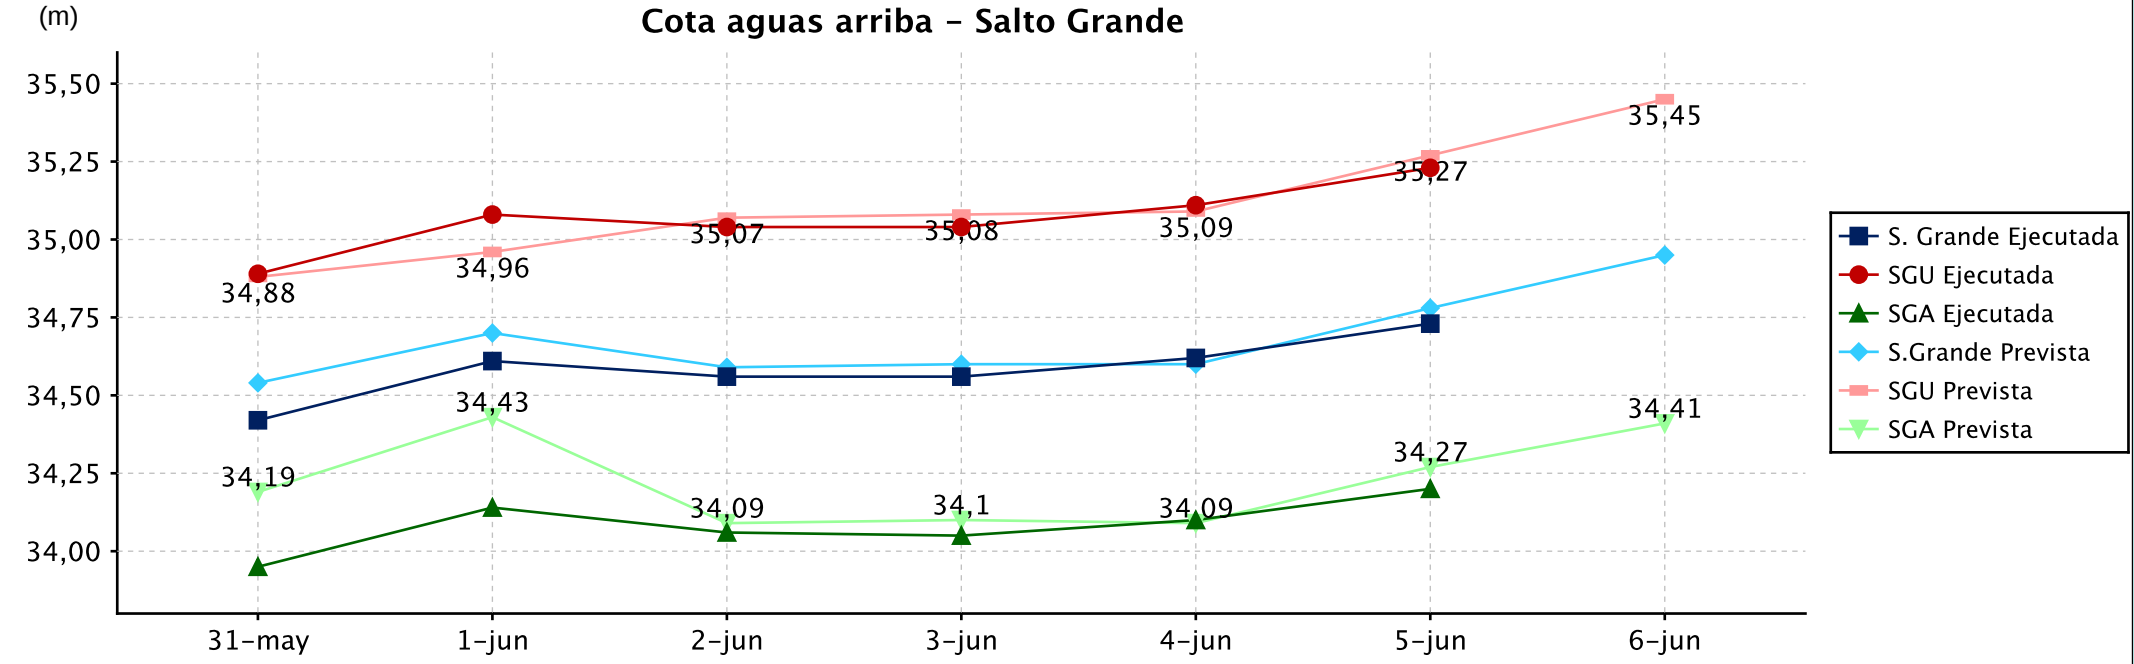

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,23
Cota Vista Arg	34,20
Cota real	34,73

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	23.522
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	278	216
Baygorria	304	378
Palmar	999	905
SGU	4.170	4.079

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	708	521
Baygorria	295	261
Palmar	396	323
SGU	4.700	4.706

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
