




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 06 de junio de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	78
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	82
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	703
C. Baygorria	1.265
C. Palmar	5.732
C. Salto Grande	20.637
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.506
TOTAL Generación	31.864

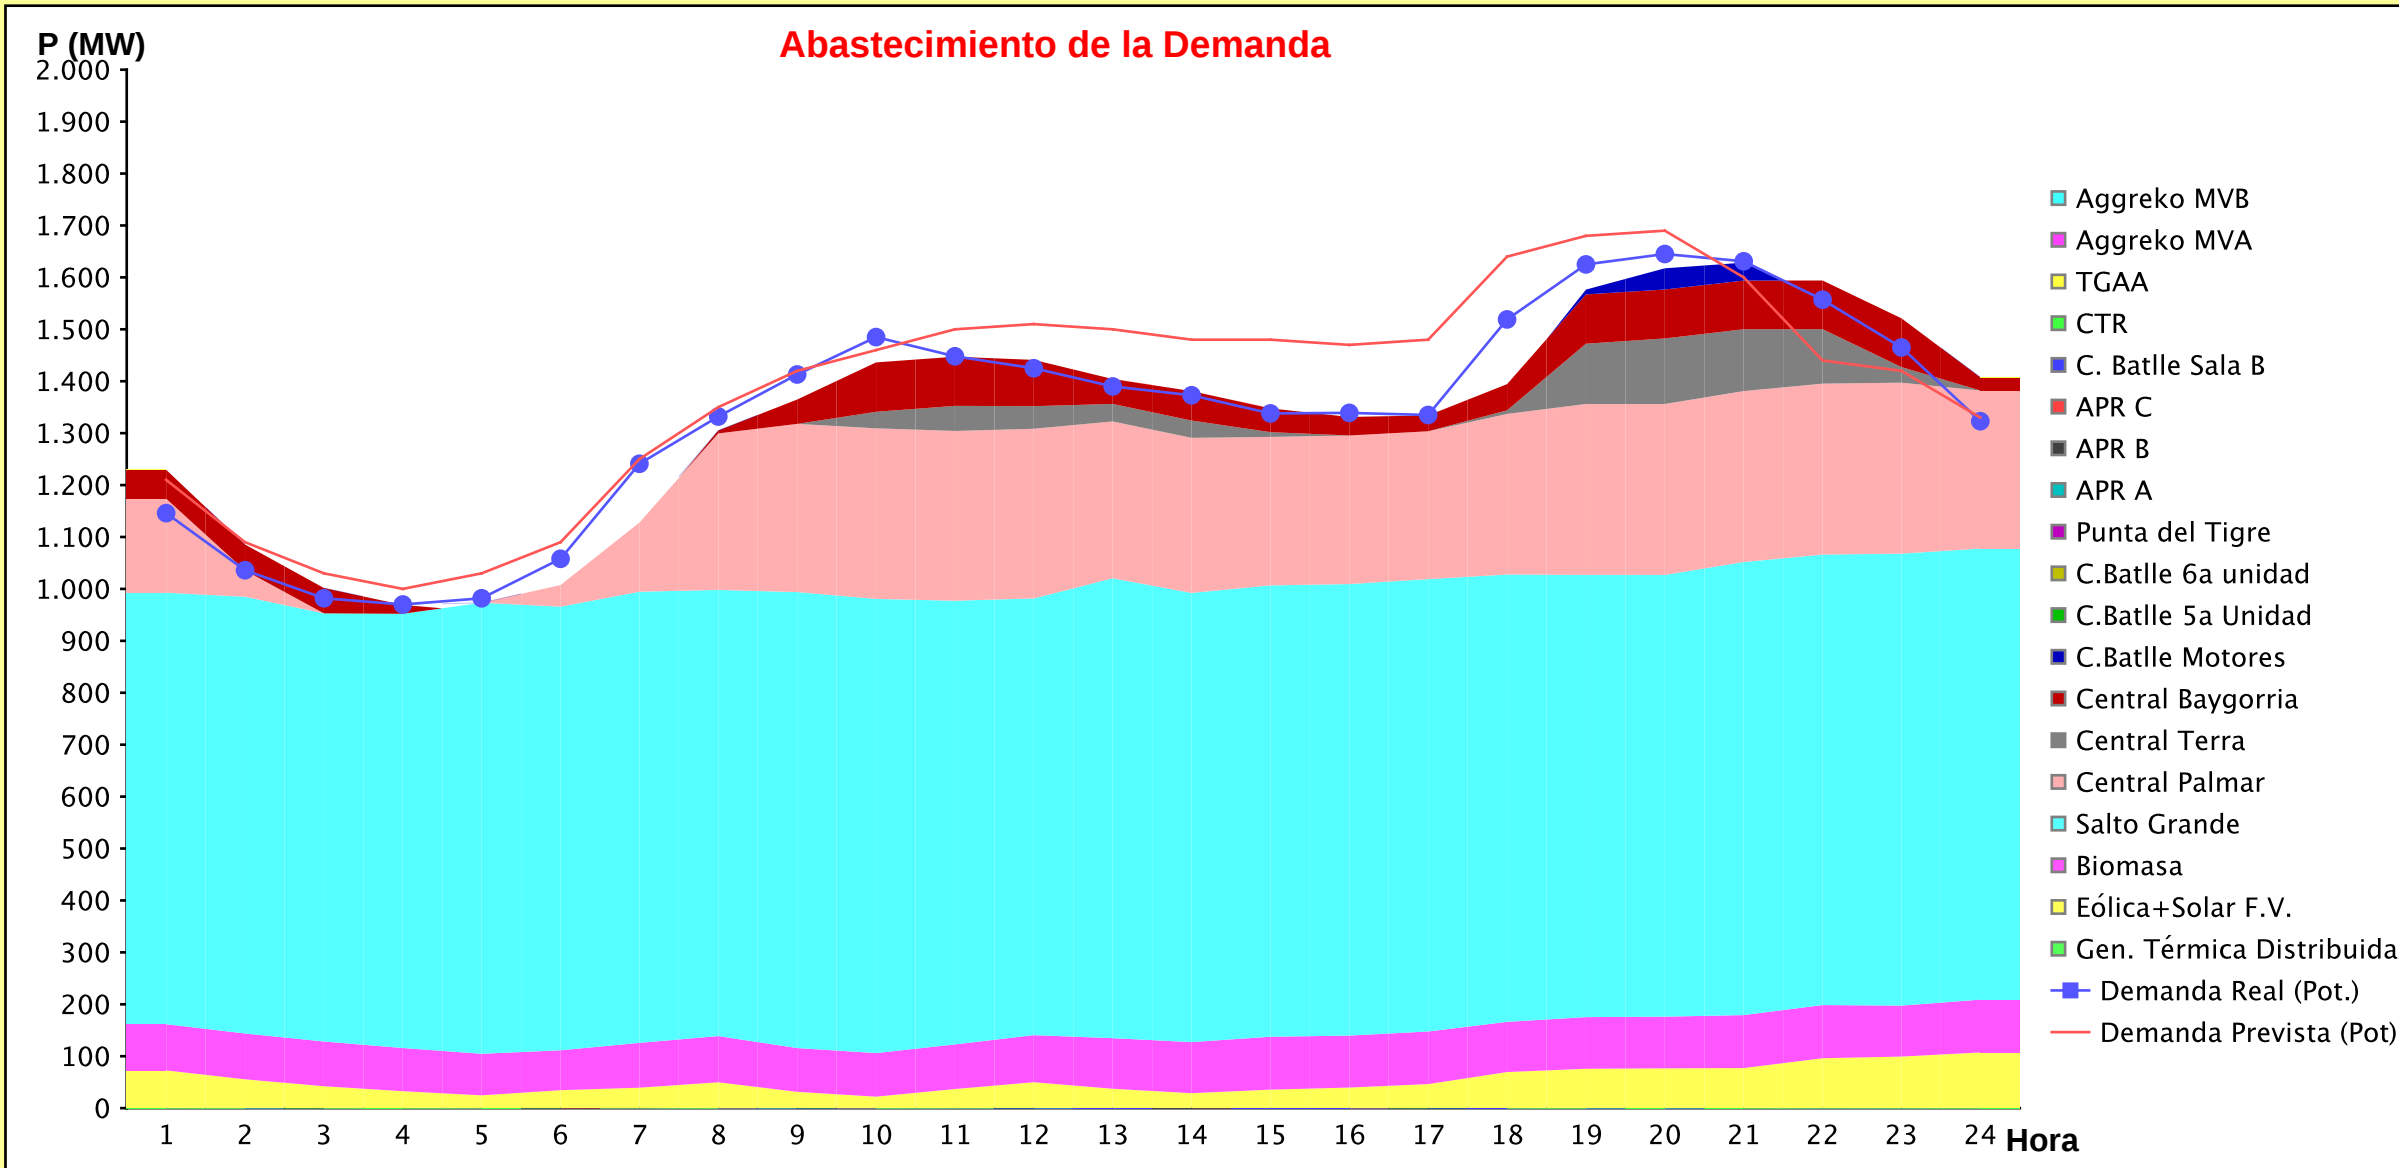

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.864
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	33.150
Diferencia (MWh)	-1.286
Ejecutada - Programada	-3,88 %

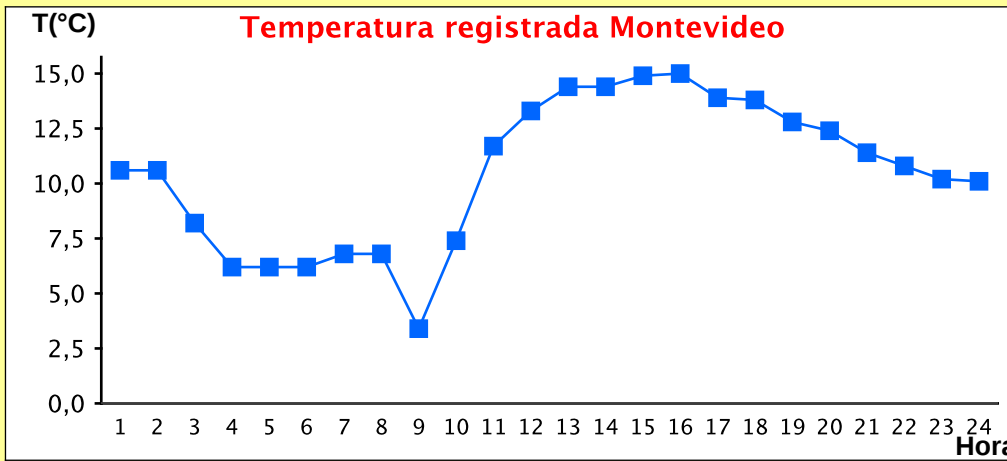



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1490,15 Hora 09:59
Potencia mínima:	964,97 Hora 03:54
Pico noche:	1675,44 Hora 20:40

Generación Media (MW)	
Eólica	54,1
Biomasa	93,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

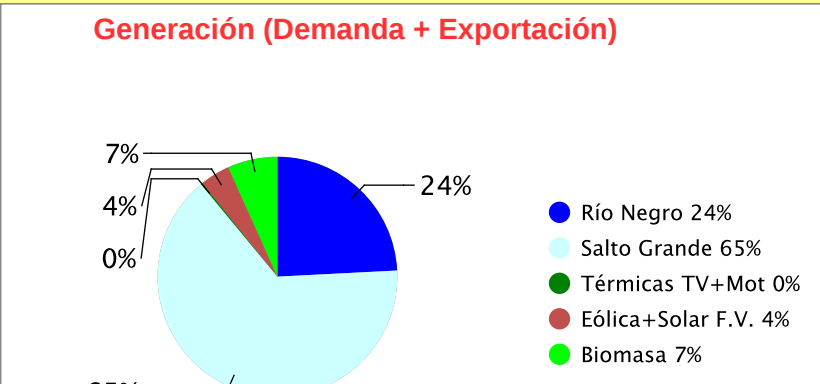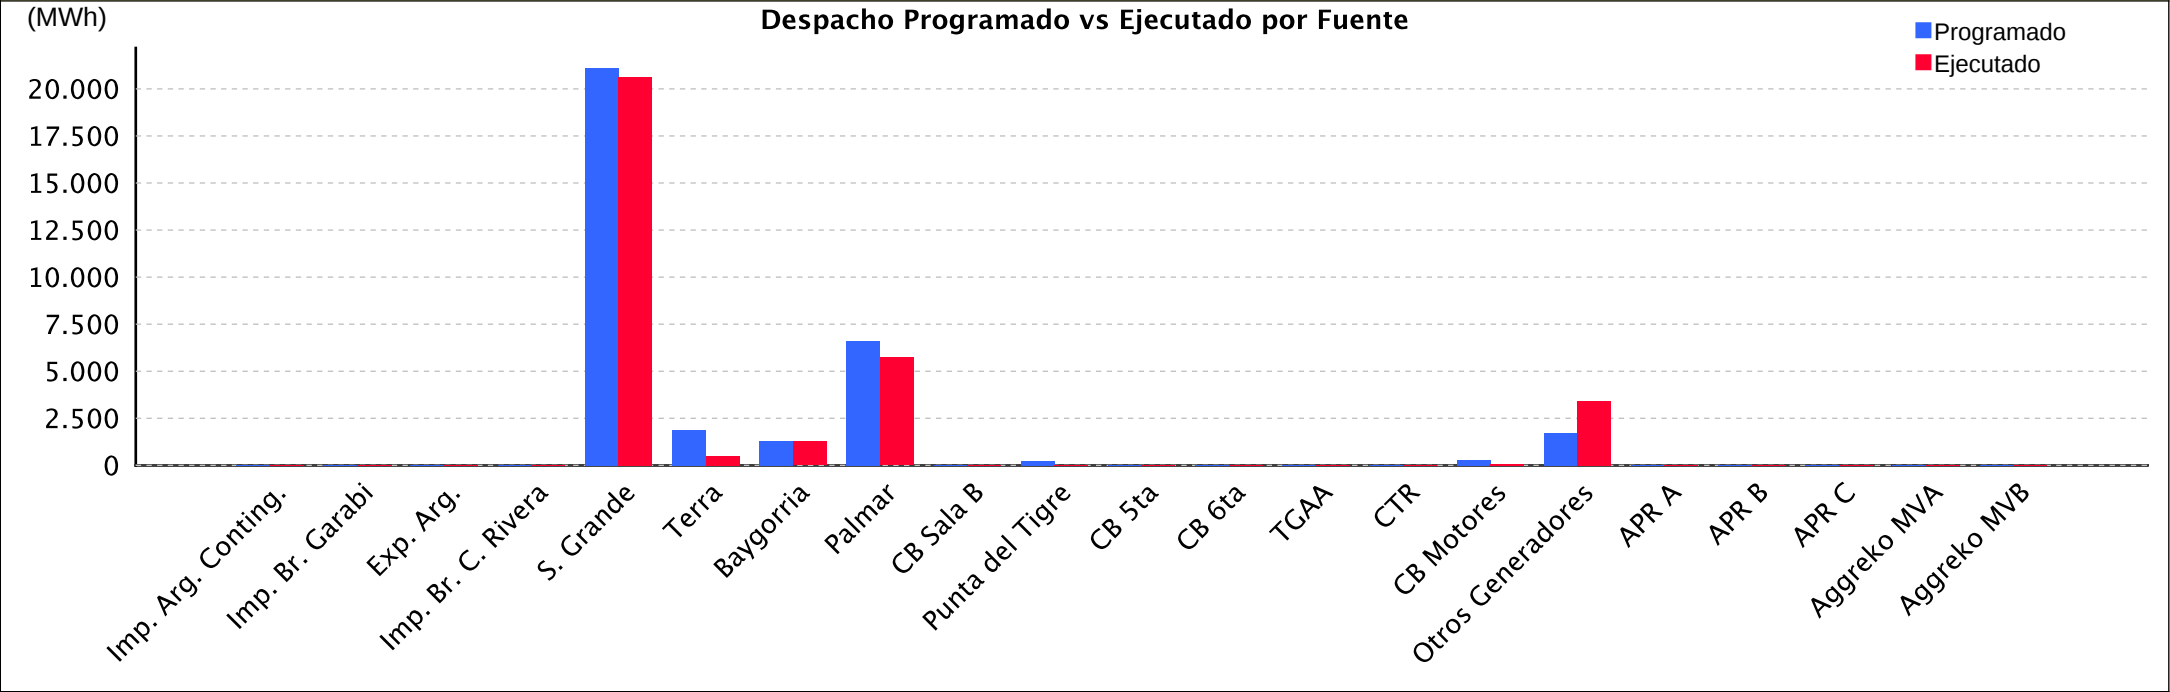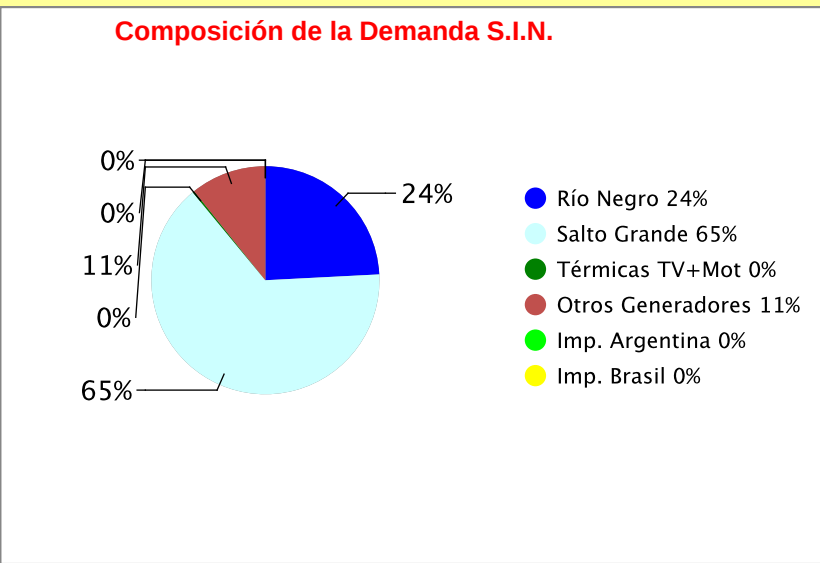



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

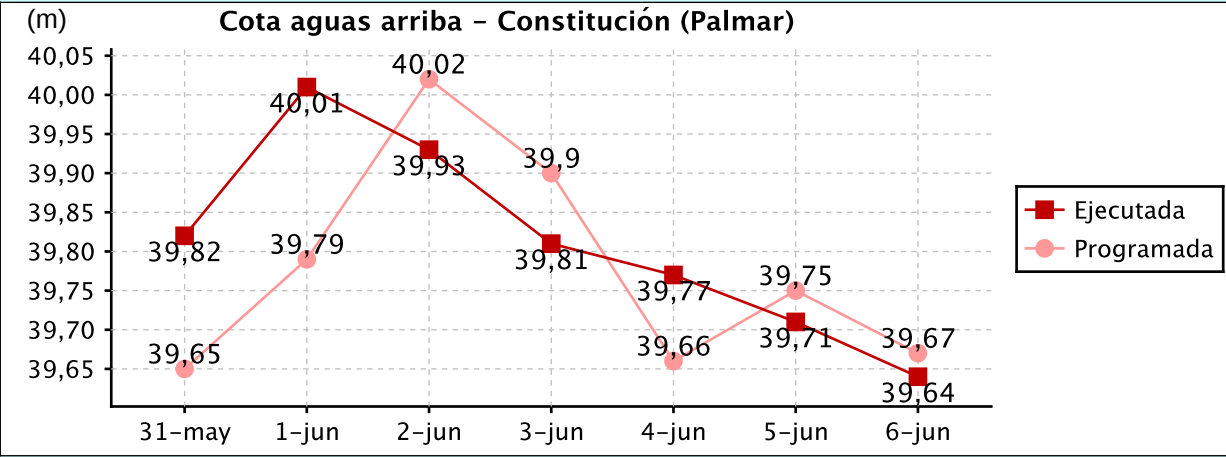
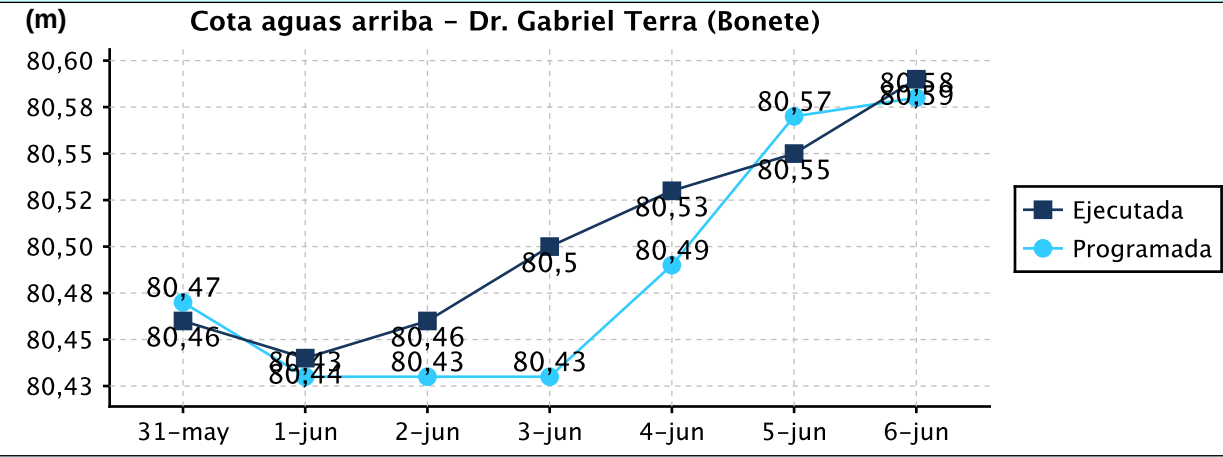


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,58	80,59
Baygorria	54,01	53,97
Palmar	39,67	39,64
SGU	35,45	35,51

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

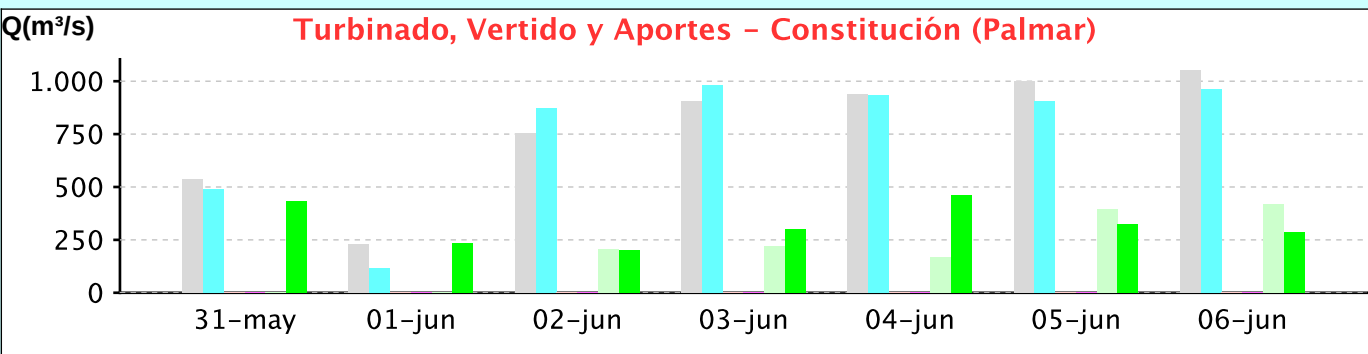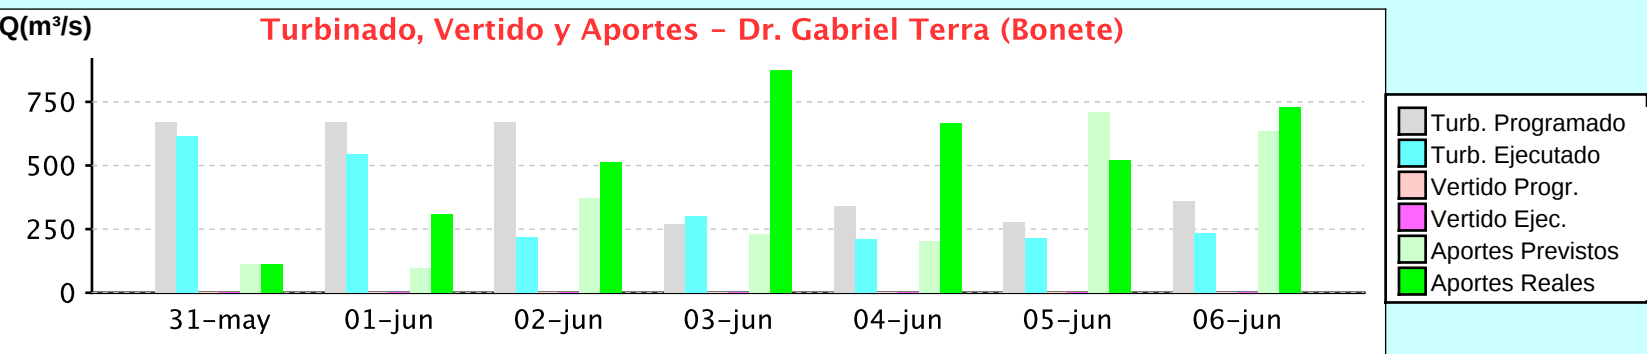

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

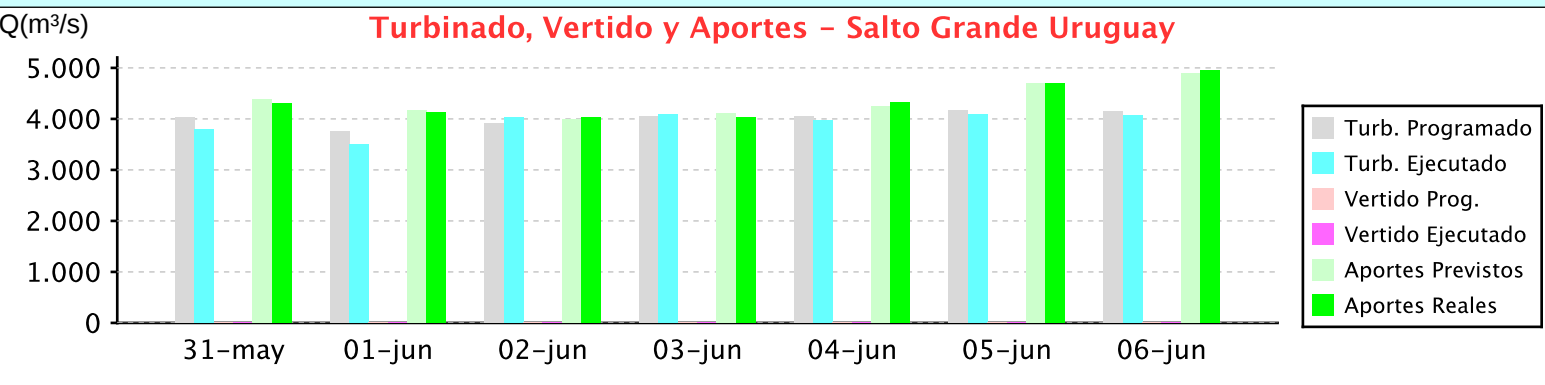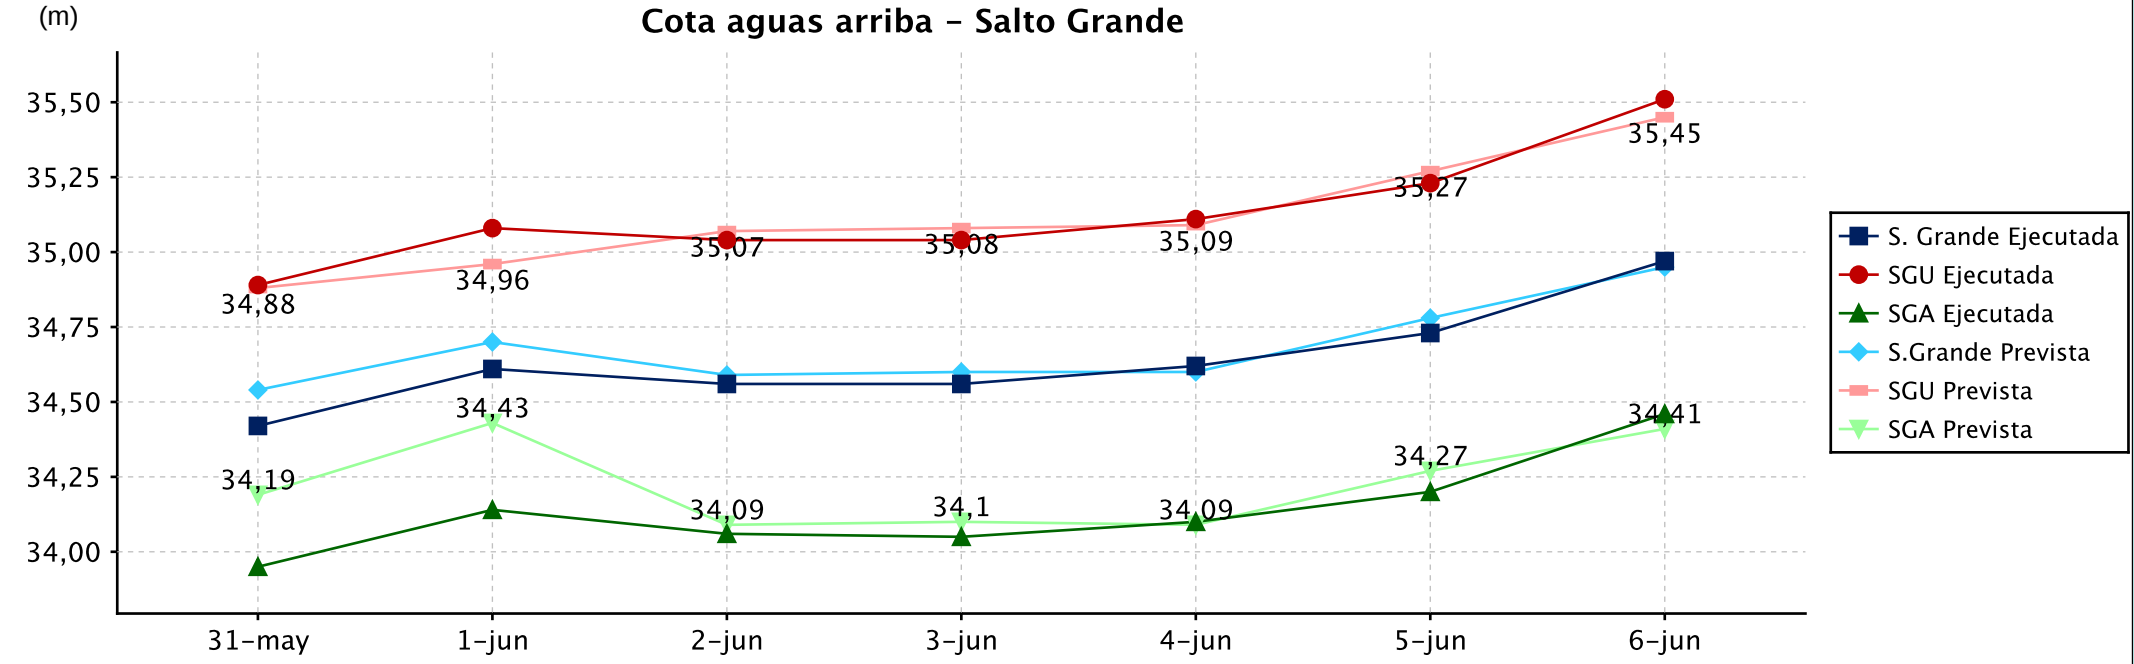

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,51
Cota Vista Arg	34,46
Cota real	34,97
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	24.410

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	360	234
Baygorria	470	433
Palmar	1.051	961
SGU	4.149	4.062

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	636	728
Baygorria	98	44
Palmar	417	287
SGU	4.900	4.957

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
