



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 08 de junio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.419
C. Baygorria	851
C. Palmar	1.967
C. Salto Grande	20.974
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.379
TOTAL Generación	28.529

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	1.125
Hidráulica	1.125
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	1.125




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.404
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.240
Diferencia (MWh)	-836
Ejecutada - Programada	-2,96 %

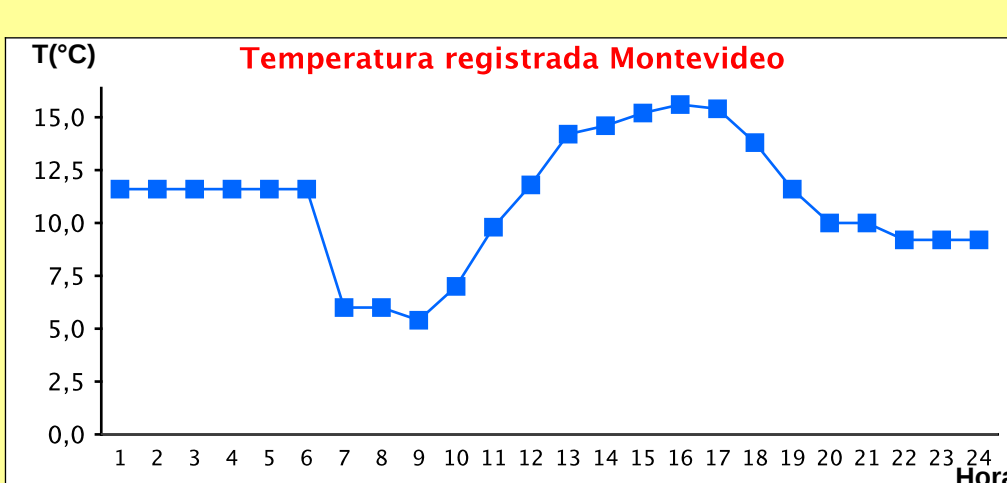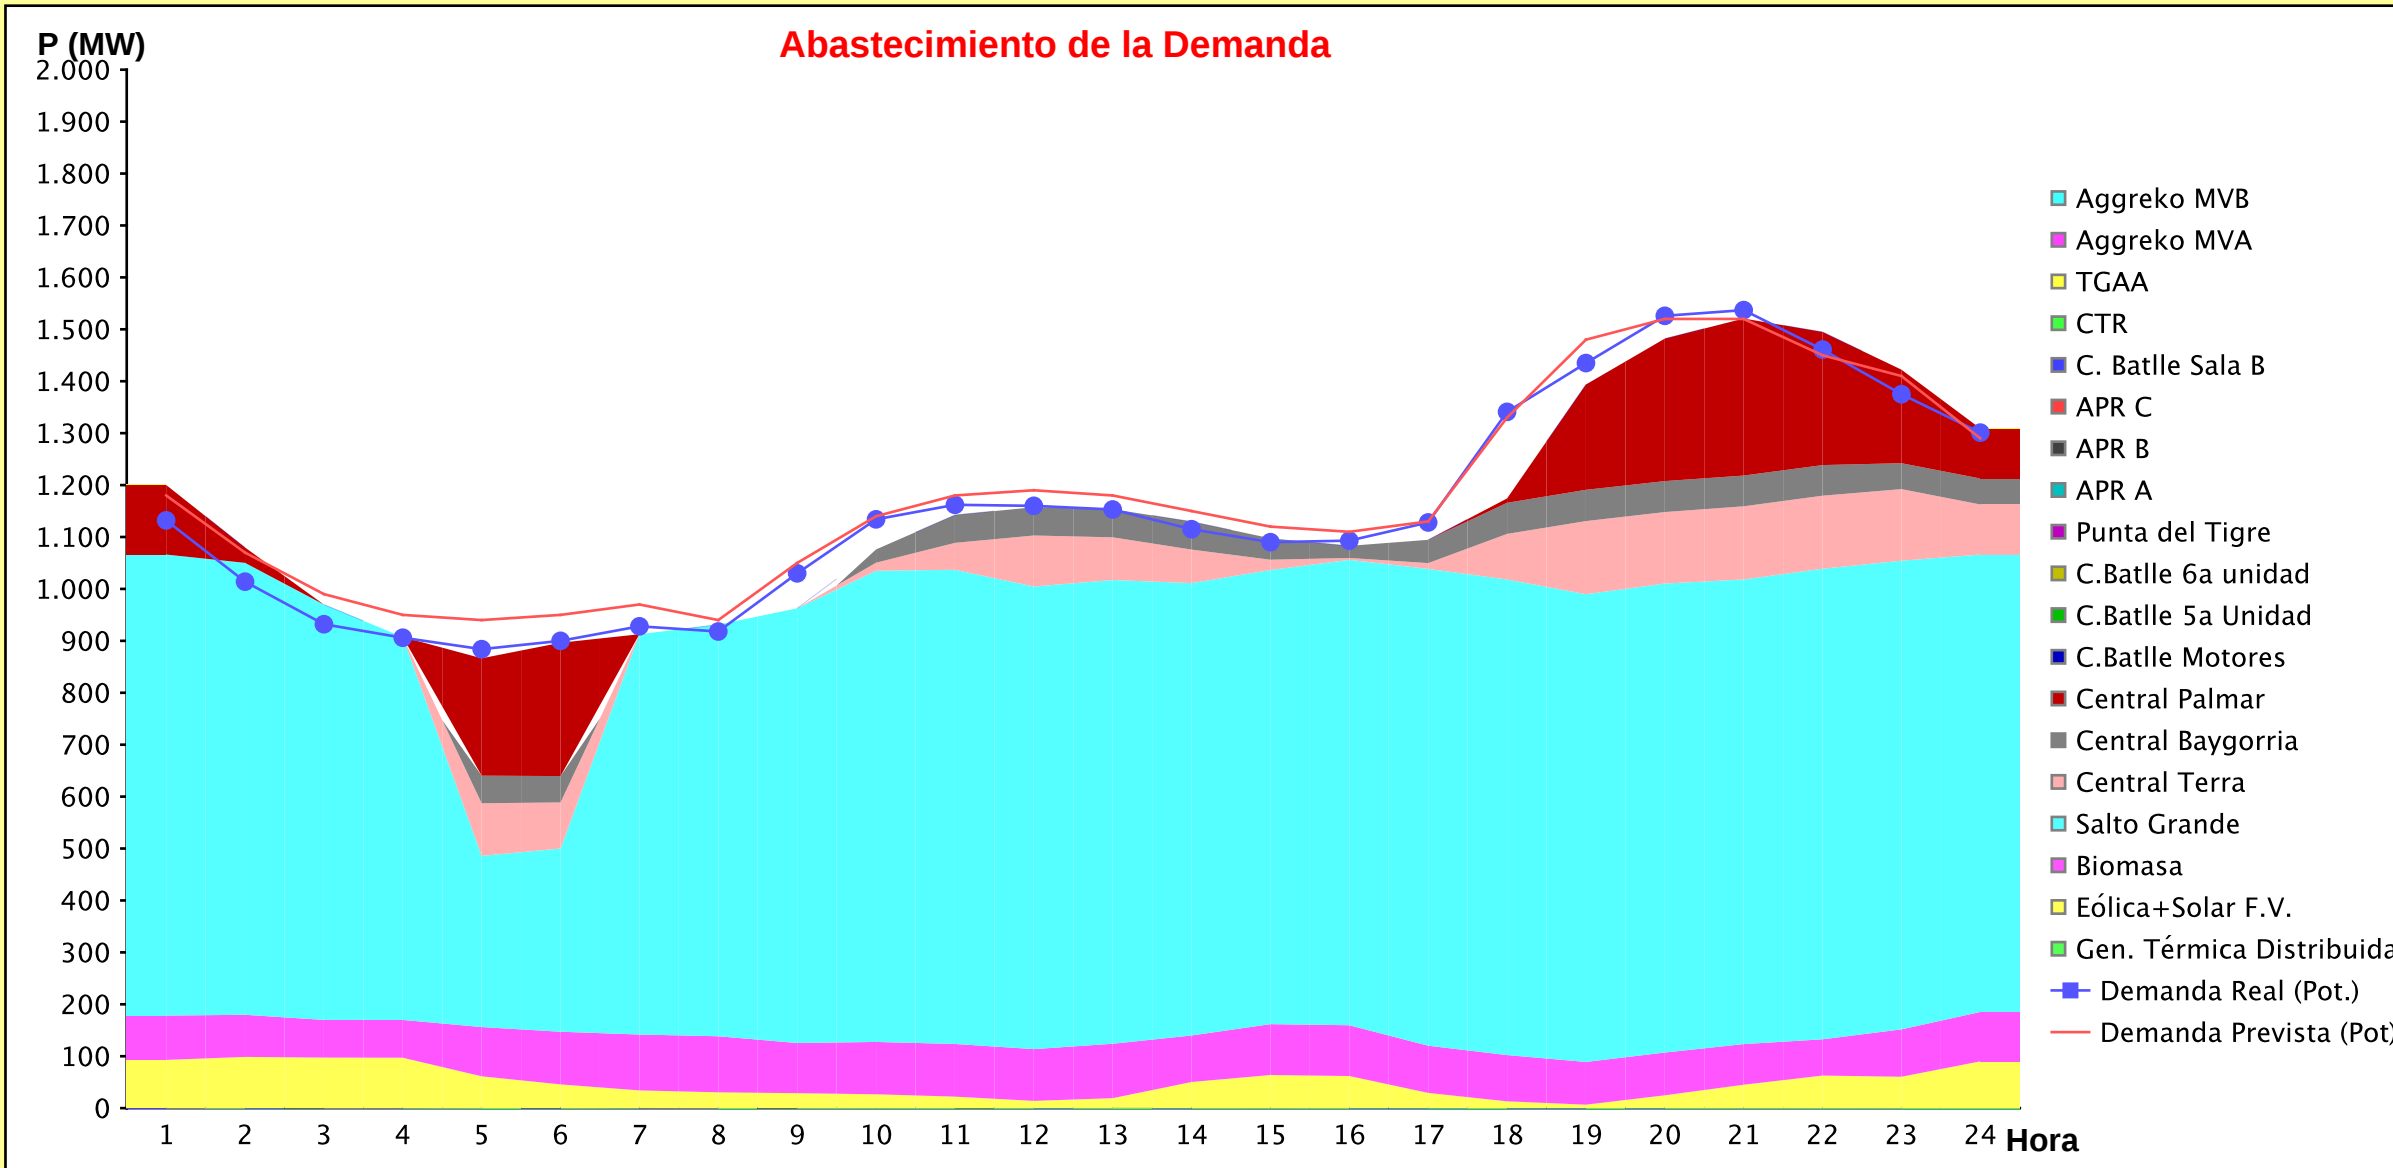



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1179,41 Hora 10:49
Potencia mínima:	884,03 Hora 05:41
Pico noche:	1570,14 Hora 21:19

Generación Media (MW)	
Eólica	49,1
Biomasa	92,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

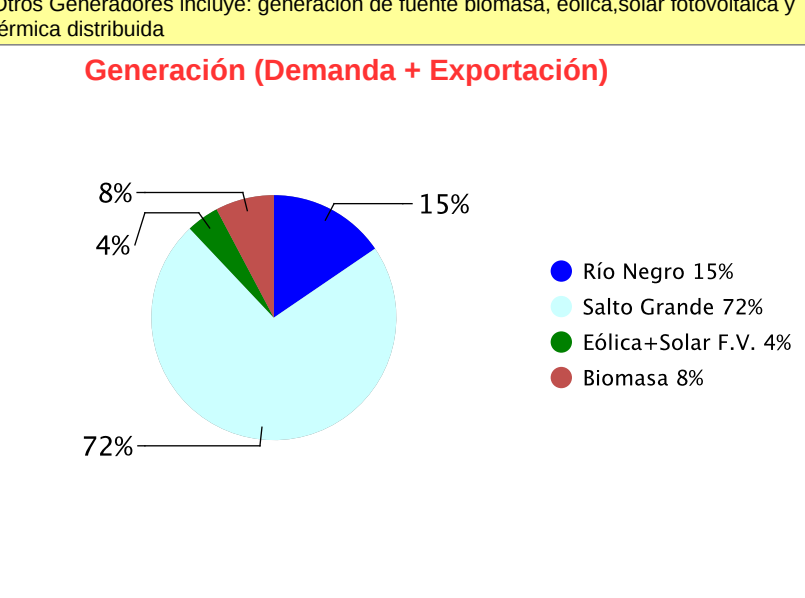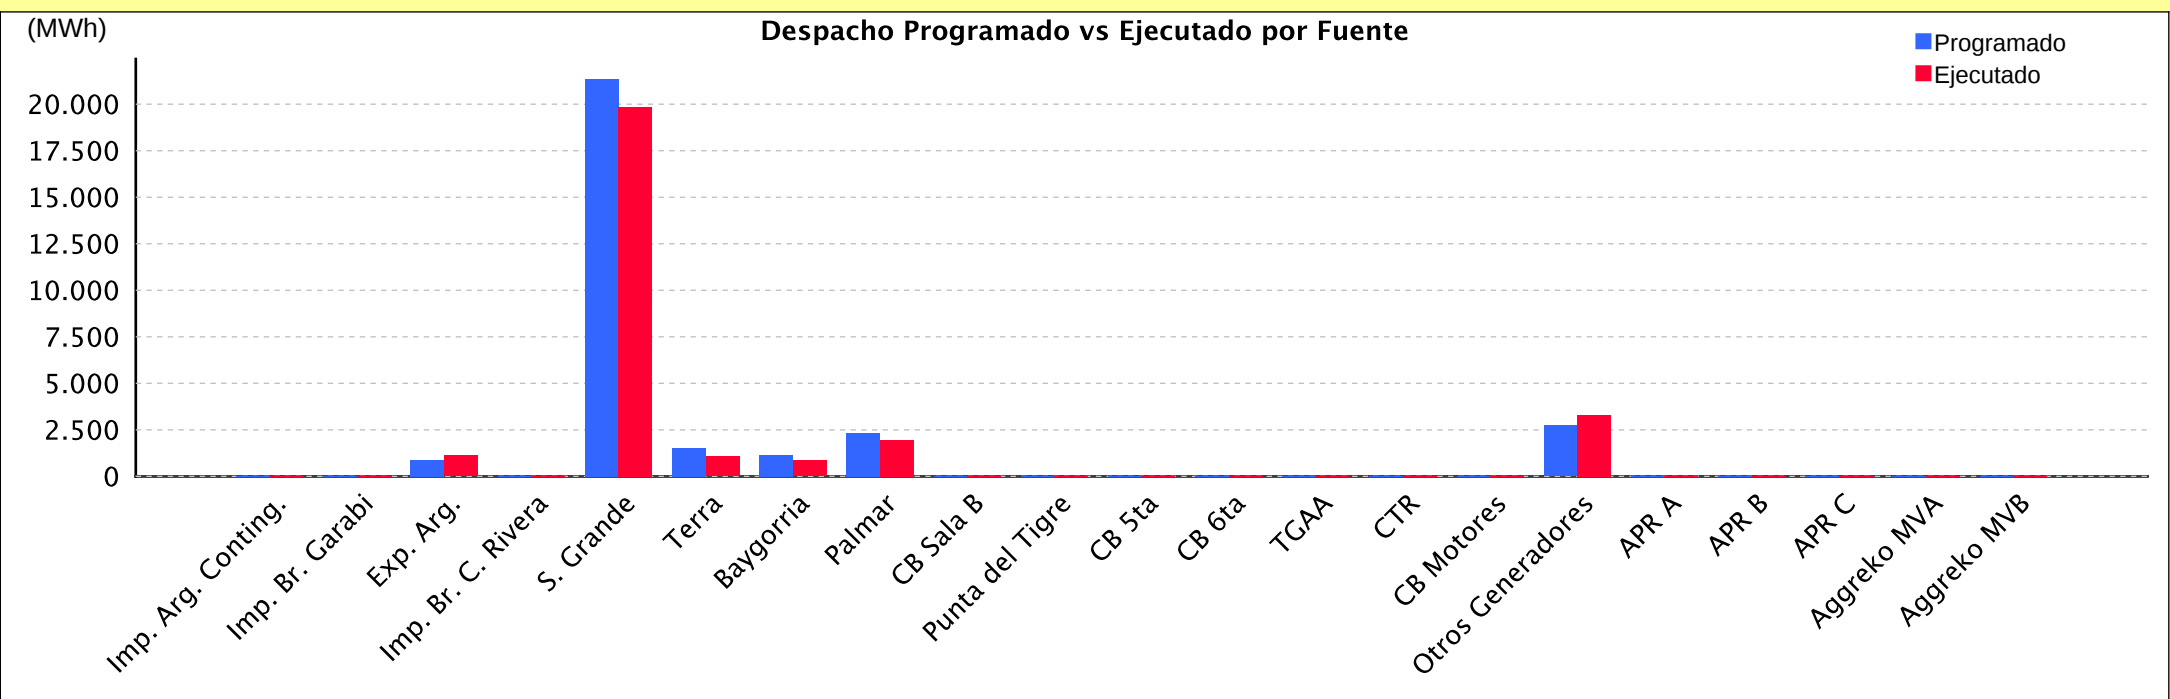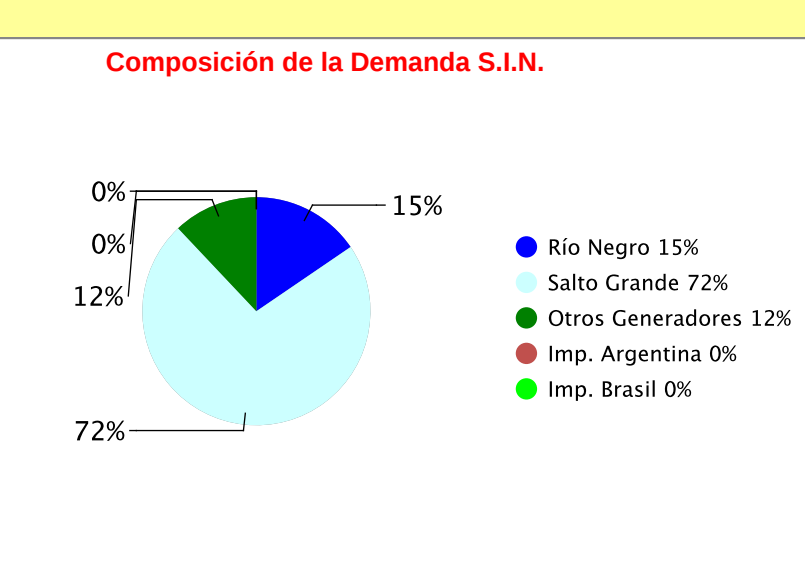



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

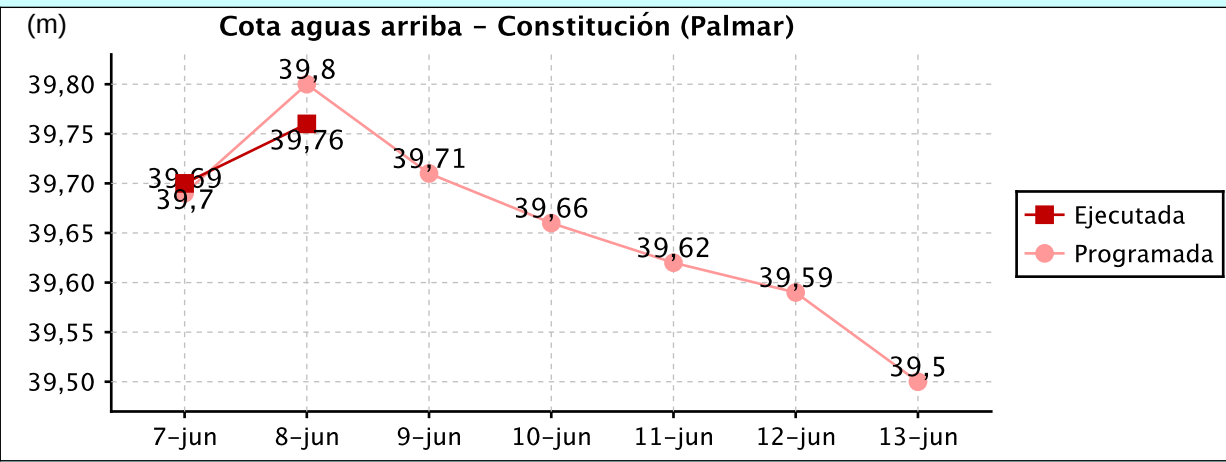
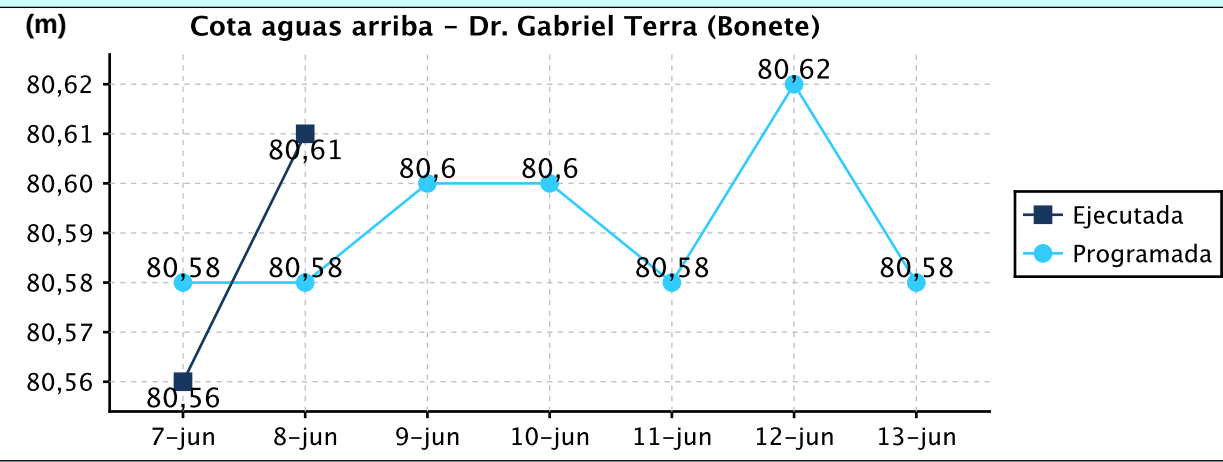


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,58	80,61
Baygorria	53,97	53,71
Palmar	39,80	39,76
SGU	35,86	35,63

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

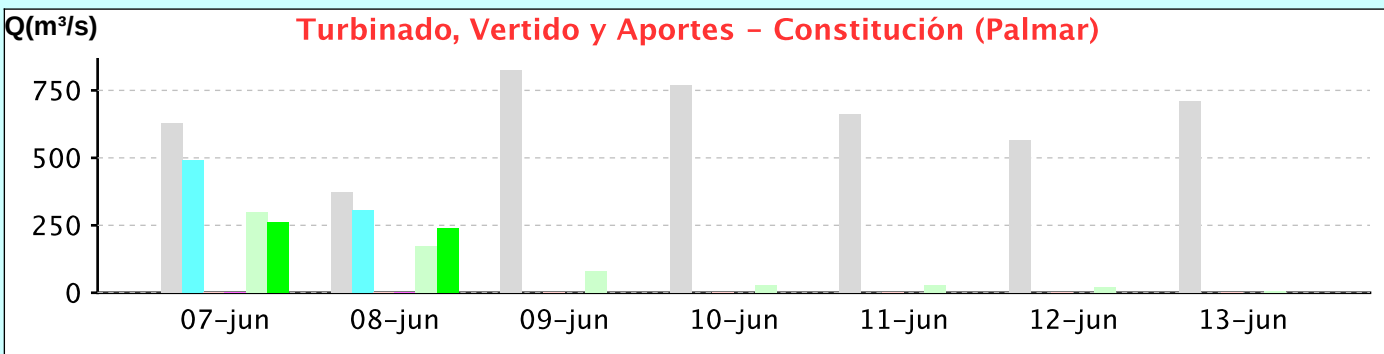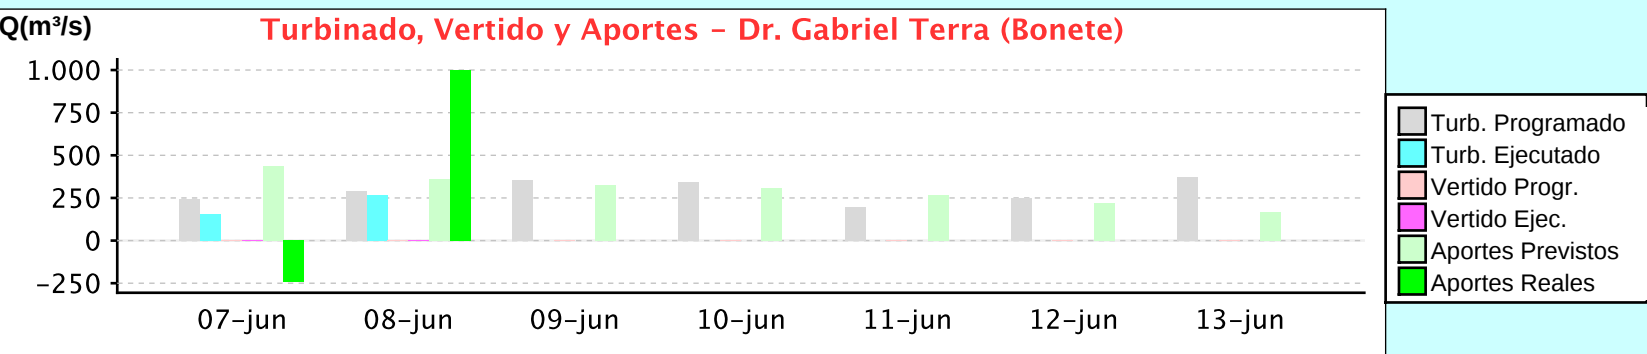

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

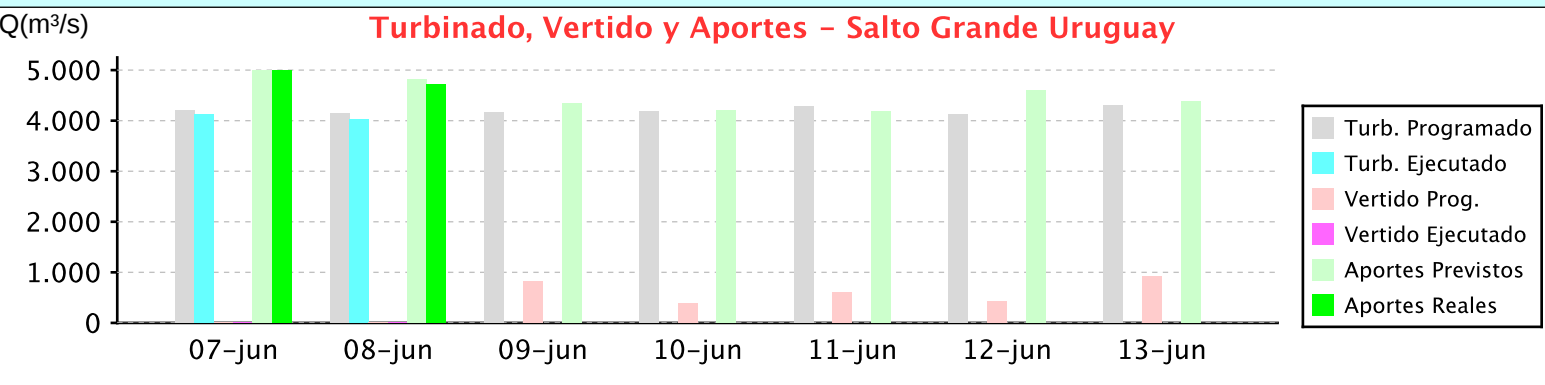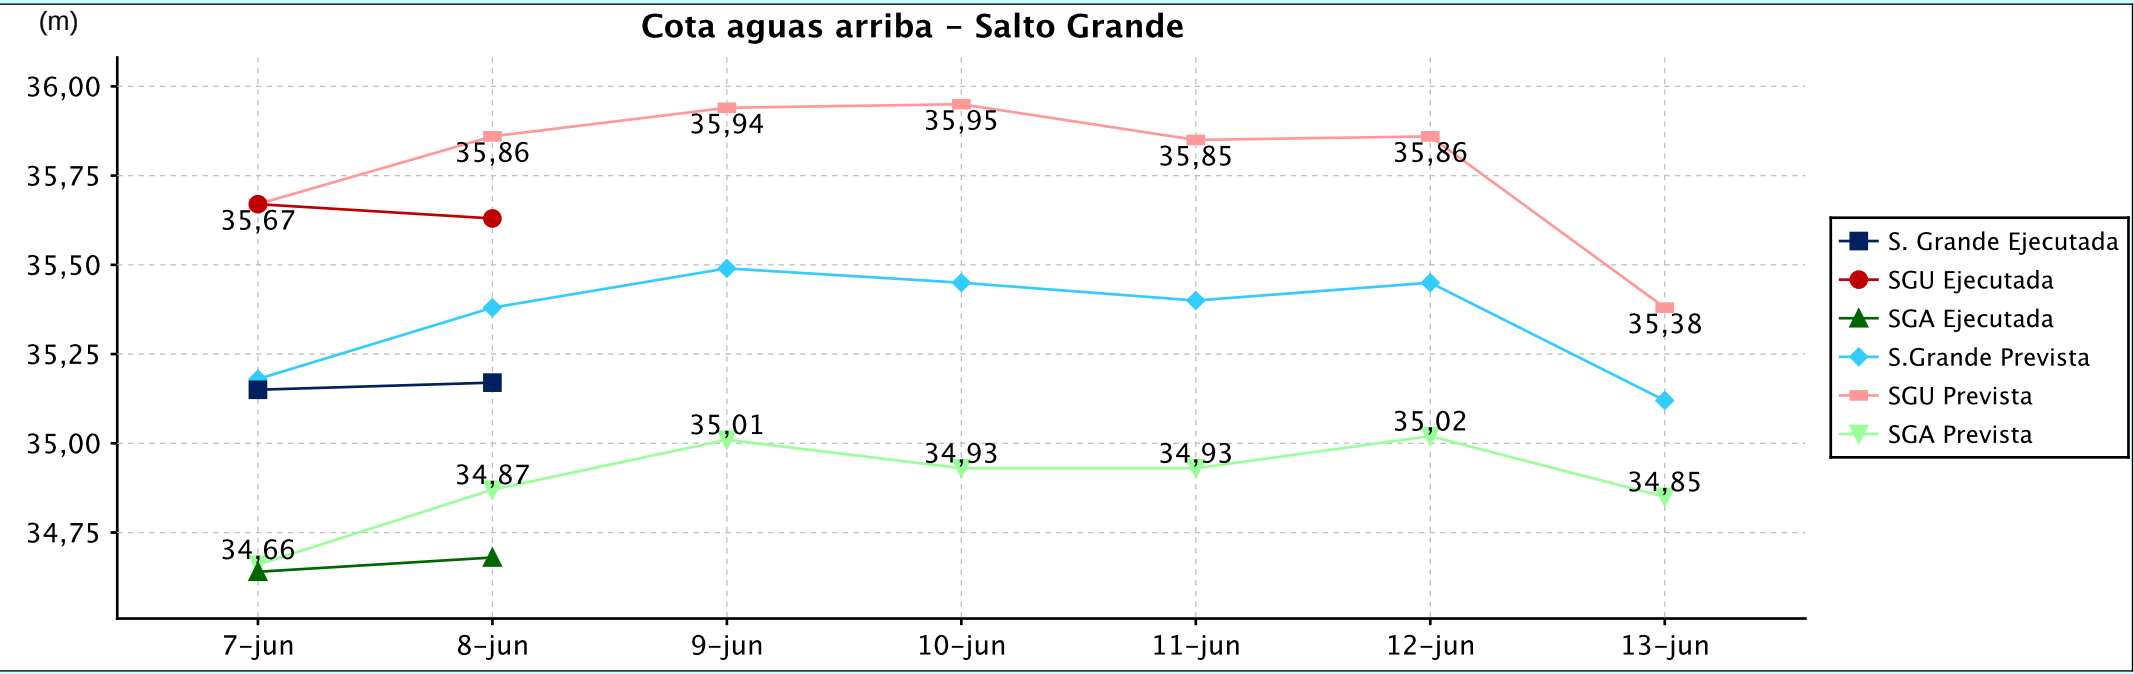

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,63
Cota Vista Arg	34,68
Cota real	35,17

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	22.565
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	292	267
Baygorria	416	304
Palmar	373	307
SGU	4.138	4.031

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	362	1.001
Baygorria	0	-26
Palmar	174	238
SGU	4.825	4.718

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
