



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 09 de junio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	292
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	296
Central La Tablada	-40
Central P. del Tigre	94
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.758
C. Baygorria	1.054
C. Palmar	3.844
C. Salto Grande	20.750
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.994
TOTAL Generación	31.741

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	448
Hidráulica	448
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	448



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.293
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.930
Diferencia (MWh)	-637
Ejecutada - Programada	-2,00 %

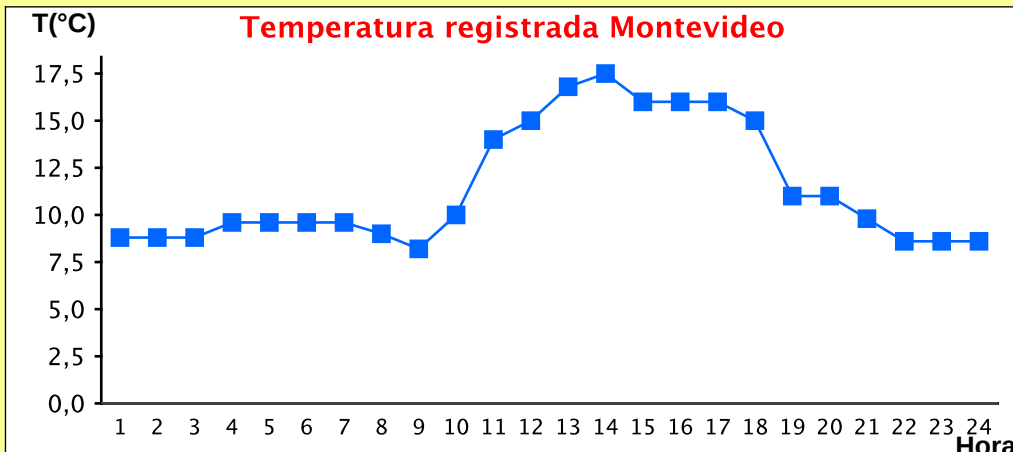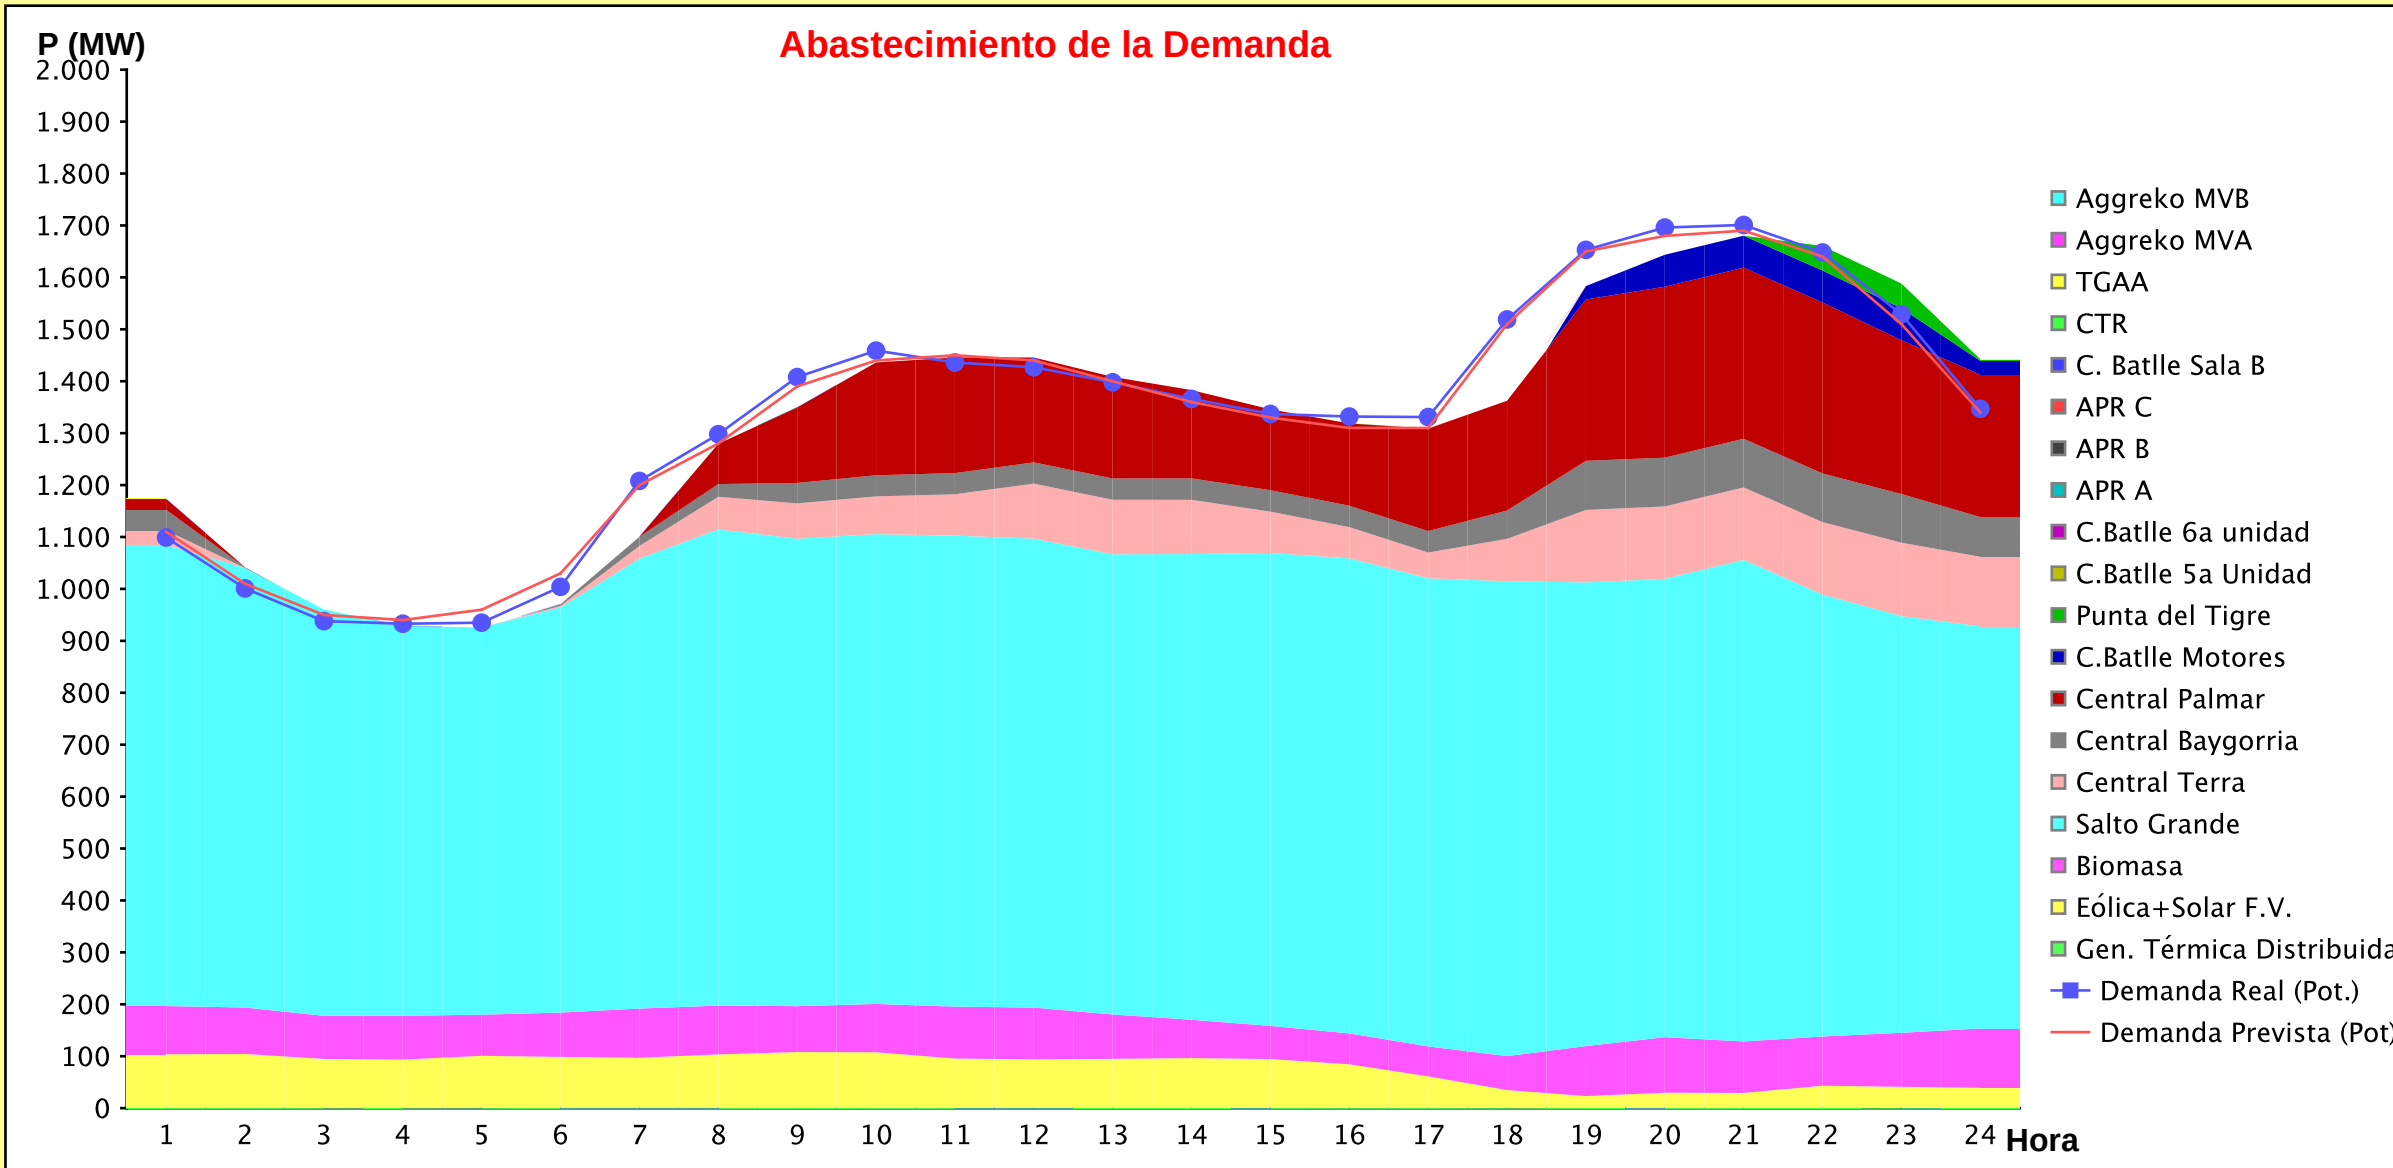


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1494,45 Hora 09:49
Potencia mínima:	939,32 Hora 04:44
Pico noche:	1729,4 Hora 20:41

Generación Media (MW)	
Eólica	78,2
Biomasa	88,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

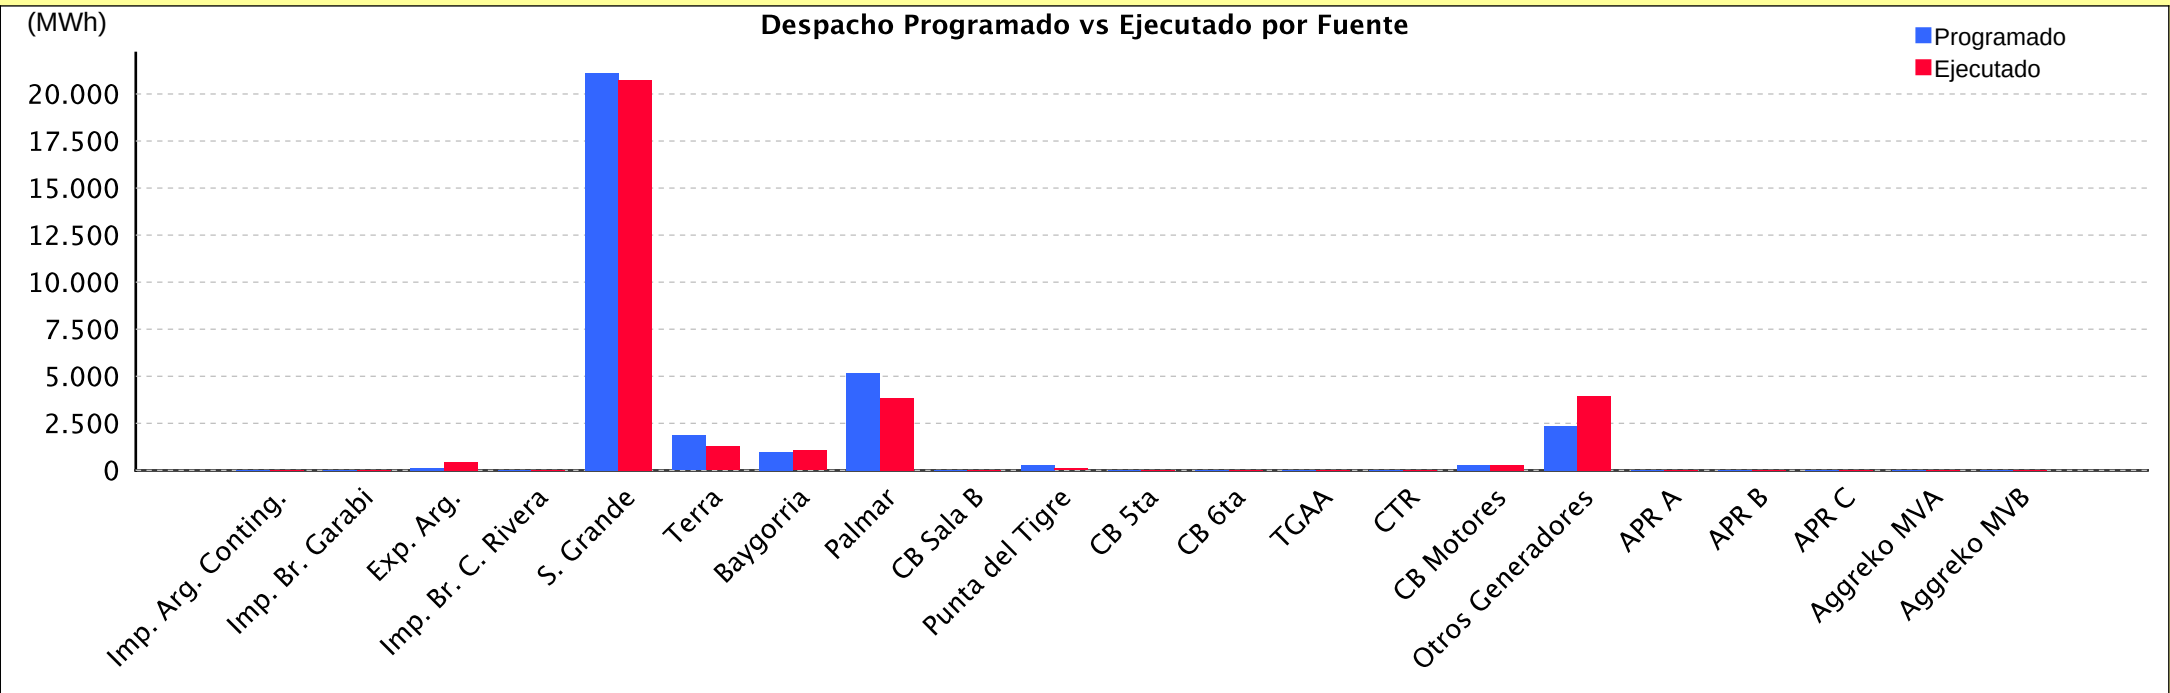
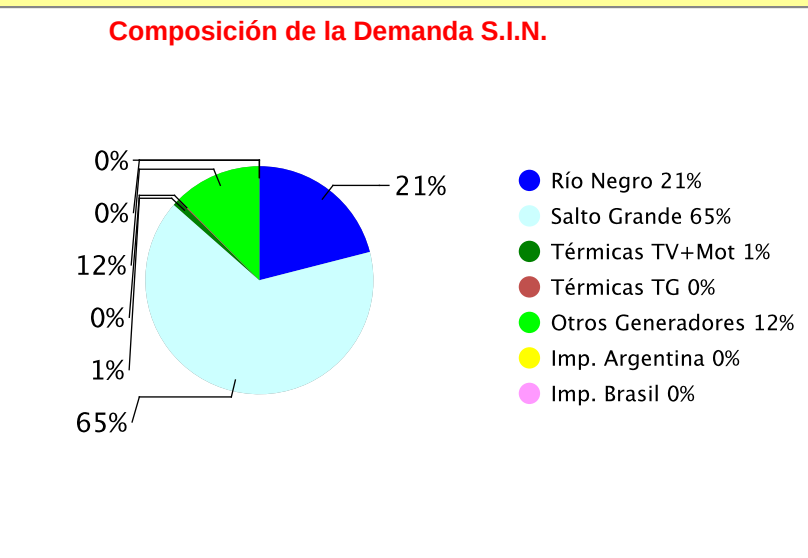


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

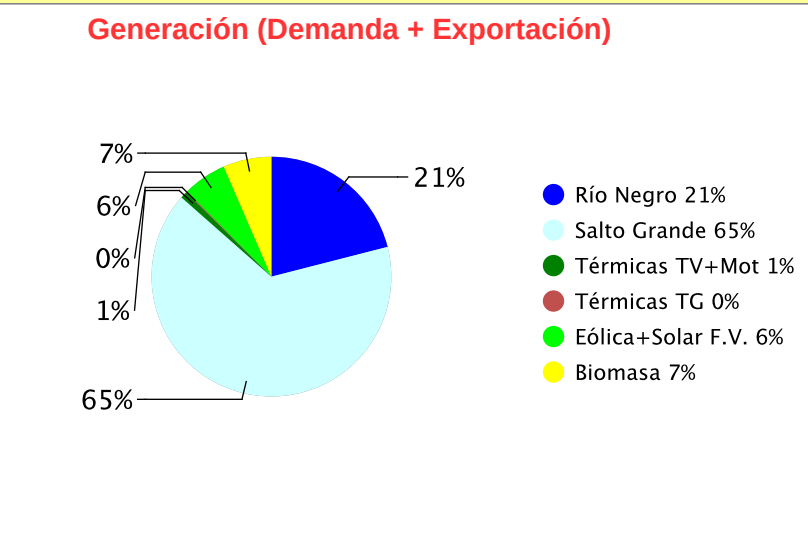



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

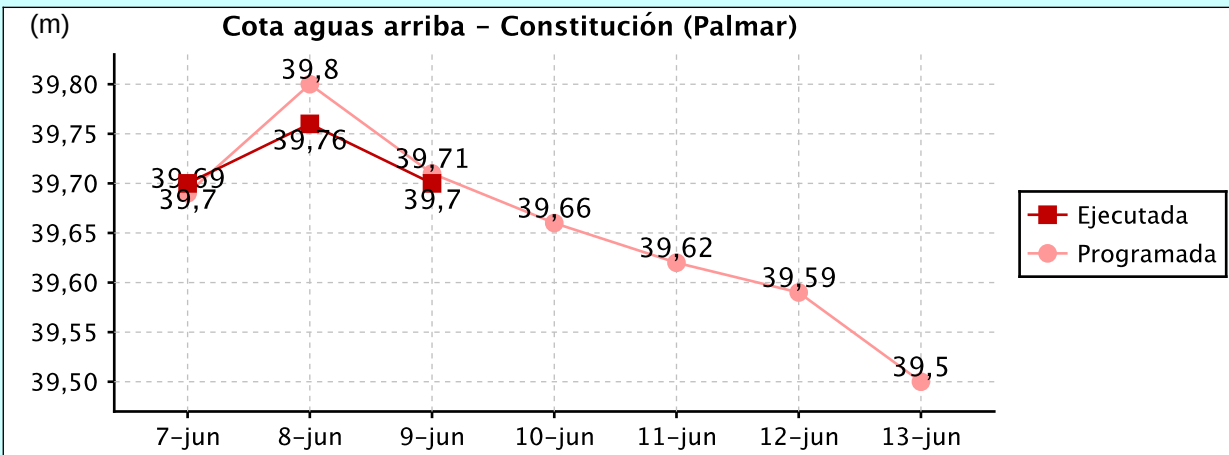
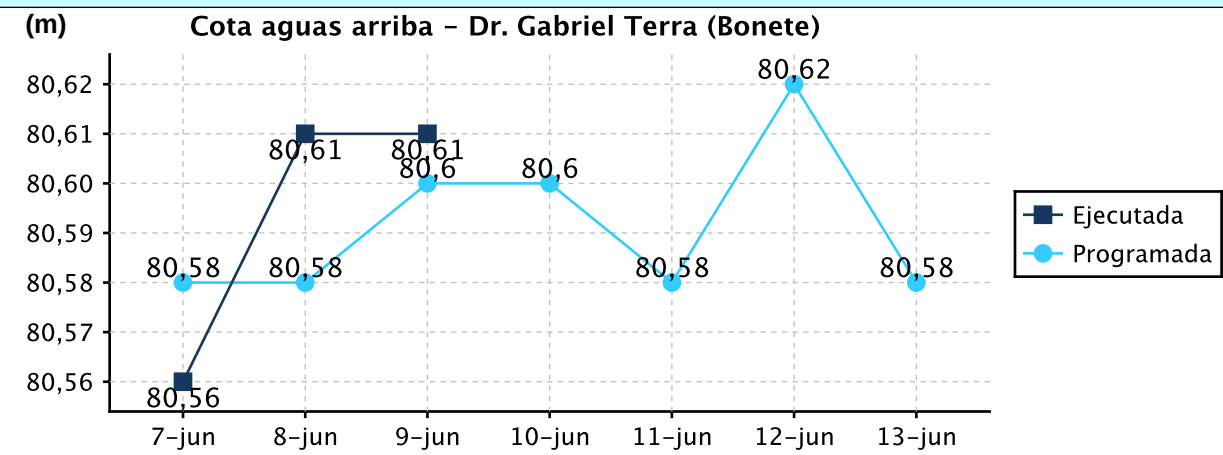


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,60	80,61
Baygorria	53,67	53,67
Palmar	39,71	39,7
SGU	35,94	35,9

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

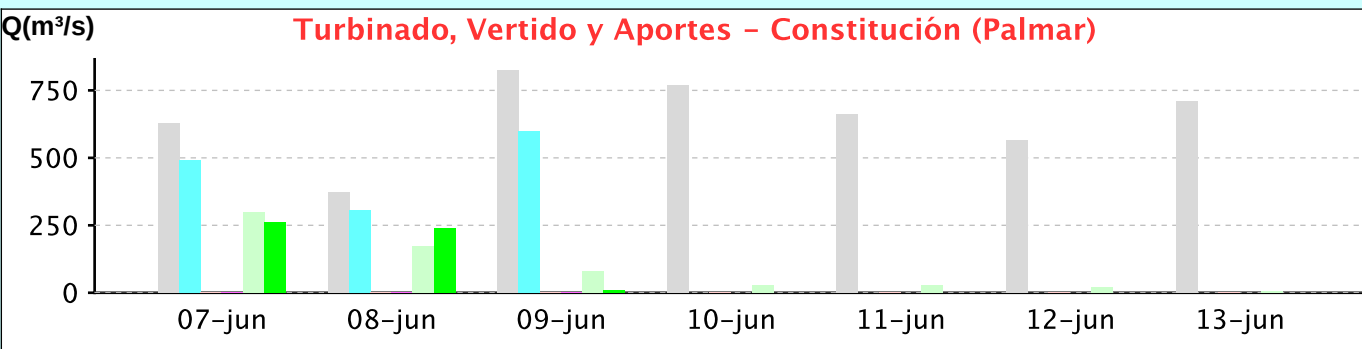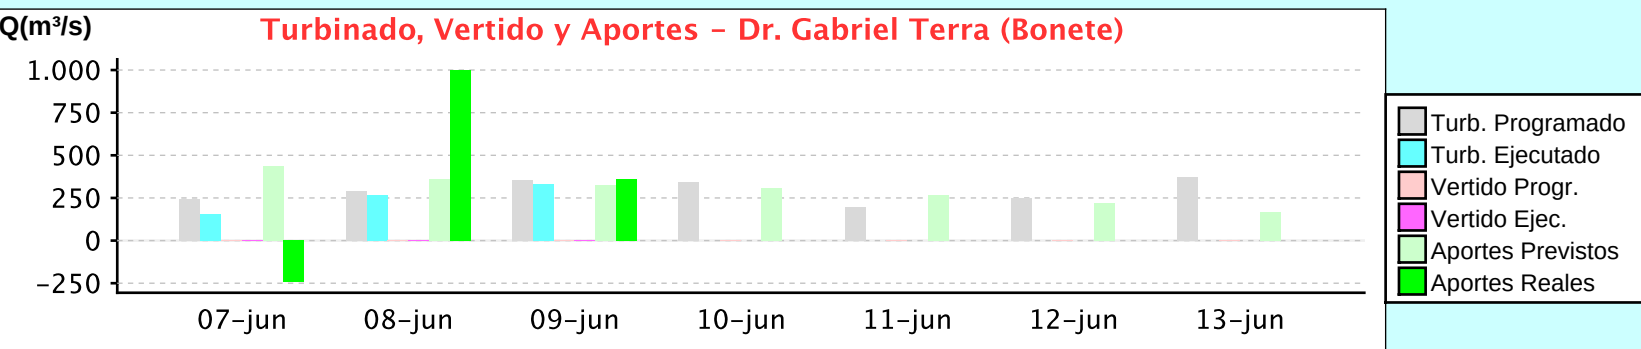

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

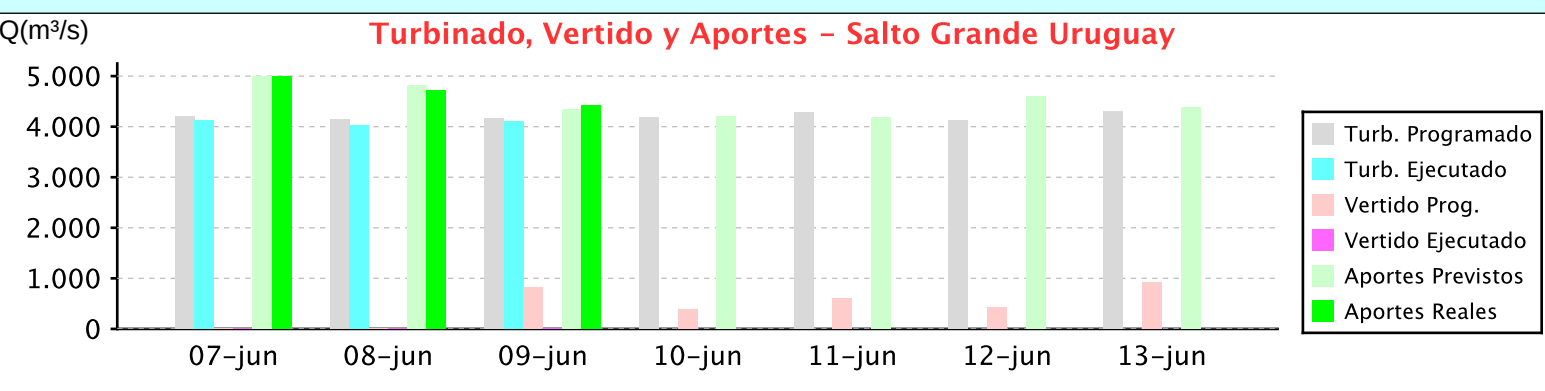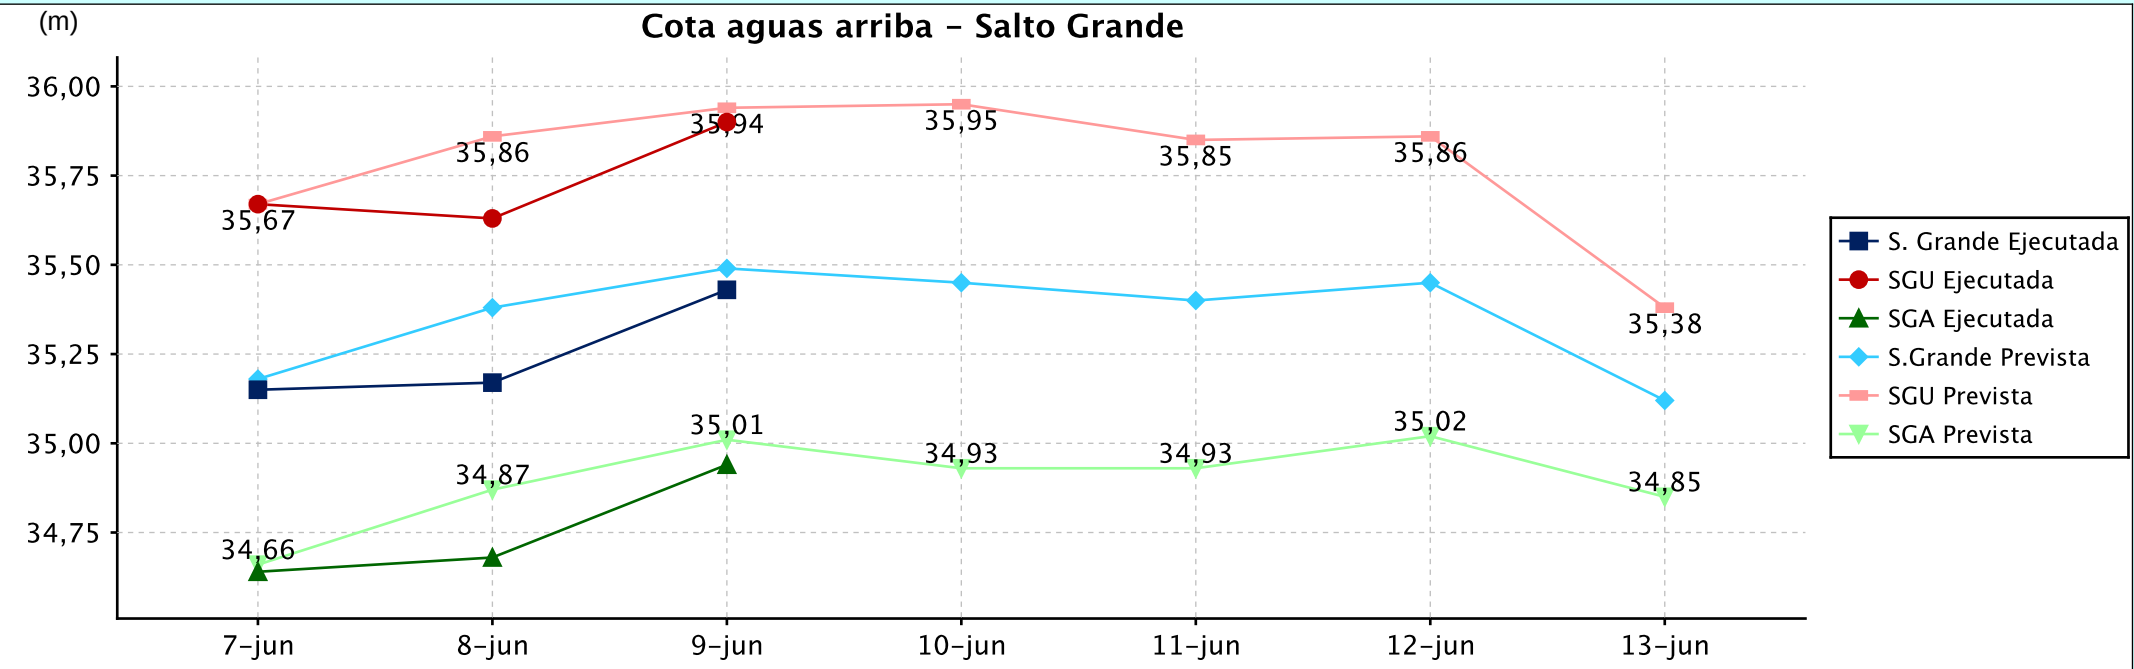

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,90
Cota Vista Arg	34,94
Cota real	35,43
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	23.492

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	356	331
Baygorria	357	386
Palmar	824	600
SGU	4.170	4.095

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	323	359
Baygorria	0	15
Palmar	80	9
SGU	4.350	4.413

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	814	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
