




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 12 de junio de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-3
Sala B	-0
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-3
Central La Tablada	-44
Central P. del Tigre	-6
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.282
C. Baygorria	625
C. Palmar	2.694
C. Salto Grande	20.962
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.405
TOTAL Generación	29.909

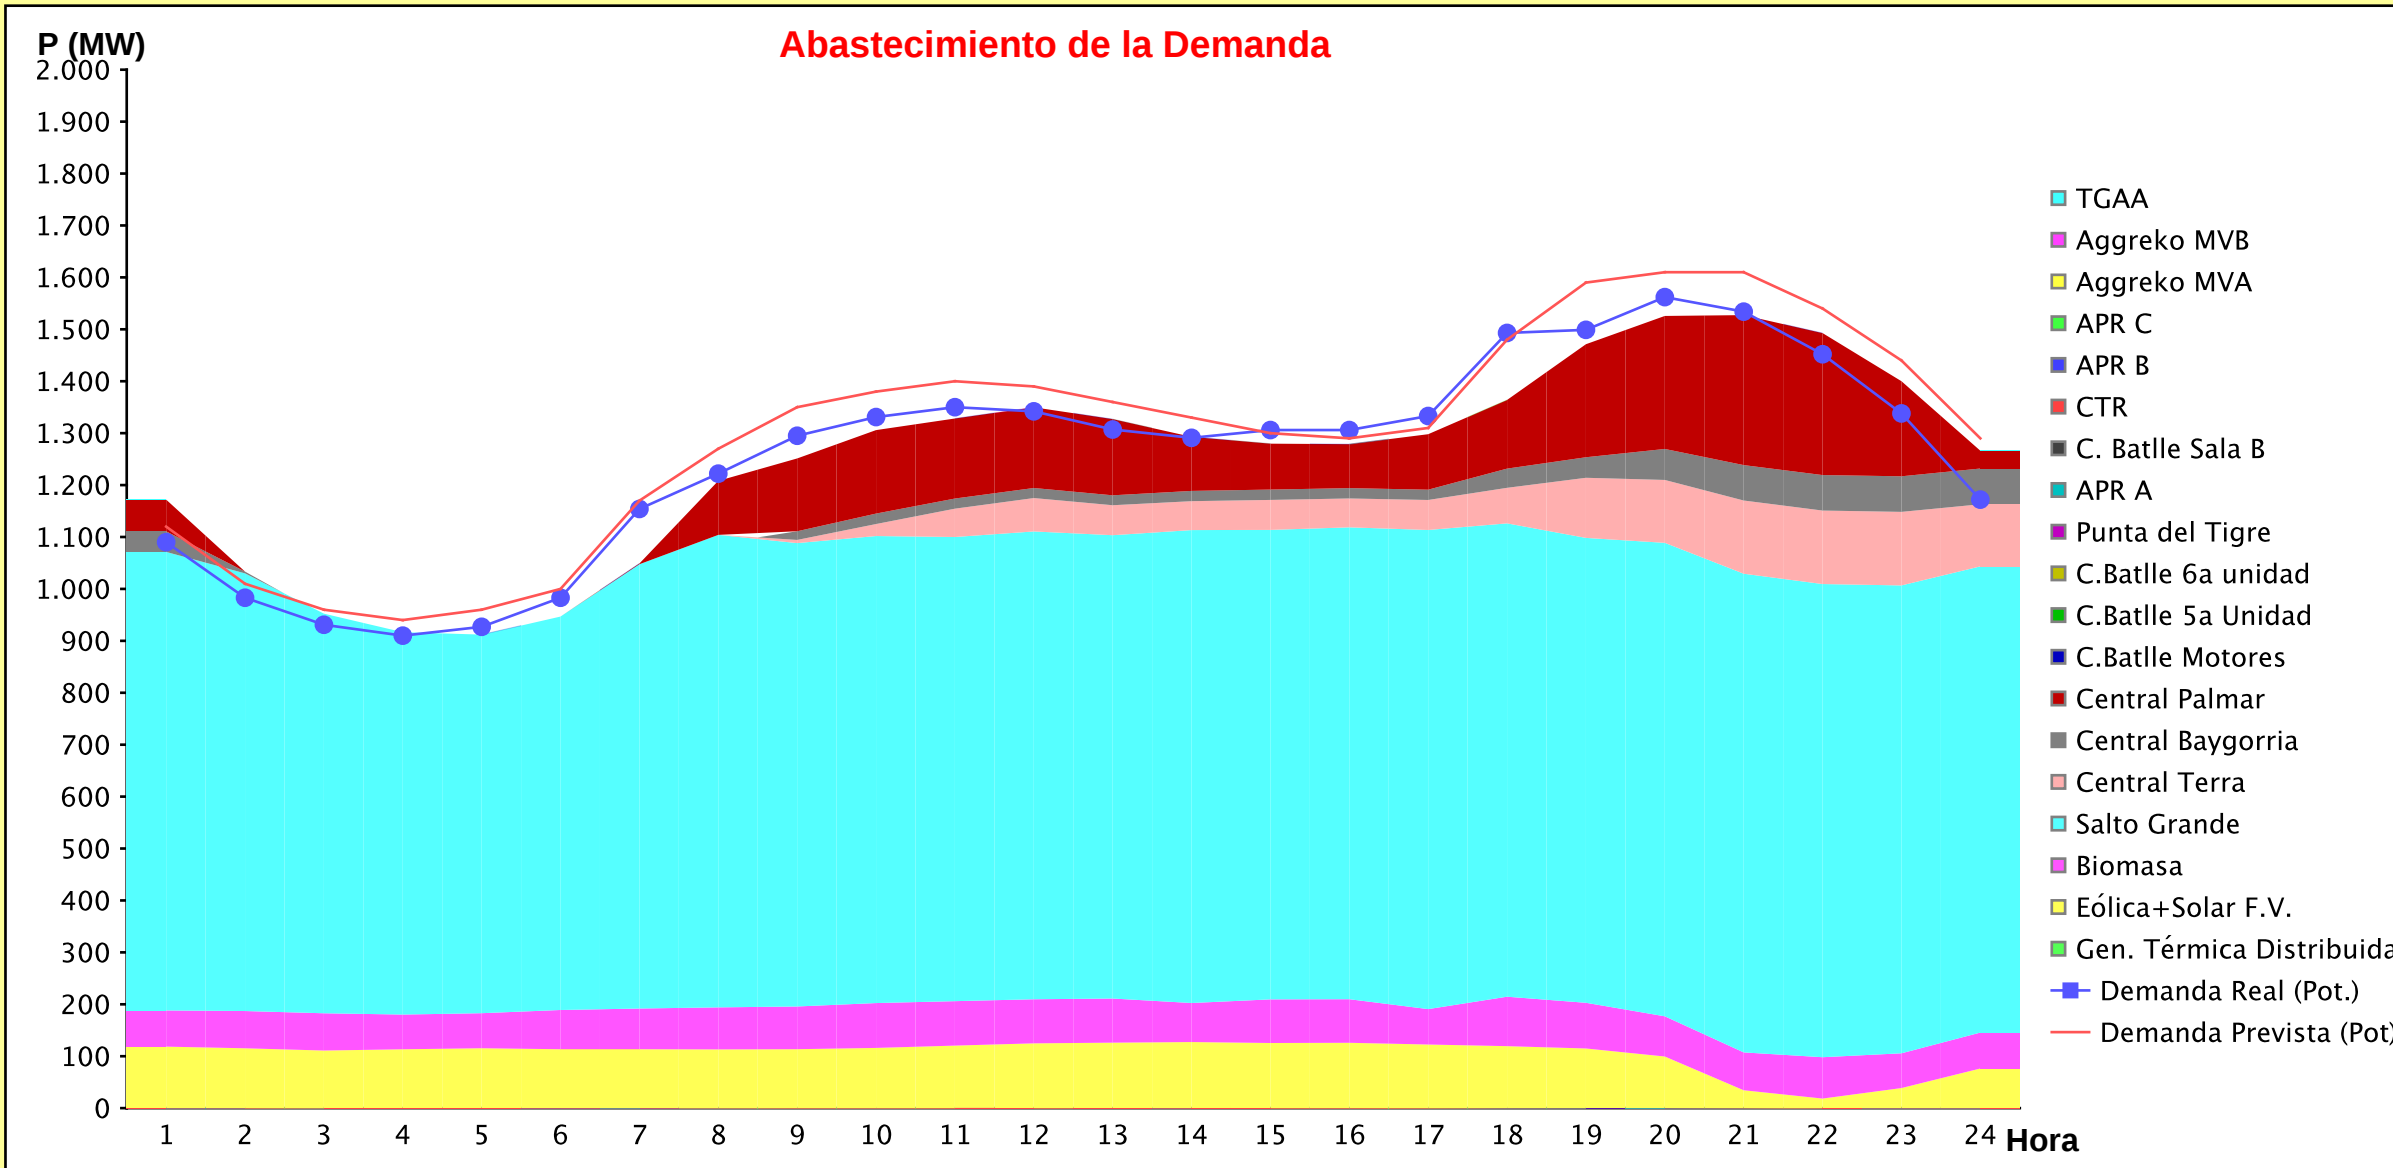

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	1.020
Hidráulica	1.020
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	1.020




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.889
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.100
Diferencia (MWh)	-2.211
Ejecutada - Programada	-7,11 %

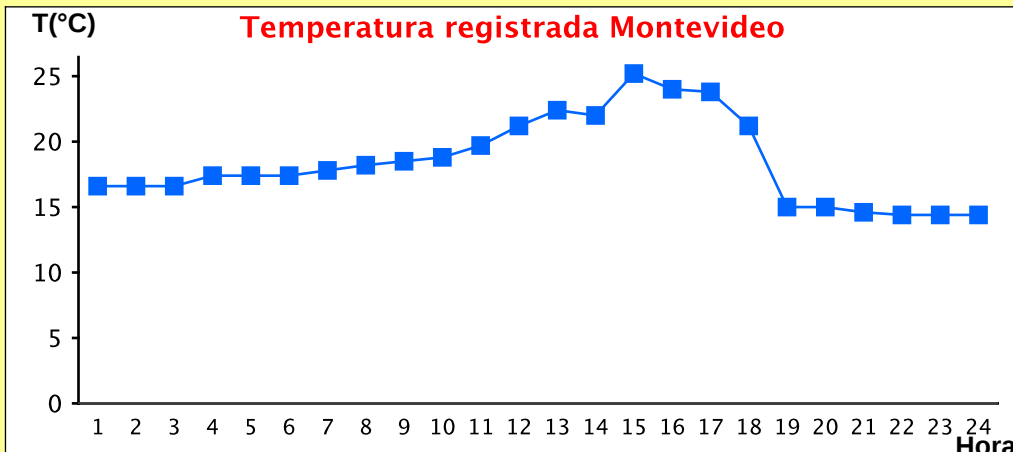



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1411,15 Hora 11:47
Potencia mínima:	938,47 Hora 03:43
Pico noche:	1574,9 Hora 19:41

Generación Media (MW)	
Eólica	105,0
Biomasa	79,0
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

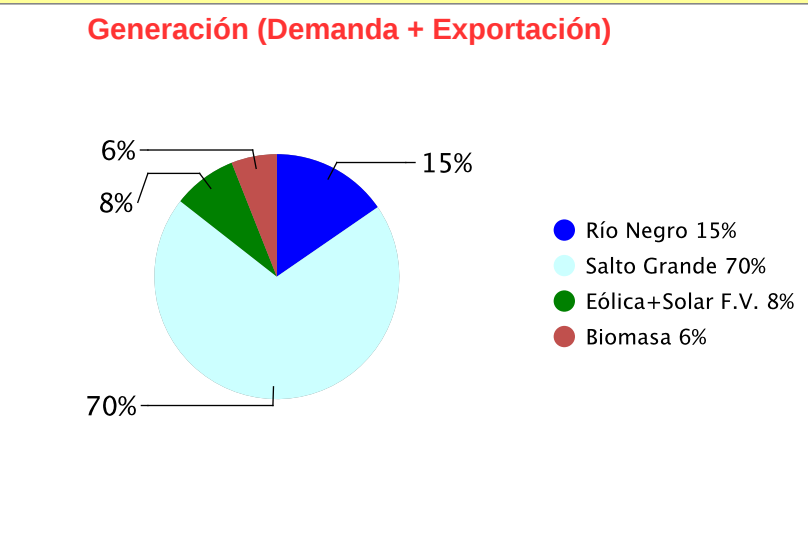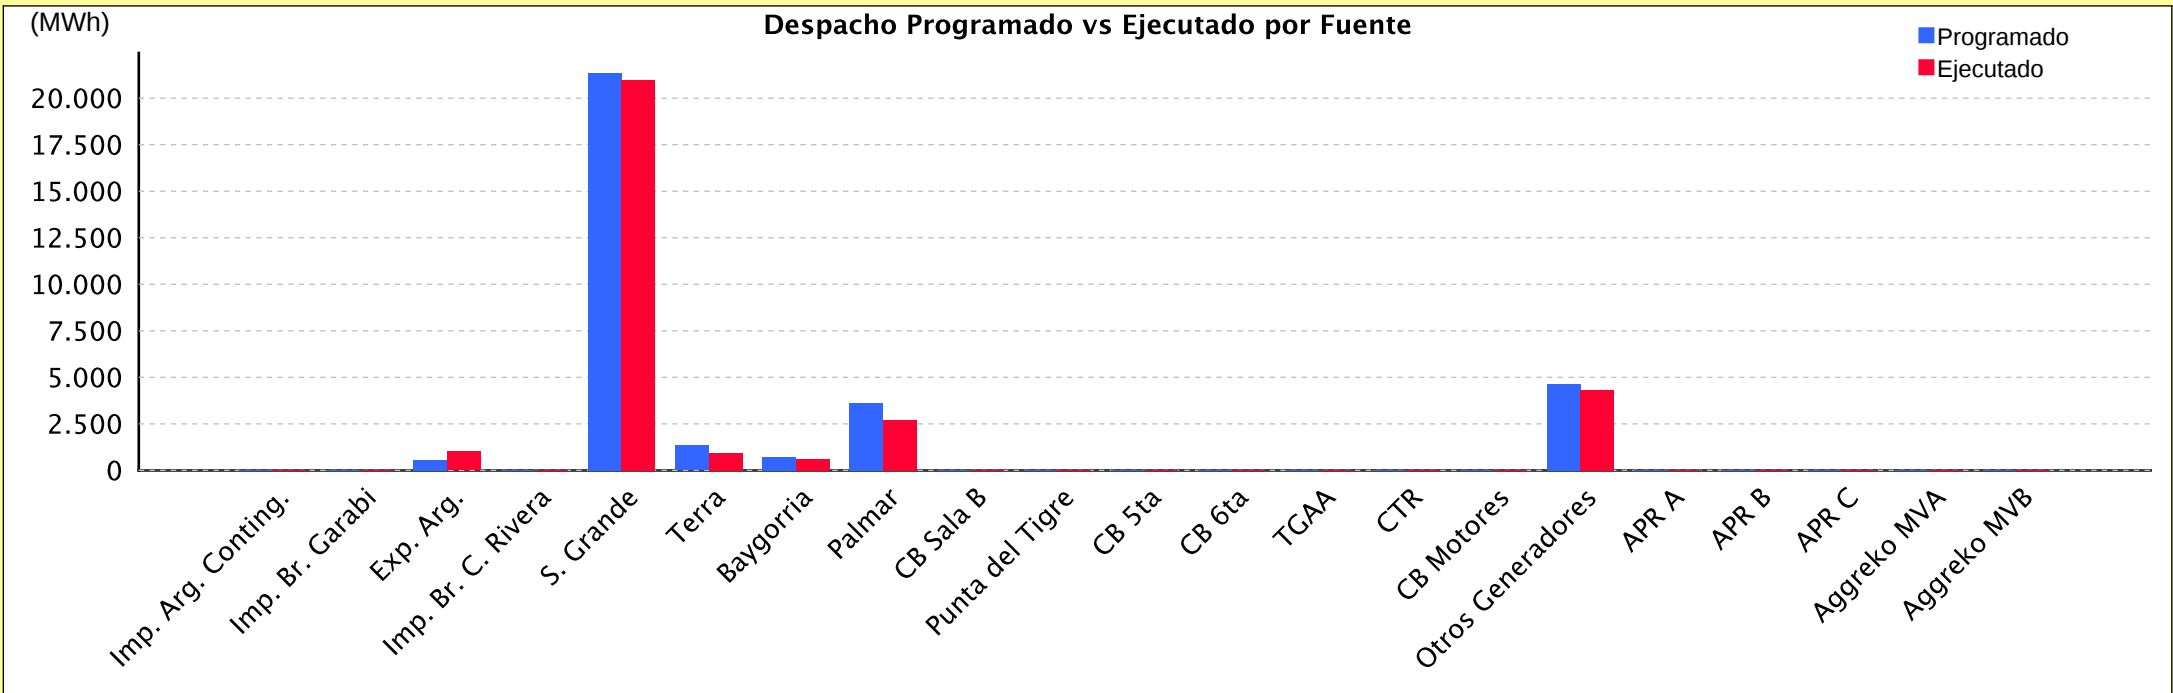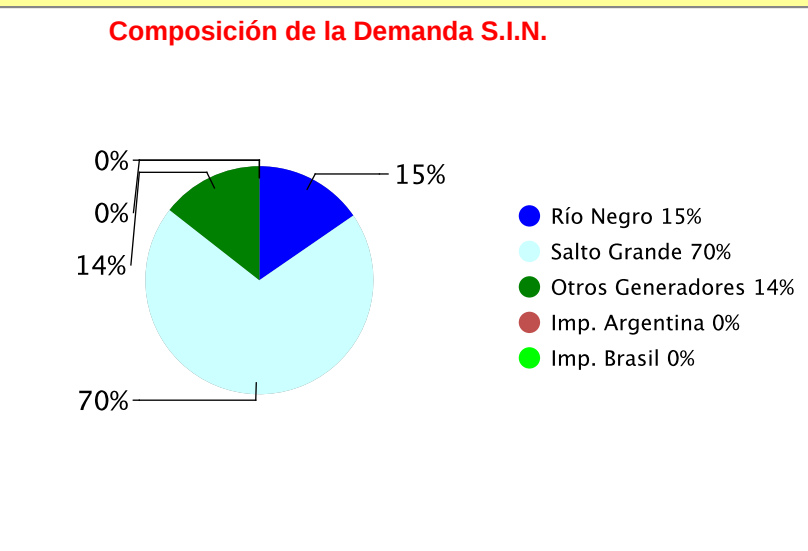



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

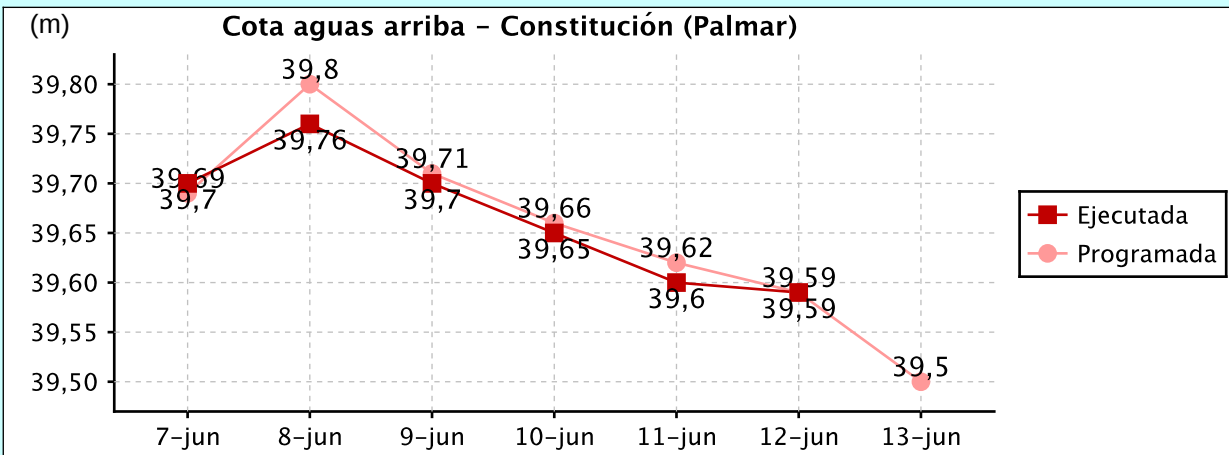
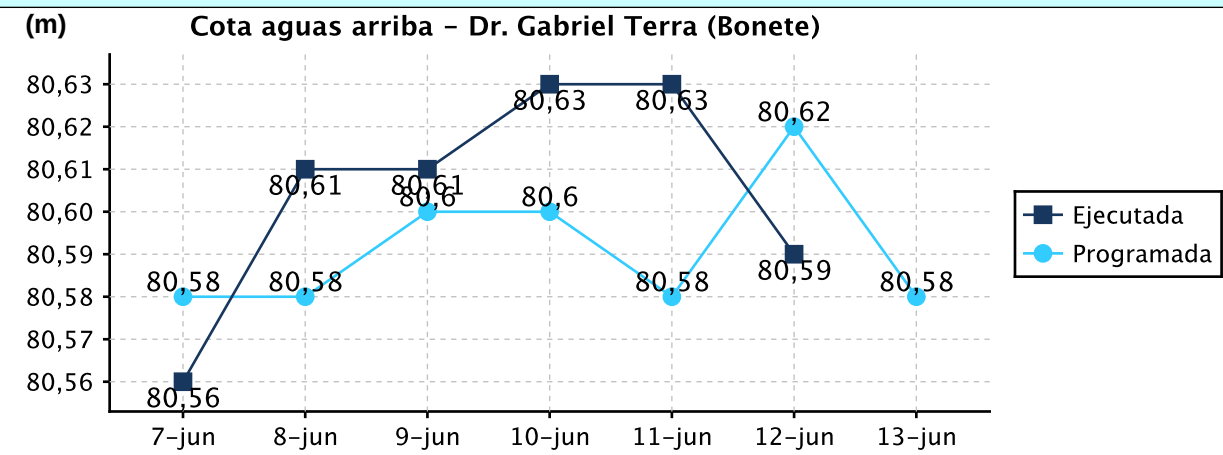


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,62	80,59
Baygorria	53,78	53,78
Palmar	39,59	39,59
SGU	35,86	35,53

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

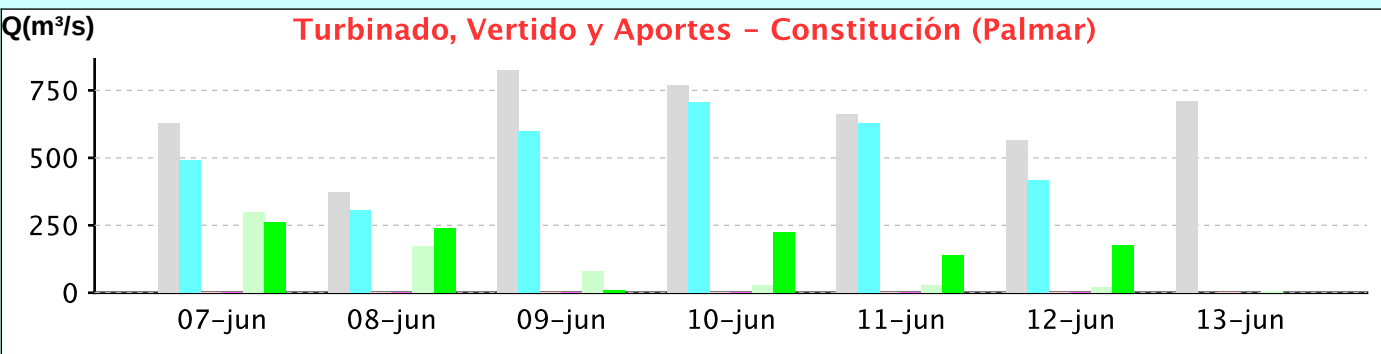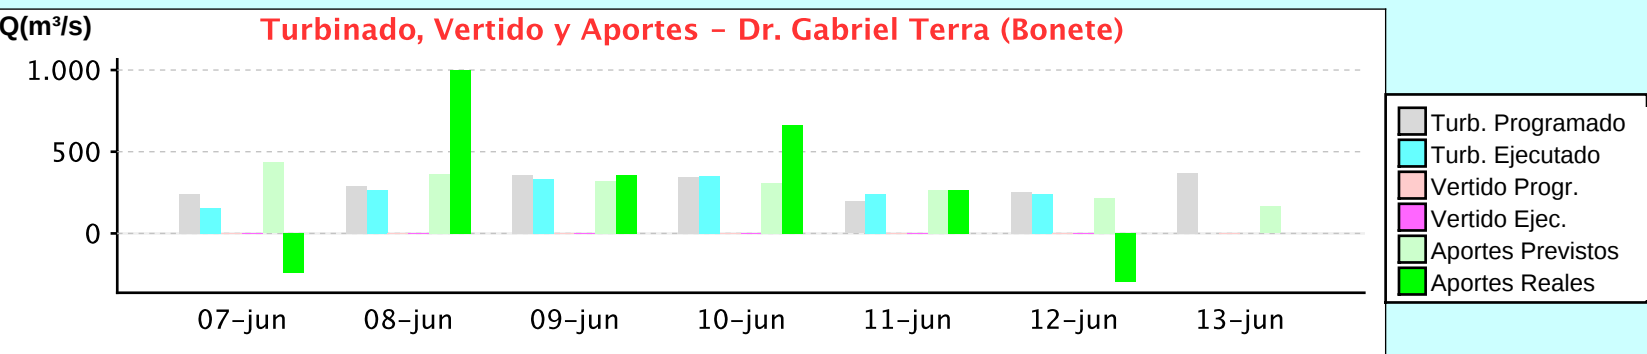

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

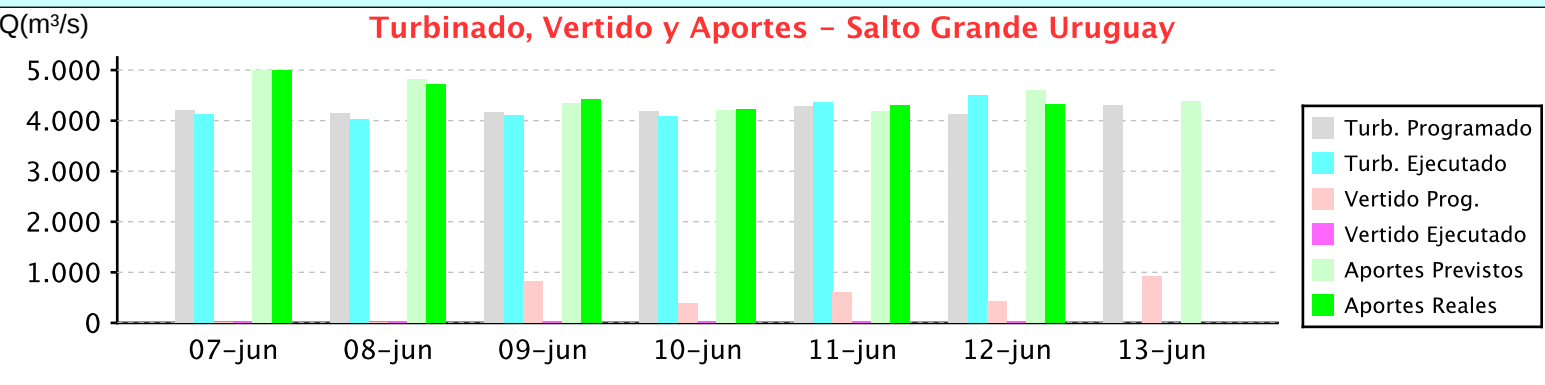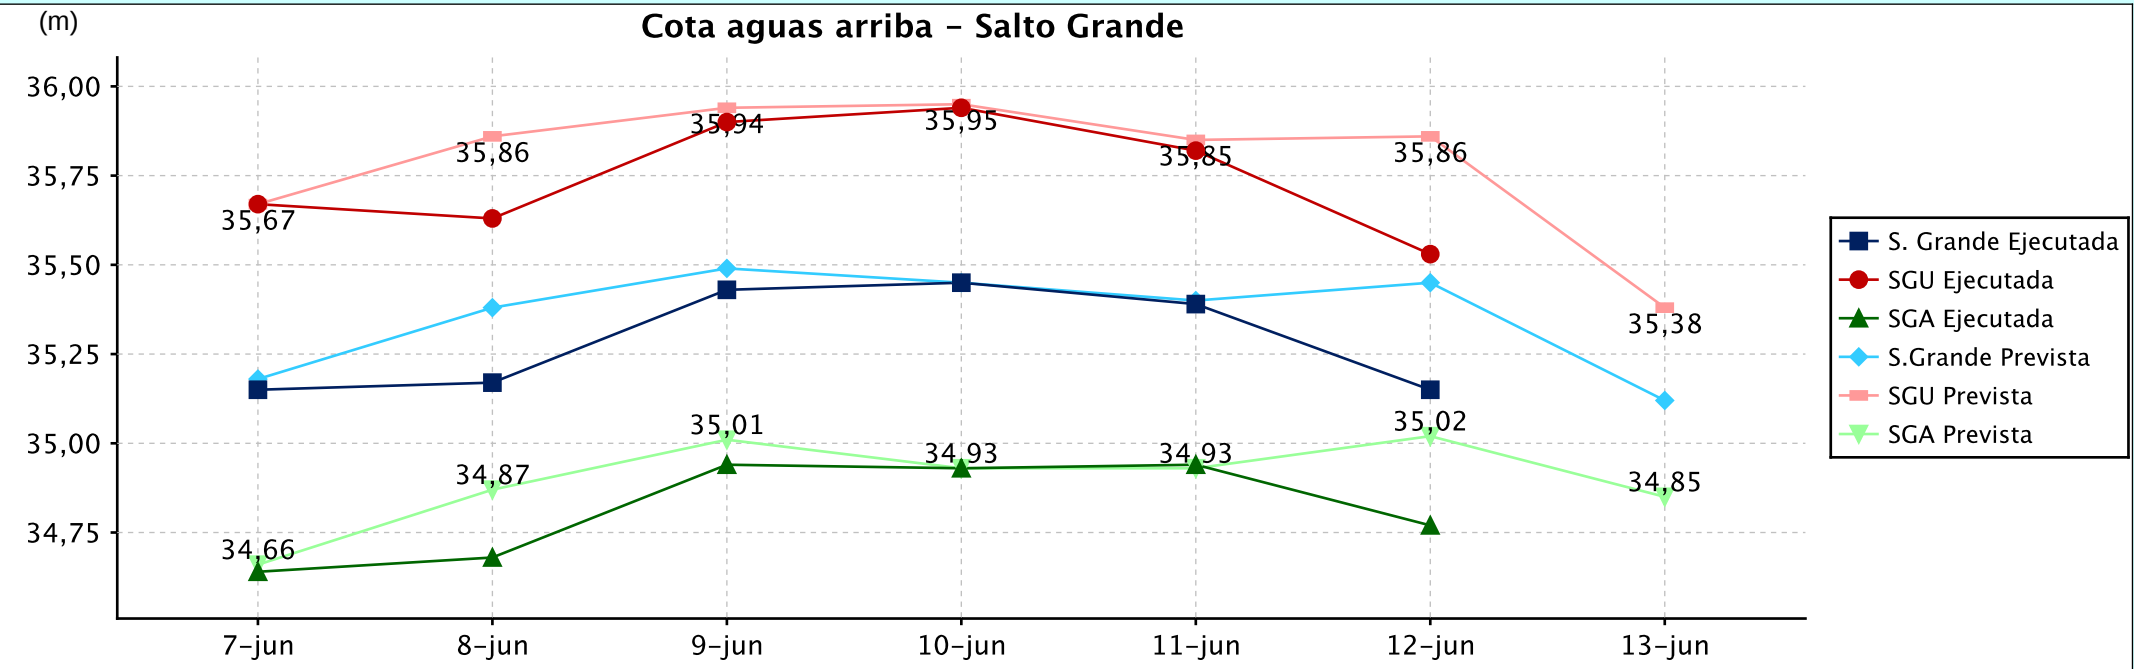

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,53
Cota Vista Arg	34,77
Cota real	35,15
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
18.296	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	252	242
Baygorria	258	219
Palmar	565	417
SGU	4.116	4.494

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	217	-298
Baygorria	0	19
Palmar	19	178
SGU	4.600	4.320

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	416	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
