




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 13 de junio de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	163
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	167
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	-5
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.852
C. Baygorria	1.096
C. Palmar	3.394
C. Salto Grande	20.995
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.571
TOTAL Generación	31.019

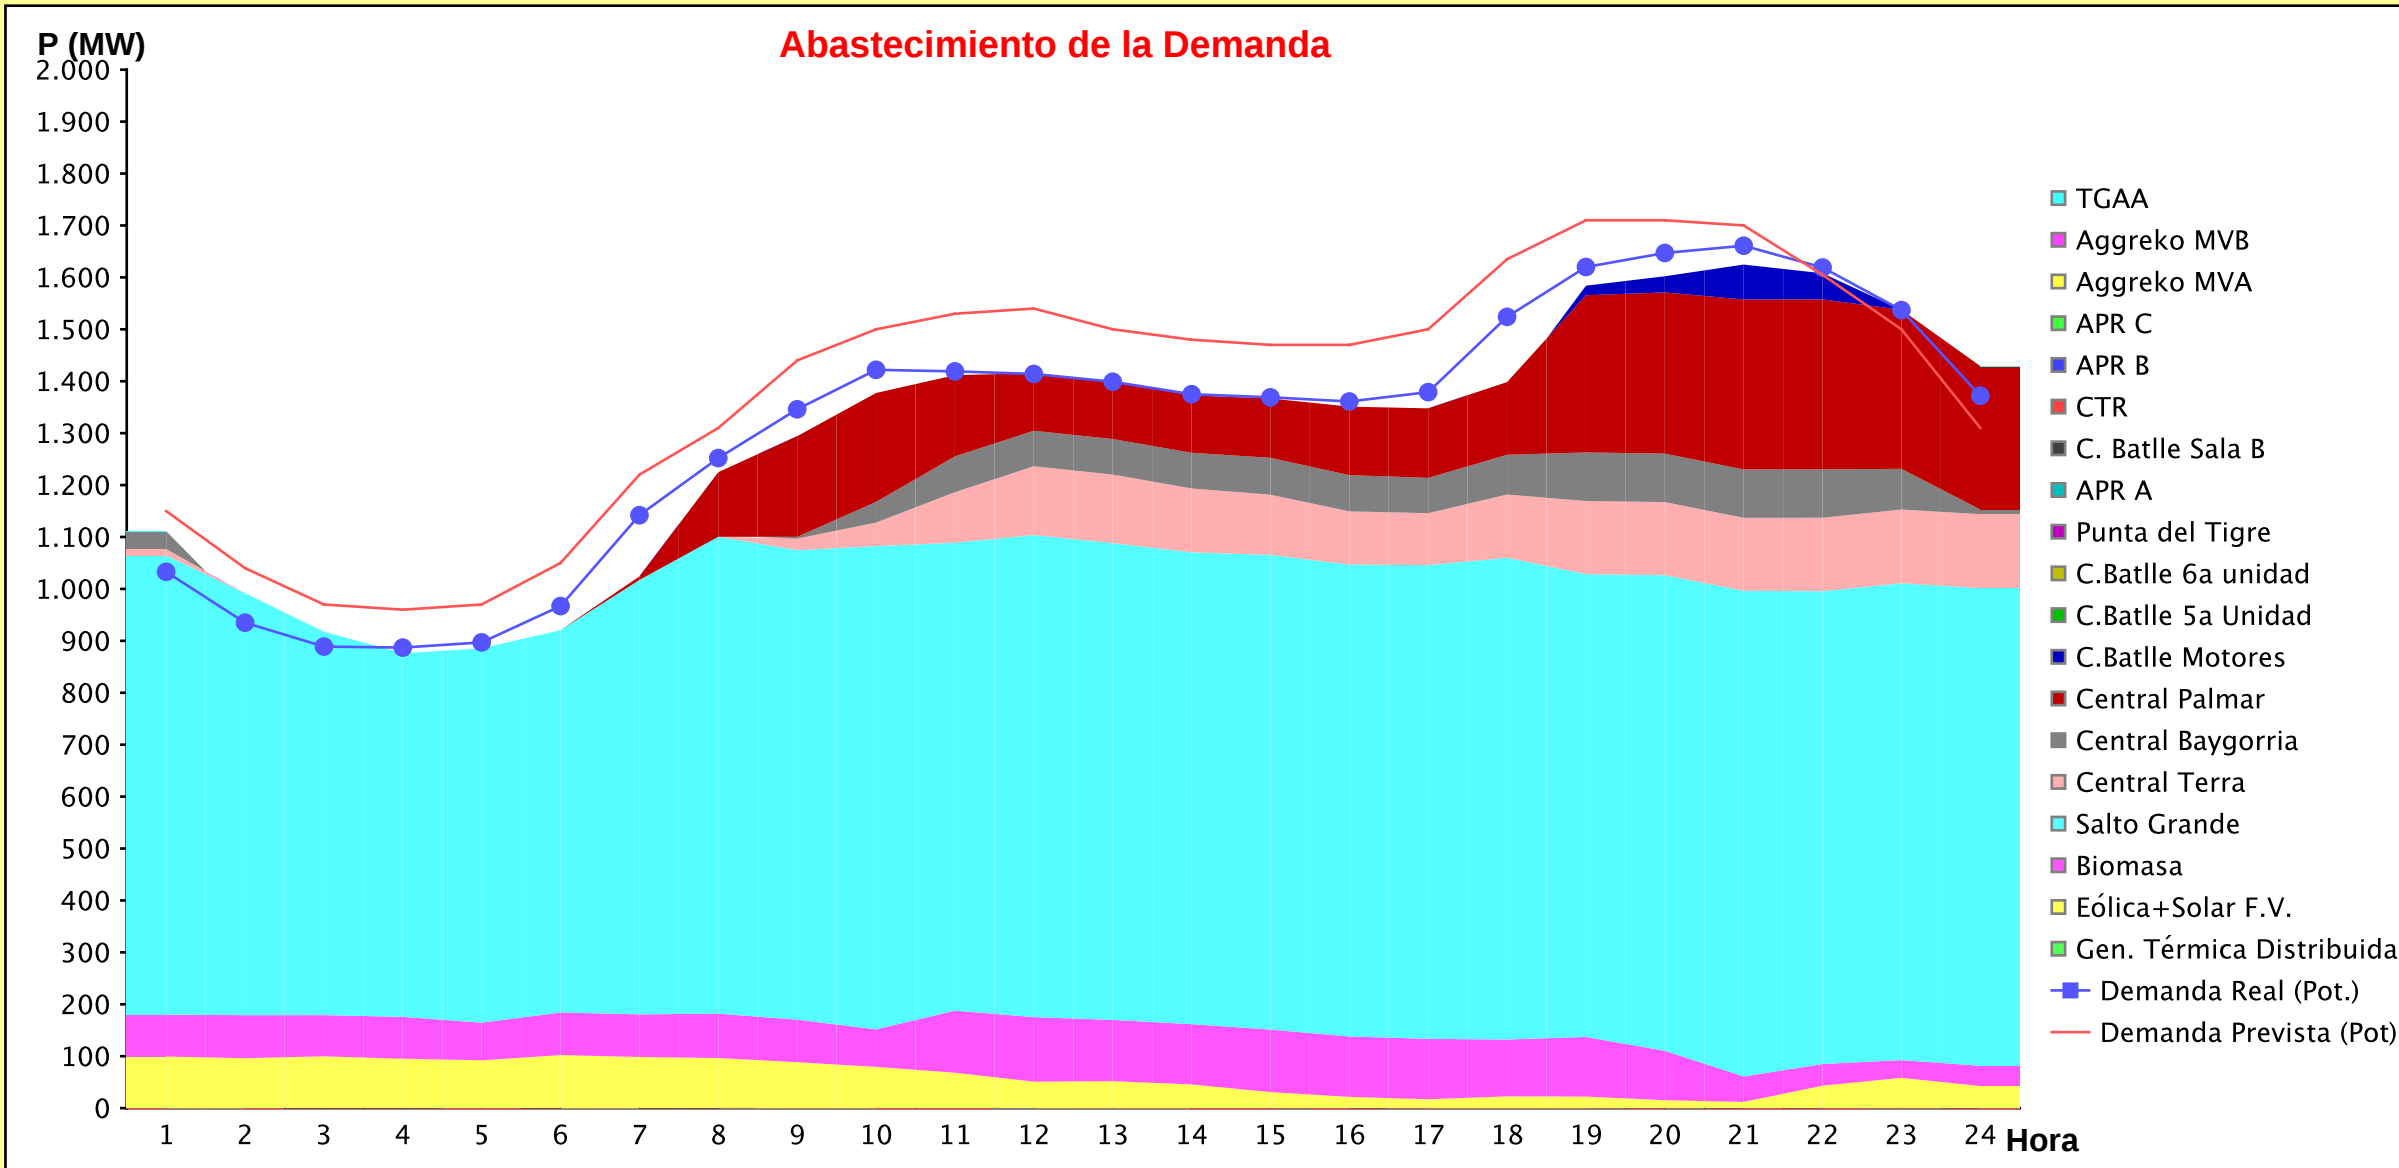

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	1.093
Hidráulica	1.093
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	1.093




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.926
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	33.270
Diferencia (MWh)	-3.344
Ejecutada - Programada	-10,05 %

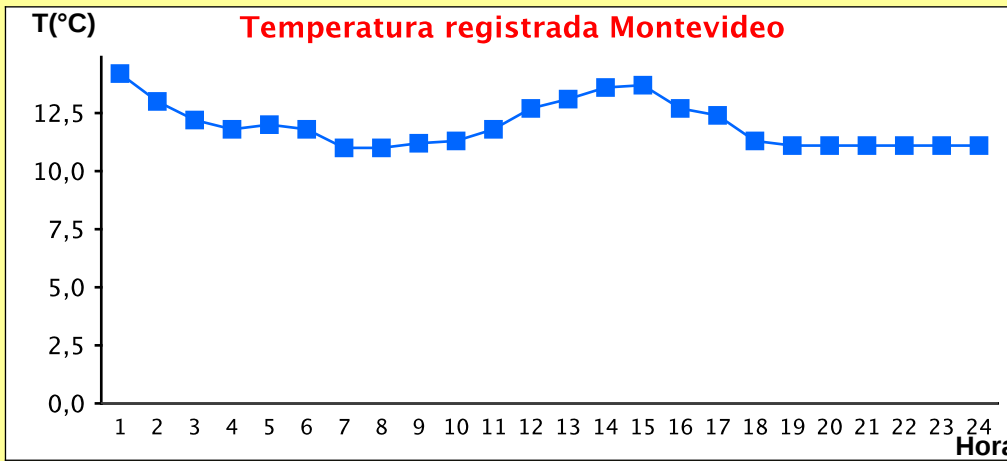



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1462,76 Hora 11:36
Potencia mínima:	901,95 Hora 03:23
Pico noche:	1680,11 Hora 20:01

Generación Media (MW)	
Eólica	60,6
Biomasa	93,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

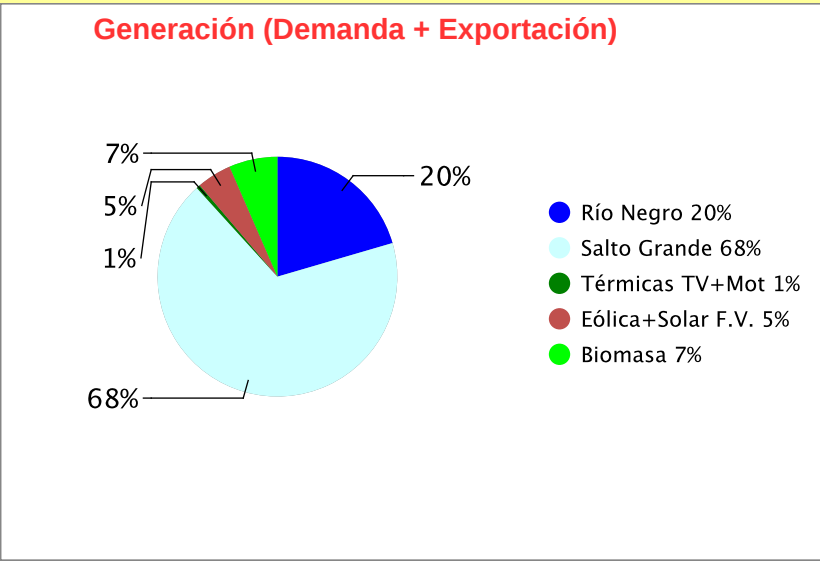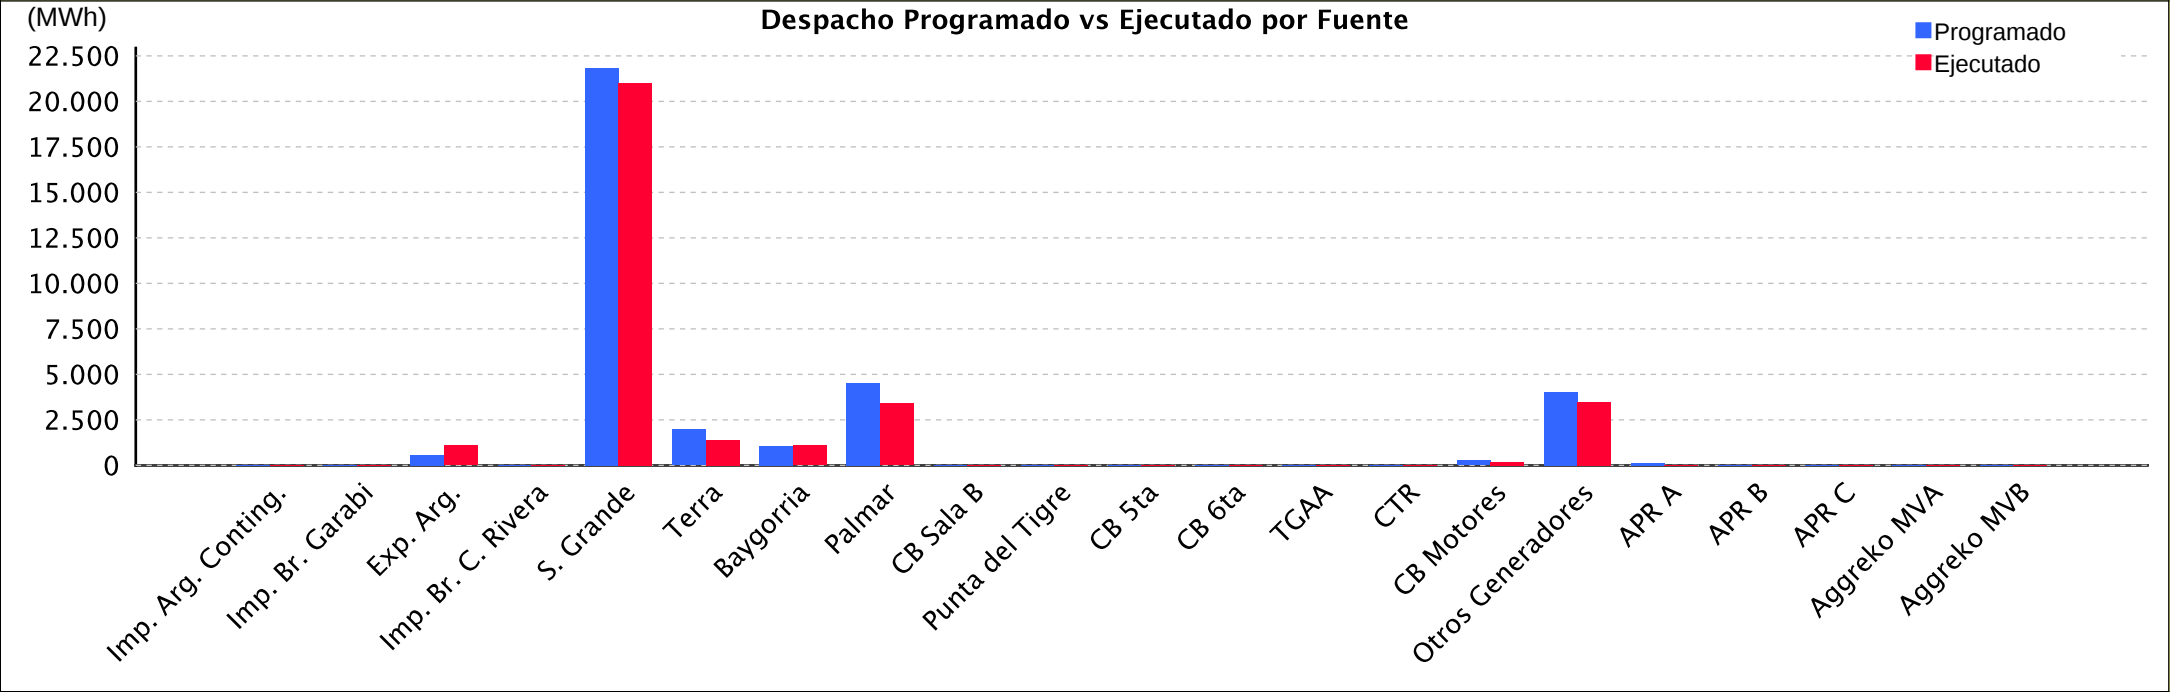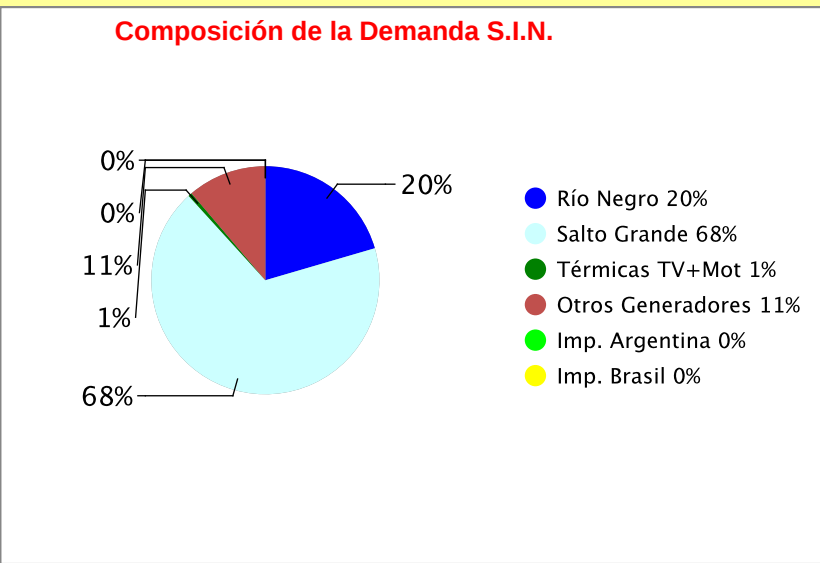



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

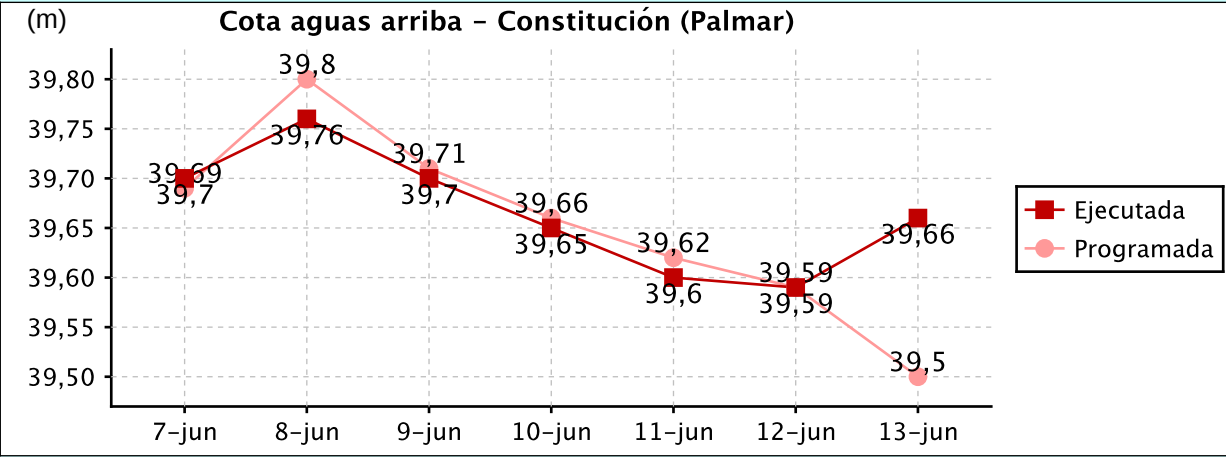
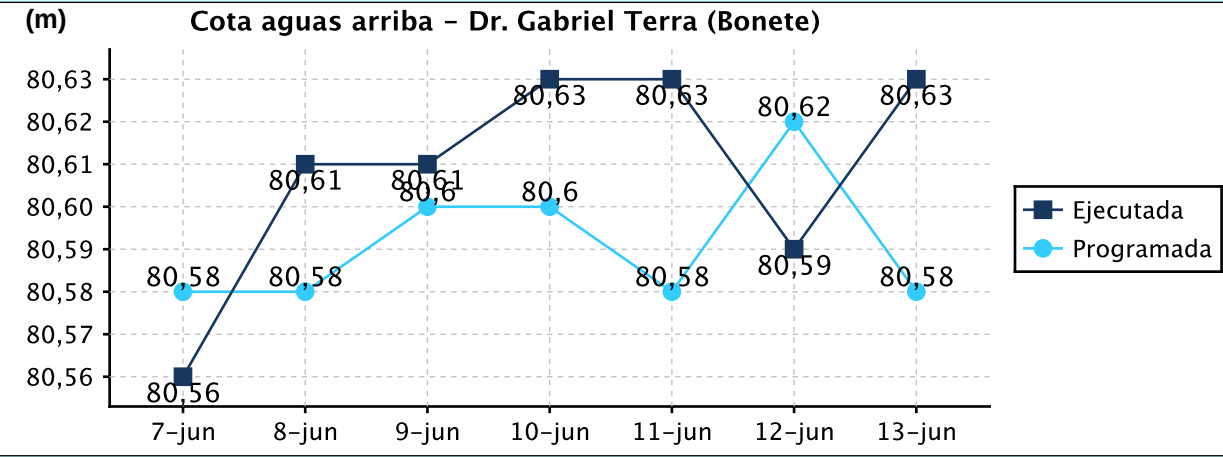


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,58	80,63
Baygorria	53,77	53,99
Palmar	39,50	39,66
SGU	35,38	35,47

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

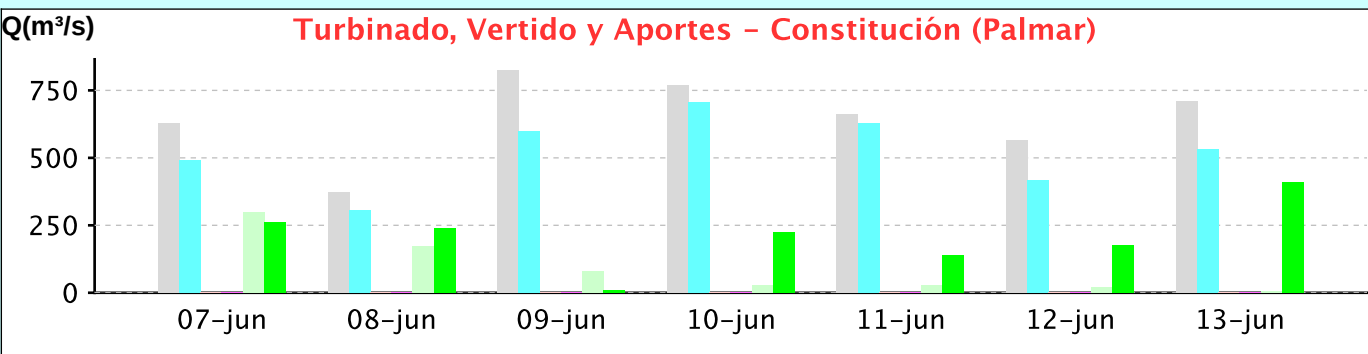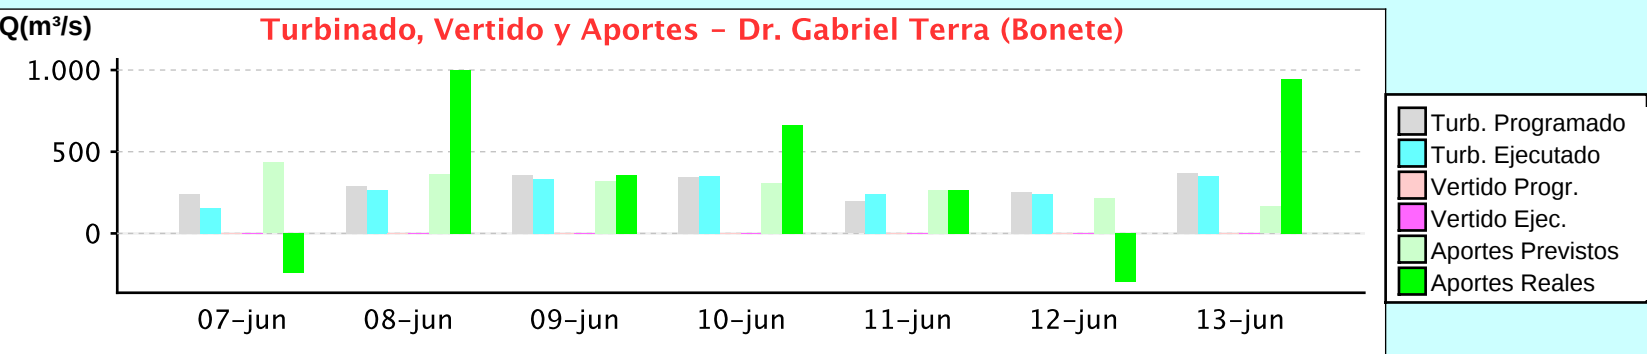

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

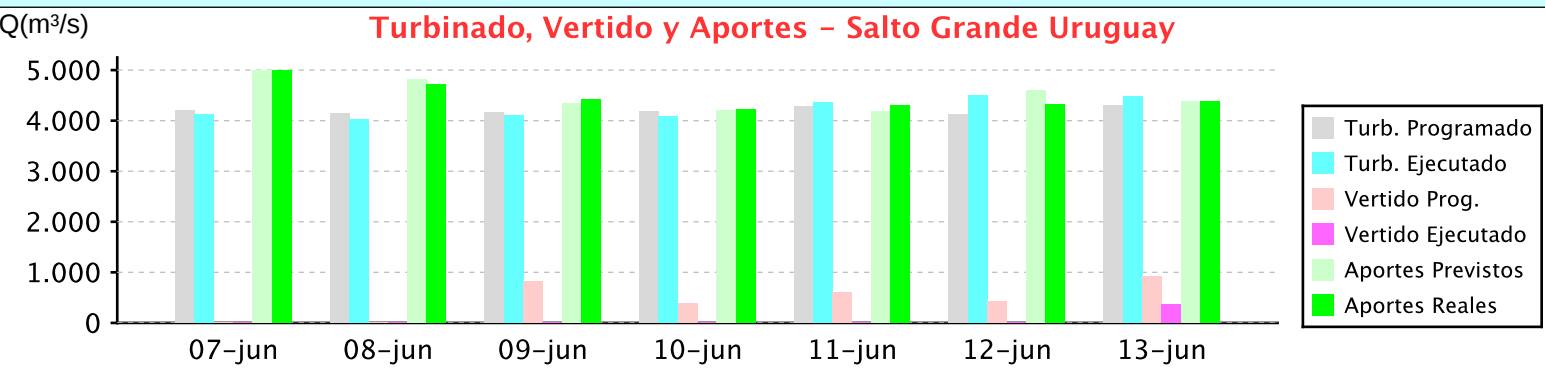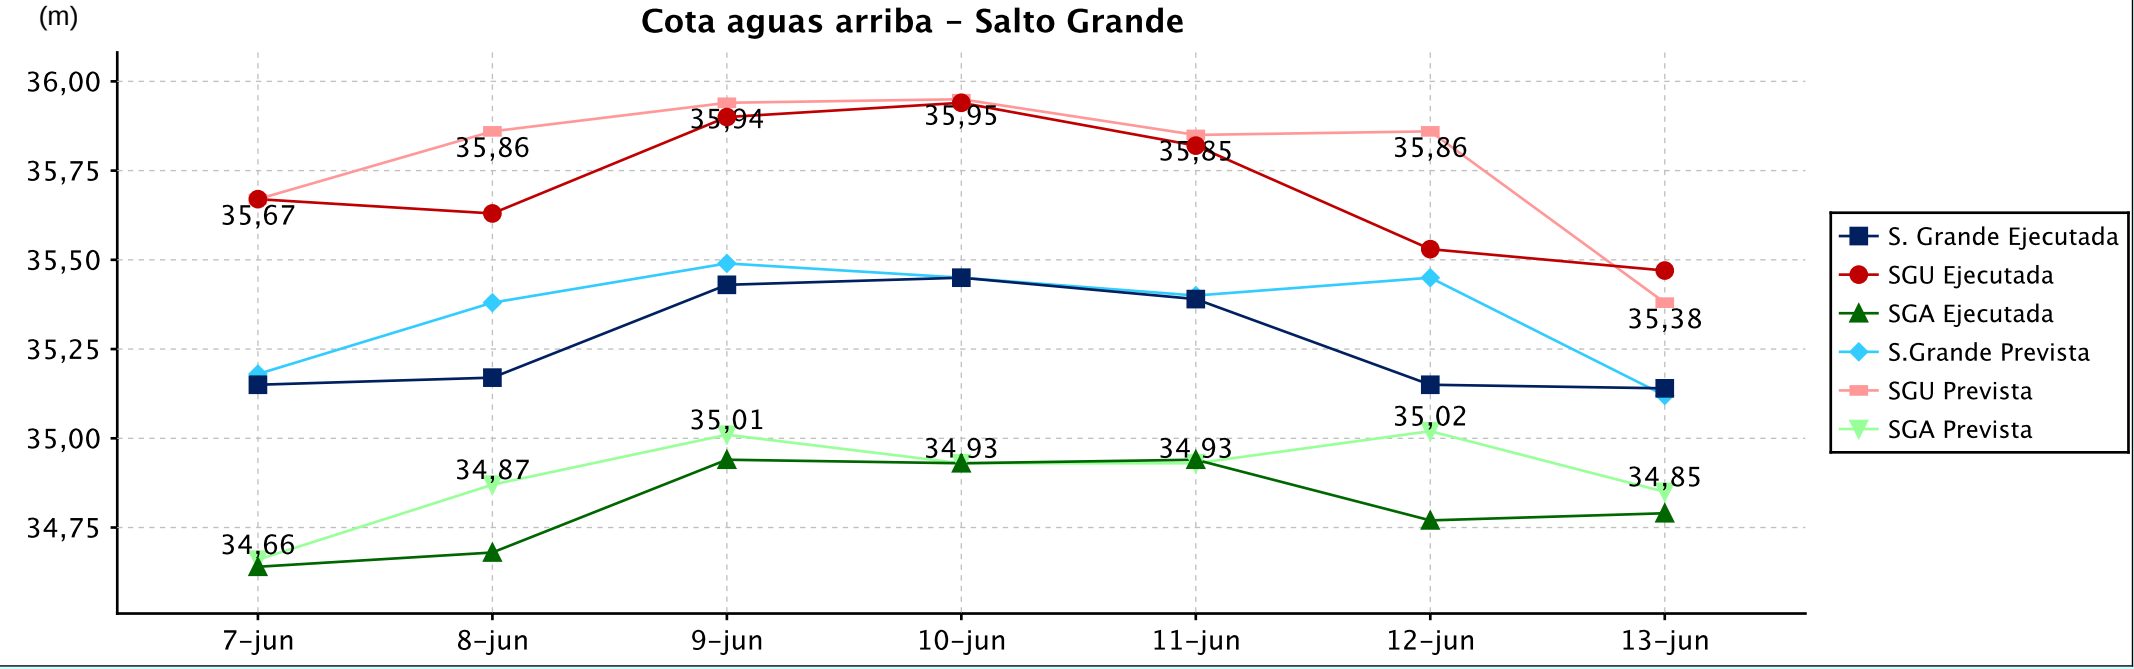

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,47
Cota Vista Arg	34,79
Cota real	35,14
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	16.329

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	372	352
Baygorria	387	391
Palmar	709	530
SGU	4.310	4.486

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	165	947
Baygorria	0	288
Palmar	6	409
SGU	4.375	4.379

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	924	370

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
