



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 14 de junio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	51
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	55
Central La Tablada	-47
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.146
C. Baygorria	1.162
C. Palmar	2.467
C. Salto Grande	21.232
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.051
TOTAL Generación	30.052

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	366
Hidráulica	366
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	366




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.686
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	32.400
Diferencia (MWh)	-2.714
Ejecutada - Programada	-8,38 %

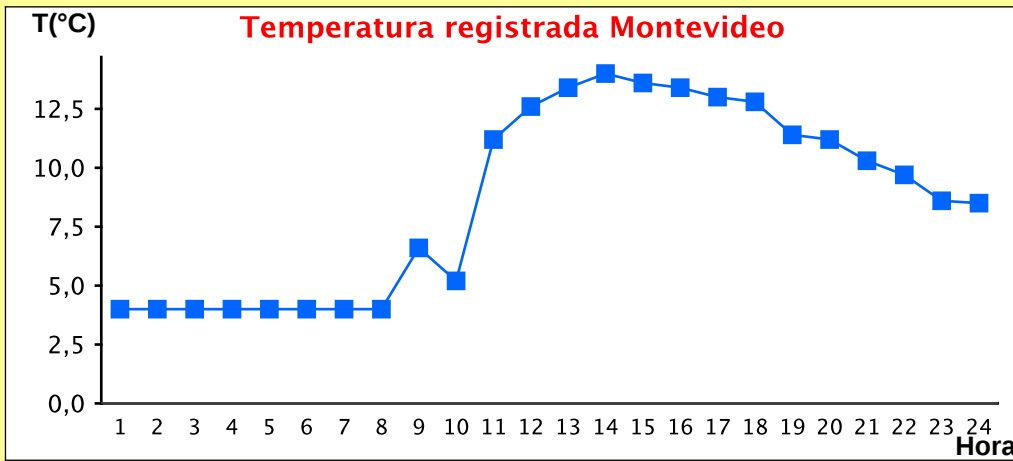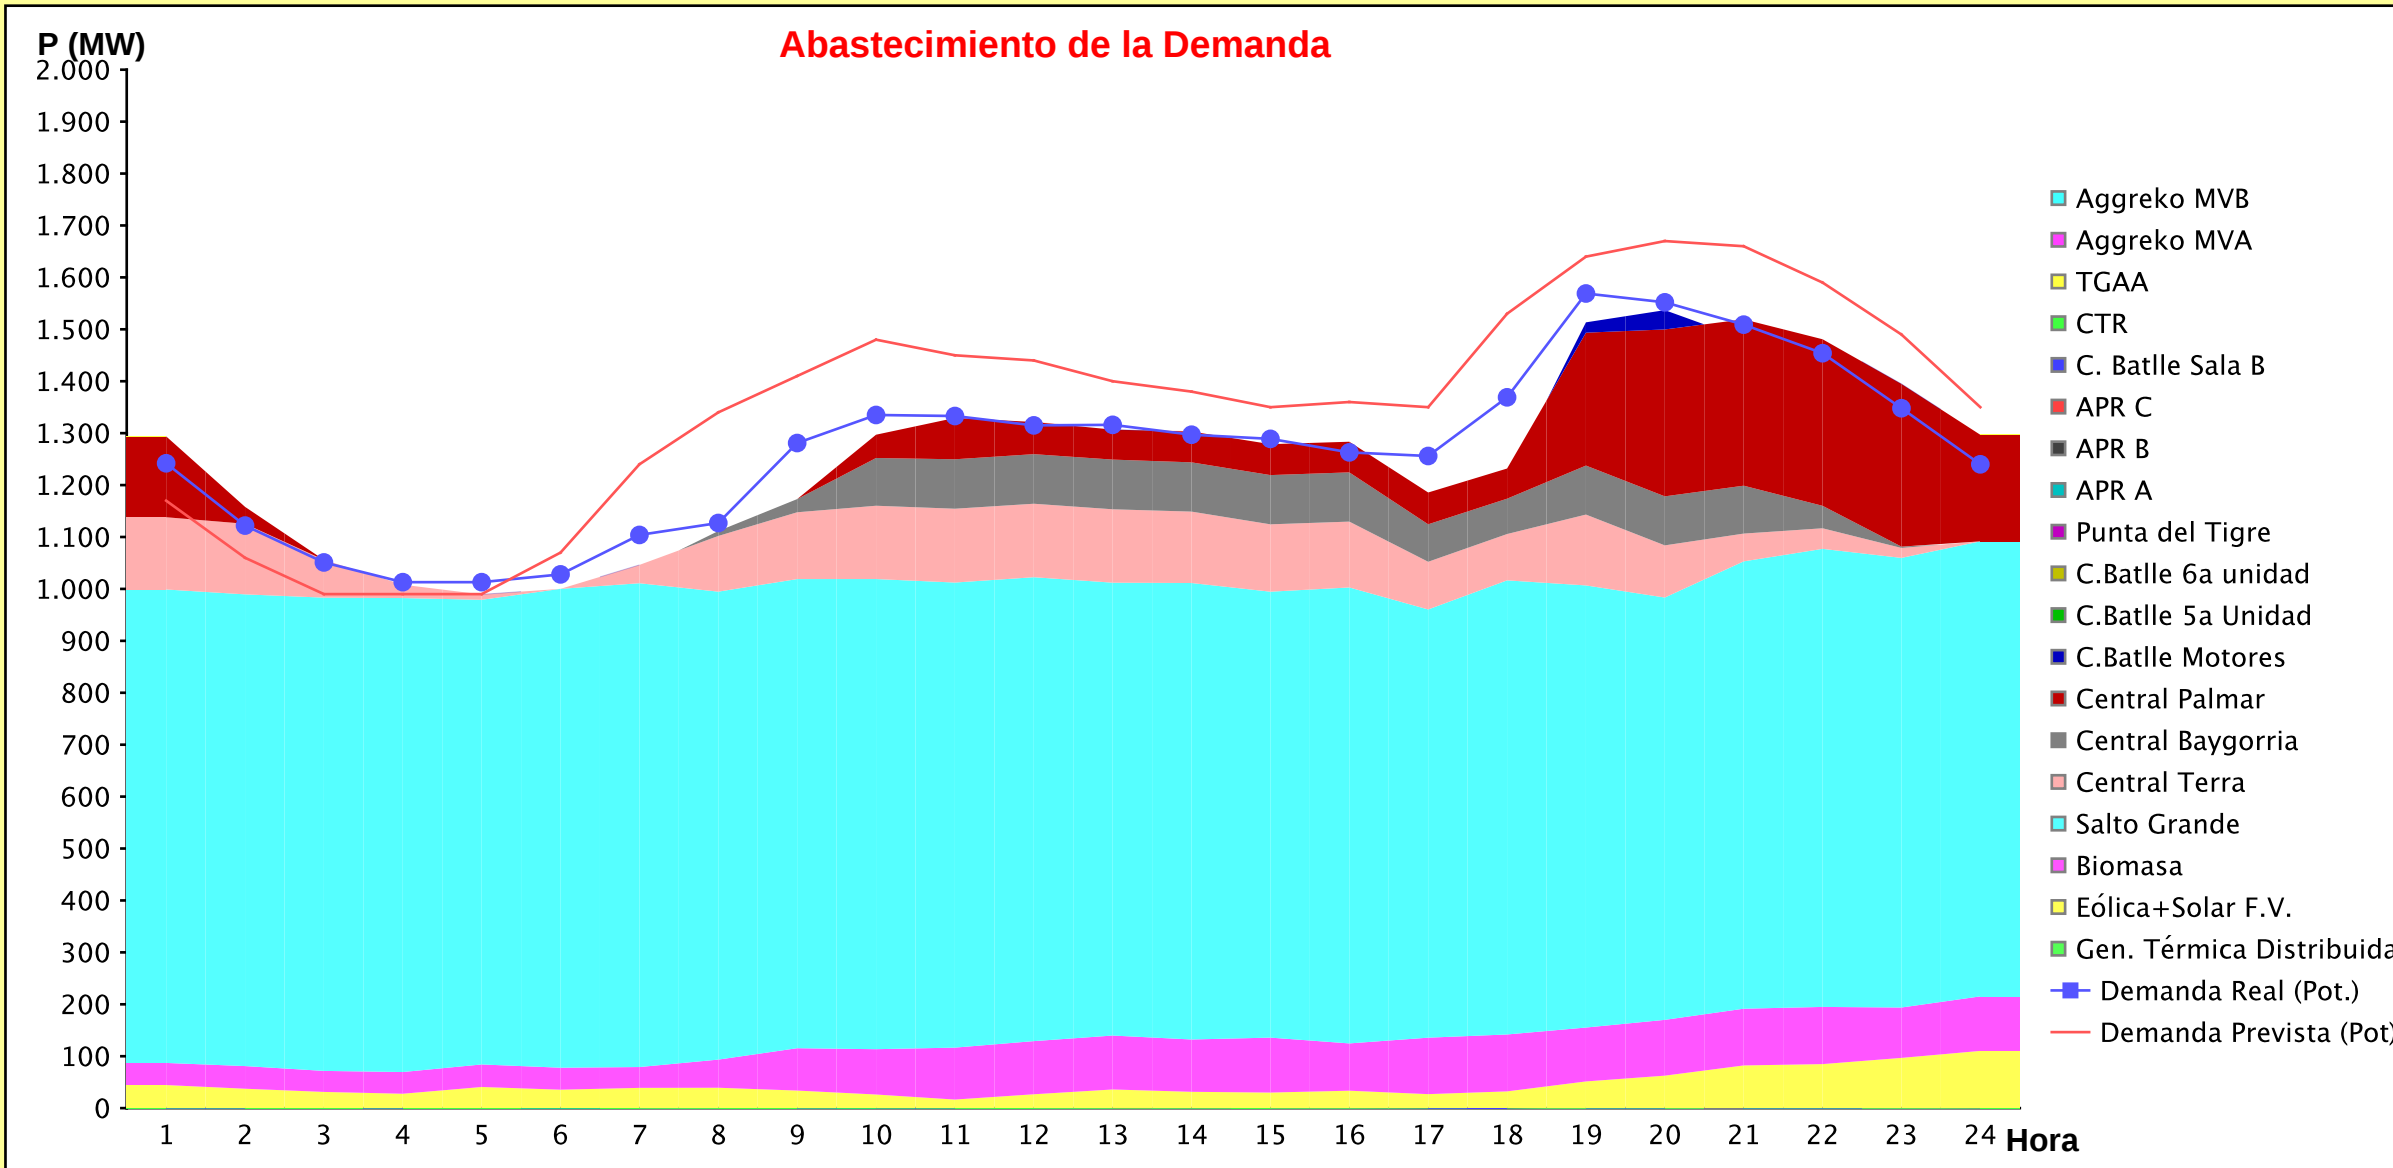



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1359,29 Hora 10:26
Potencia mínima:	1012,48 Hora 04:23
Pico noche:	1592,83 Hora 18:55

Generación Media (MW)	
Eólica	45,0
Biomasa	88,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

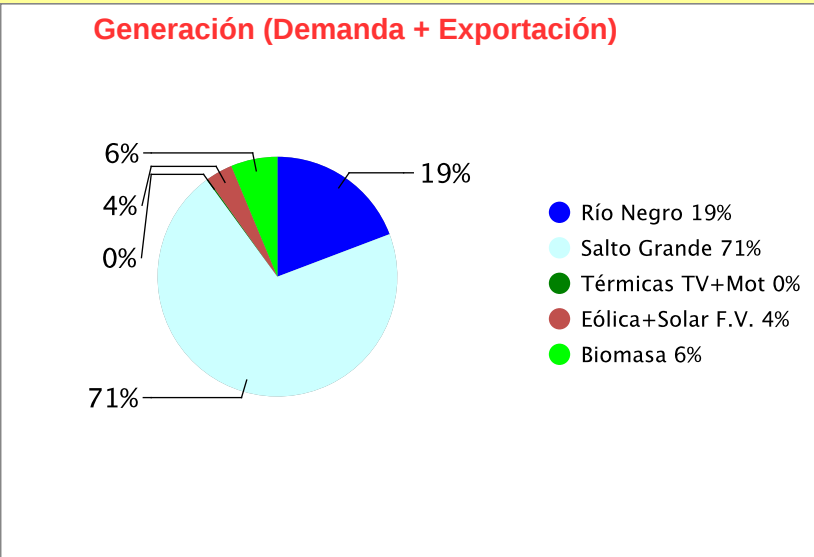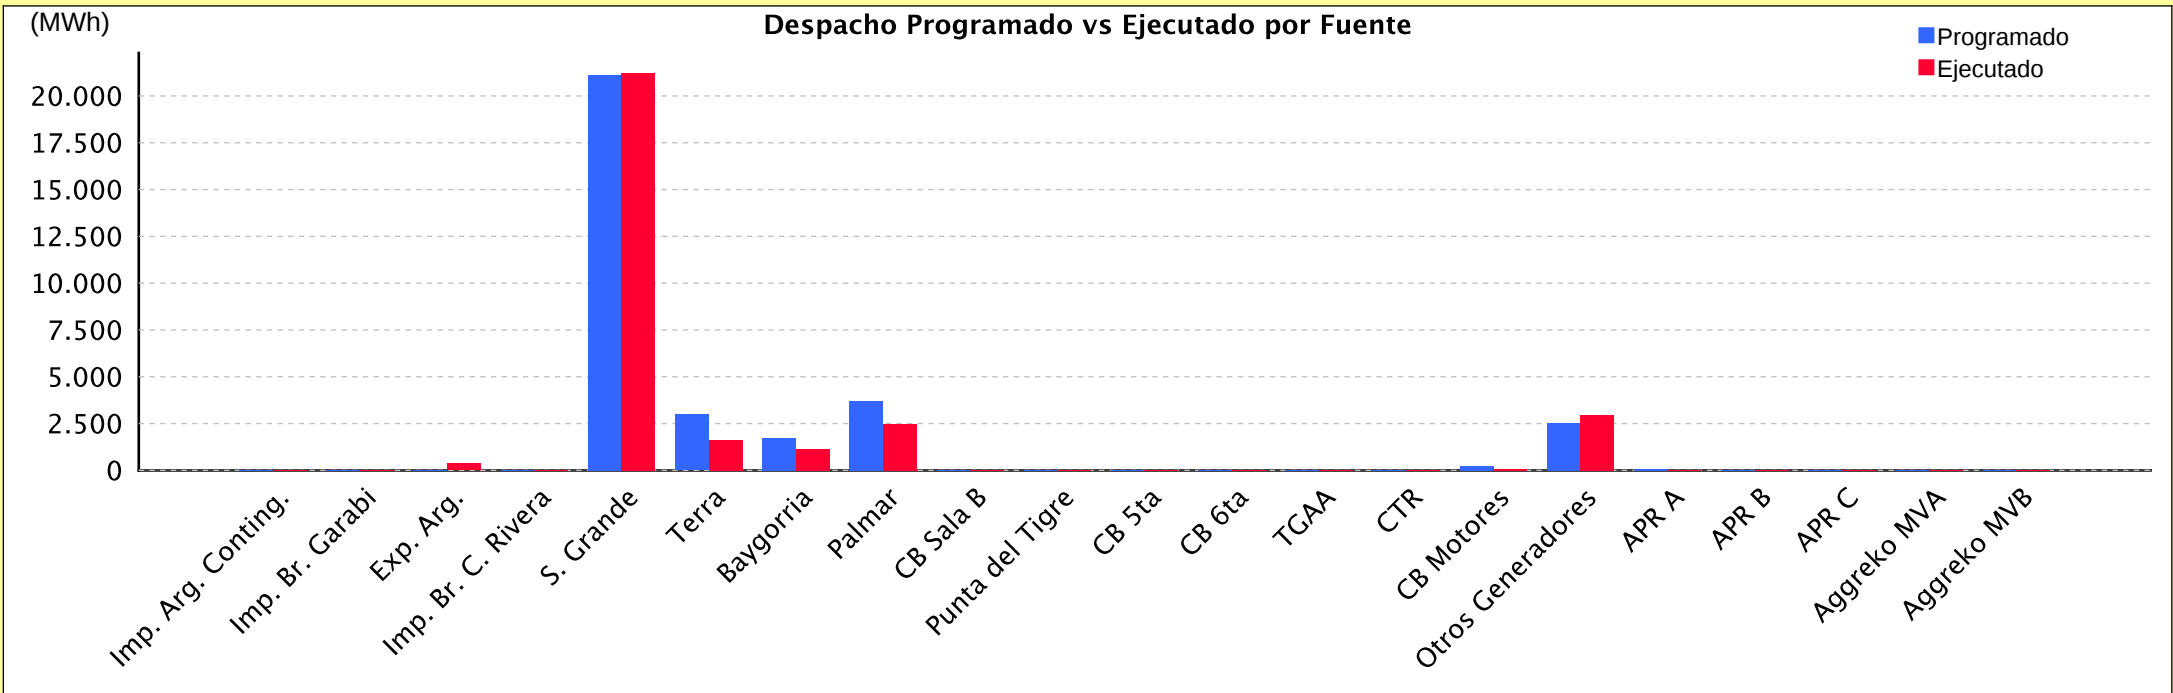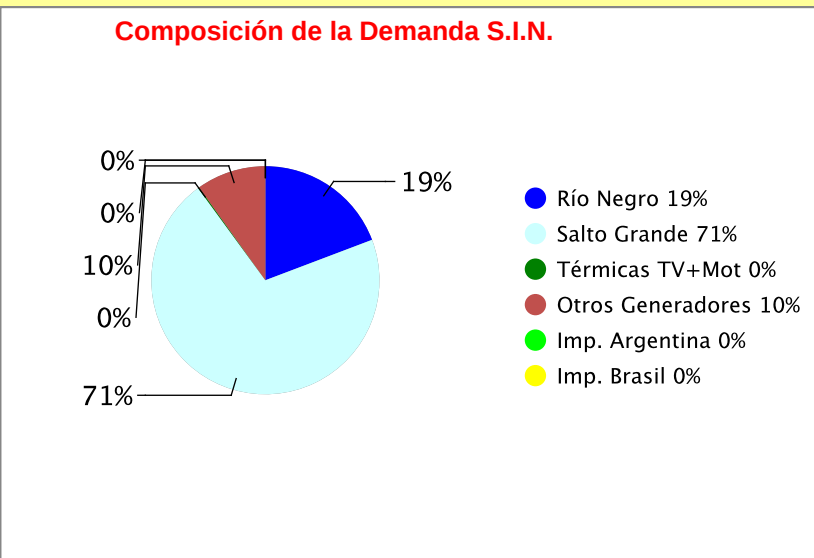



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

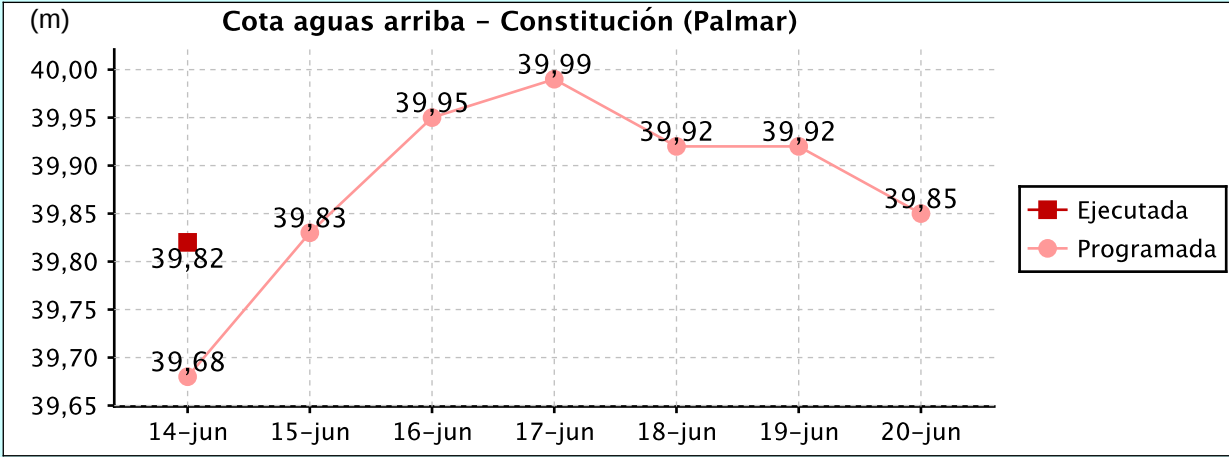
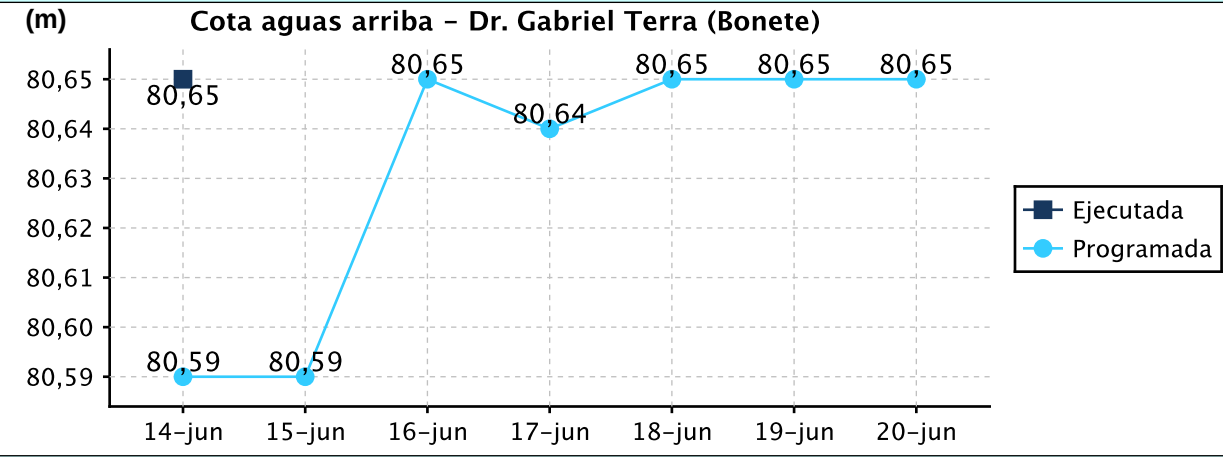


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,59	80,65
Baygorria	53,82	54,19
Palmar	39,68	39,82
SGU	35,47	35,51

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

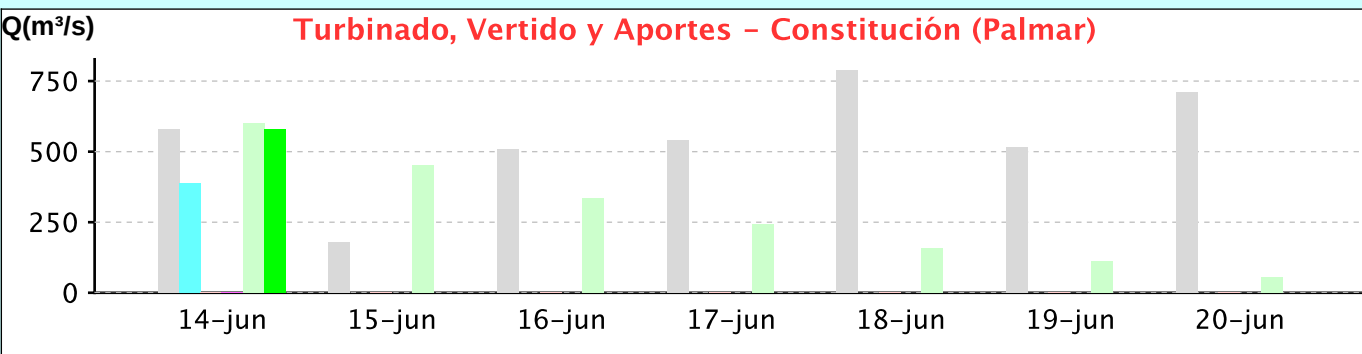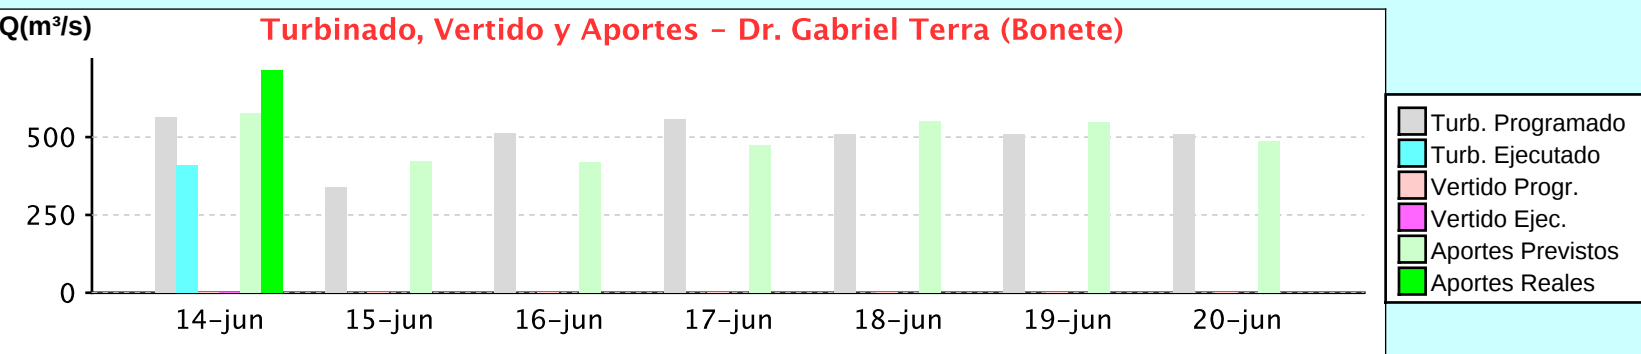

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

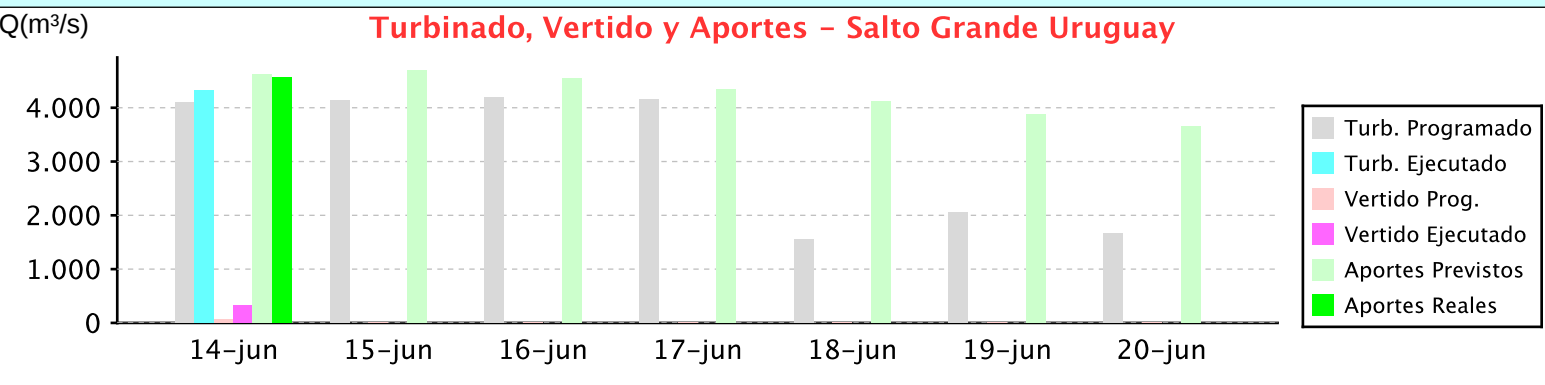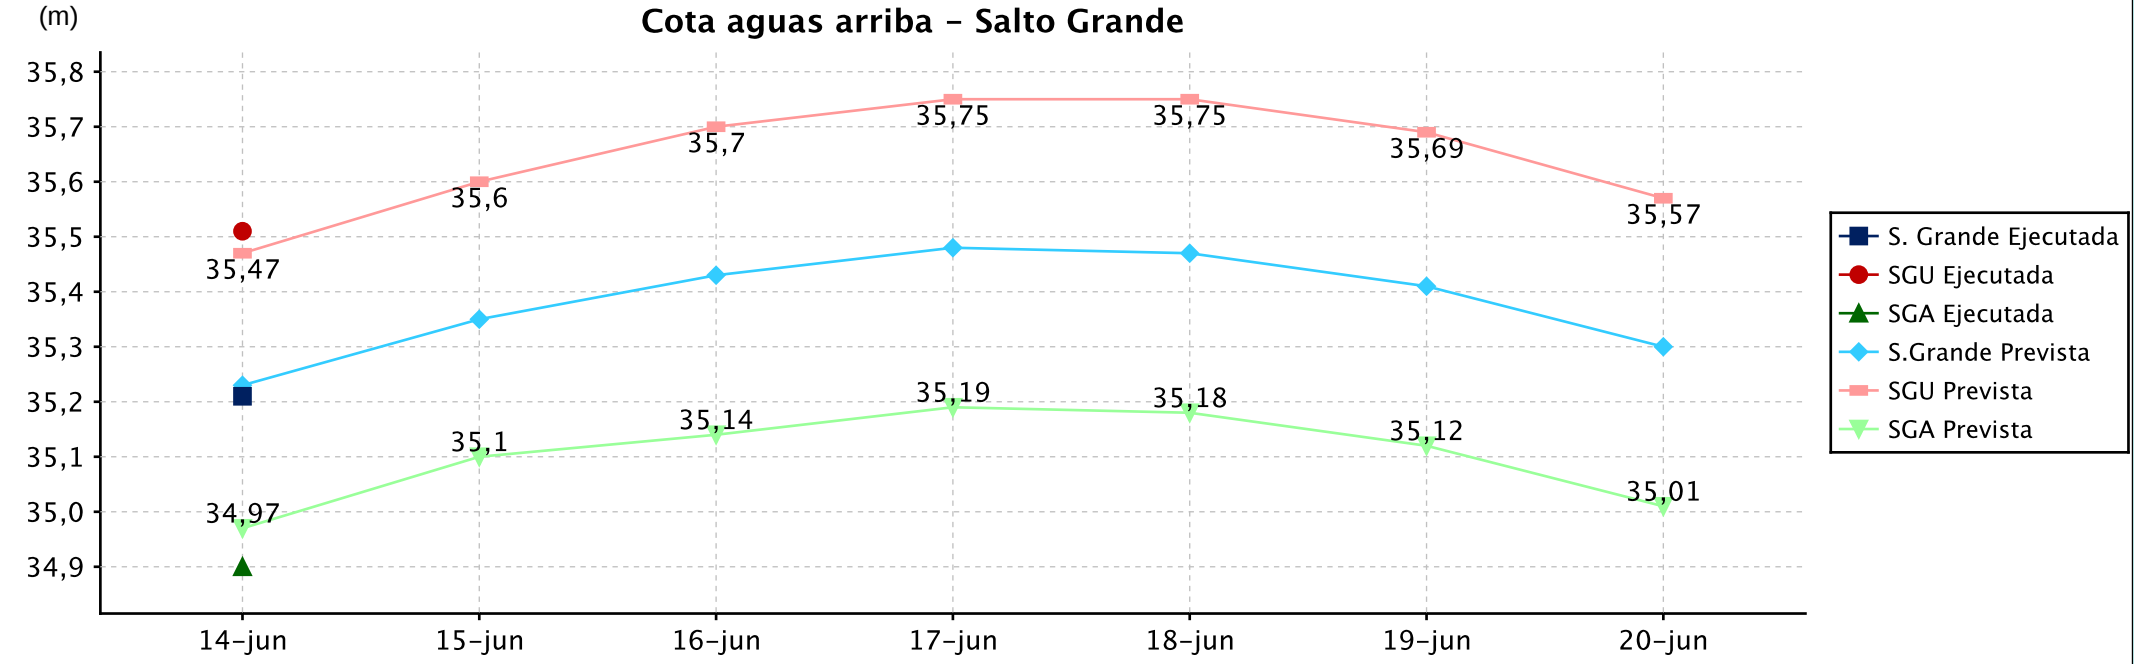

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,51
Cota Vista Arg	34,90
Cota real	35,21
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	14.658

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	563	409
Baygorria	609	412
Palmar	578	387
SGU	4.091	4.321

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	578	714
Baygorria	85	264
Palmar	599	581
SGU	4.625	4.564

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	73	317

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
