



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)




ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 15 de junio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-51
Central P. del Tigre	-7
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	168
C. Baygorria	372
C. Palmar	3.222
C. Salto Grande	20.070
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.705
TOTAL Generación	27.468



Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	1.343
Hidráulica	1.343
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	1.343

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.125
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Diferencia (MWh)	-1.505
Ejecutada - Programada	-5,45 %

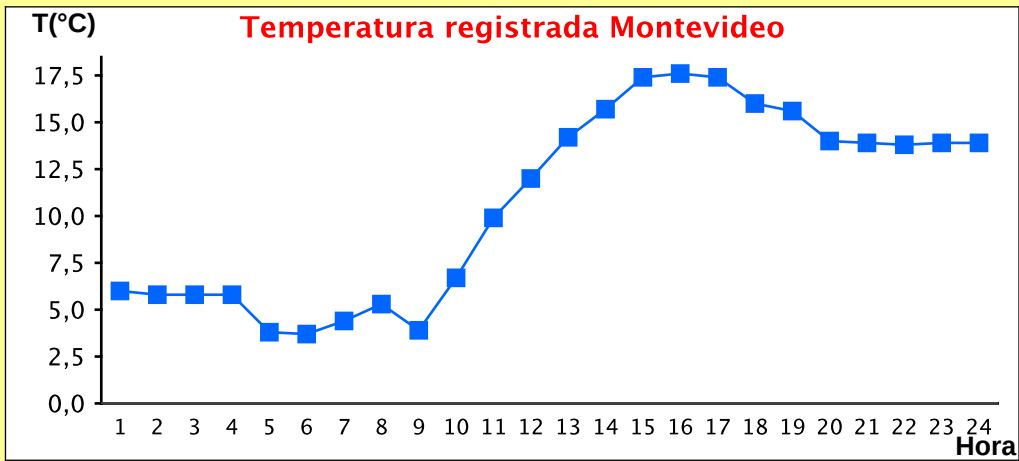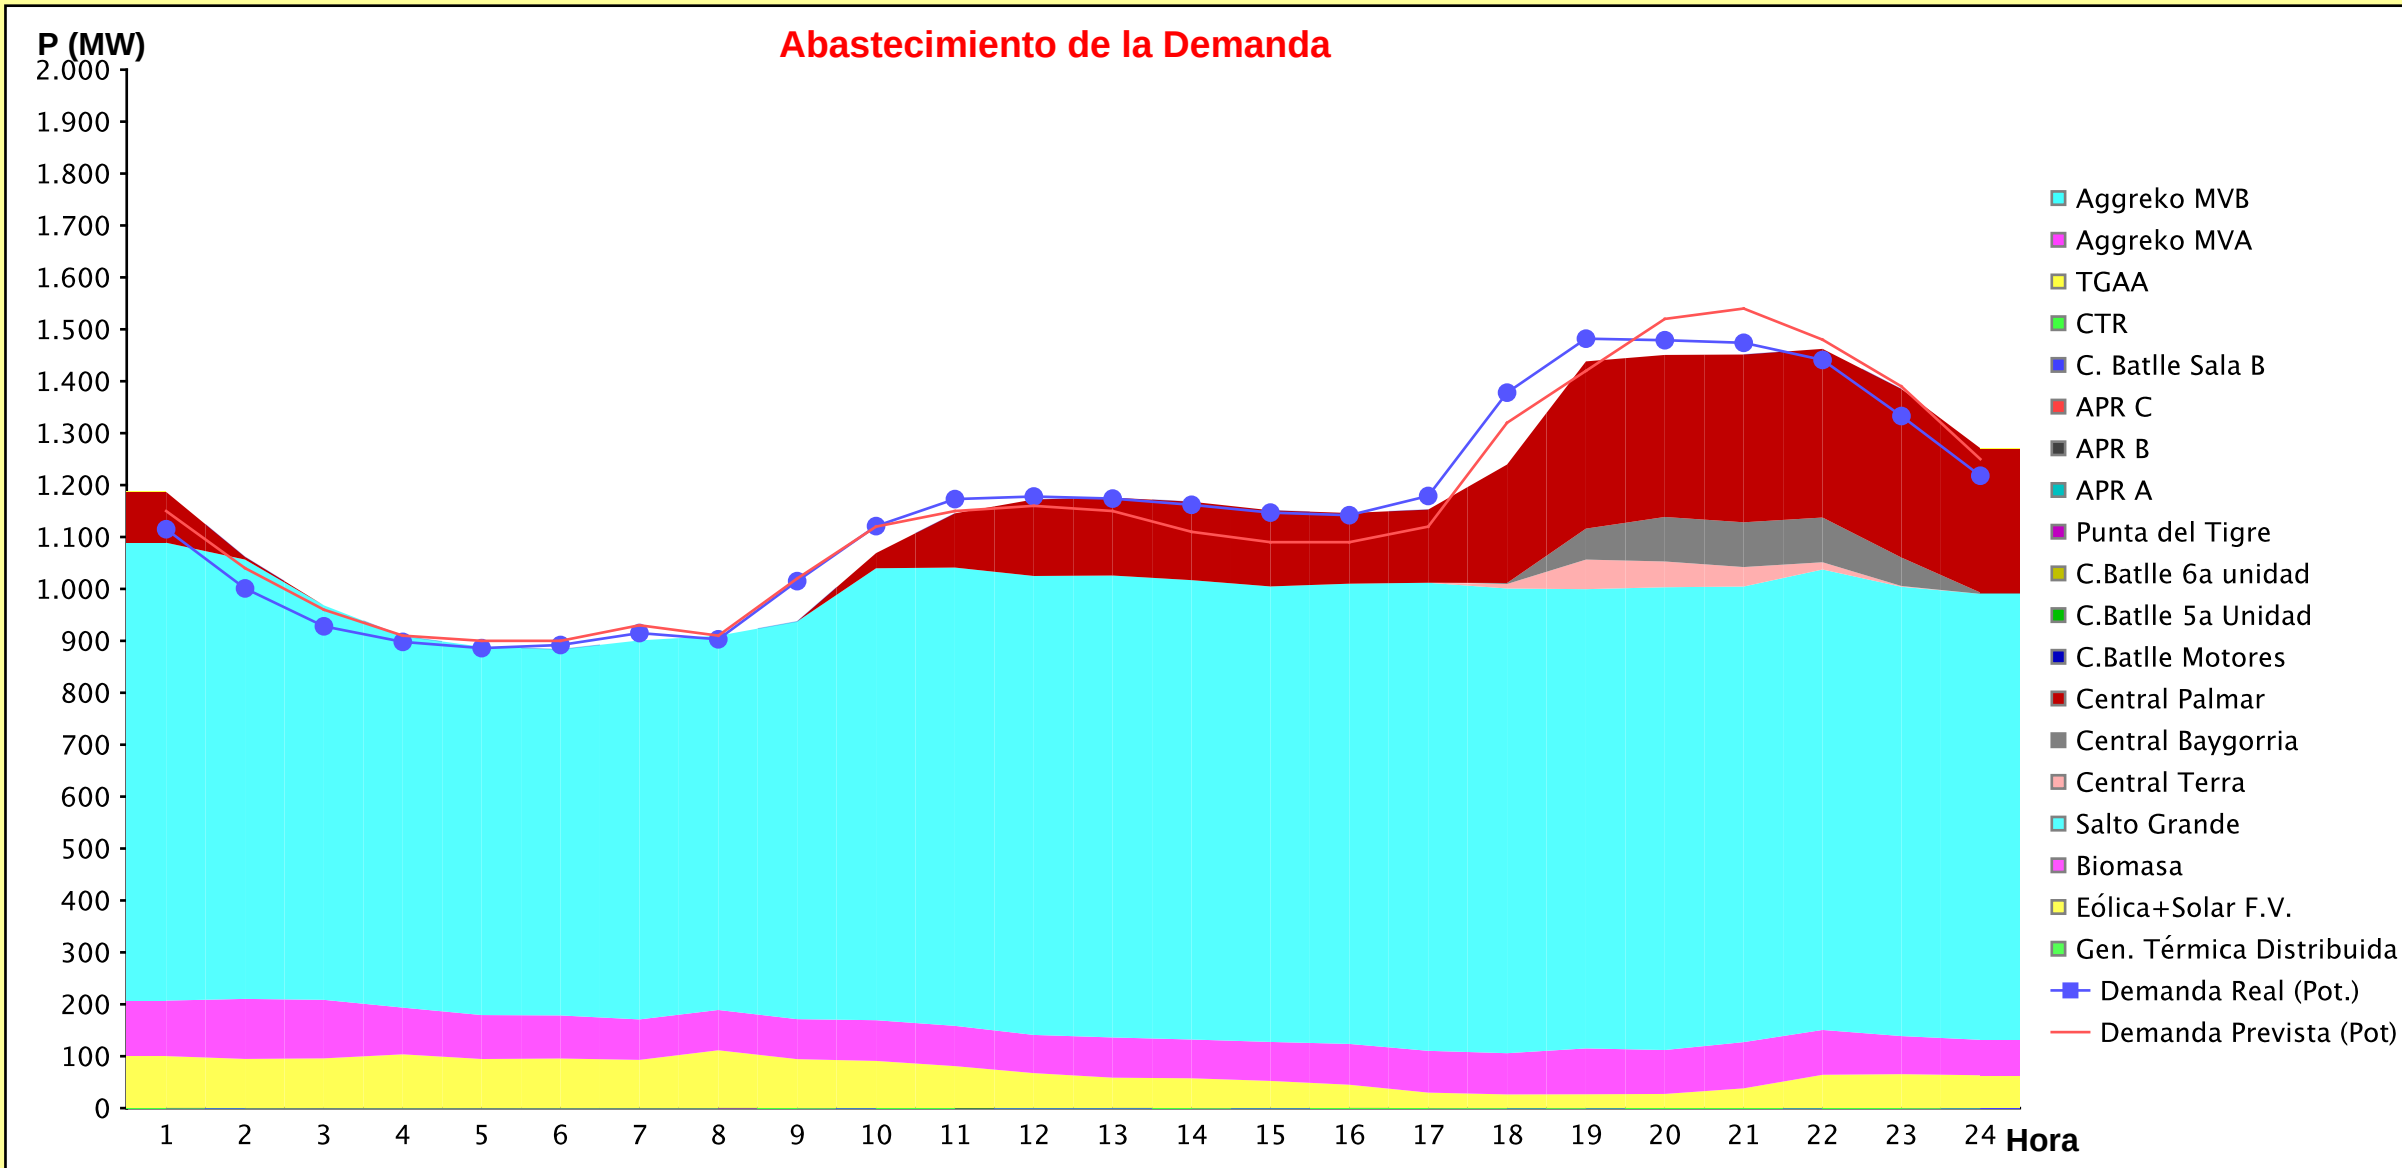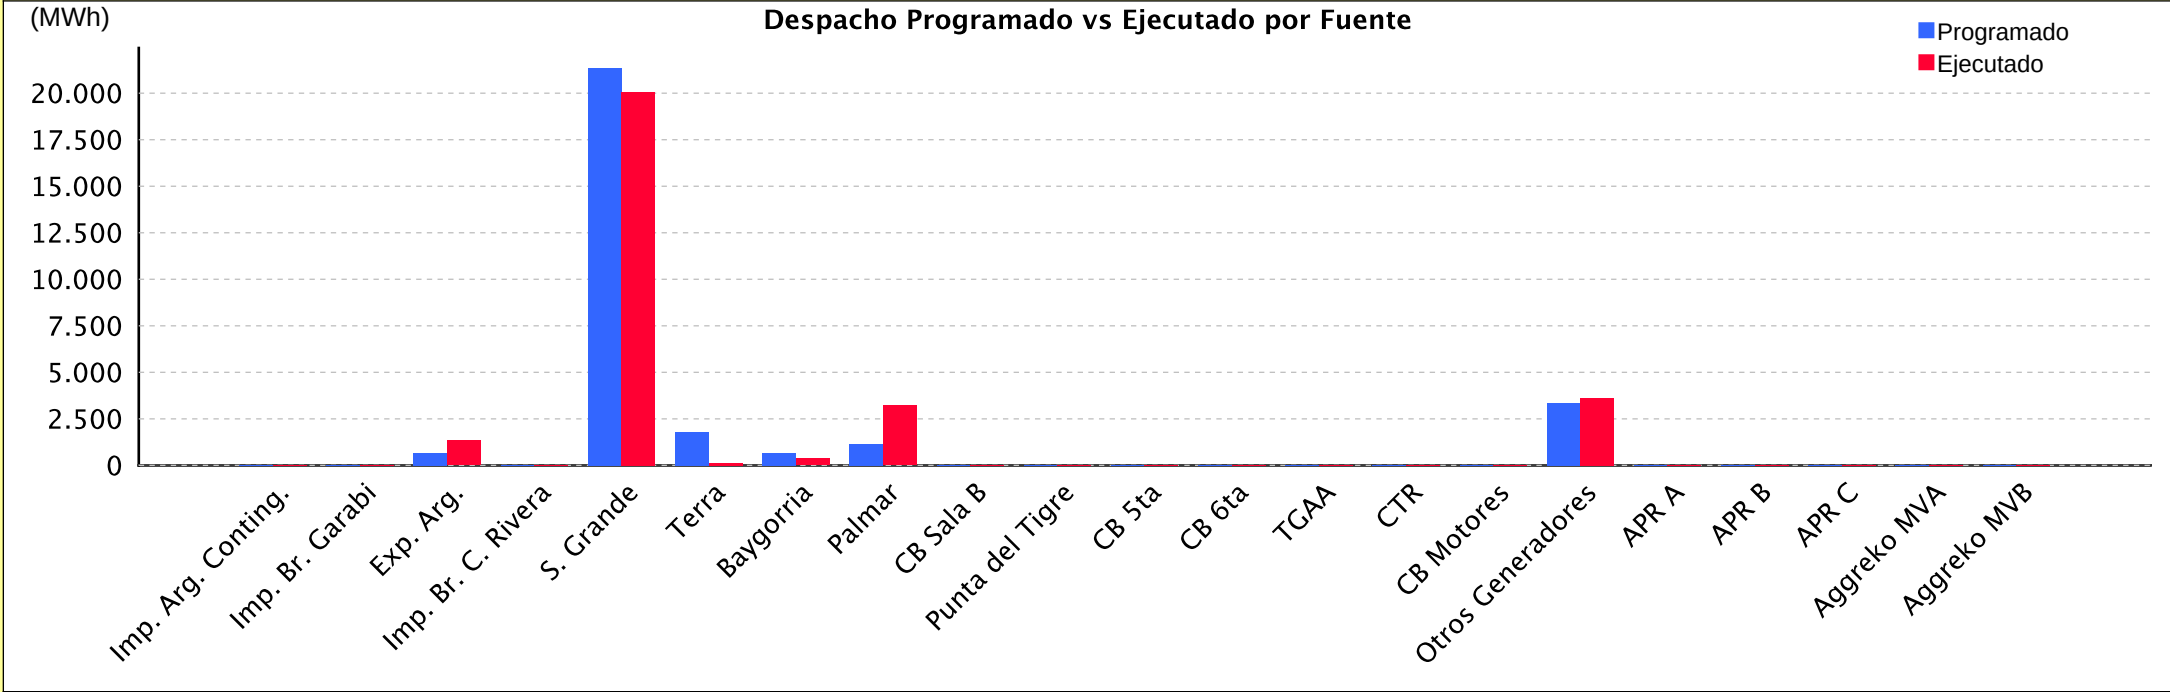



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1217,91 Hora 12:43
Potencia mínima:	920,63 Hora 05:07
Pico noche:	1514,12 Hora 21:07

Generación Media (MW)	
Eólica	70,1
Biomasa	84,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

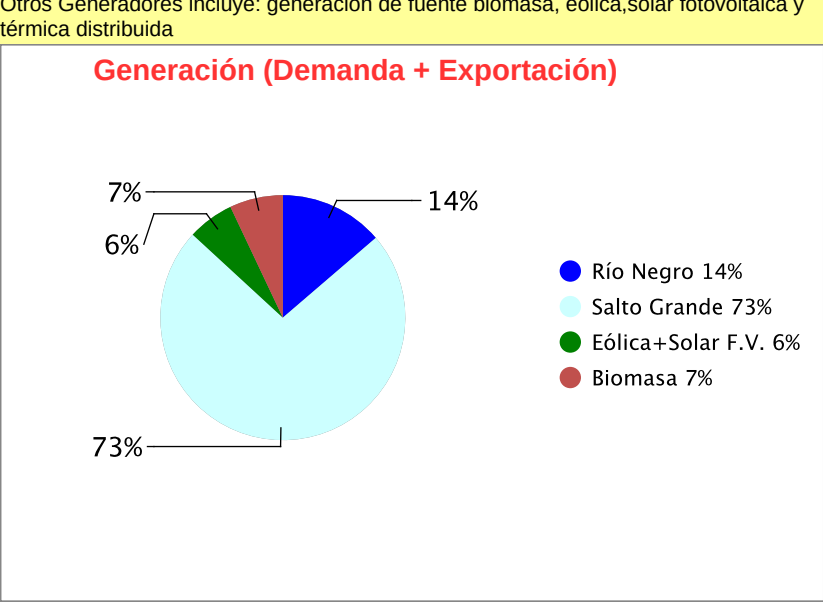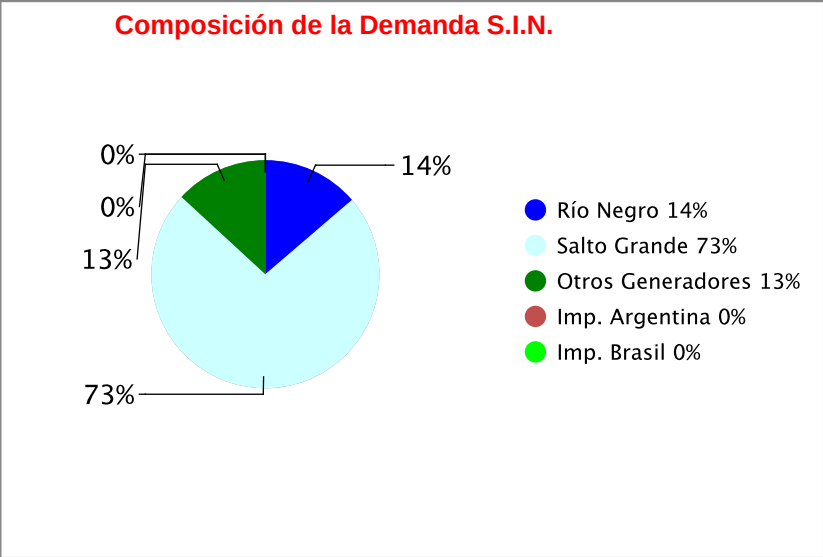



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

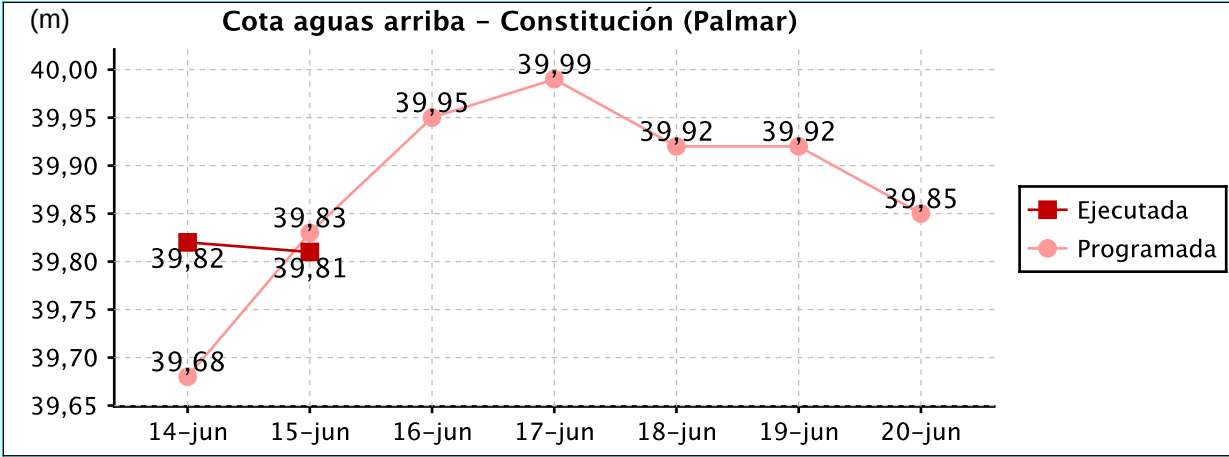
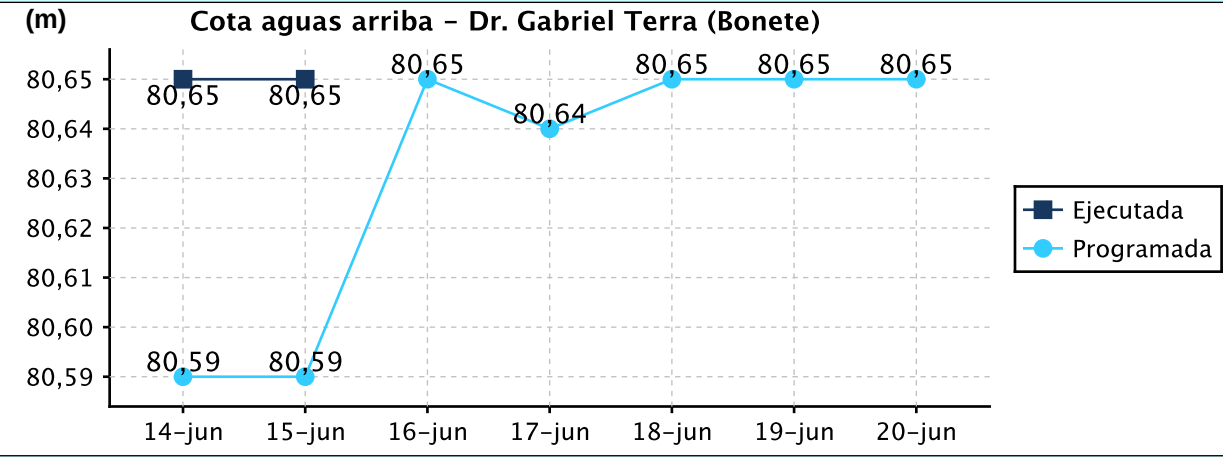


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,59	80,65
Baygorria	53,93	54,15
Palmar	39,83	39,81
SGU	35,60	35,61

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

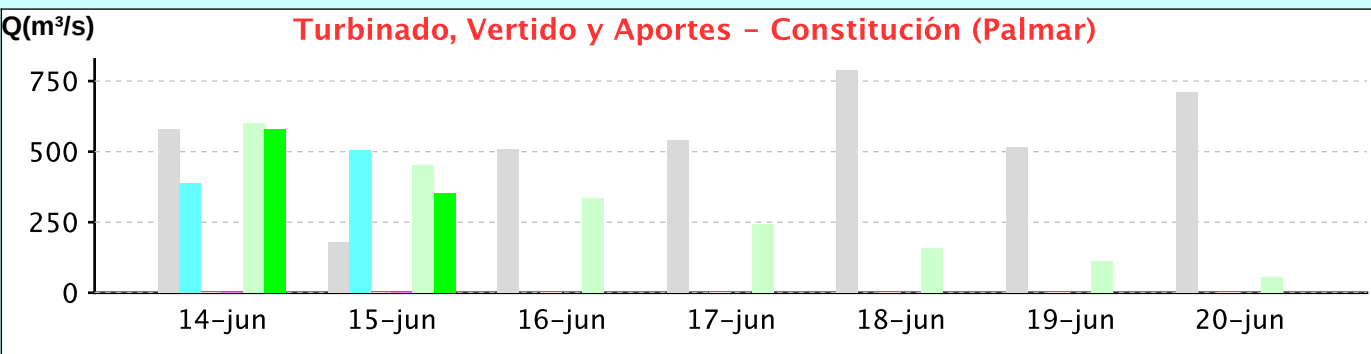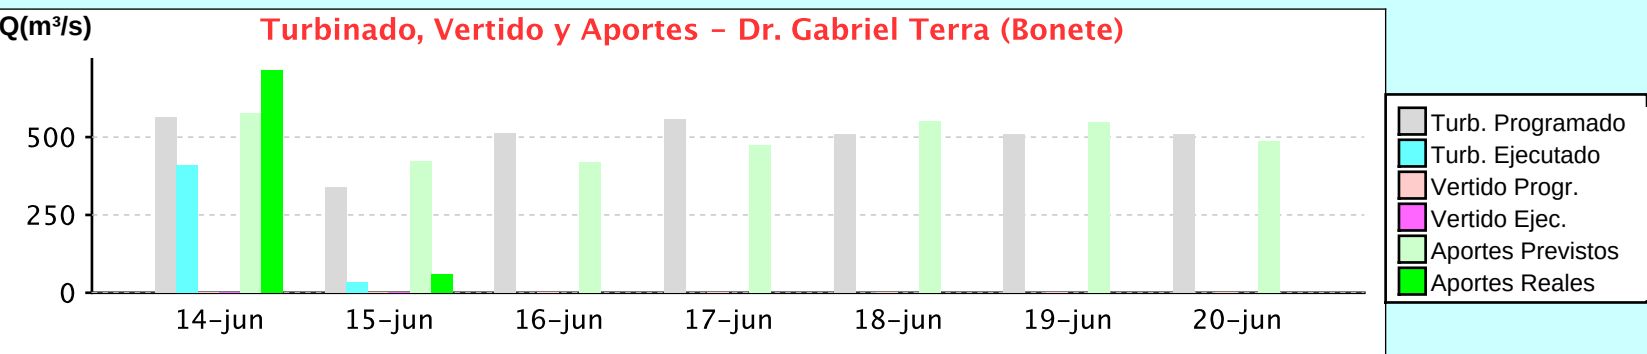

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

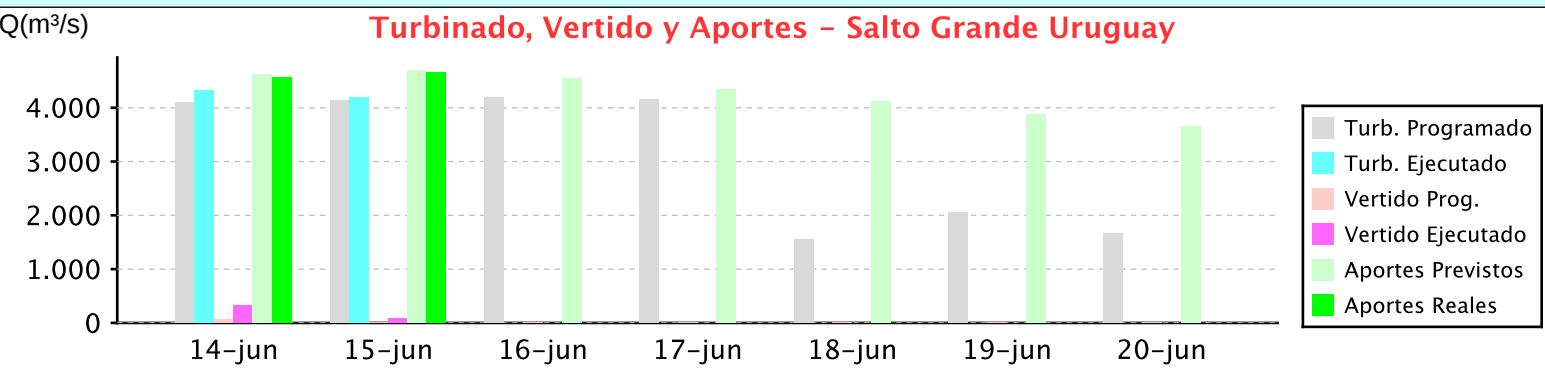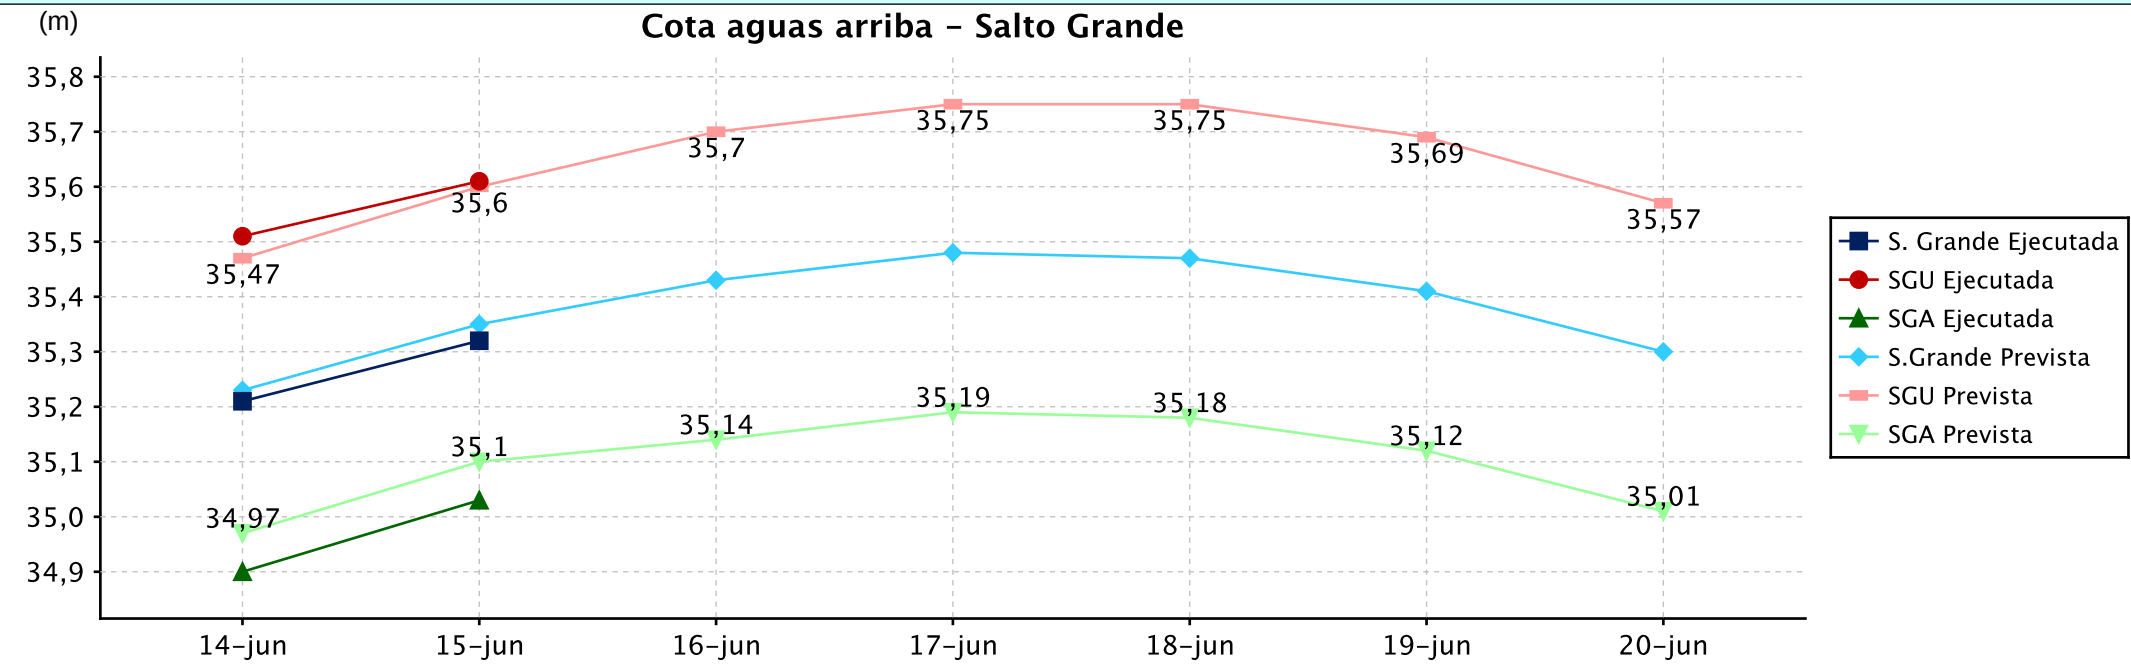

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,61
Cota Vista Arg	35,03
Cota real	35,32
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	14.134

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	339	32
Baygorria	235	132
Palmar	178	503
SGU	4.138	4.192

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	422	60
Baygorria	37	48
Palmar	453	352
SGU	4.700	4.648

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	85

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
