



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 17 de junio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	280
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	284
Central La Tablada	-45
Central P. del Tigre	203
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.894
C. Baygorria	1.731
C. Palmar	3.931
C. Salto Grande	21.279
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.249
TOTAL Generación	33.516

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	490
Hidráulica	490
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	490




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	33.026
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	33.030
Diferencia (MWh)	-4
Ejecutada - Programada	-0,01 %

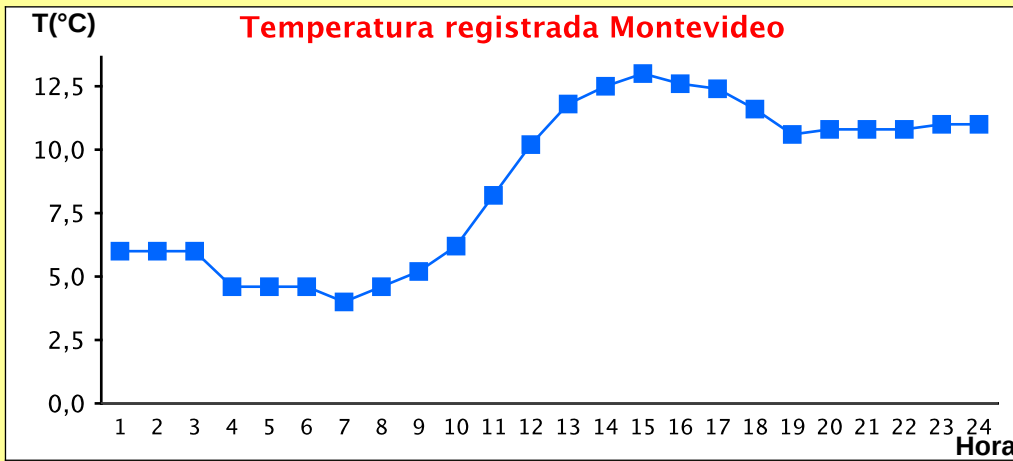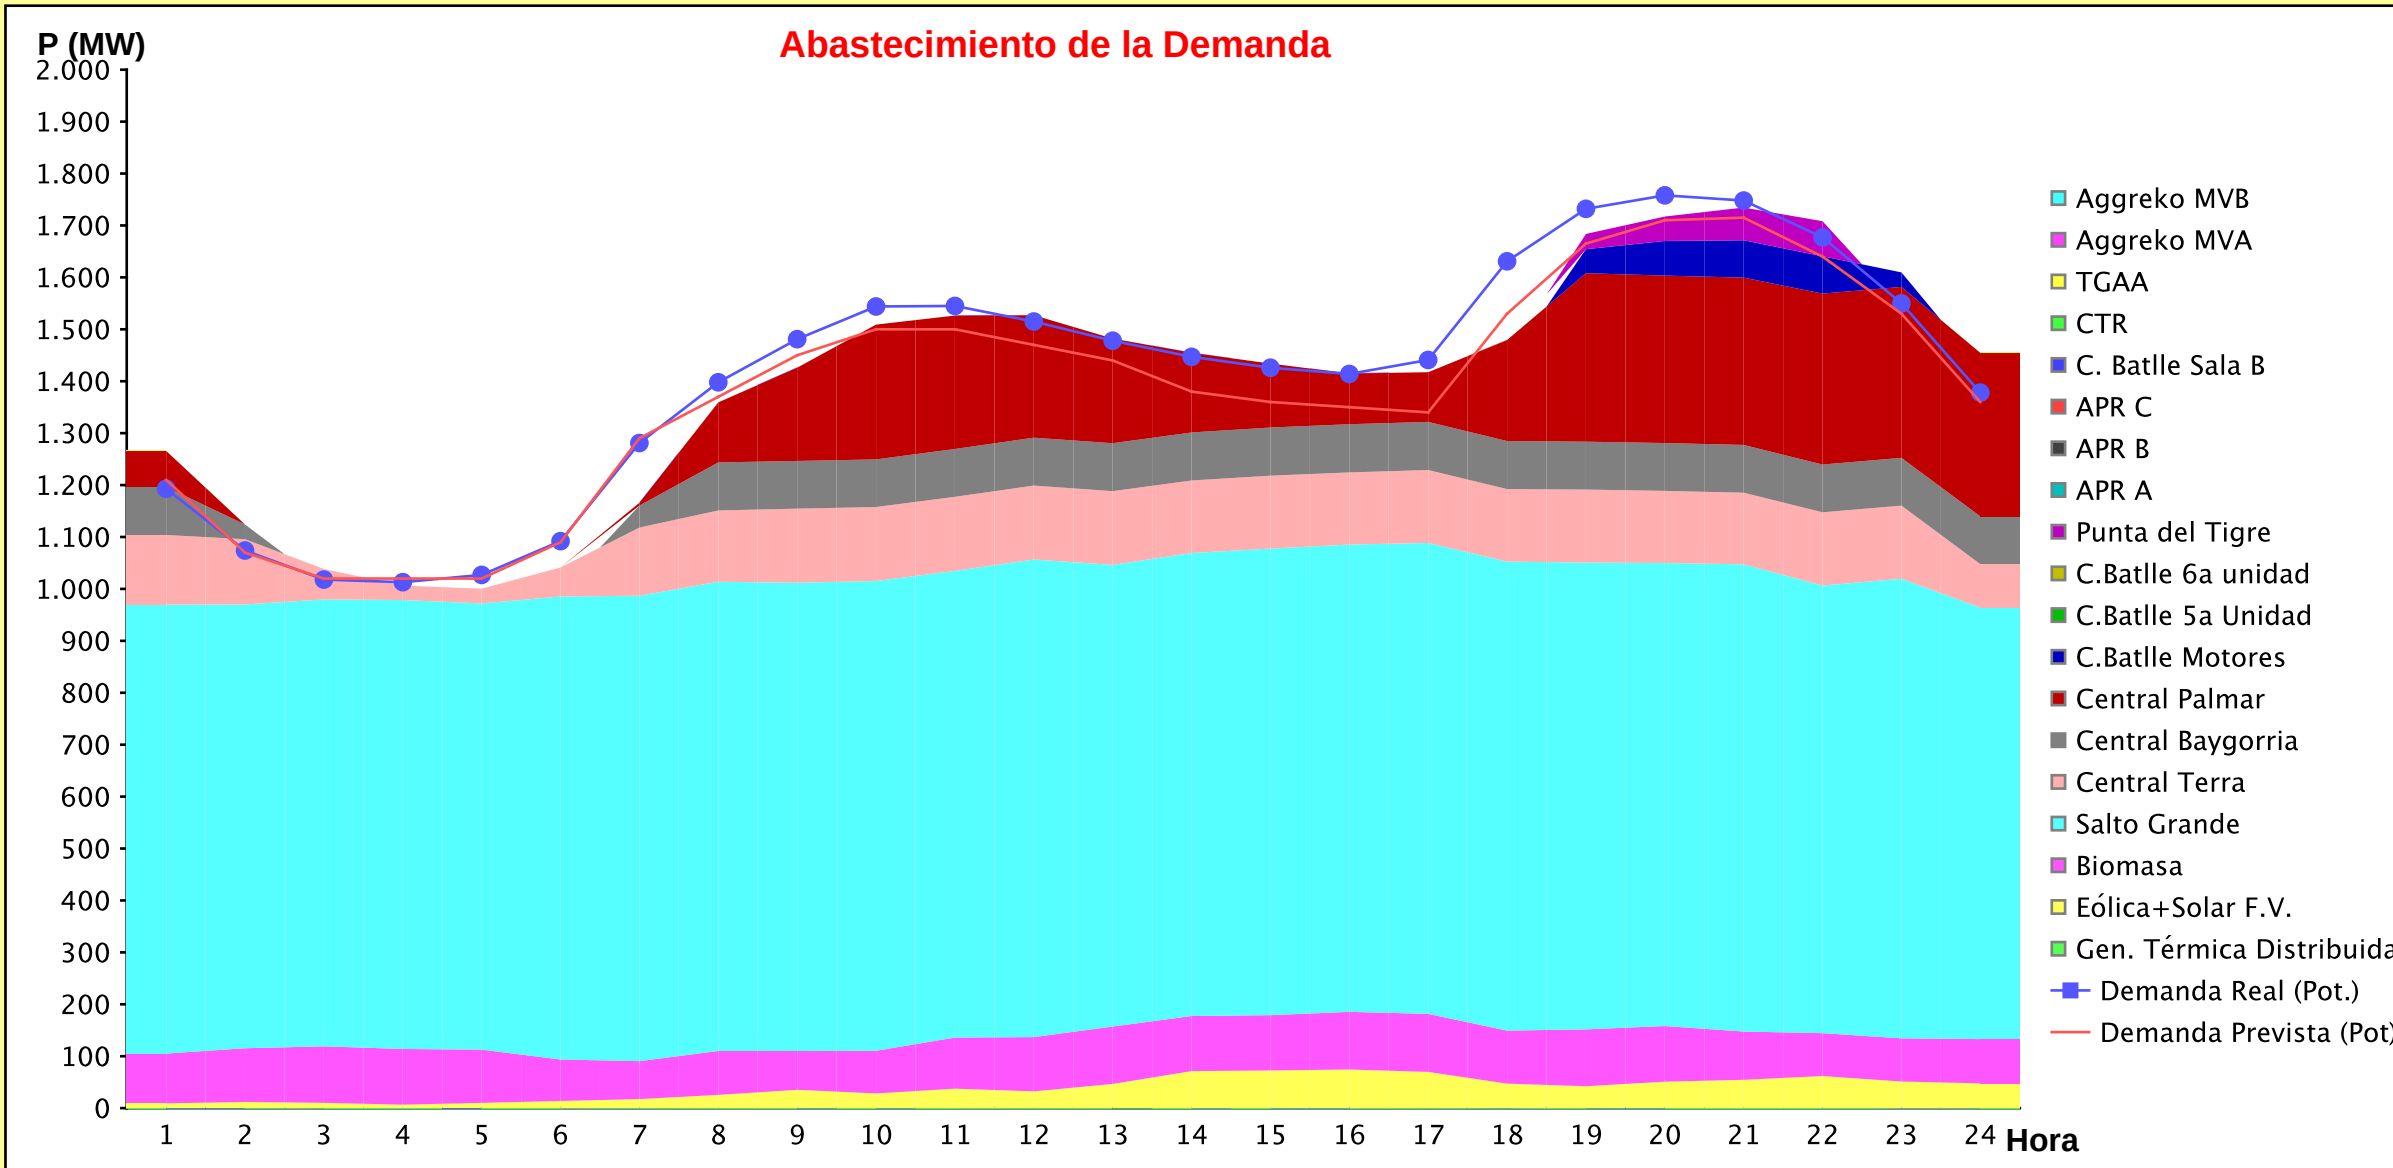



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1562,3 Hora 11:21
Potencia mínima:	1000,98 Hora 04:06
Pico noche:	1768,33 Hora 19:58

Generación Media (MW)	
Eólica	39,3
Biomasa	97,8
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

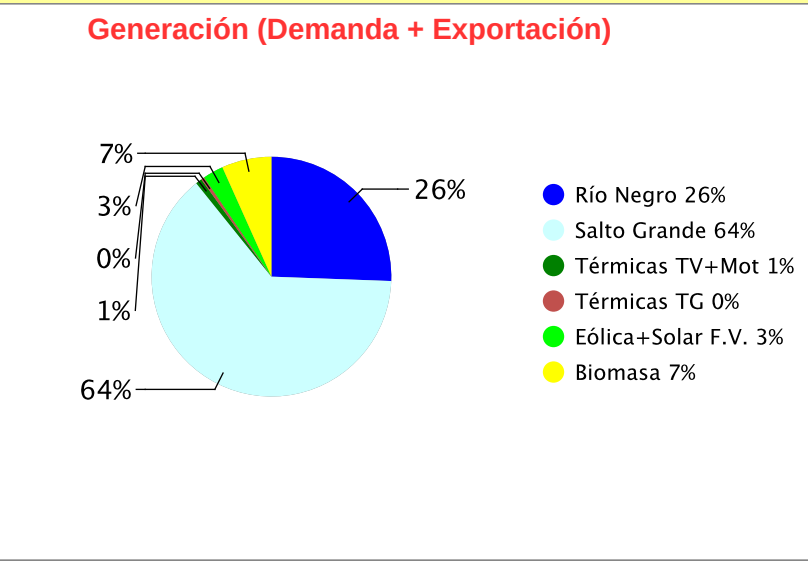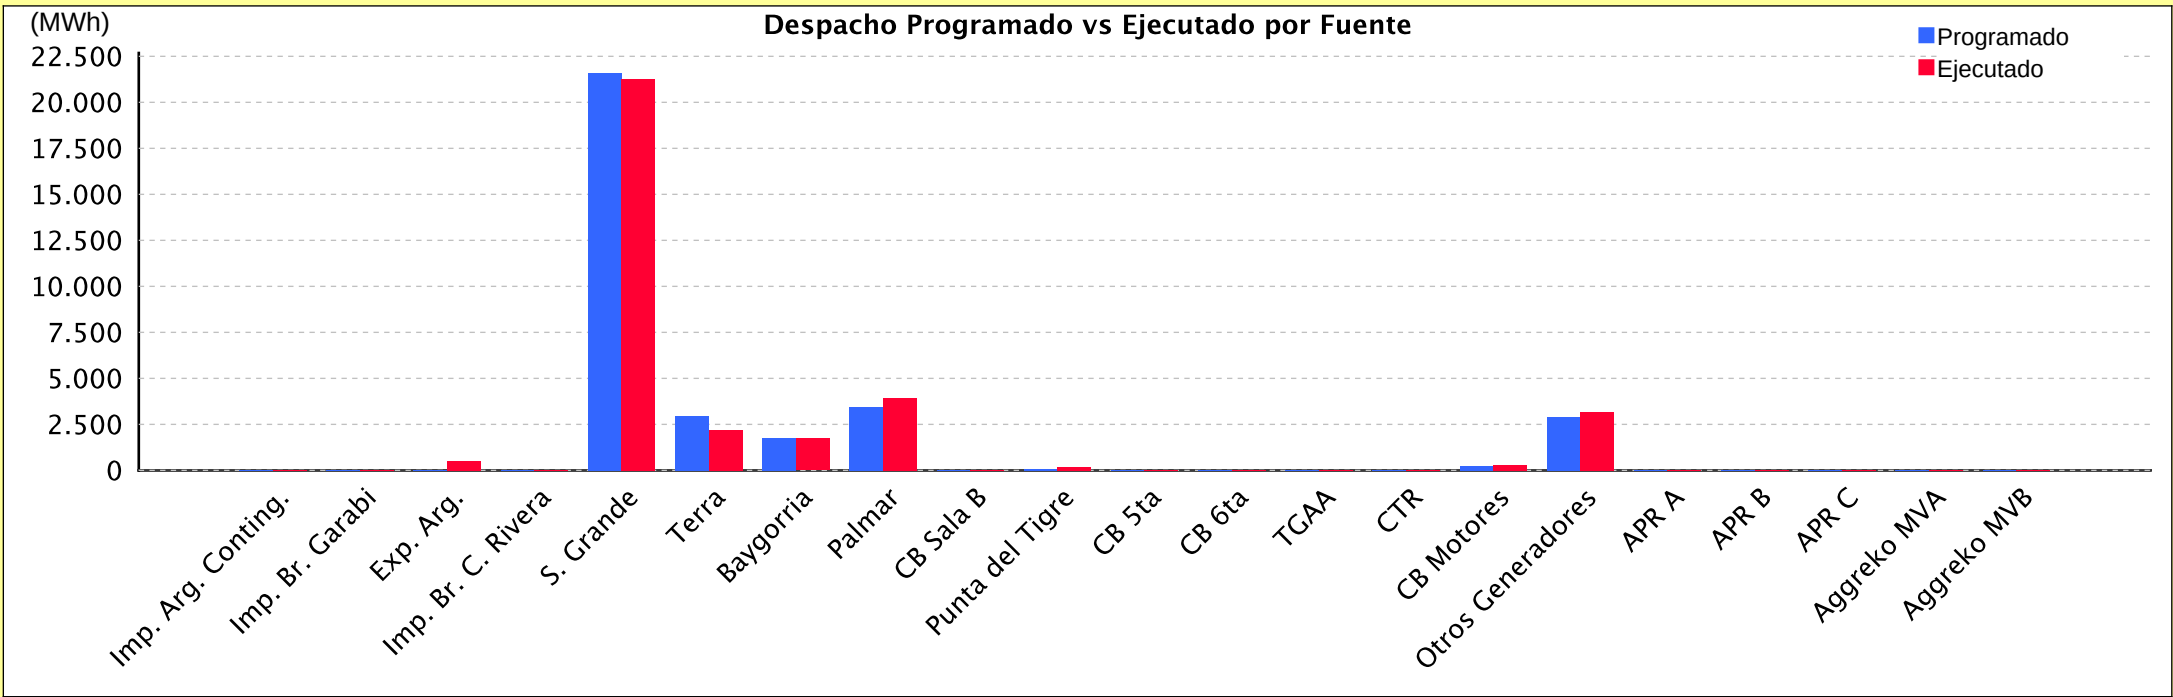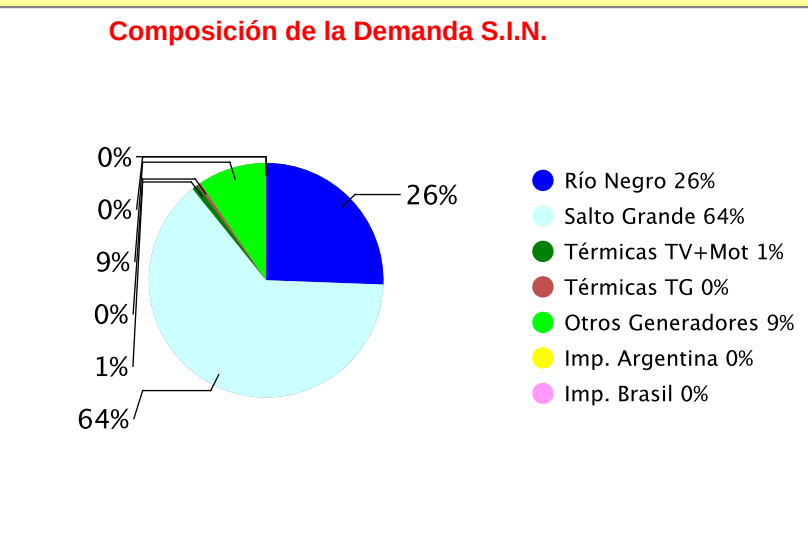



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

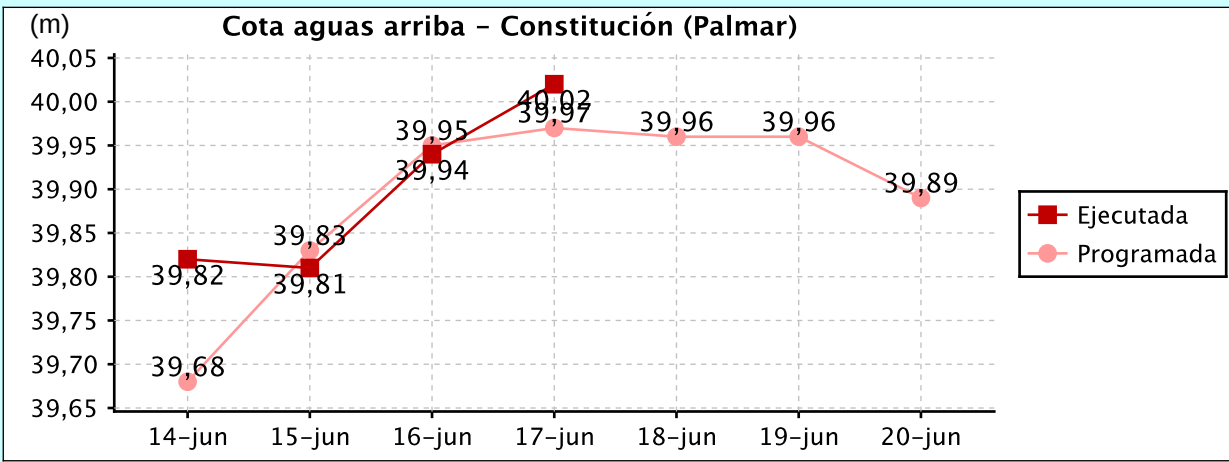
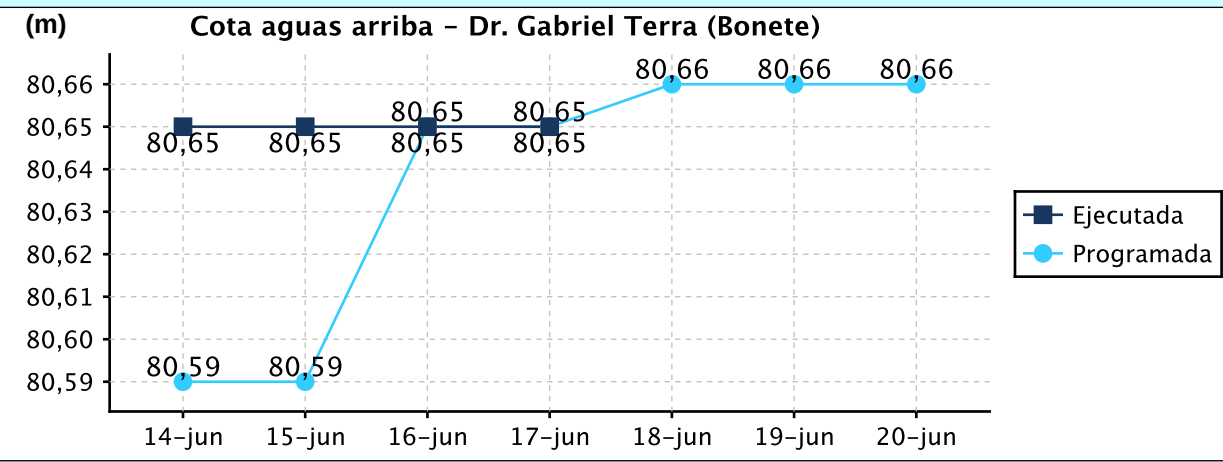


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,65	80,65
Baygorria	54,03	53,94
Palmar	39,97	40,02
SGU	35,80	35,75

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

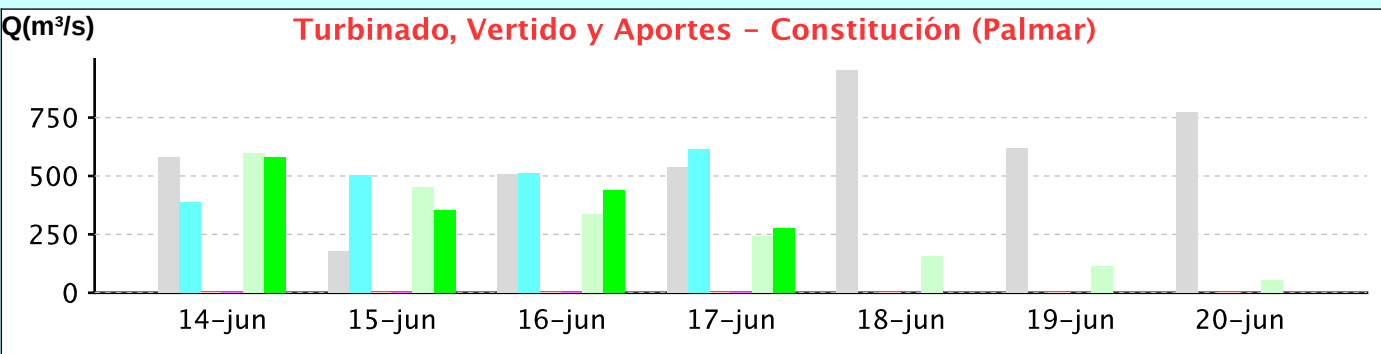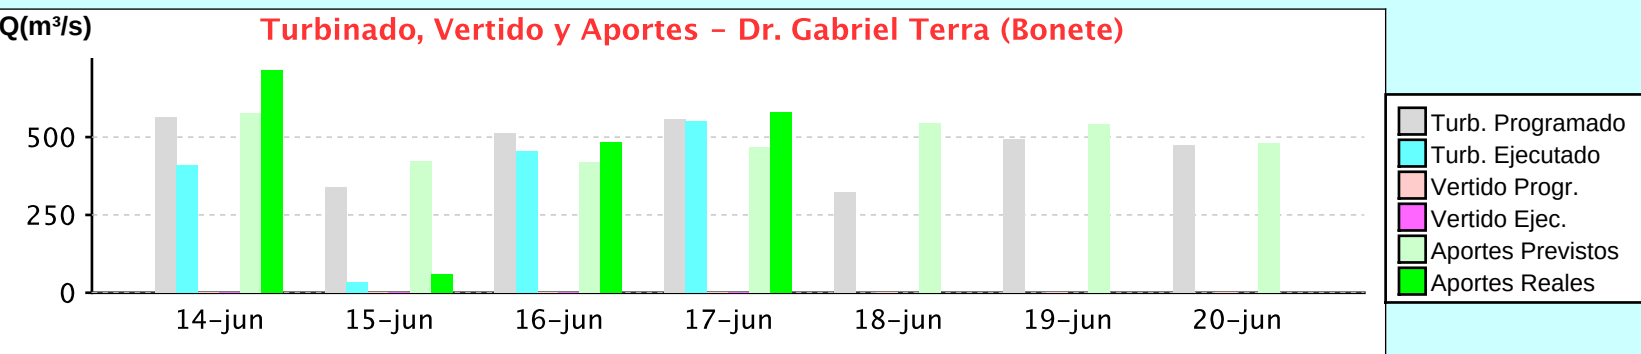

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

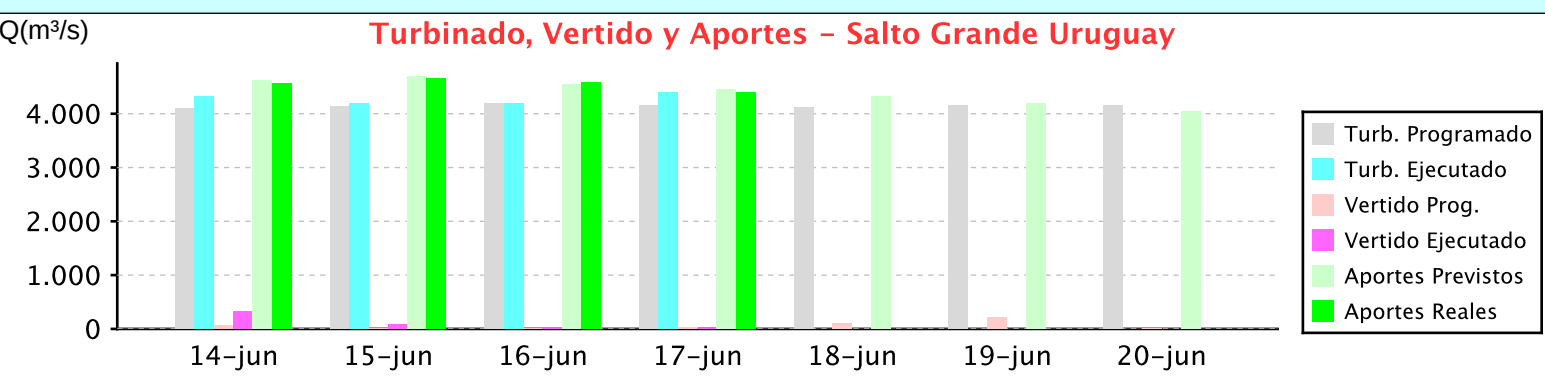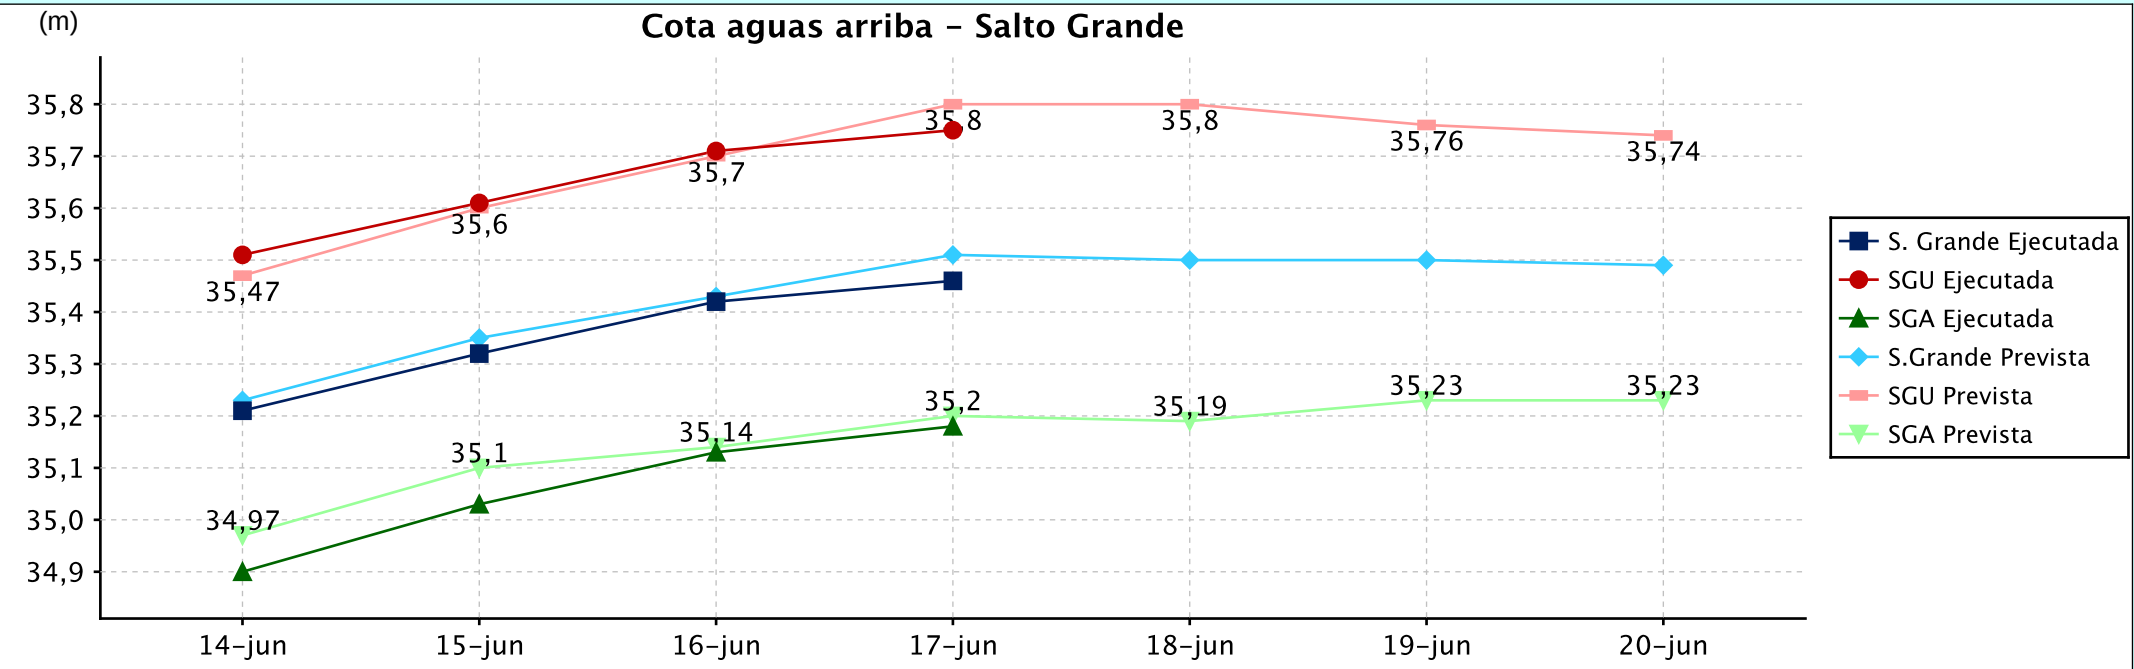

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,75
Cota Vista Arg	35,18
Cota real	35,46

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	14.106
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	557	551
Baygorria	631	640
Palmar	539	613
SGU	4.161	4.404

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	466	578
Baygorria	0	49
Palmar	241	278
SGU	4.450	4.404

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	21	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
