



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 19 de junio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	190
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	194
Central La Tablada	-45
Central P. del Tigre	116
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.535
C. Baygorria	1.212
C. Palmar	4.930
C. Salto Grande	21.442
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.708
TOTAL Generación	32.082

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	483
Hidráulica	483
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	483




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.599
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	32.410
Diferencia (MWh)	-811
Ejecutada - Programada	-2,50 %

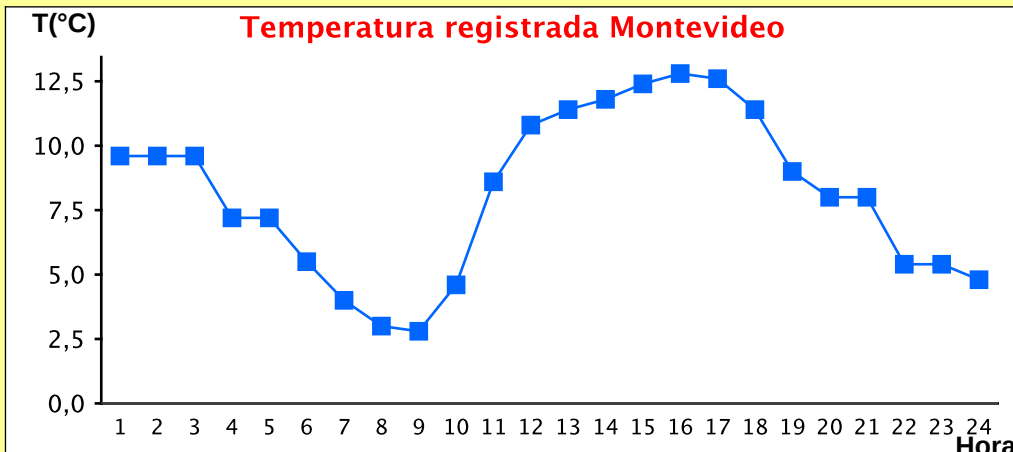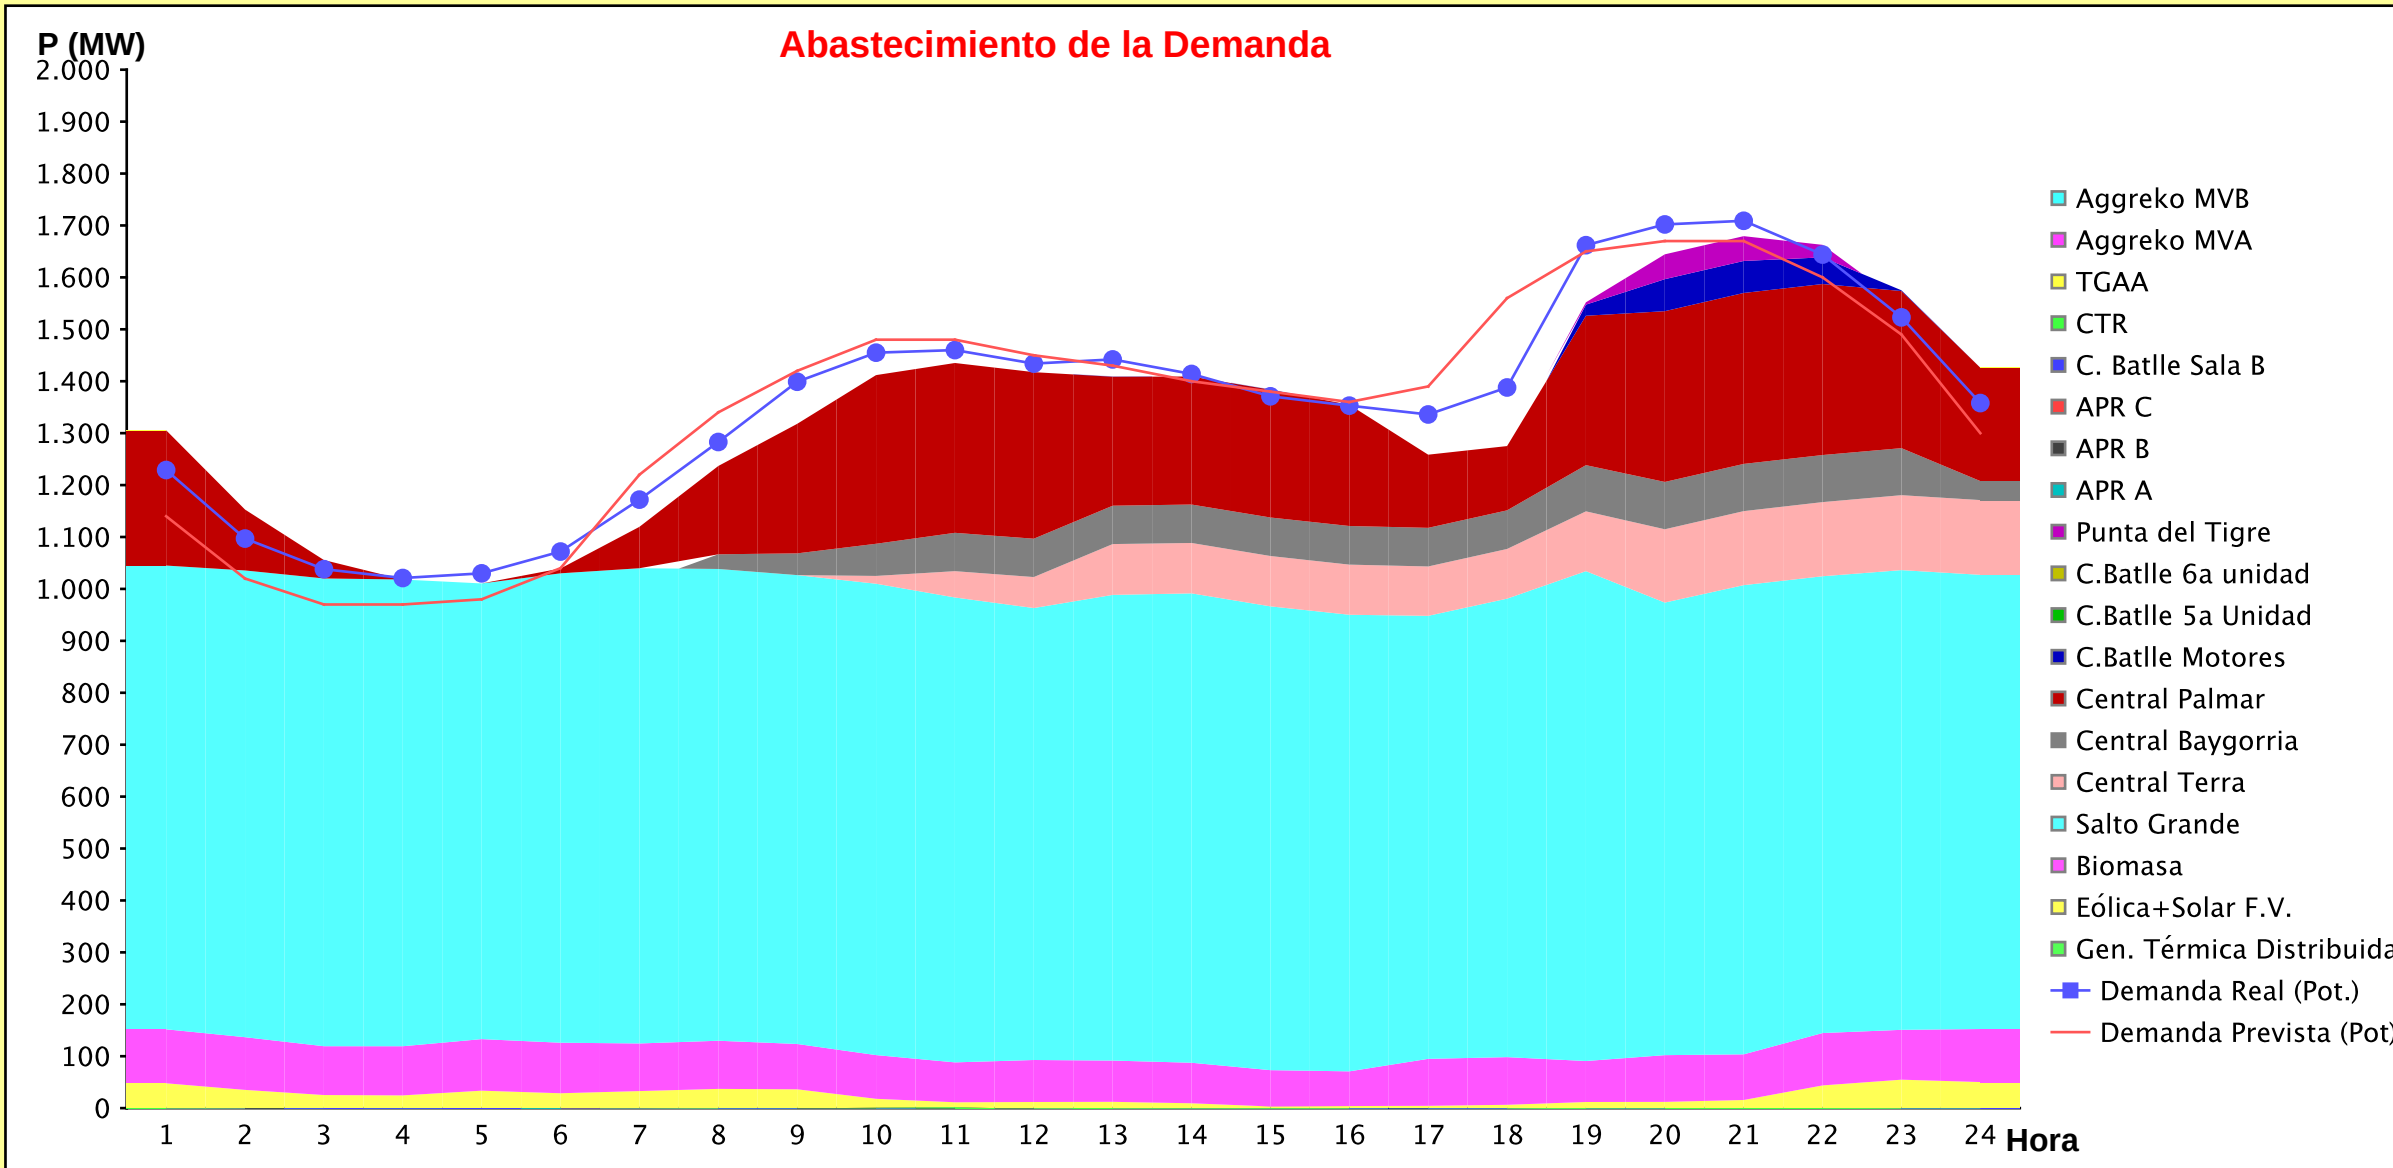



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1469,11 Hora 10:36
Potencia mínima:	1012,61 Hora 04:00
Pico noche:	1722,59 Hora 20:43

Generación Media (MW)	
Eólica	24,5
Biomasa	90,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,1
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

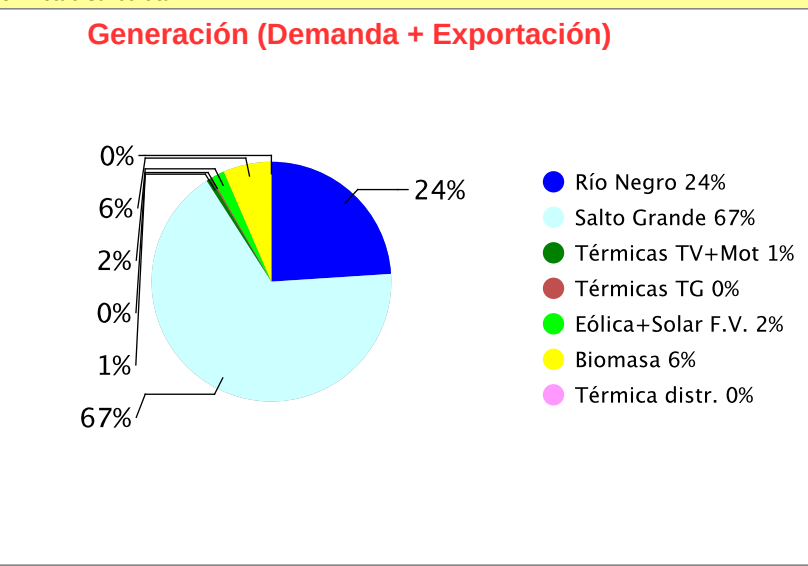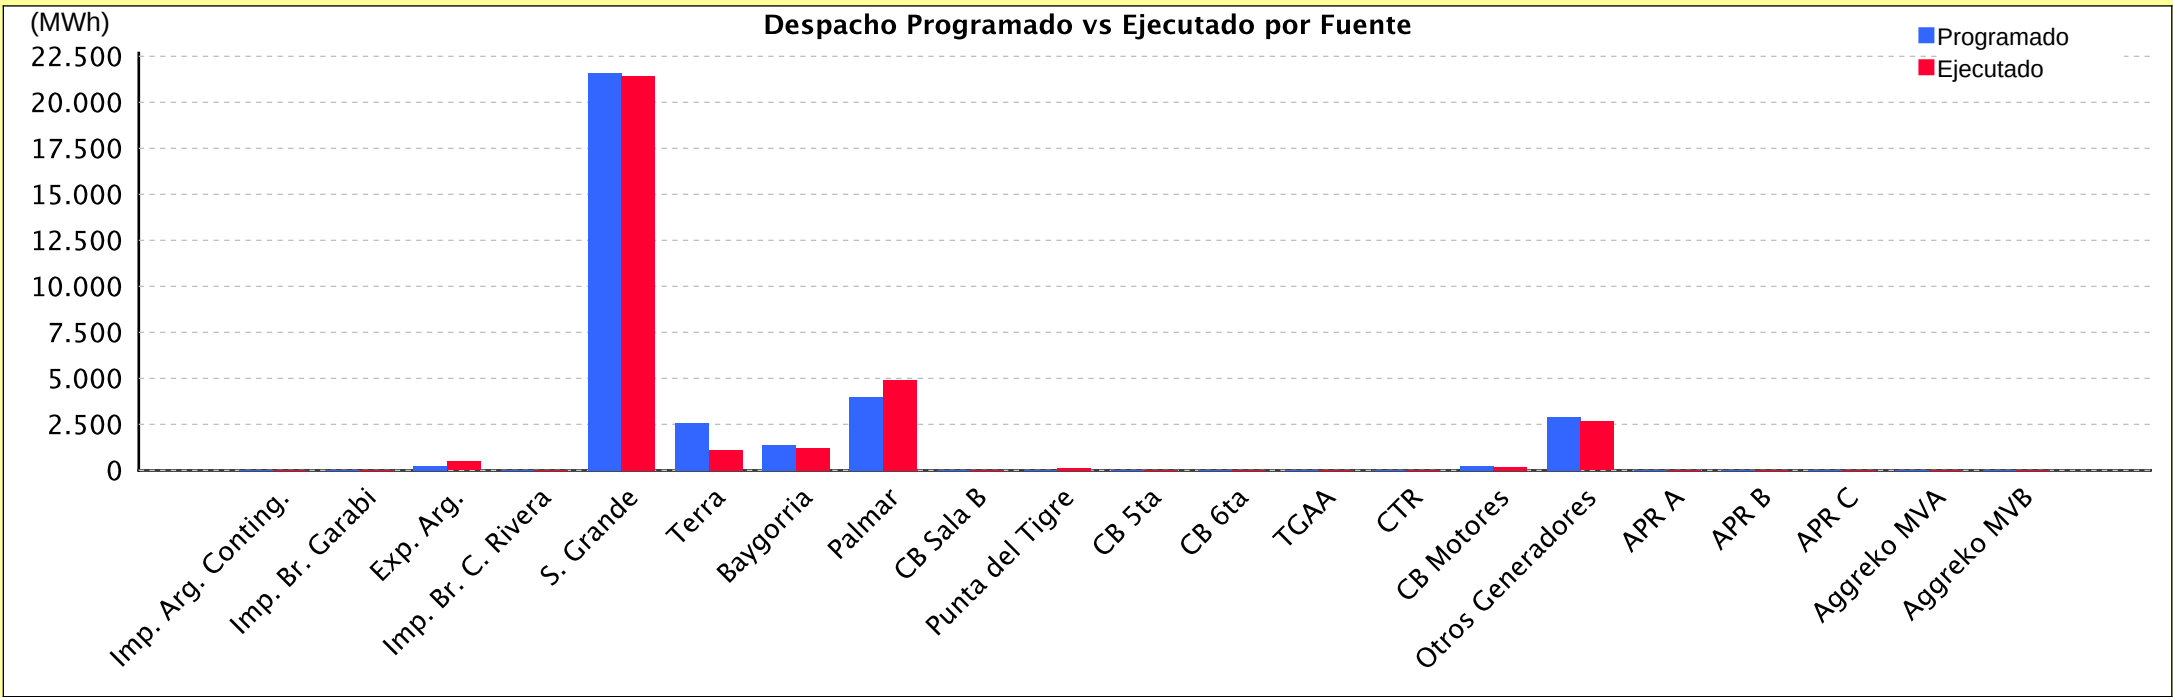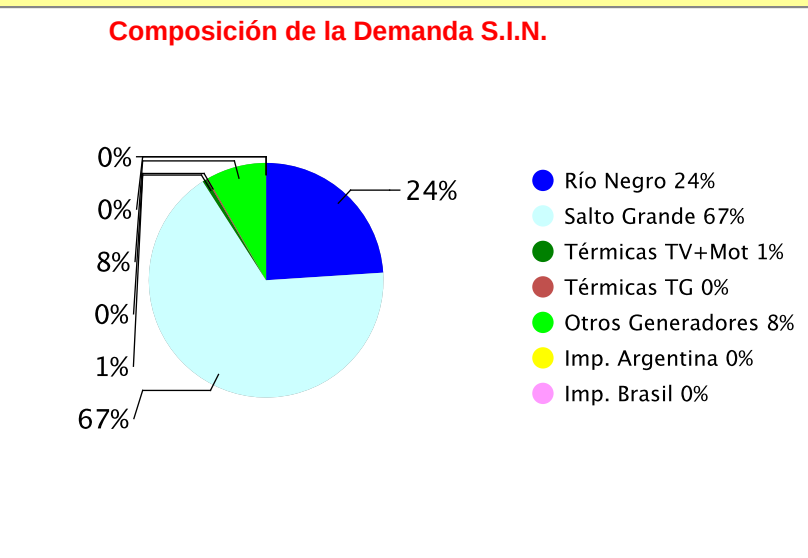



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

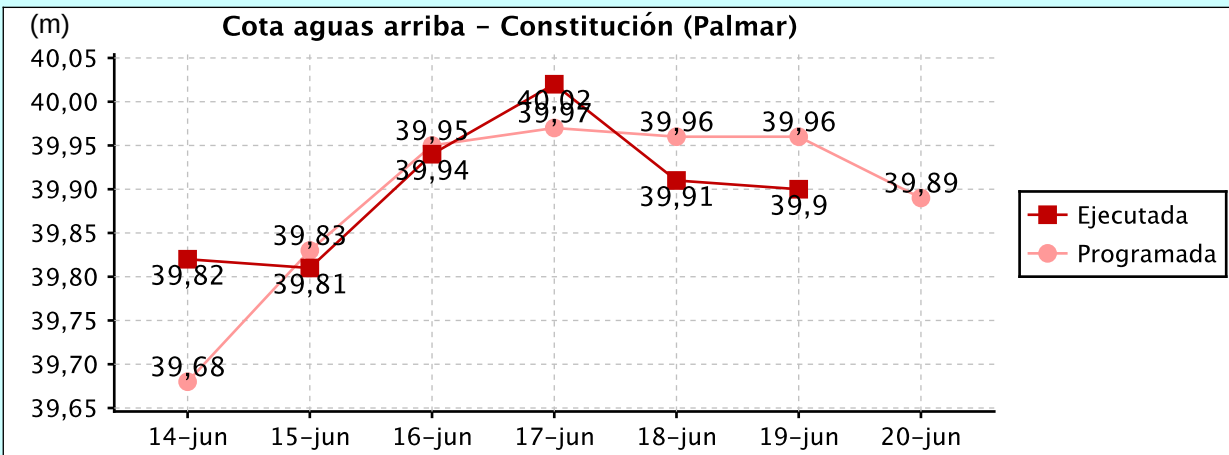
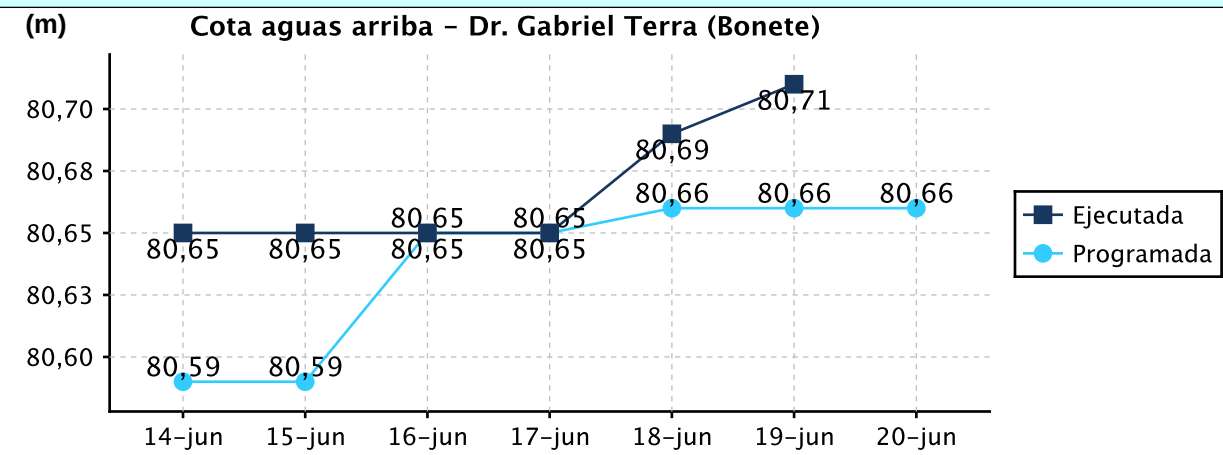


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,66	80,71
Baygorria	53,97	53,76
Palmar	39,96	39,9
SGU	35,76	35,76

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

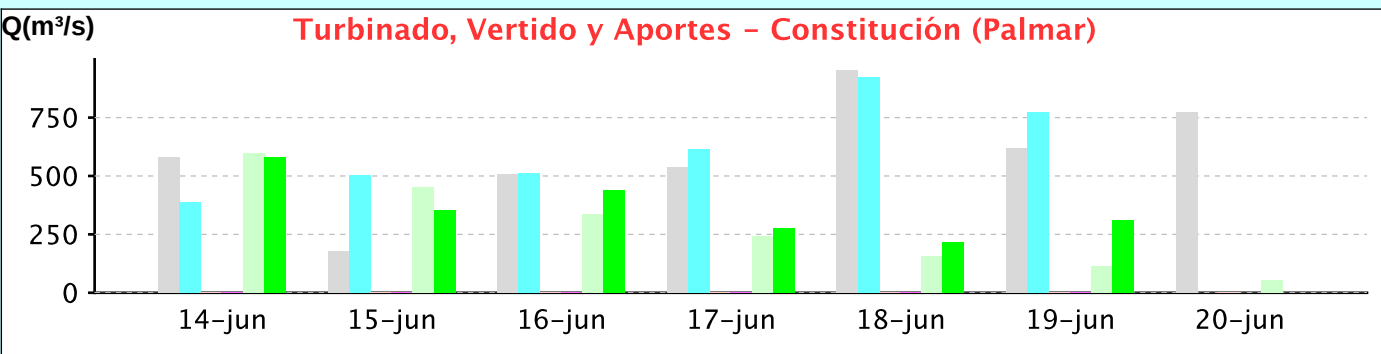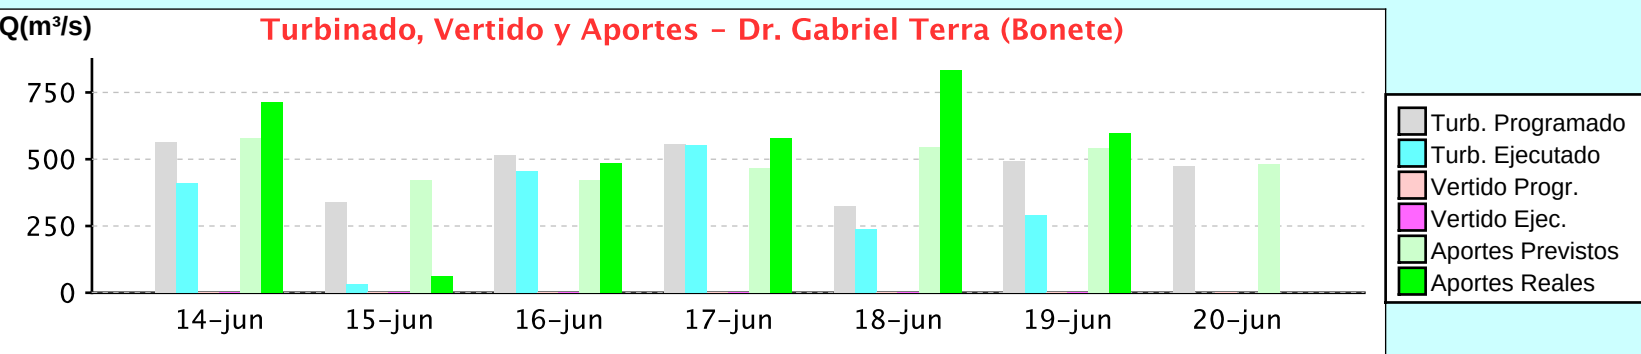

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

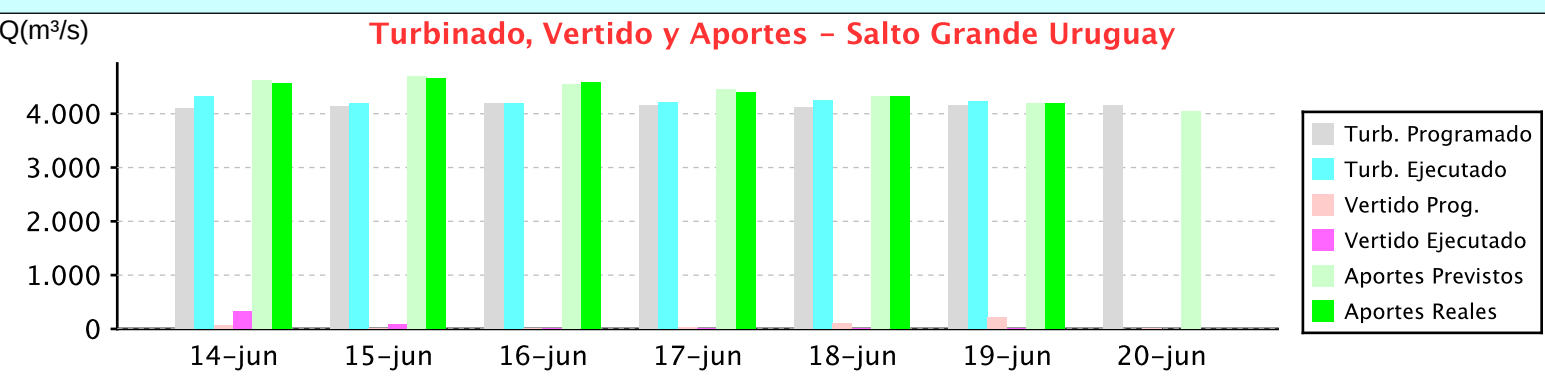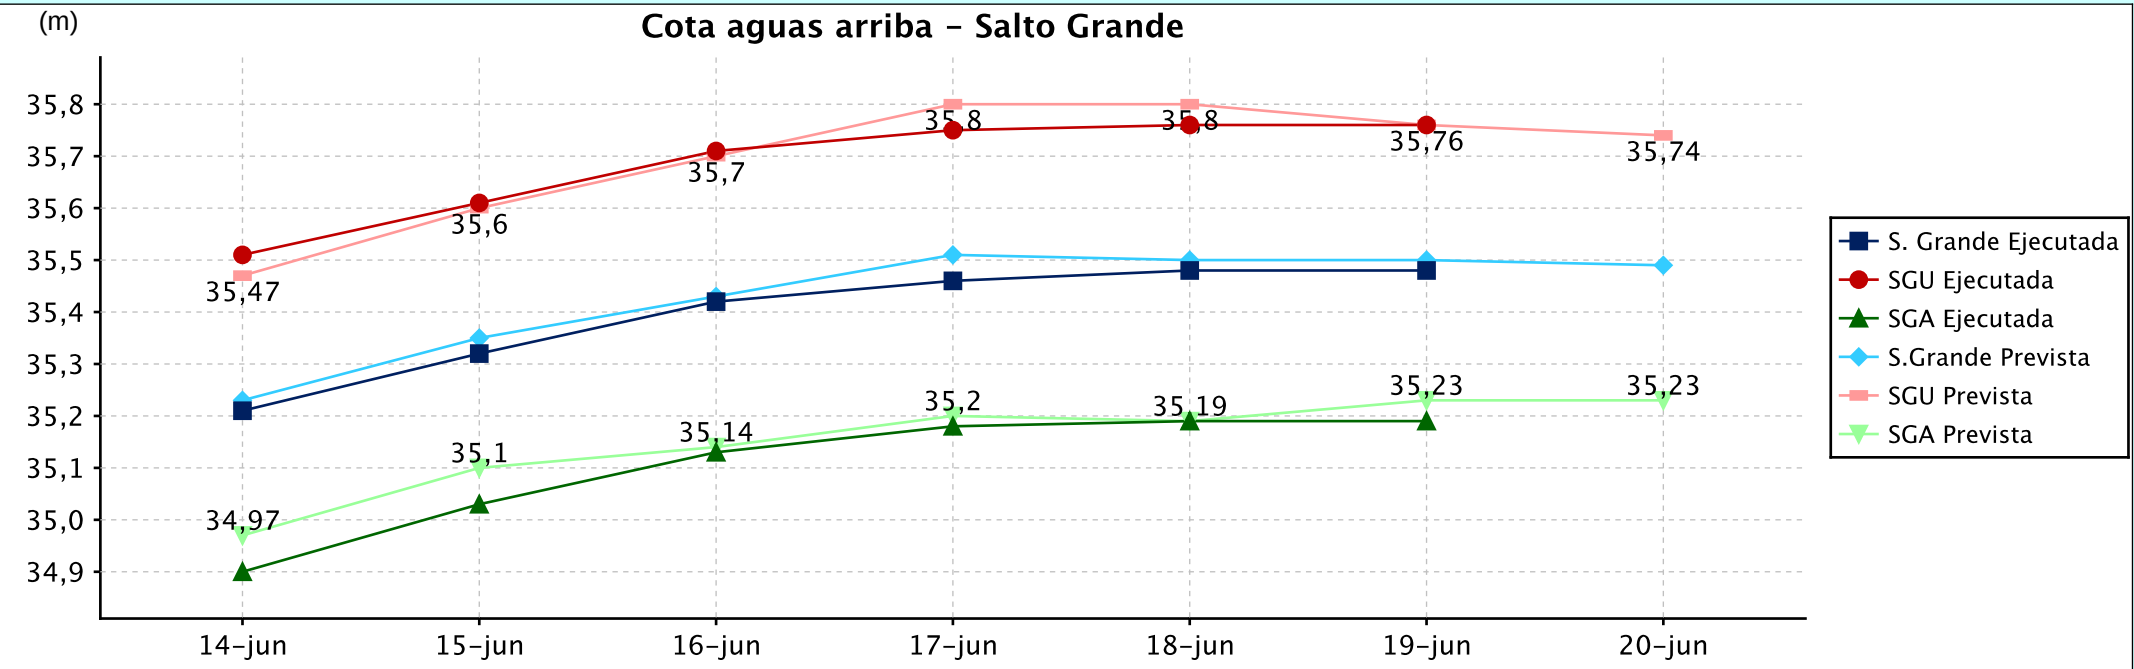

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,76
Cota Vista Arg	35,19
Cota real	35,48

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	13.888
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	493	290
Baygorria	494	442
Palmar	620	772
SGU	4.162	4.226

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	542	596
Baygorria	0	-15
Palmar	112	310
SGU	4.200	4.194

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	216	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
