




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


domingo 29 de junio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	3.518
Sala B	-4
5ta.	8
6ta.	2.044
Motores	1.470
Central La Tablada	-51
Central P. del Tigre	67
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.627
C. Baygorria	439
C. Palmar	2.992
C. Salto Grande	14.075
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.293
TOTAL Generación	28.954



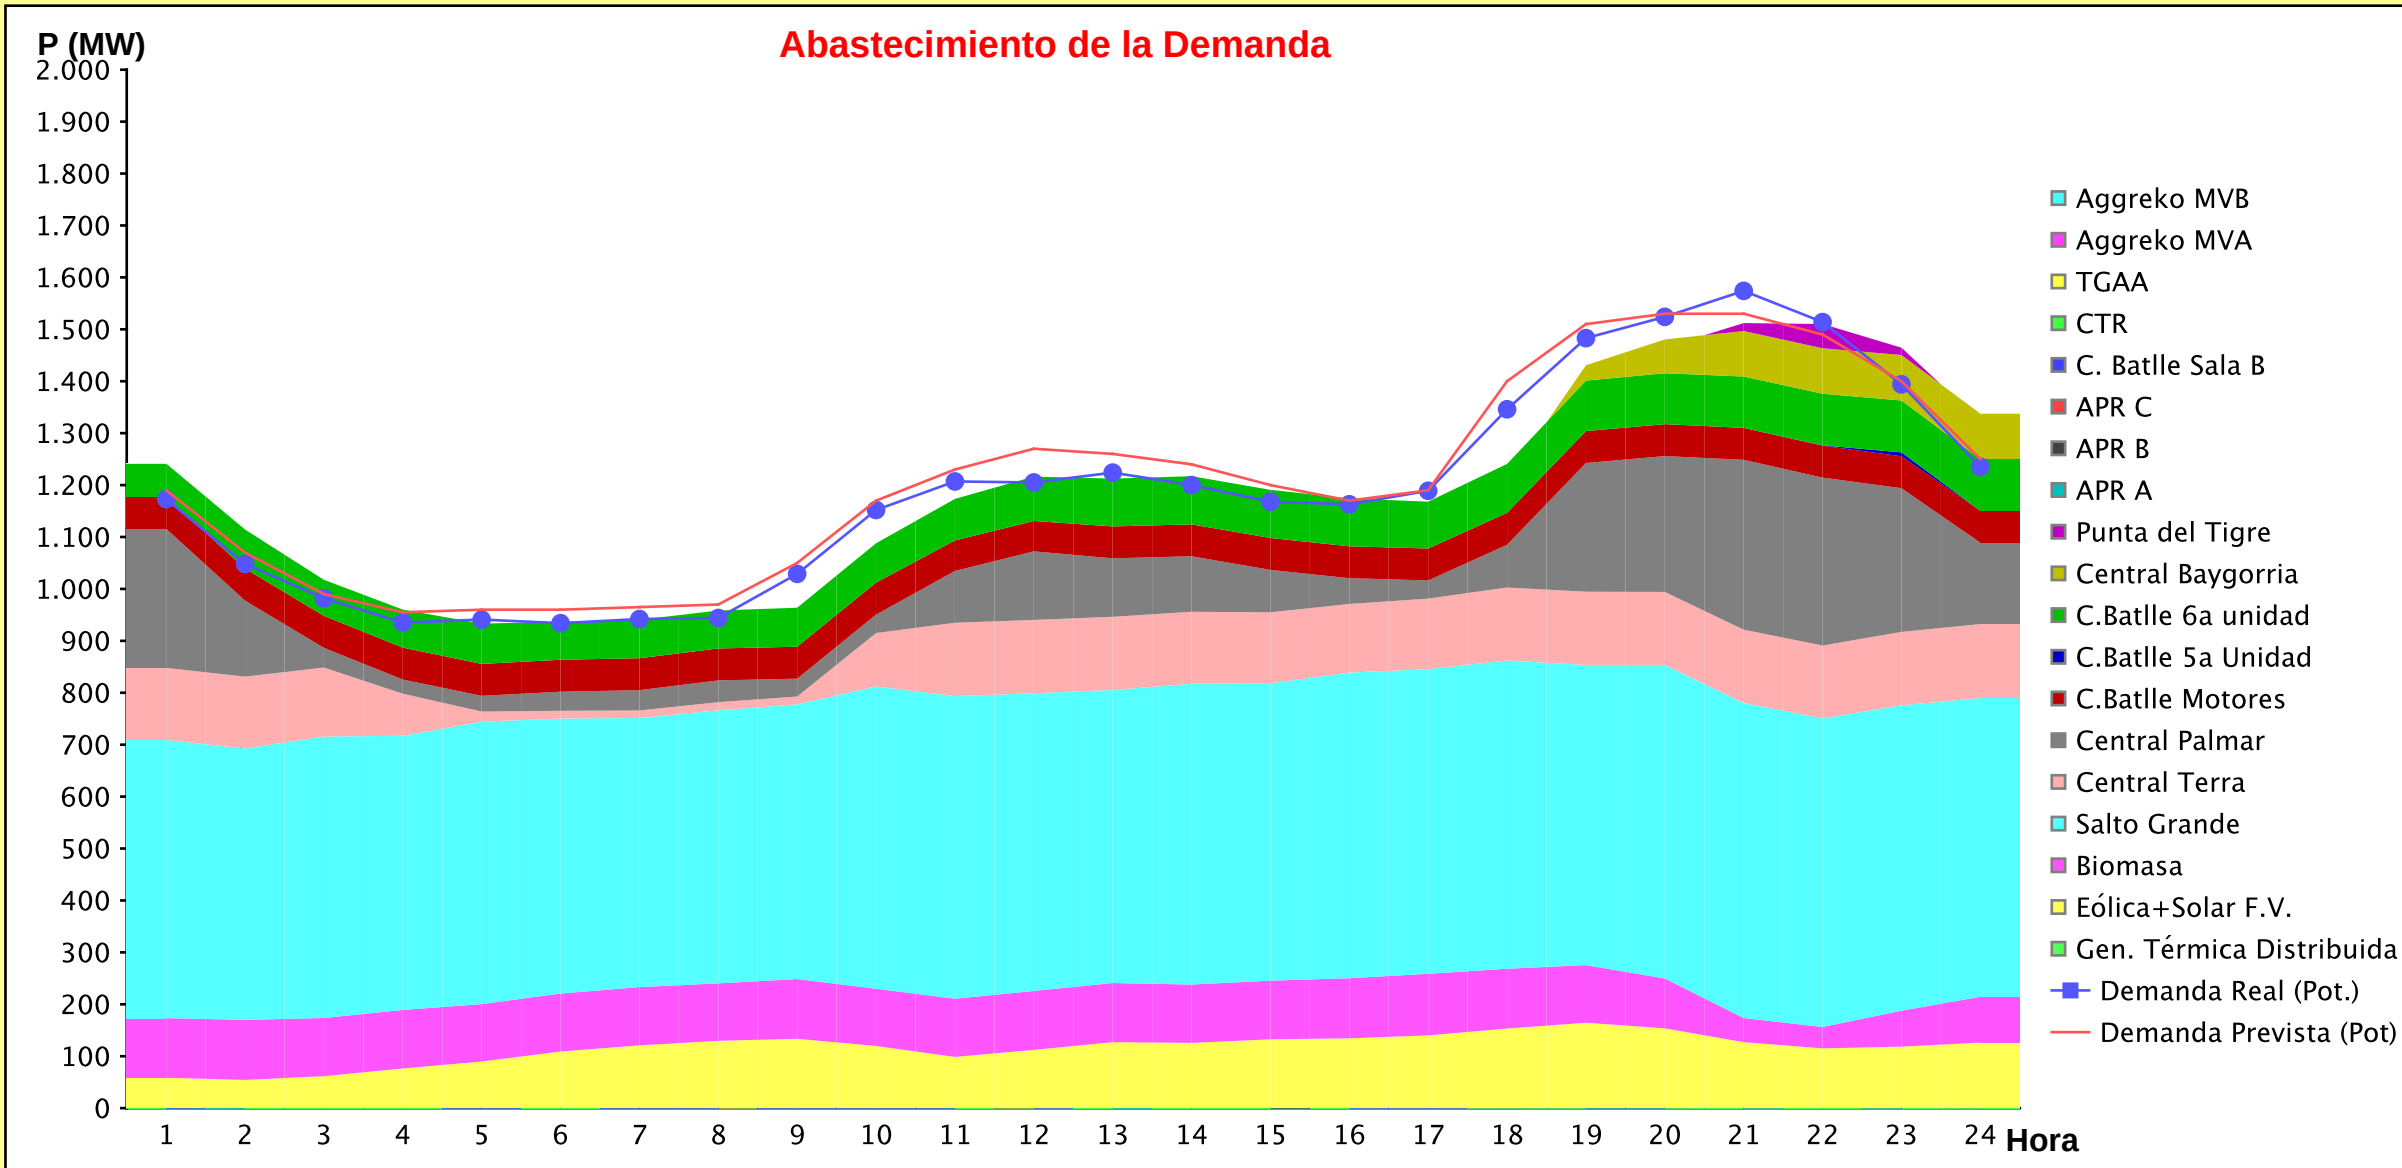


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	529
Hidráulica	529
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	529

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.425
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	28.950
Diferencia (MWh)	-525
Ejecutada - Programada	-1,81 %


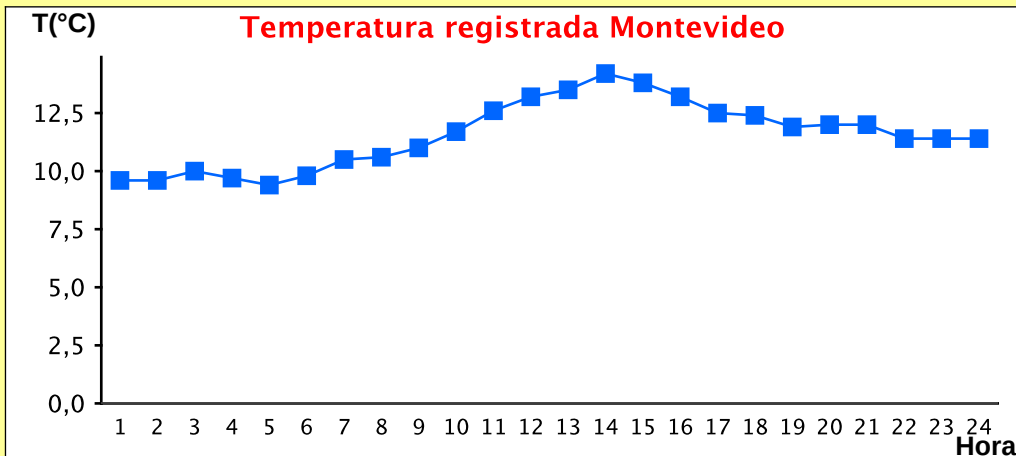


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1238,89 Hora 13:02
Potencia mínima:	928,61 Hora 05:09
Pico noche:	1622,12 Hora 21:01
Generación Media (MW)	
Eólica	116,0
Biomasa	106,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

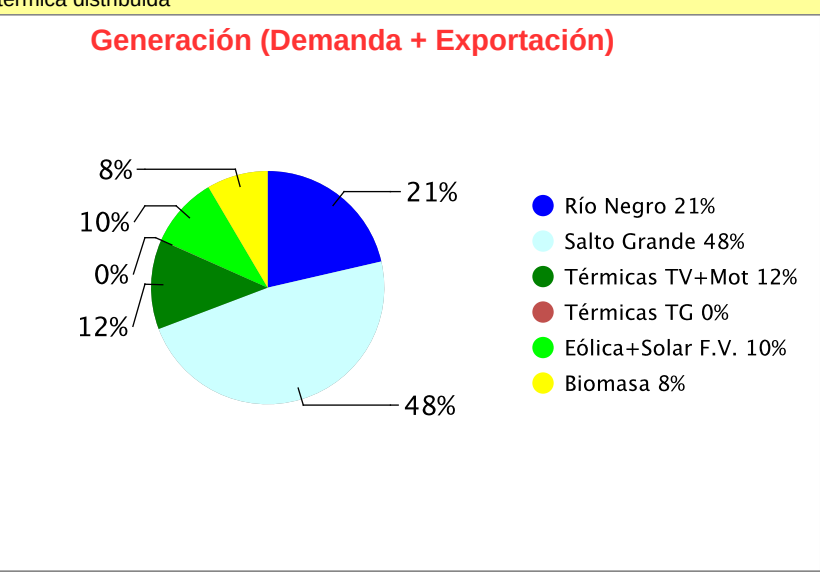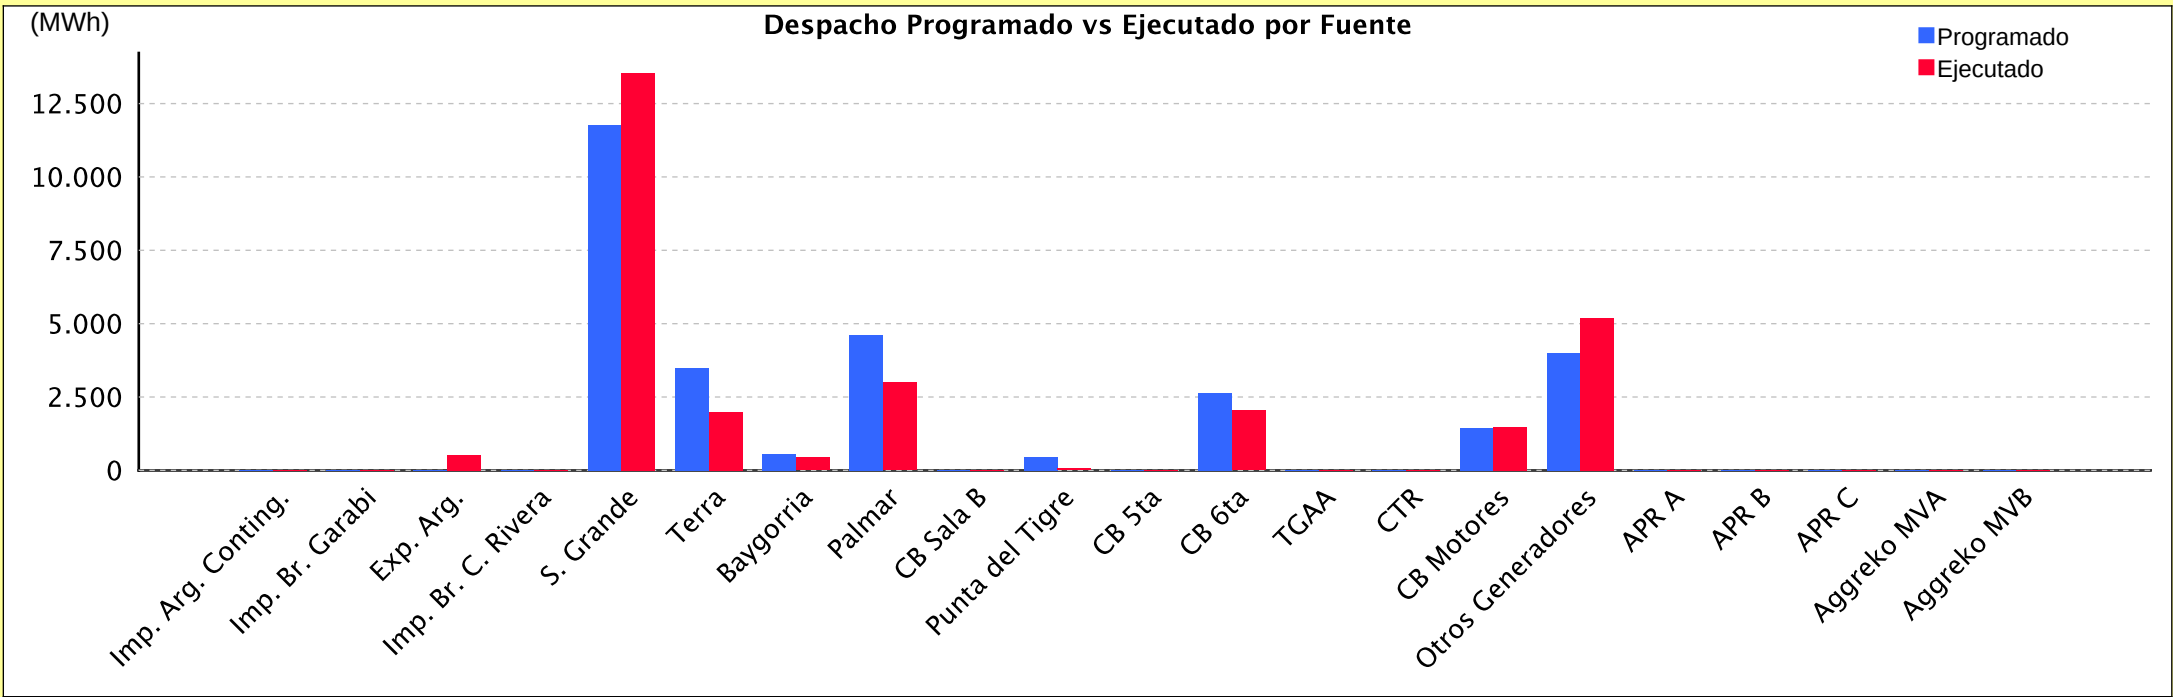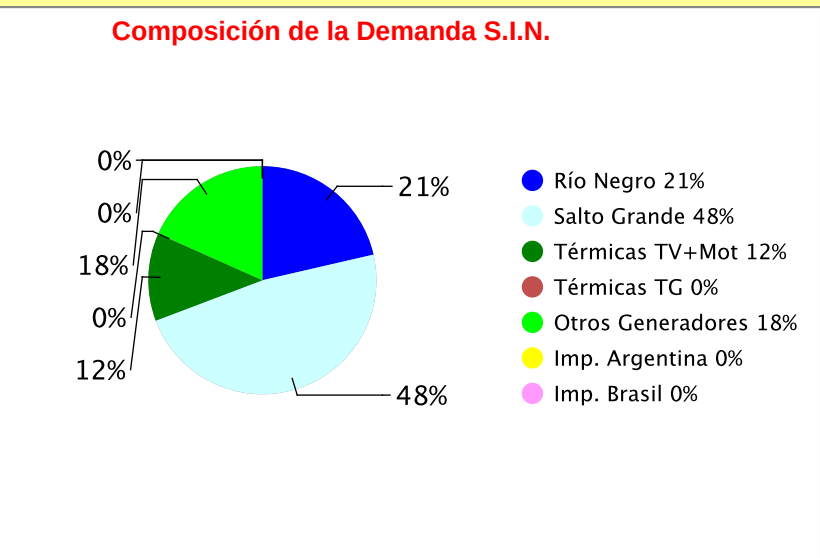



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

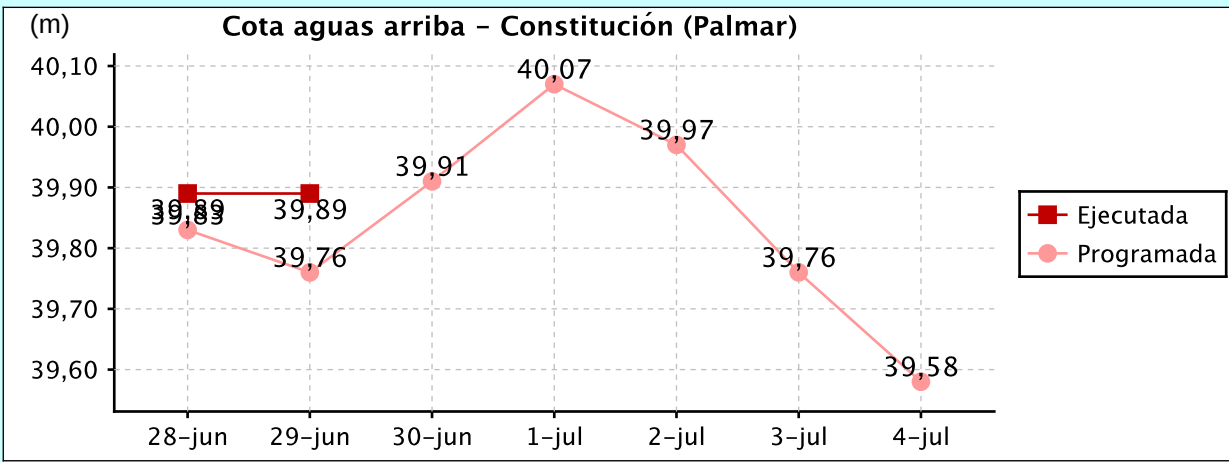
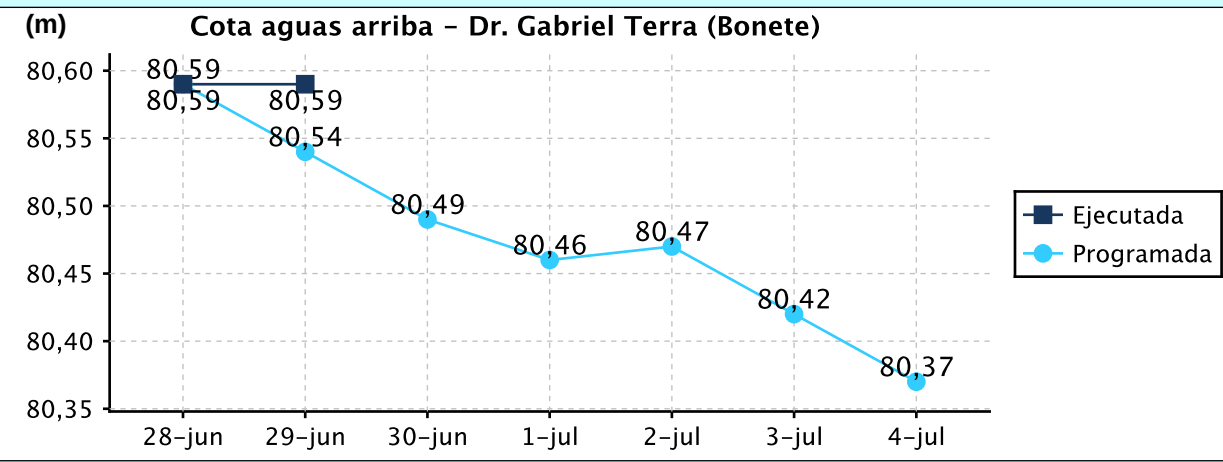


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,54	80,59
Baygorria	54,34	53,7
Palmar	39,76	39,89
SGU	30,01	29,66

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

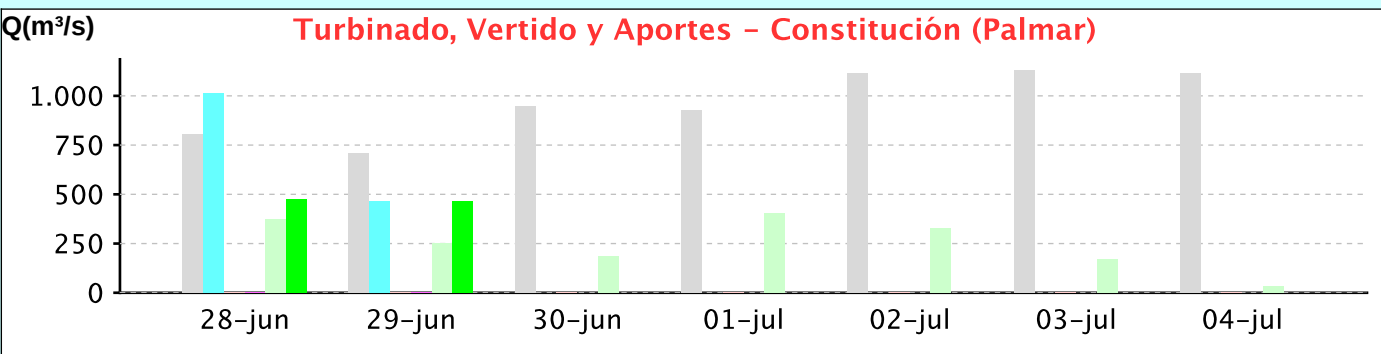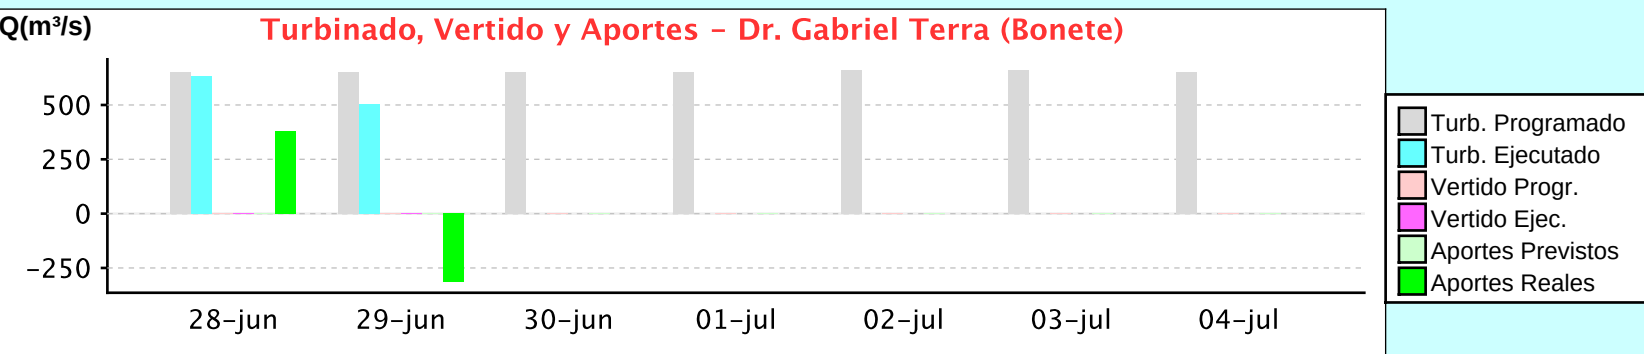

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

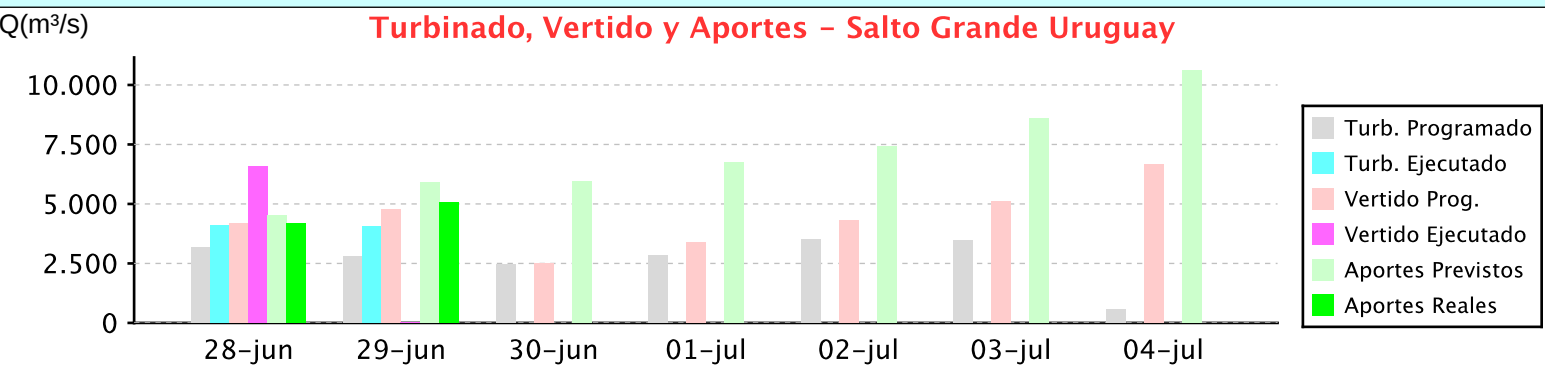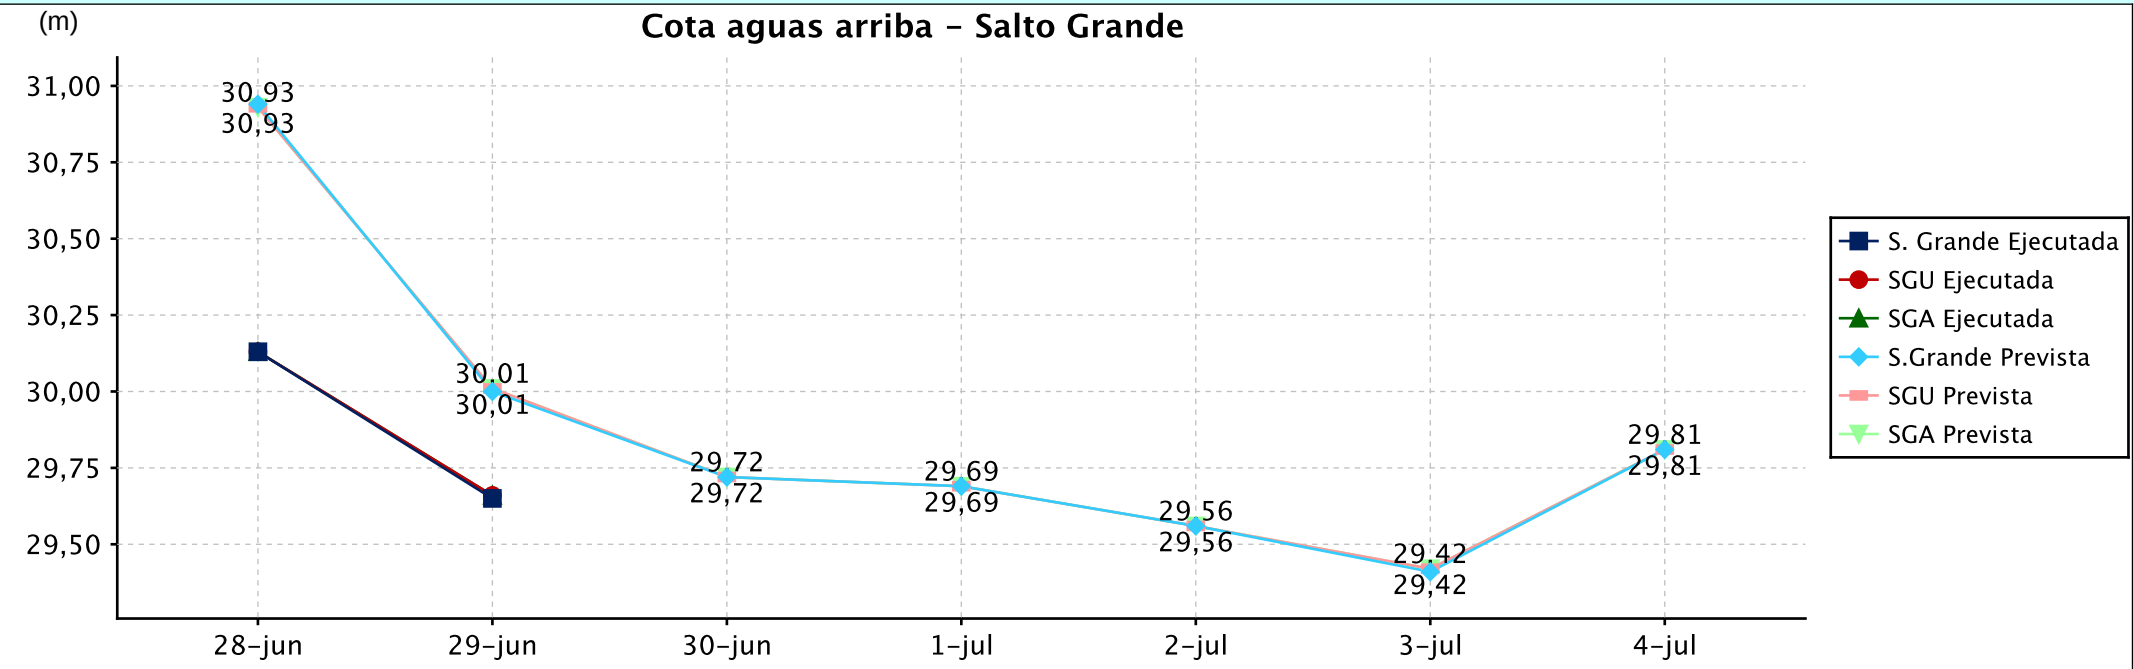

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	29,66
Cota Vista Arg	29,66
Cota real	29,65
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	653	502
Baygorria	210	164
Palmar	708	463
SGU	2.808	4.074

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-315
Baygorria	0	16
Palmar	250	465
SGU	5.925	5.080

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	4.774	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
