



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 01 de julio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	3.837
Sala B	-4
5ta.	21
6ta.	2.605
Motores	1.215
Central La Tablada	-40
Central P. del Tigre	3.124
APR A	321
APR B	30
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.087
C. Baygorria	2.027
C. Palmar	5.735
C. Salto Grande	13.448
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.278
TOTAL Generación	33.844

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	242
Hidráulica	242
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	242




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	33.602
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	34.235
Diferencia (MWh)	-633
Ejecutada - Programada	-1,85 %

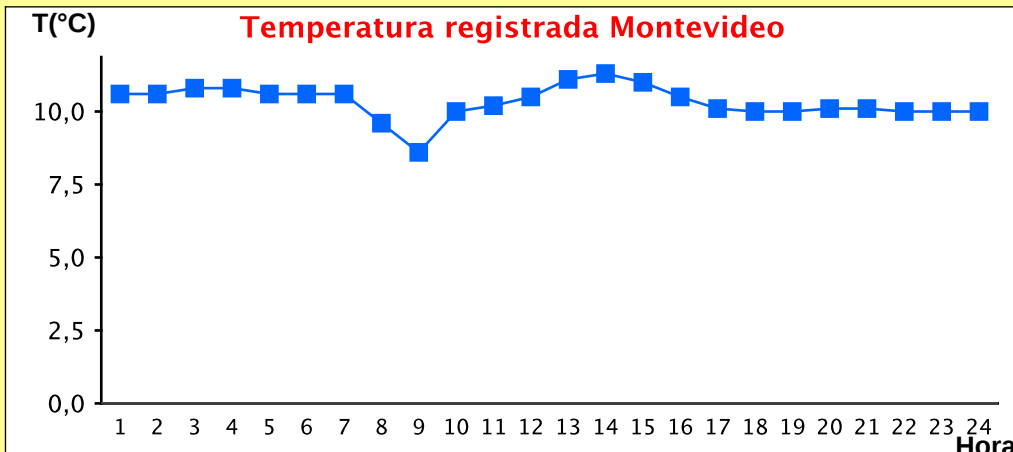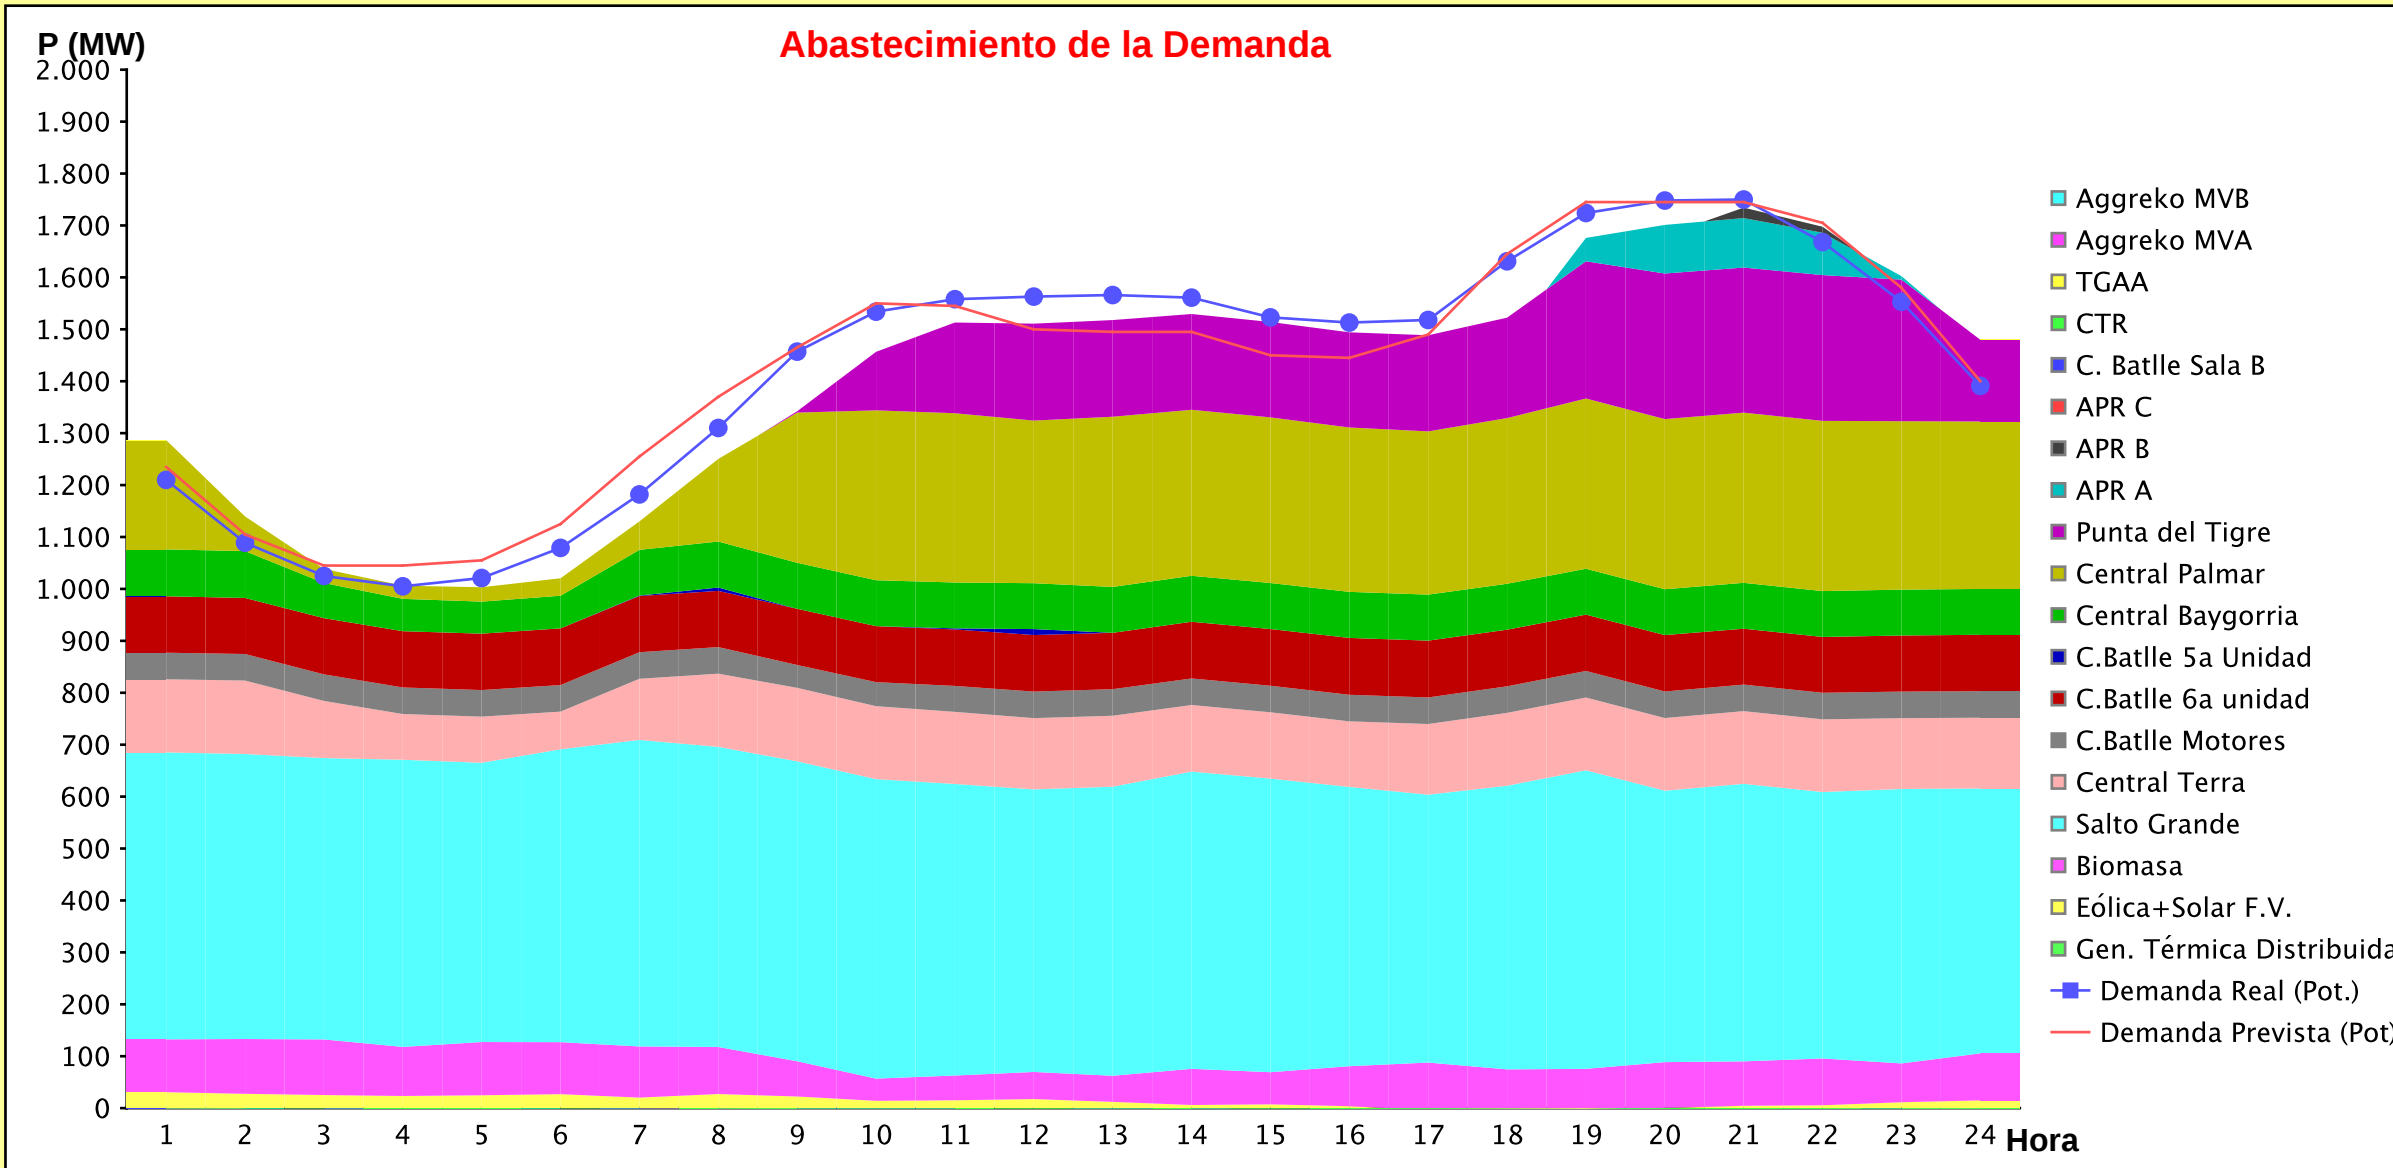



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1574,12 Hora 12:42
Potencia mínima:	1000,56 Hora 03:47
Pico noche:	1752,8 Hora 20:24

Generación Media (MW)	
Eólica	15,5
Biomasa	86,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

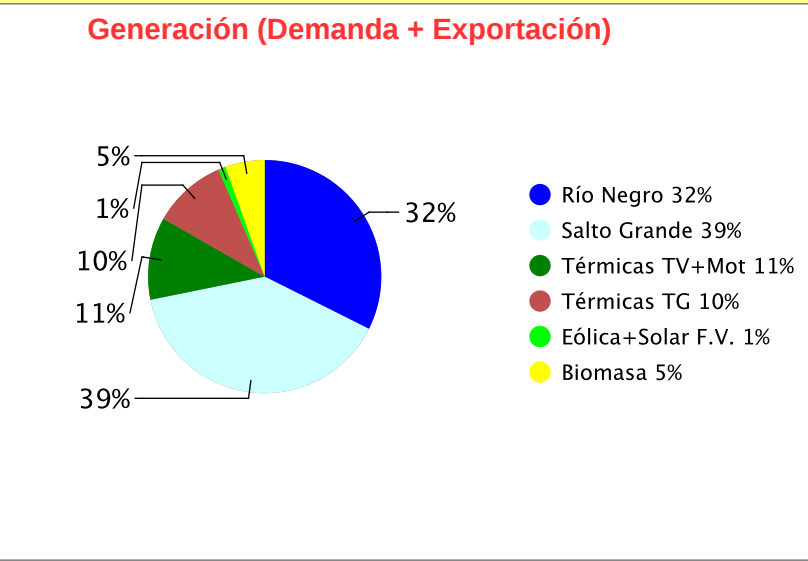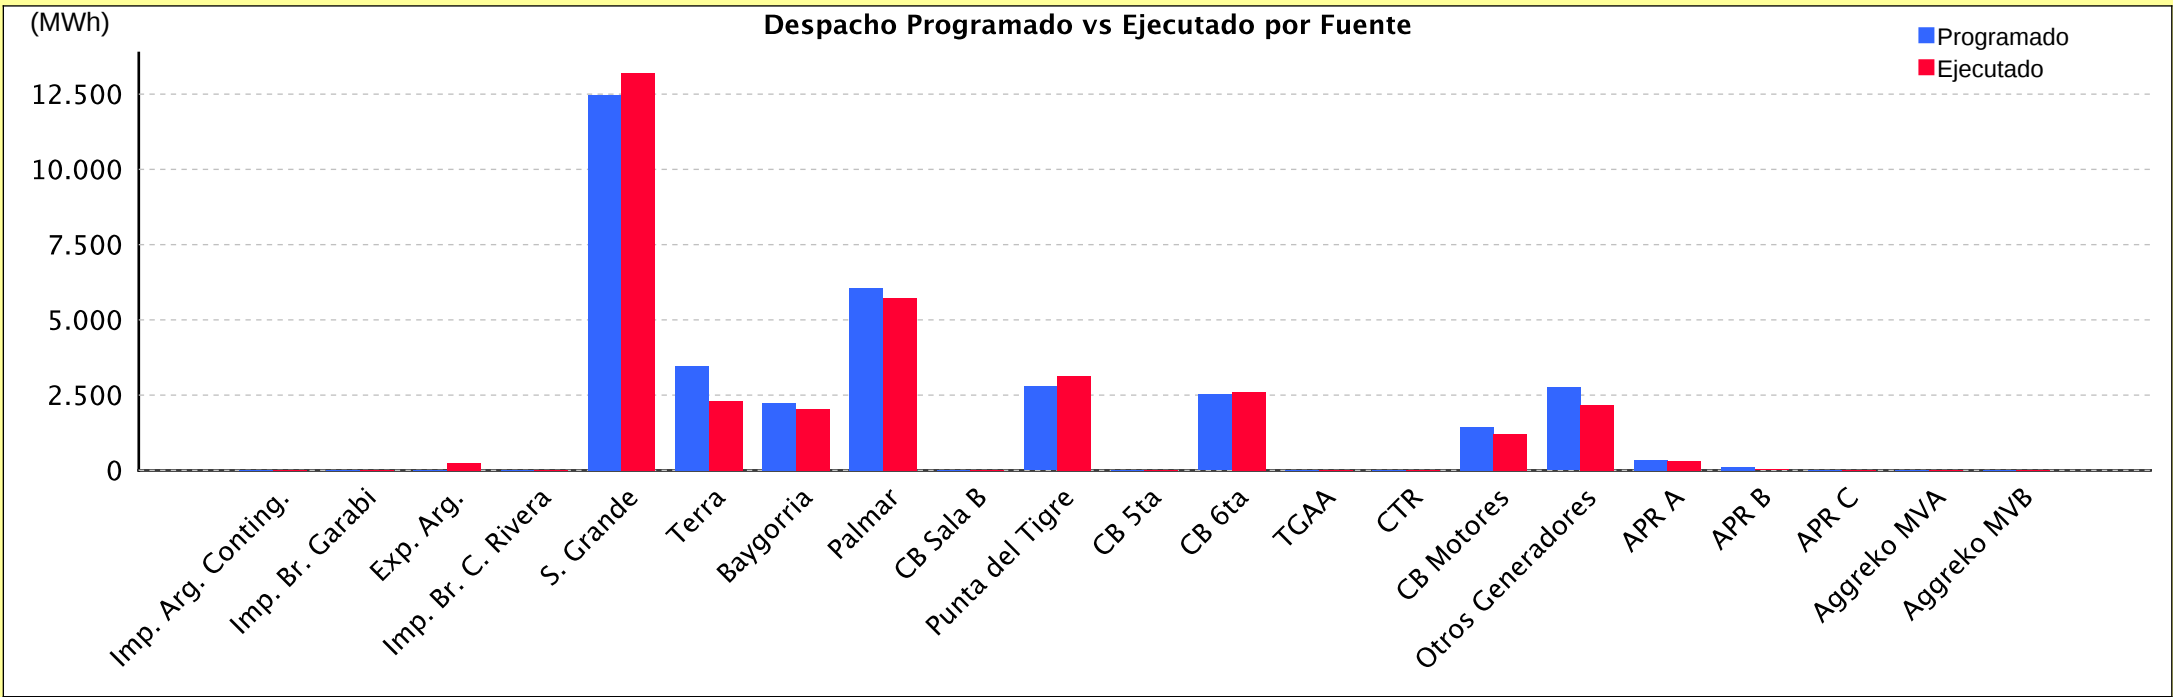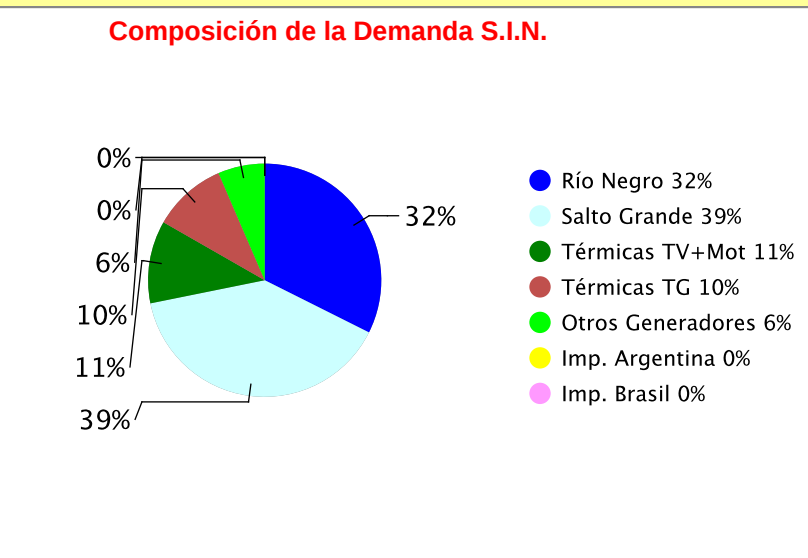



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

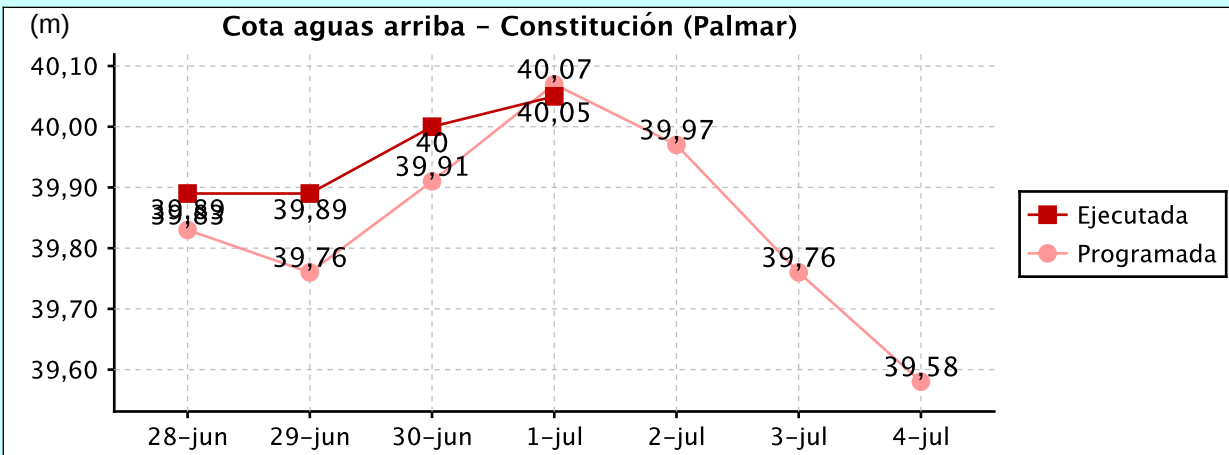
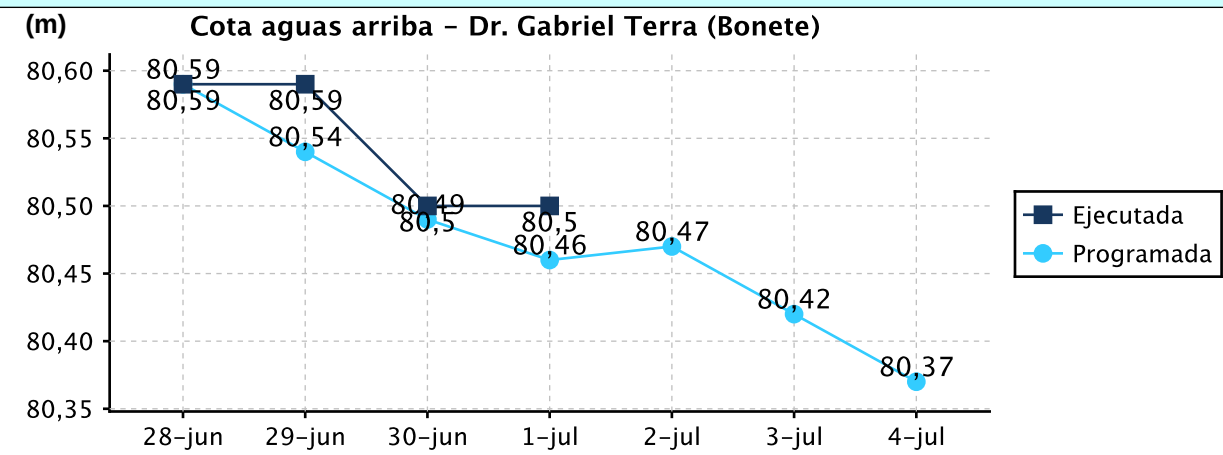


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,46	80,5
Baygorria	53,87	53,89
Palmar	40,07	40,05
SGU	29,69	29,42

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

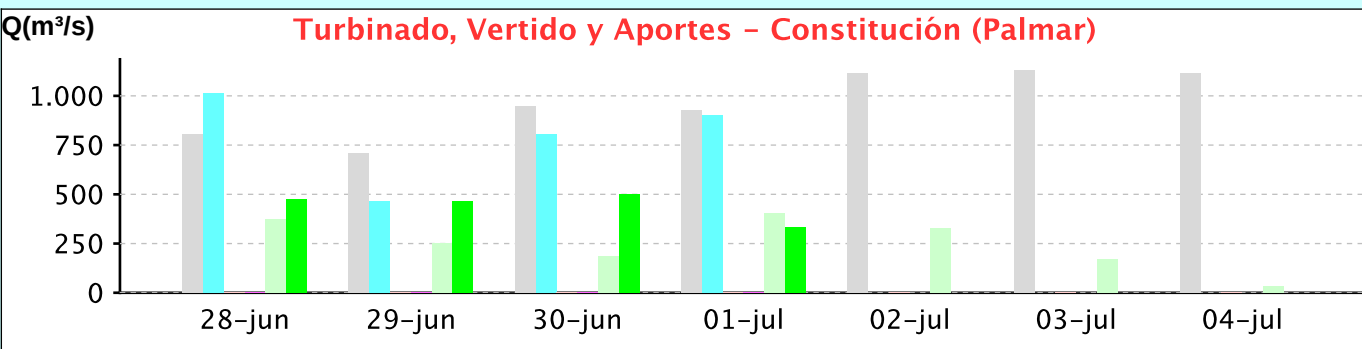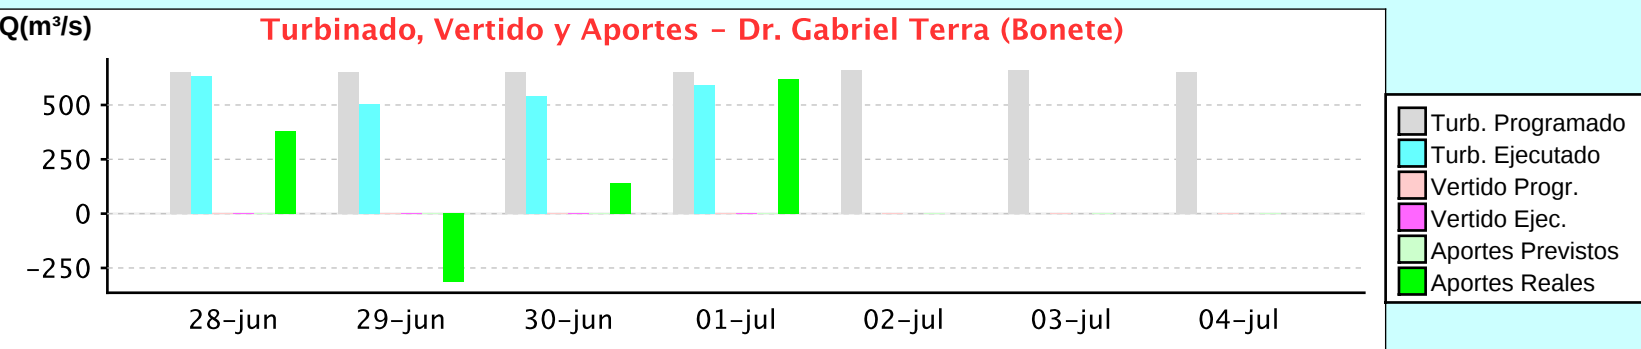

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

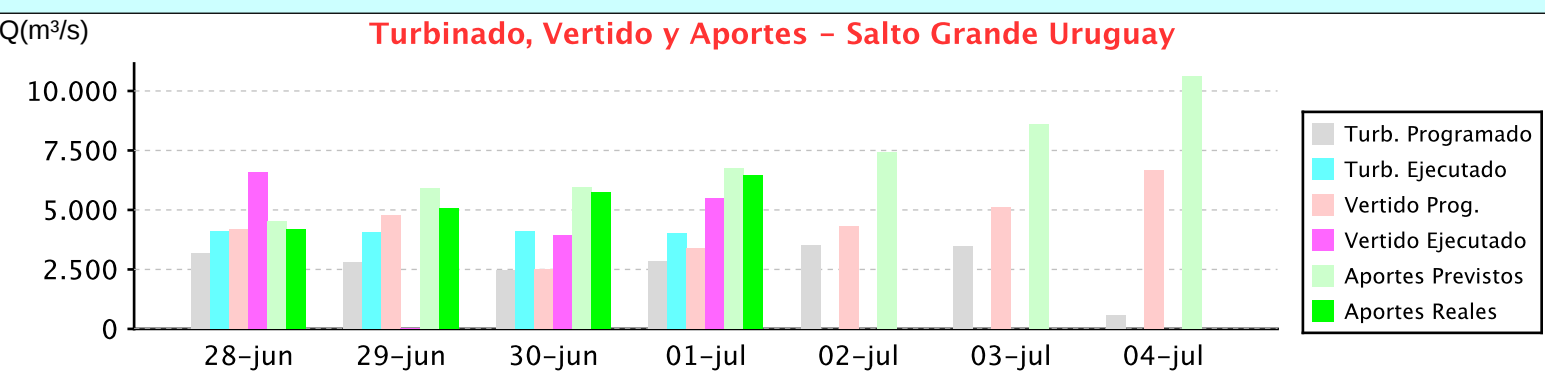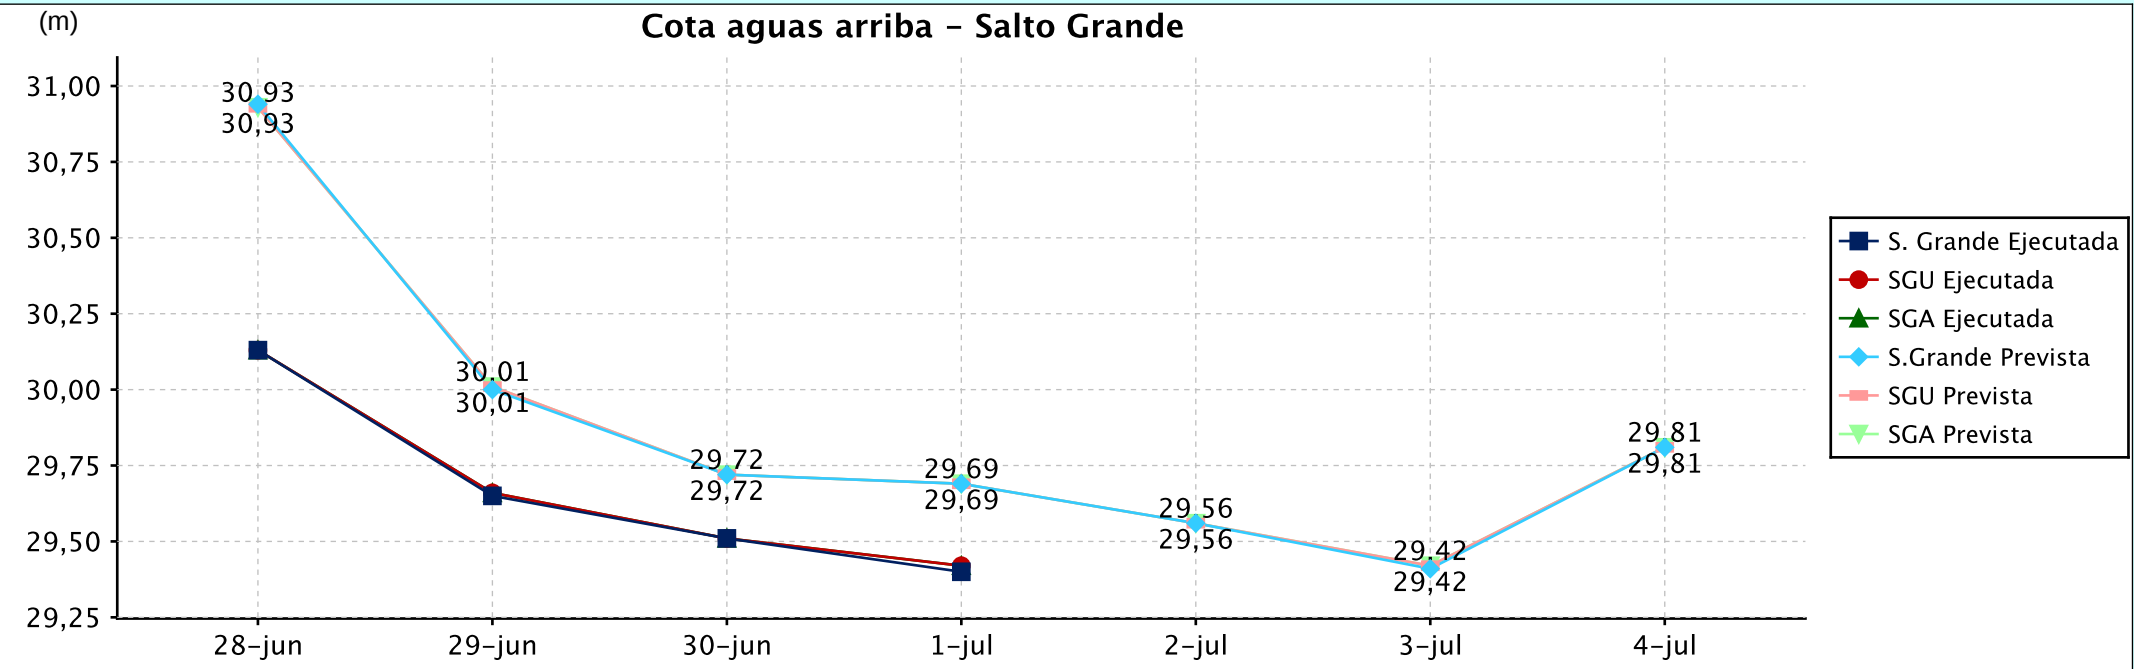

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	29,42
Cota Vista Arg	29,42
Cota real	29,40

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	653	591
Baygorria	834	747
Palmar	929	902
SGU	2.831	4.018

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	620
Baygorria	0	35
Palmar	406	334
SGU	6.725	6.470

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	3.404	5.495

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
