



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 05 de julio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	5.500
Sala B	-4
5ta.	1.354
6ta.	2.604
Motores	1.546
Central La Tablada	-44
Central P. del Tigre	332
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.622
C. Baygorria	1.783
C. Palmar	4.917
C. Salto Grande	9.824
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.944
TOTAL Generación	29.872

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	43
Hidráulica	43
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	43




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.829
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.270
Diferencia (MWh)	-441
Ejecutada - Programada	-1,46 %

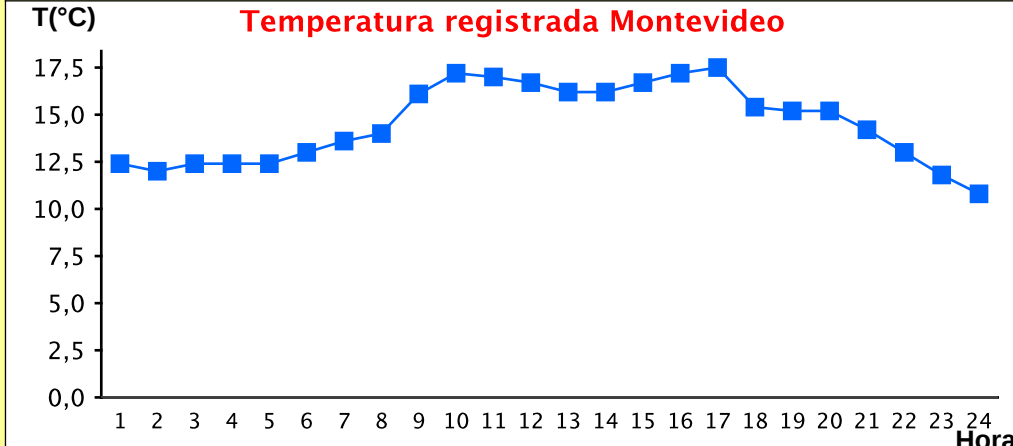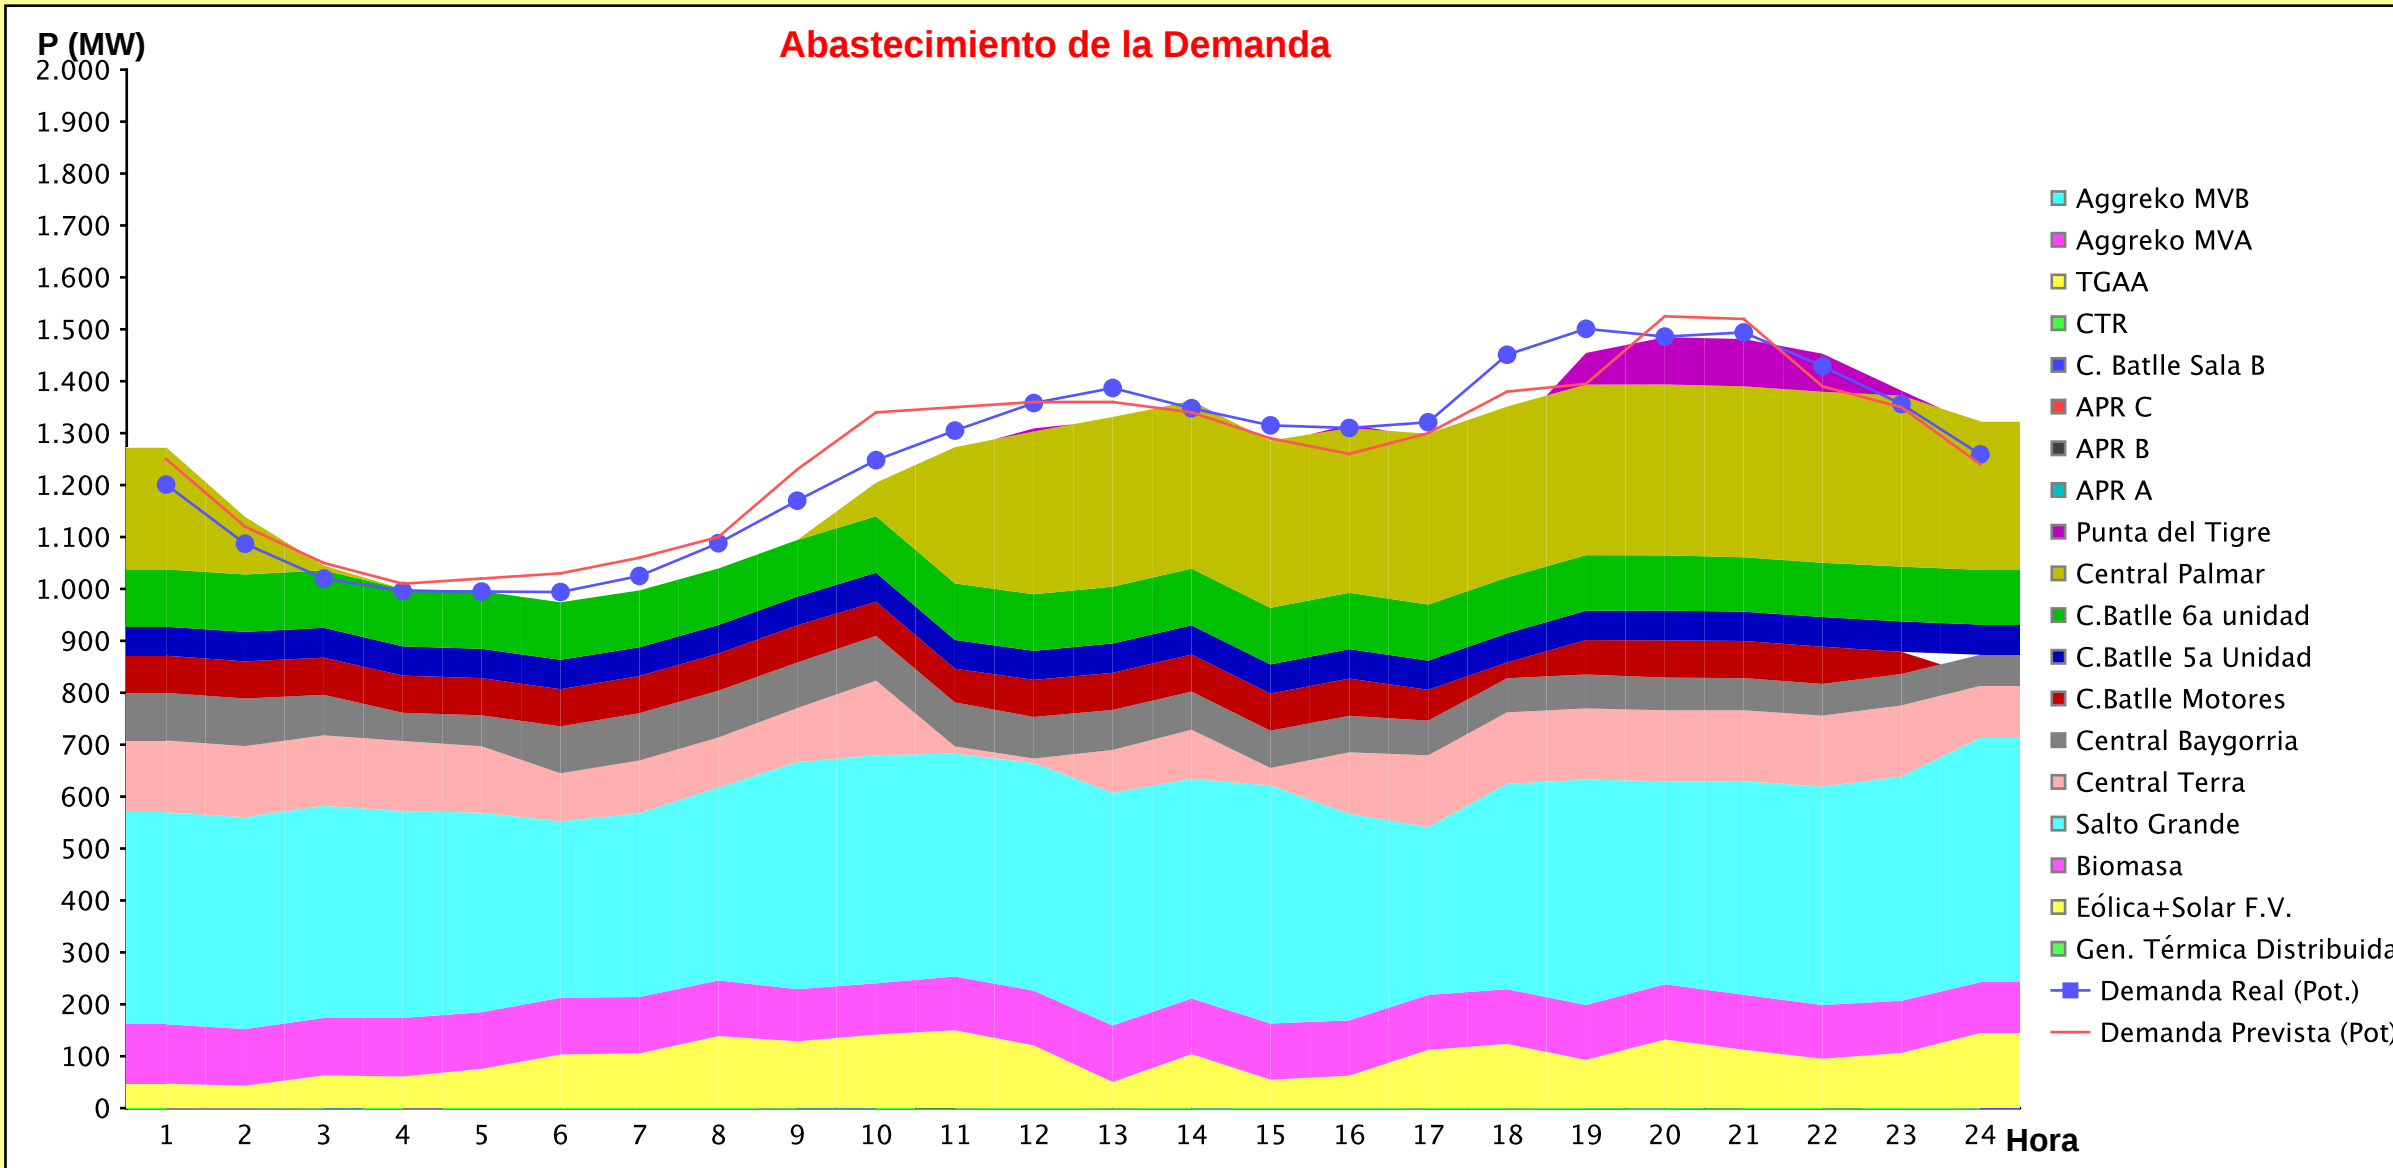



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1409,39 Hora 12:54
Potencia mínima:	976,57 Hora 04:36
Pico noche:	1517,6 Hora 20:30

Generación Media (MW)	
Eólica	99,2
Biomasa	106,9
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

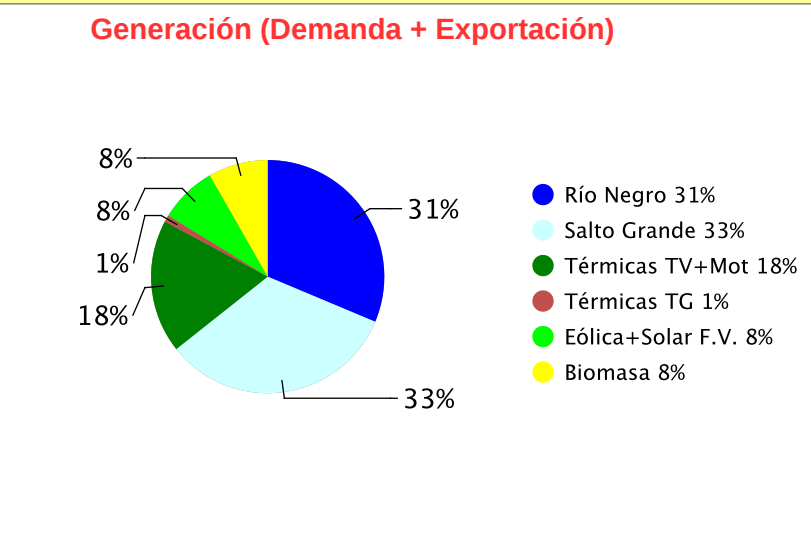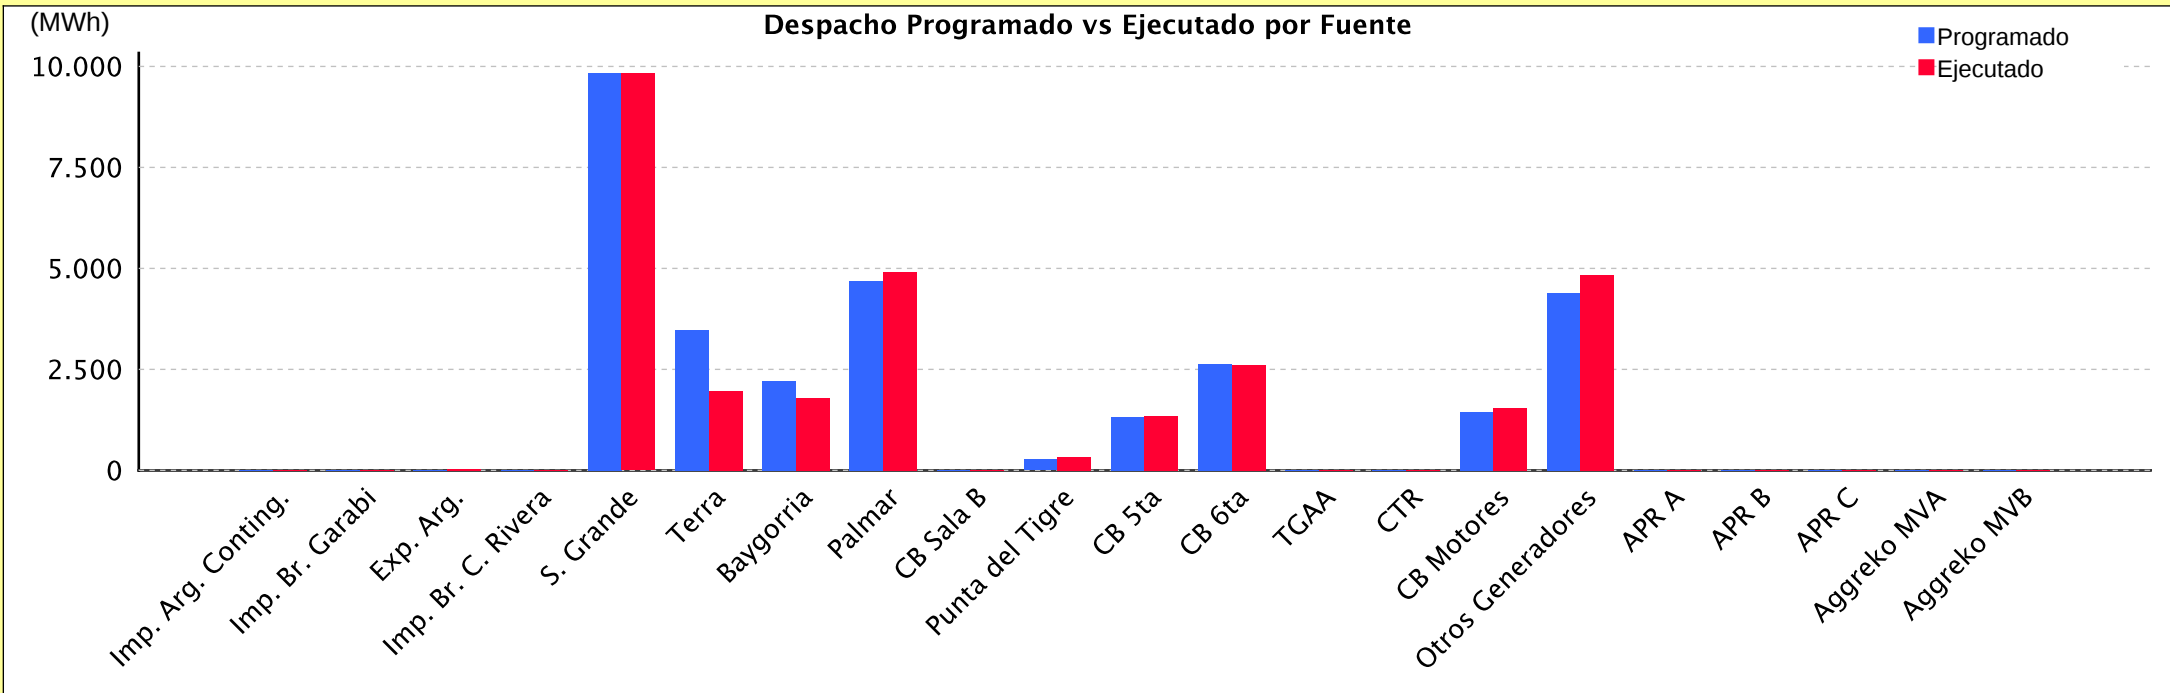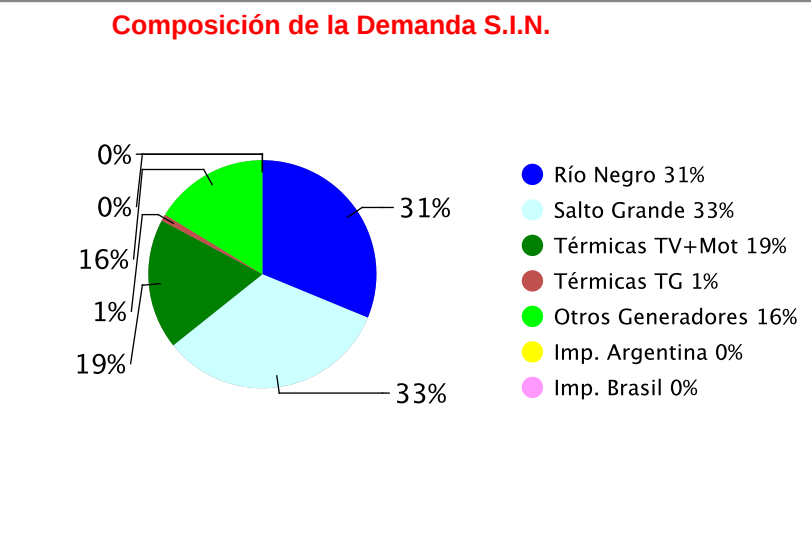



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

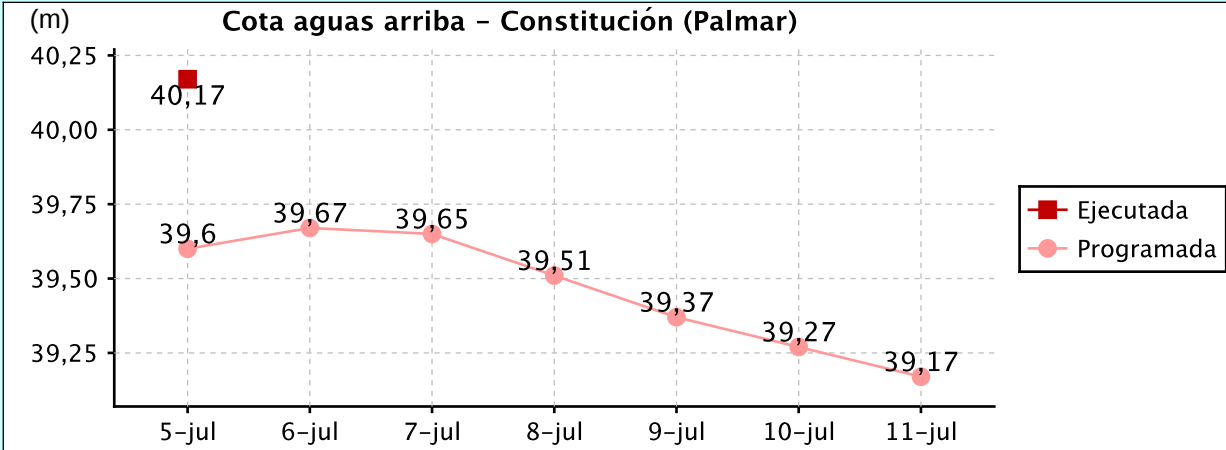
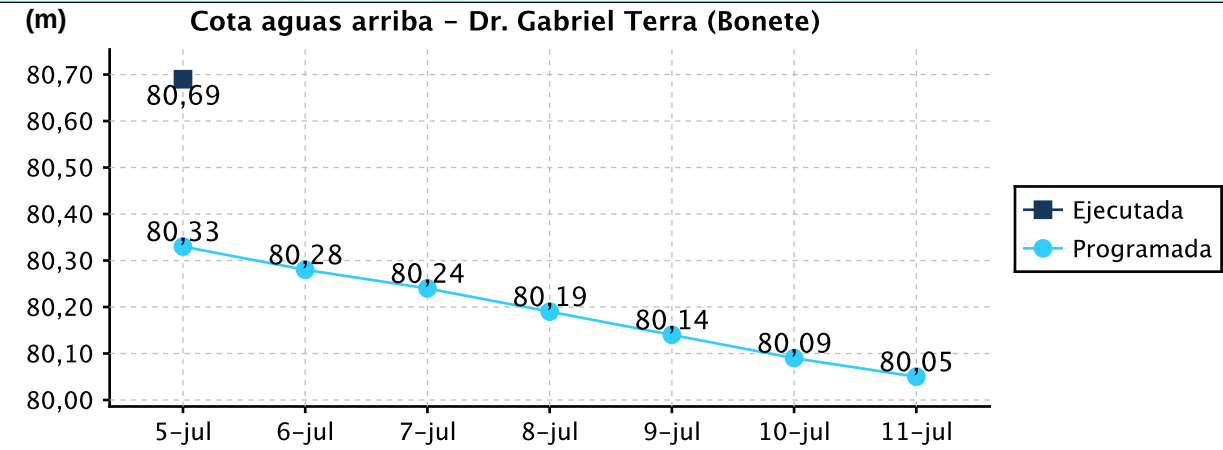


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,33	80,69
Baygorria	53,86	54,63
Palmar	39,60	40,17
SGU	30,95	31,59

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

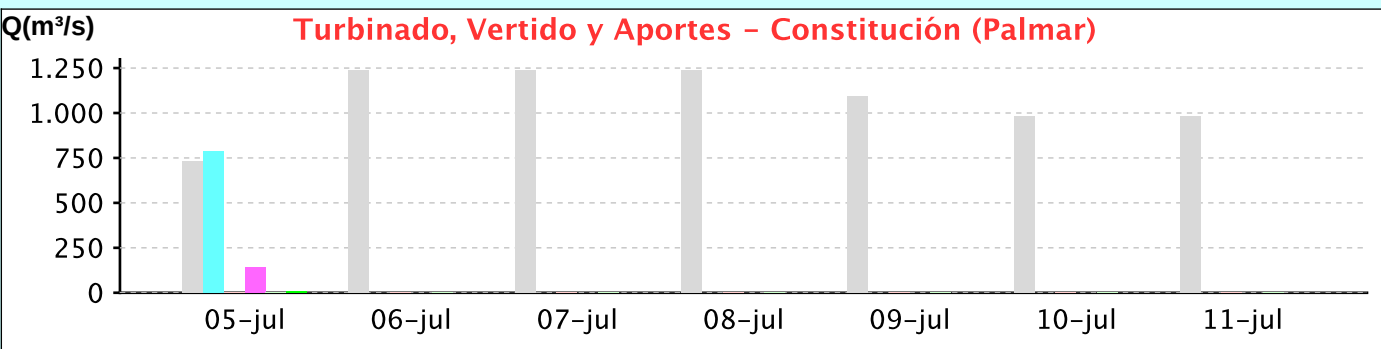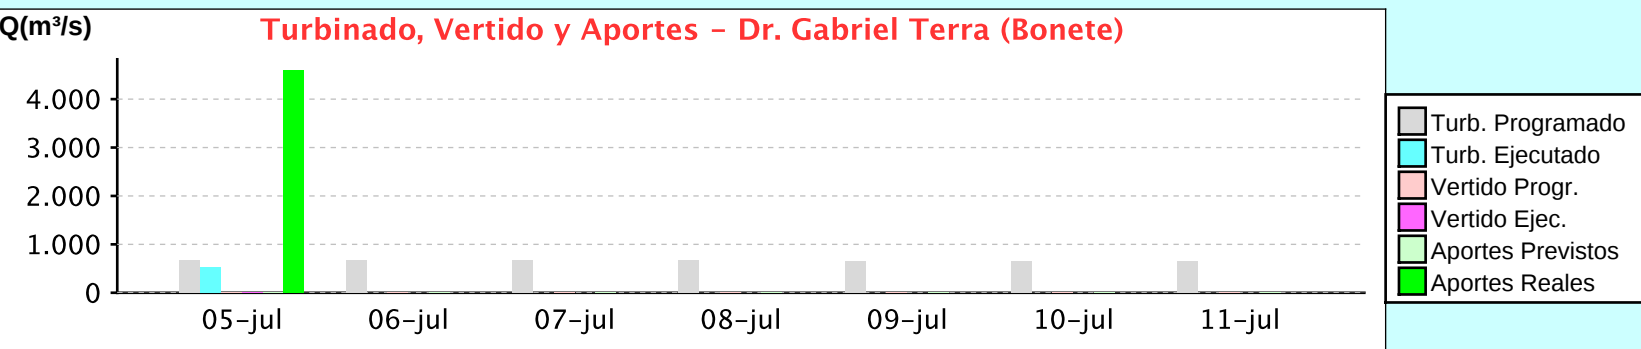

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

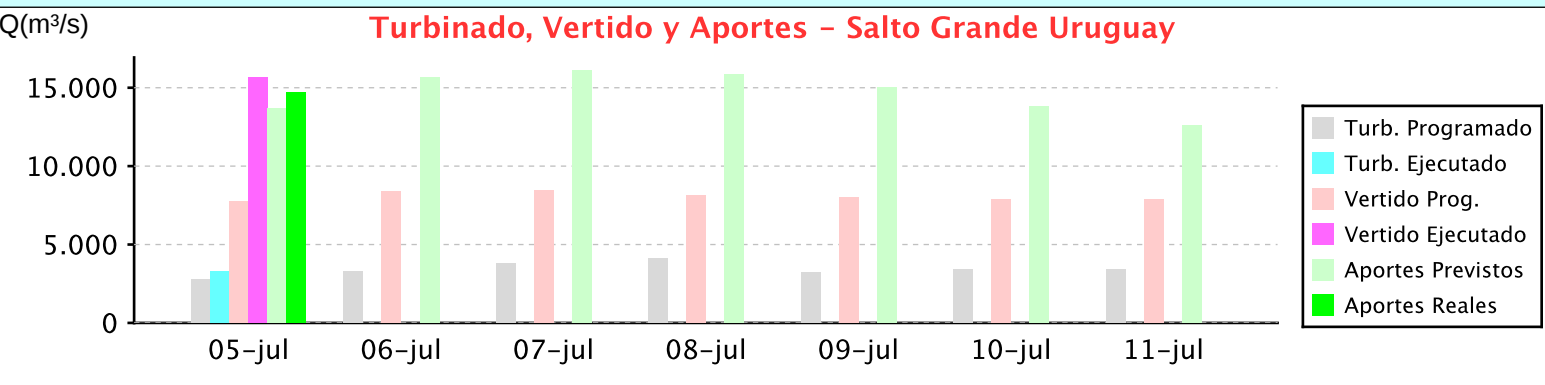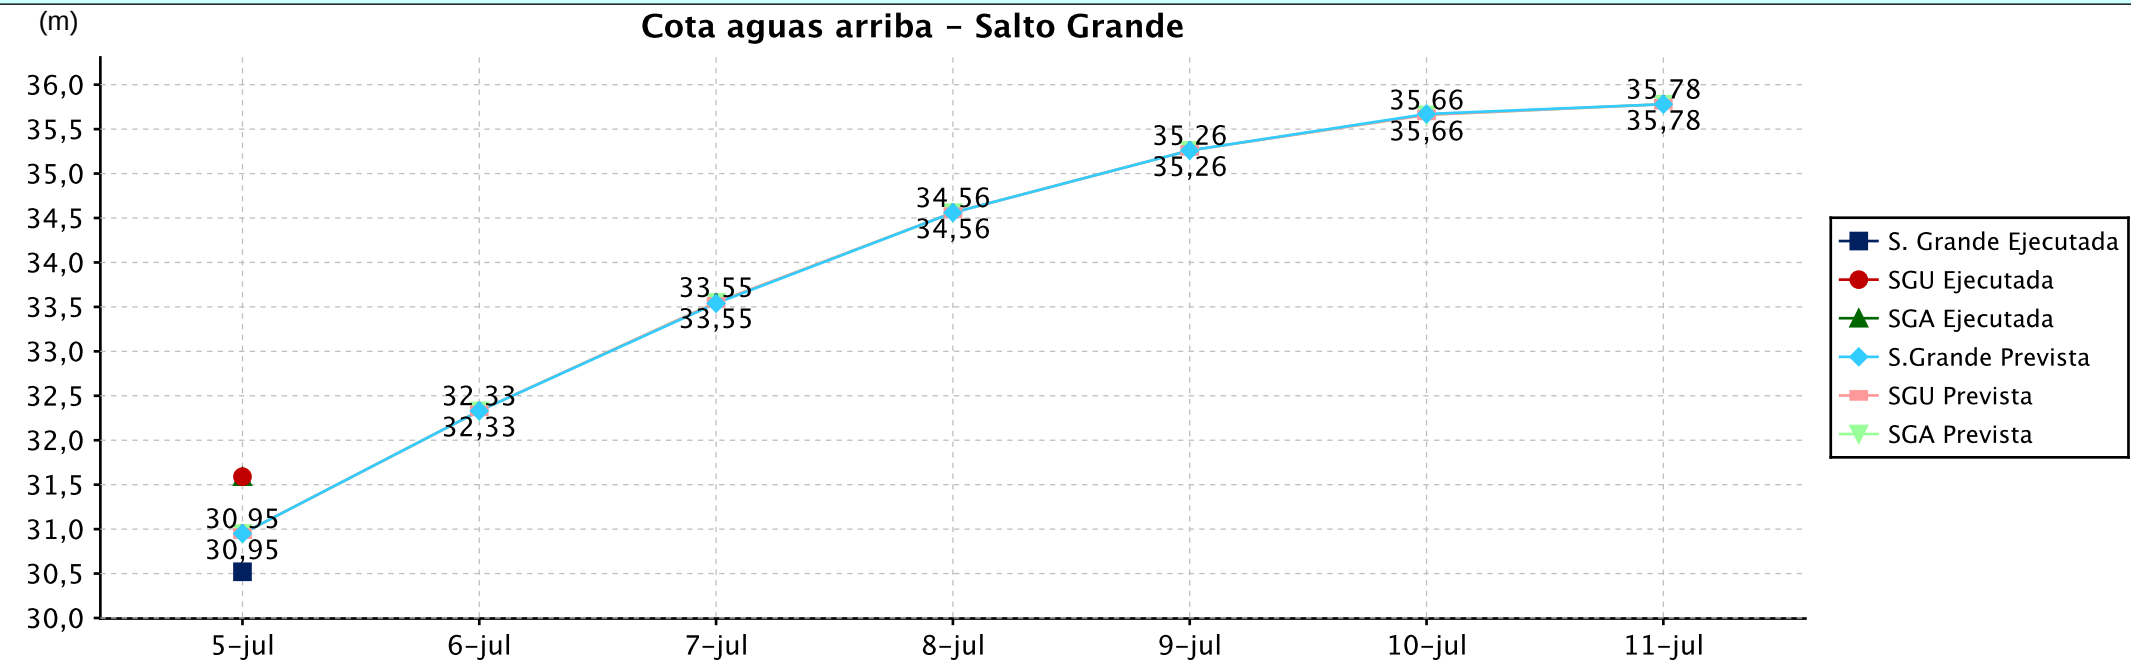

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	31,59
Cota Vista Arg	31,59
Cota real	30,52
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	661	524
Baygorria	818	720
Palmar	731	790
SGU	2.806	3.298

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	4.593
Baygorria	0	2.694
Palmar	0	6
SGU	13.675	14.710

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	1.855
Palmar	0	144
SGU	7.755	15.644

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
