




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


domingo 06 de julio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	3.626
Sala B	-4
5ta.	804
6ta.	2.466
Motores	360
Central La Tablada	-44
Central P. del Tigre	333
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.238
C. Baygorria	1.545
C. Palmar	7.826
C. Salto Grande	11.531
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.445
TOTAL Generación	33.494



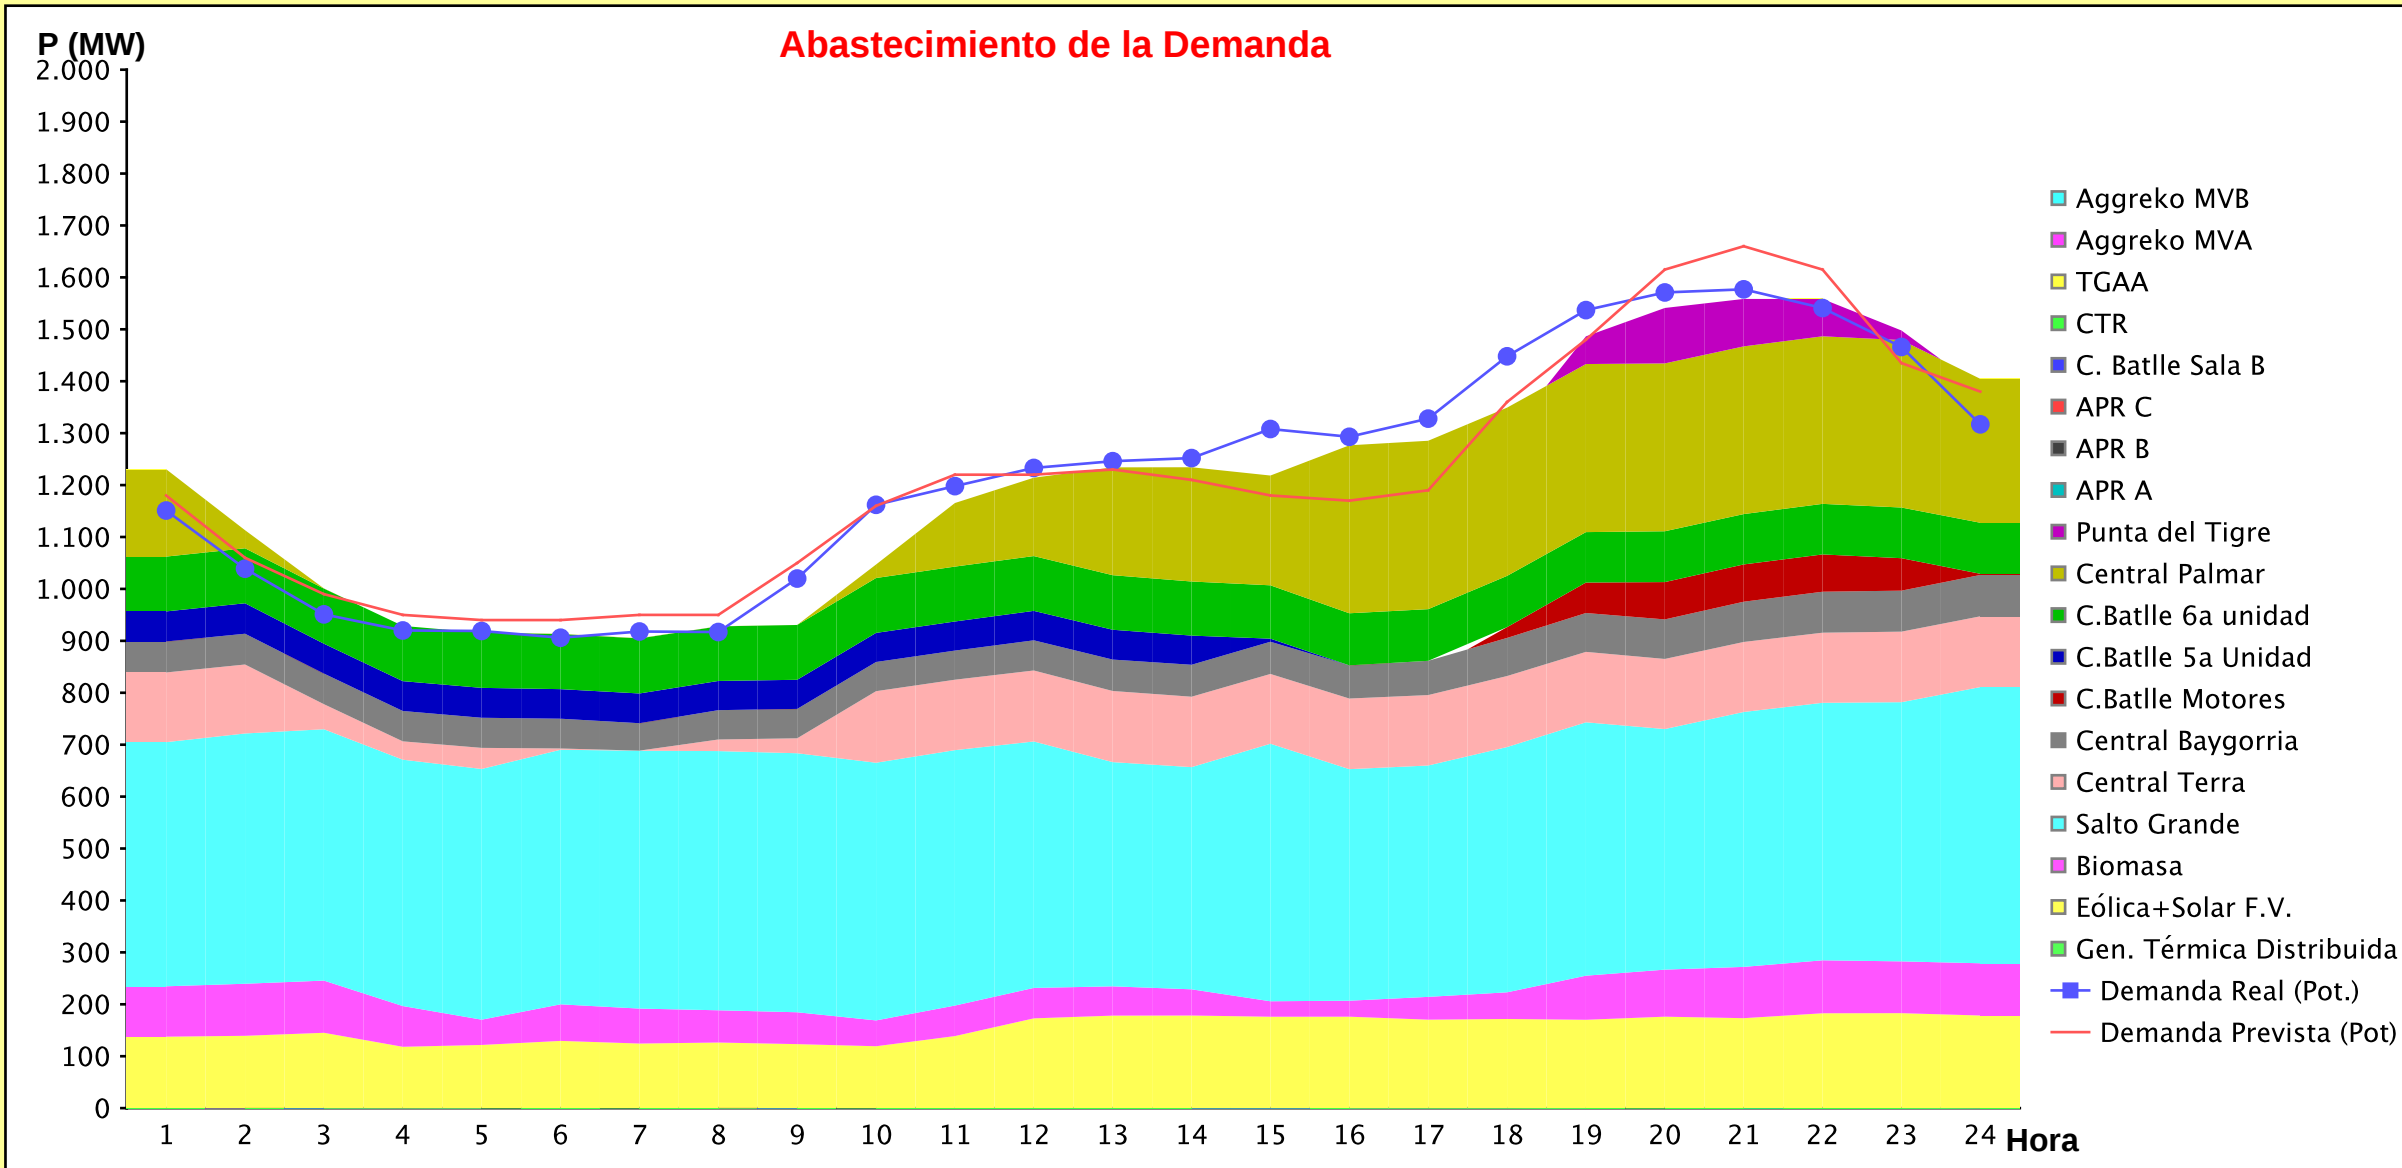


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	4.578
Hidráulica	4.578
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	4.578

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.916
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	29.135
Diferencia (MWh)	-219
Ejecutada - Programada	-0,75 %


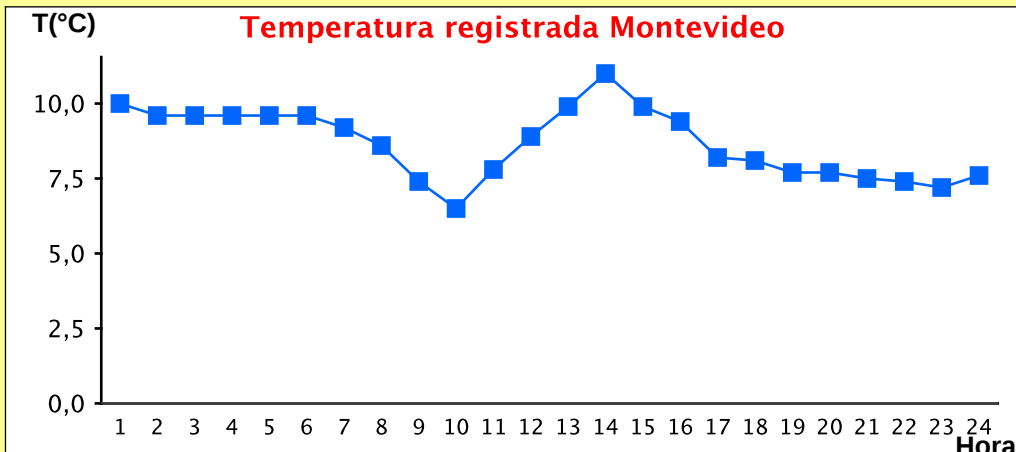


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1335,23 Hora 16:58
Potencia mínima:	906,51 Hora 05:04
Pico noche:	1595,38 Hora 20:45
Generación Media (MW)	
Eólica	154,7
Biomasa	74,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

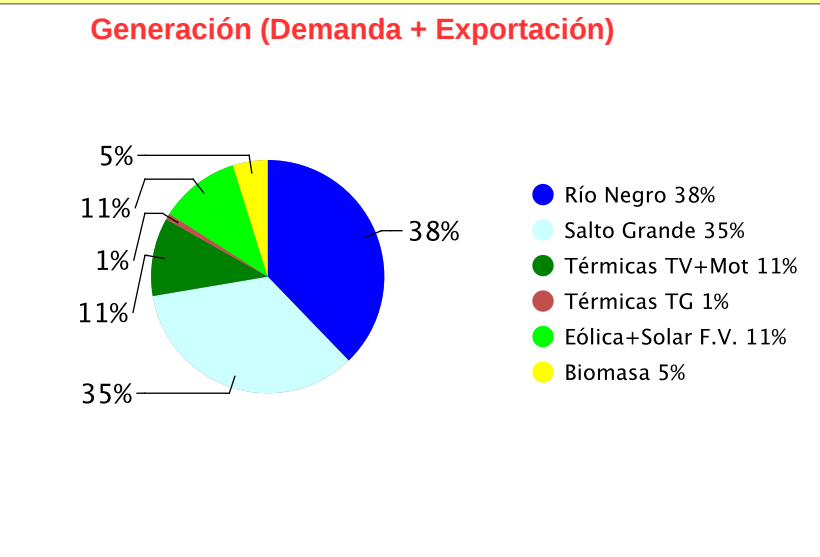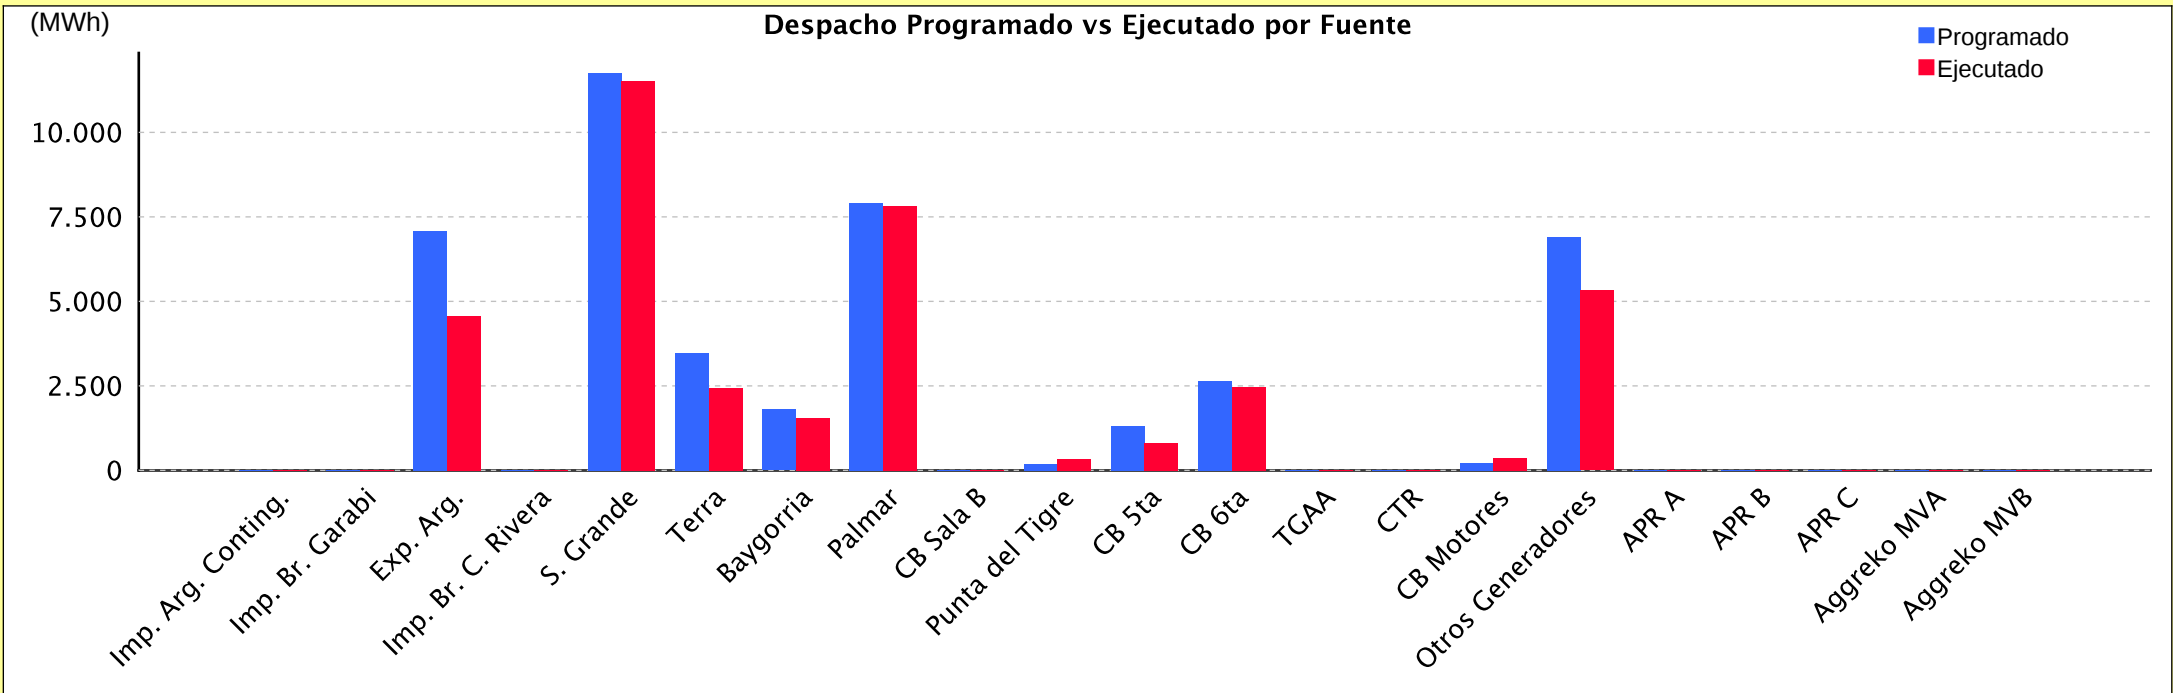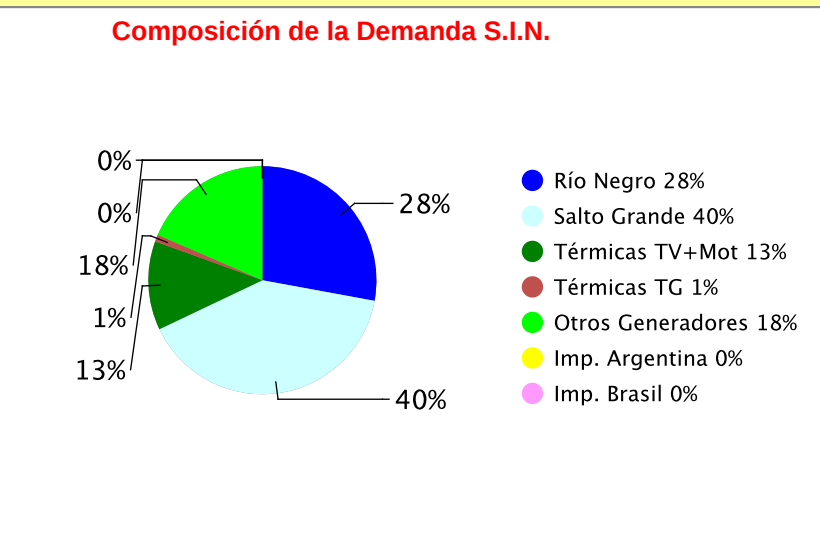



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

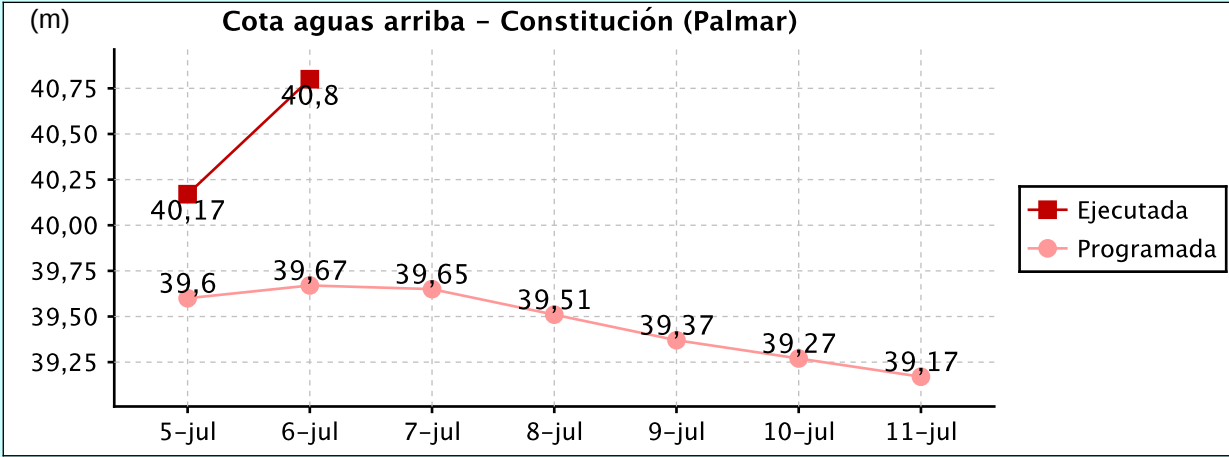
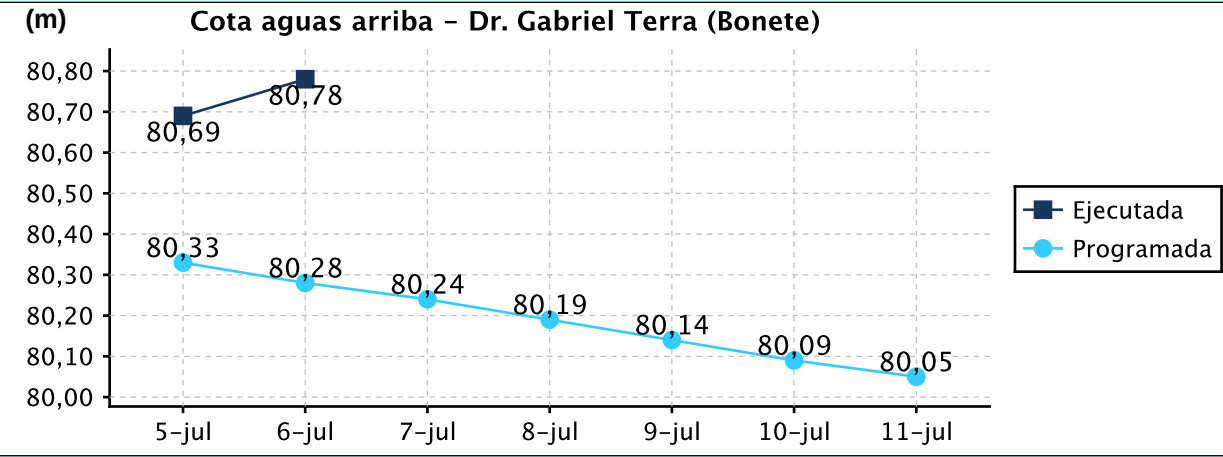


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,28	80,78
Baygorria	53,84	54,13
Palmar	39,67	40,8
SGU	32,33	33,06

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

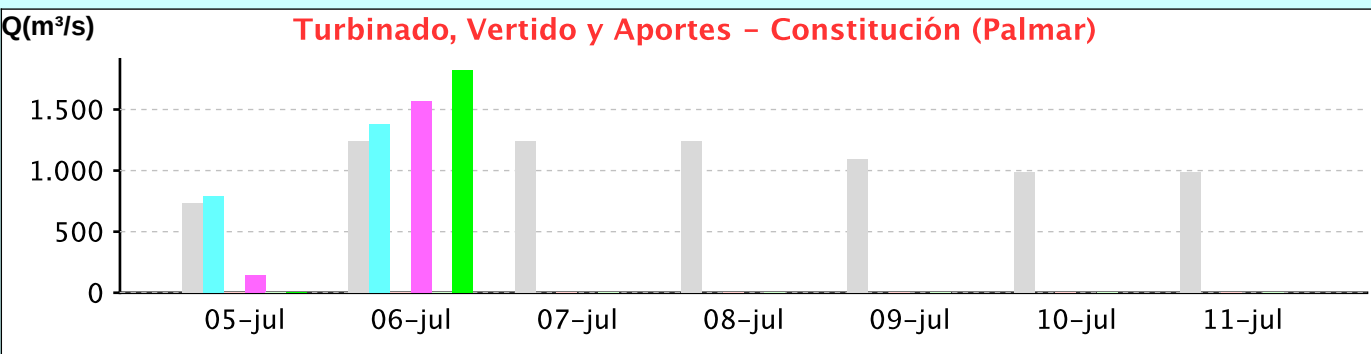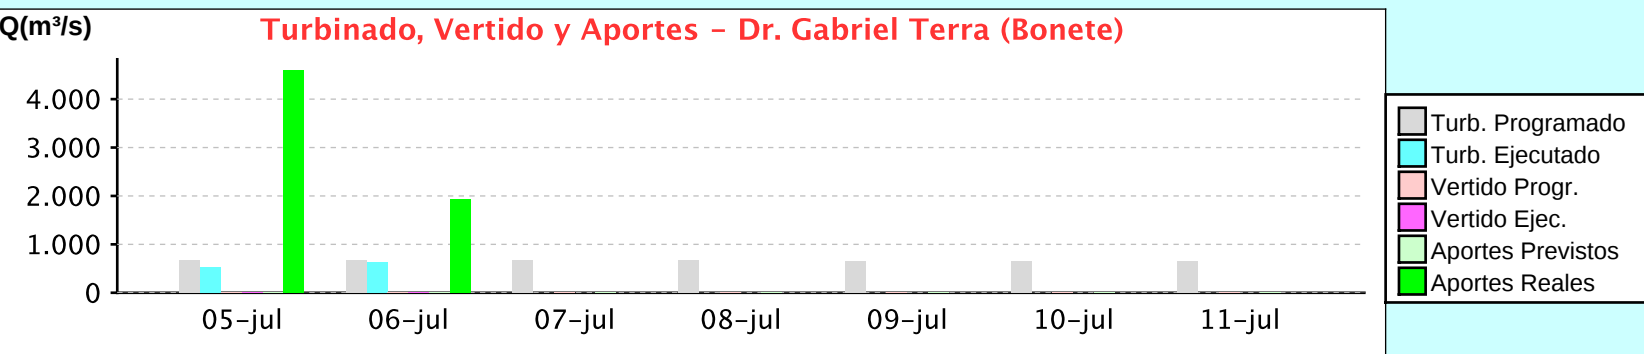

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

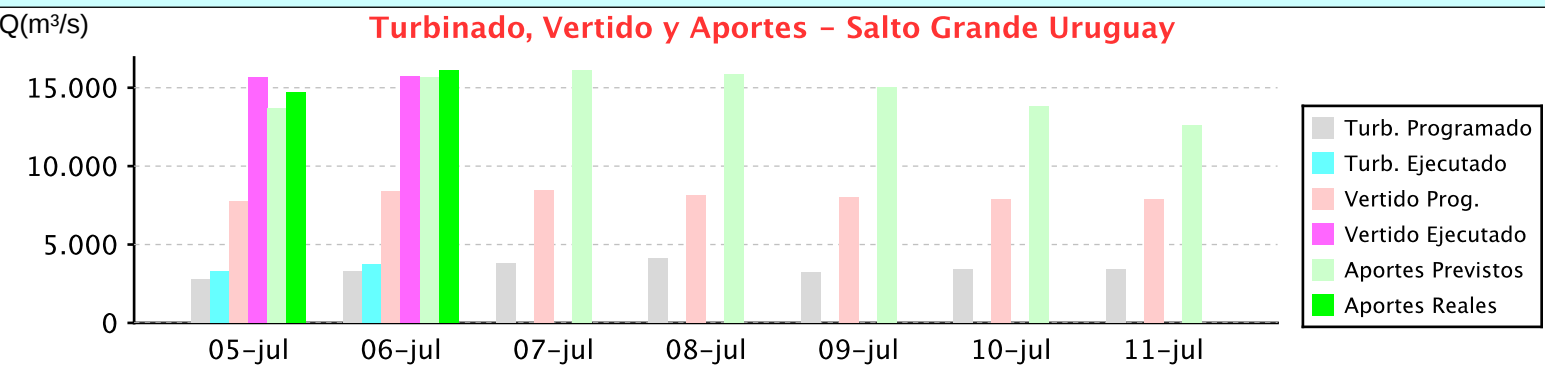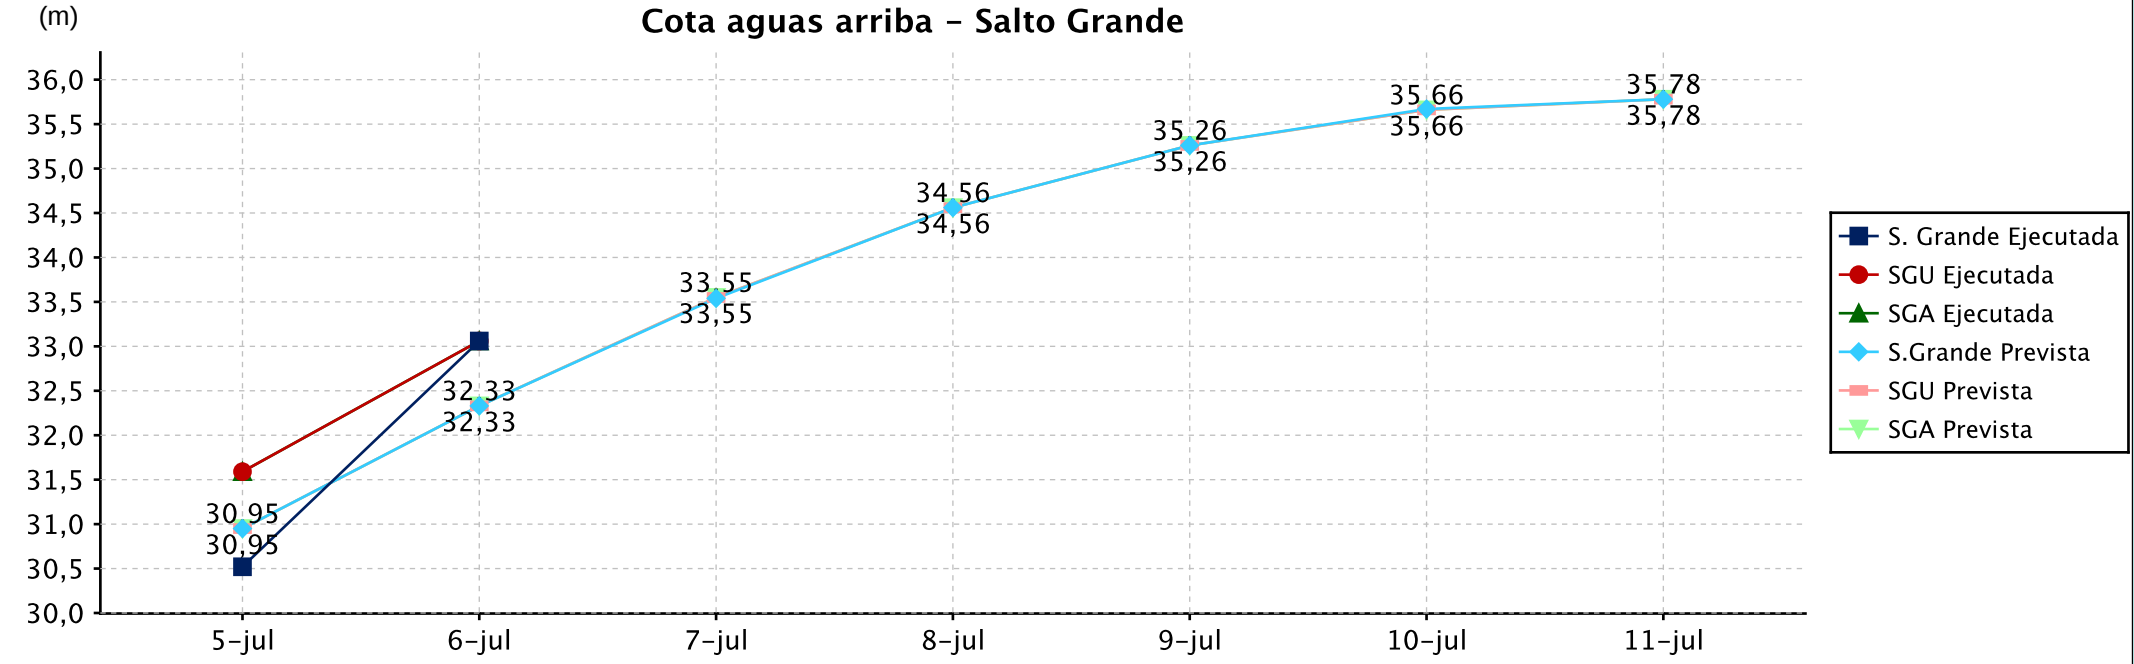

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,06
Cota Vista Arg	33,06
Cota real	33,06
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	661	640
Baygorria	668	716
Palmar	1.237	1.380
SGU	3.263	3.714

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	1.932
Baygorria	0	2.197
Palmar	0	1.820
SGU	15.675	16.077

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	2.739
Palmar	0	1.564
SGU	8.358	15.741

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
