




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


miércoles 16 de julio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	306
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	310
Central La Tablada	-40
Central P. del Tigre	280
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.392
C. Baygorria	2.017
C. Palmar	7.887
C. Salto Grande	18.283
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.541
TOTAL Generación	34.662


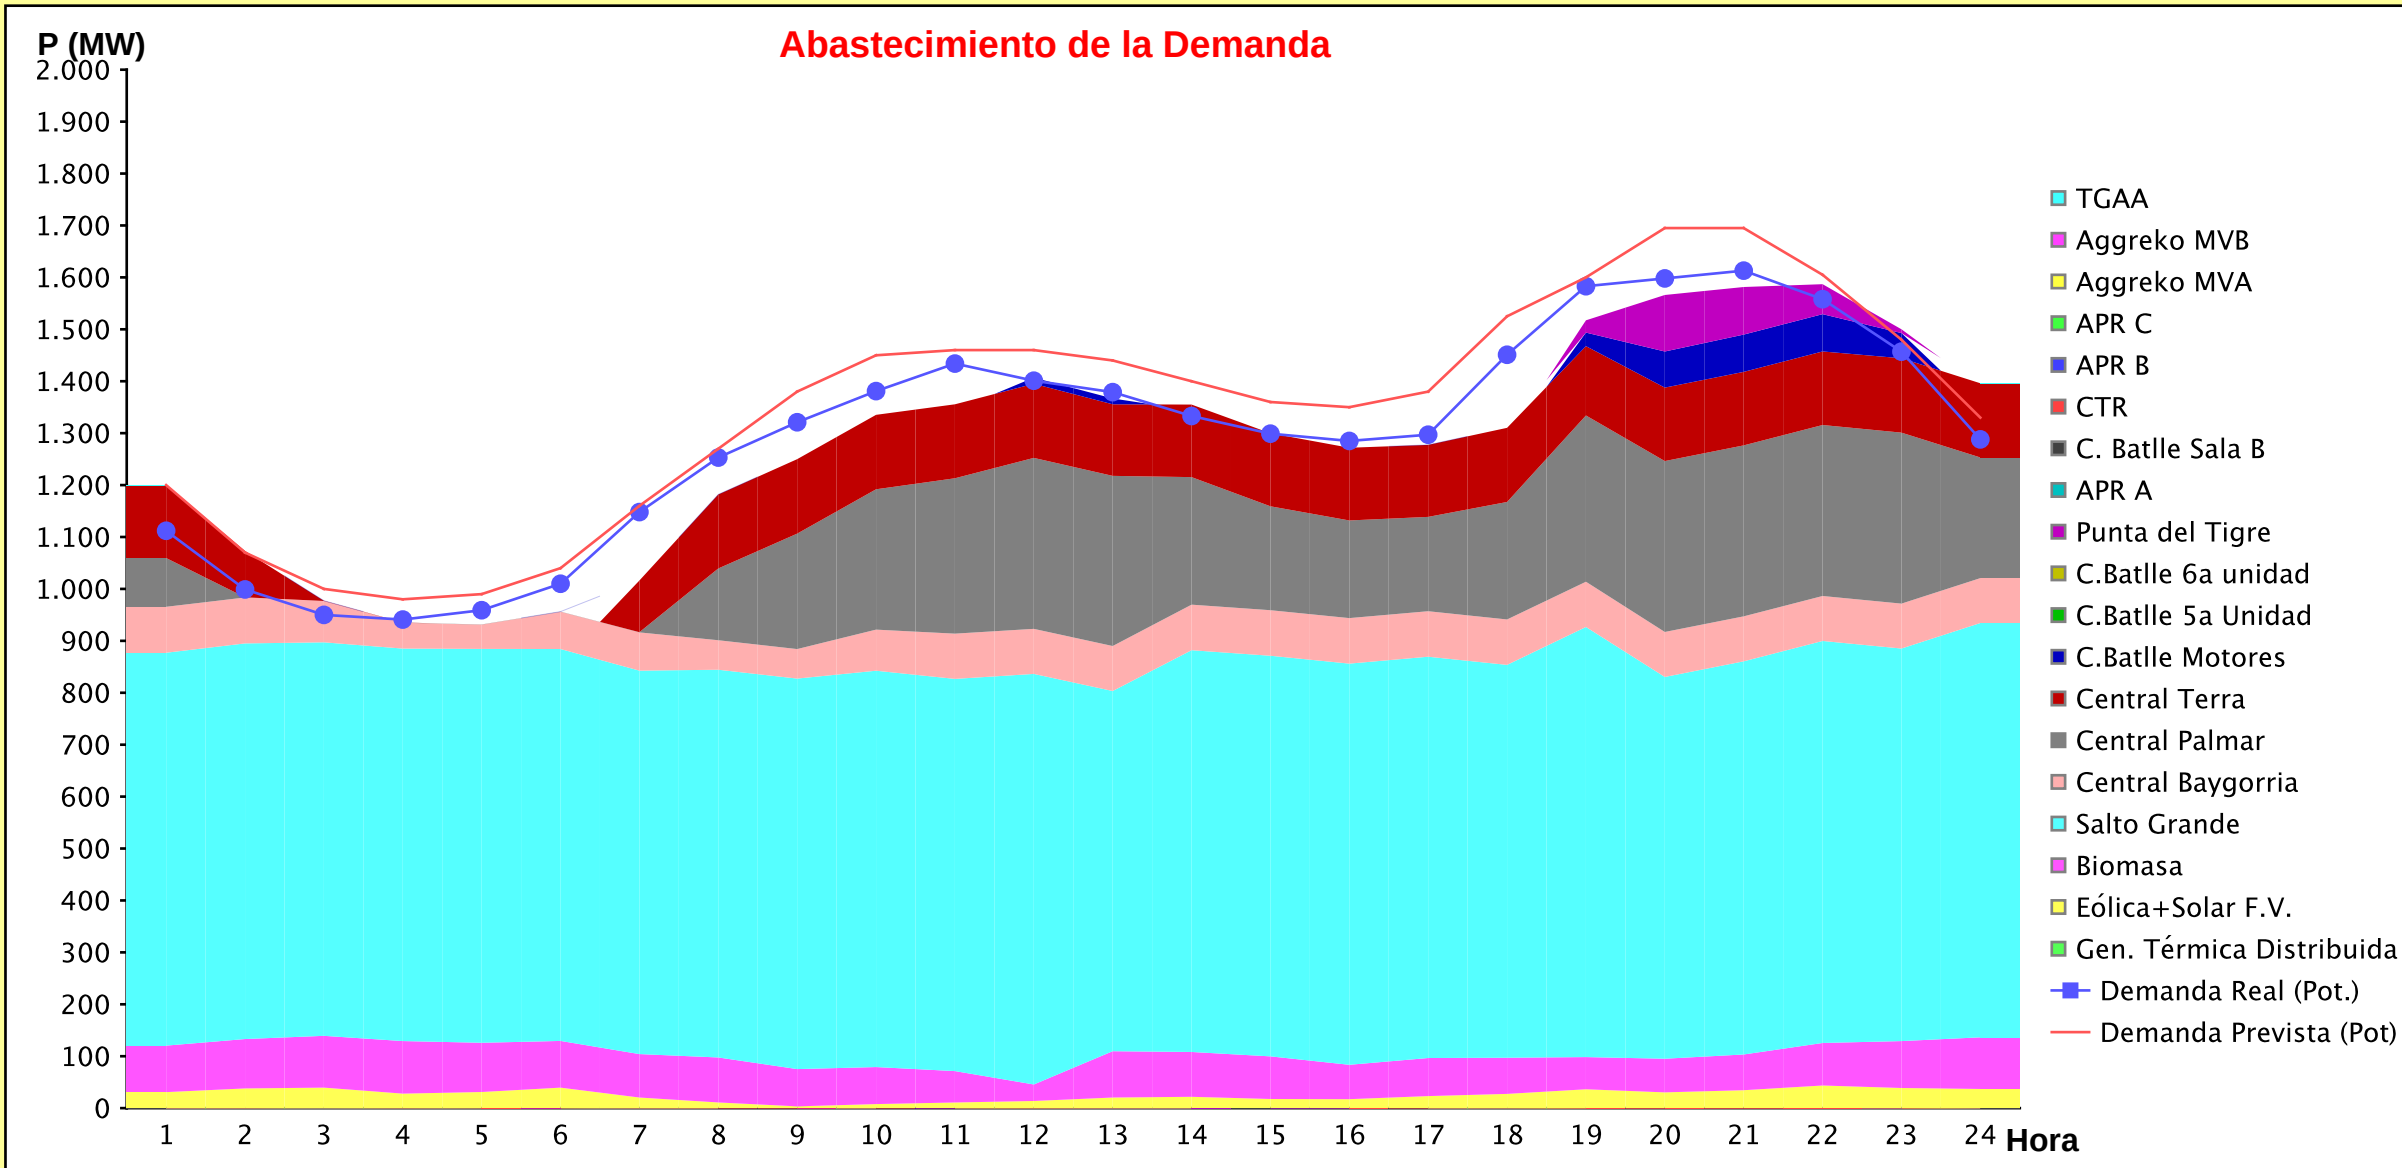


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	4.065
Hidráulica	4.065
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	4.065


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.597
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	32.320
Diferencia (MWh)	-1.723
Ejecutada - Programada	-5,33 %

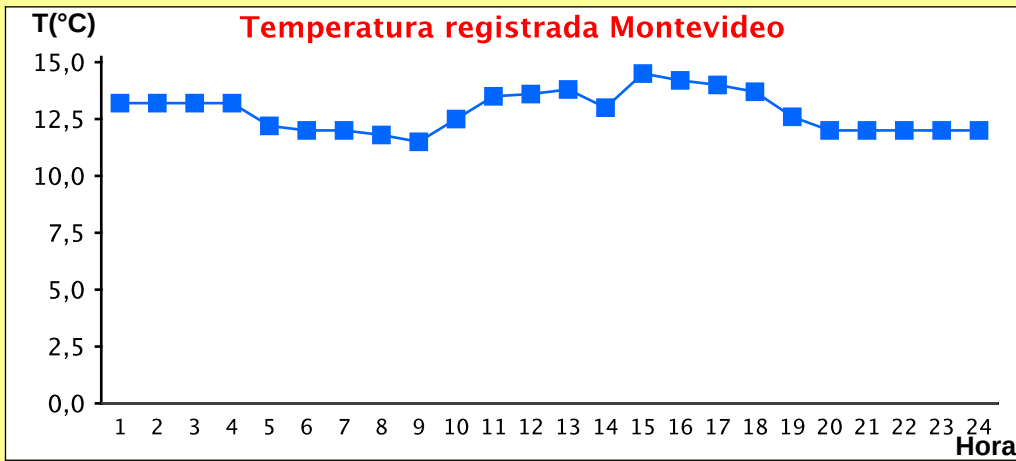

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1453,92 Hora 10:47
Potencia mínima:	924,6 Hora 03:51
Pico noche:	1628,75 Hora 20:39
Generación Media (MW)	
Eólica	26,8
Biomasa	81,8
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

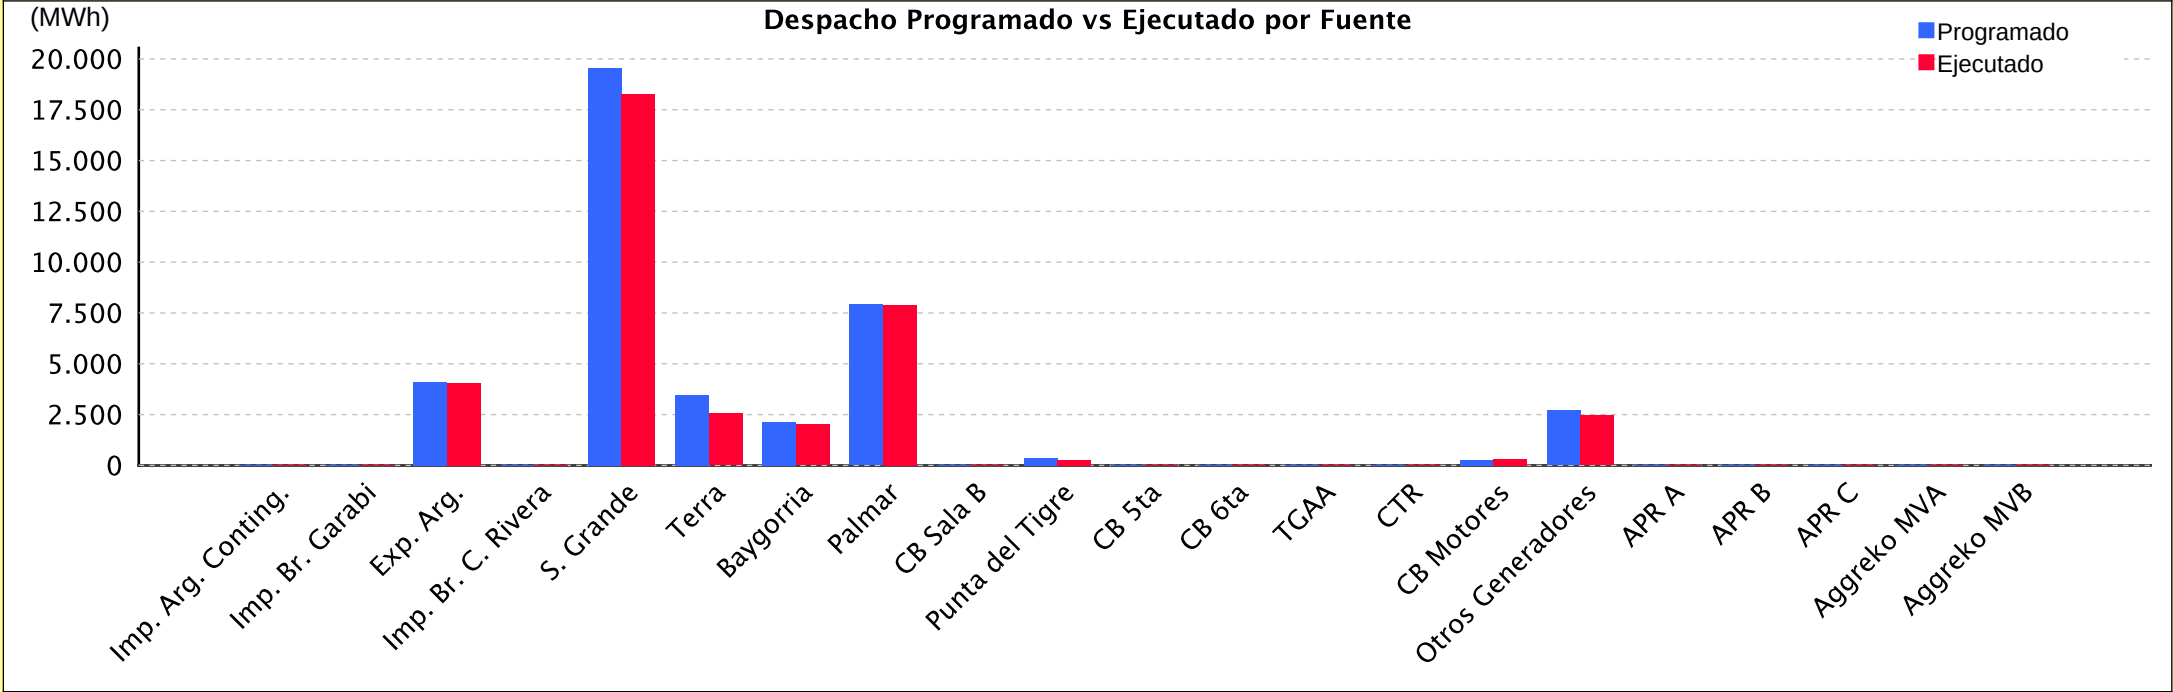
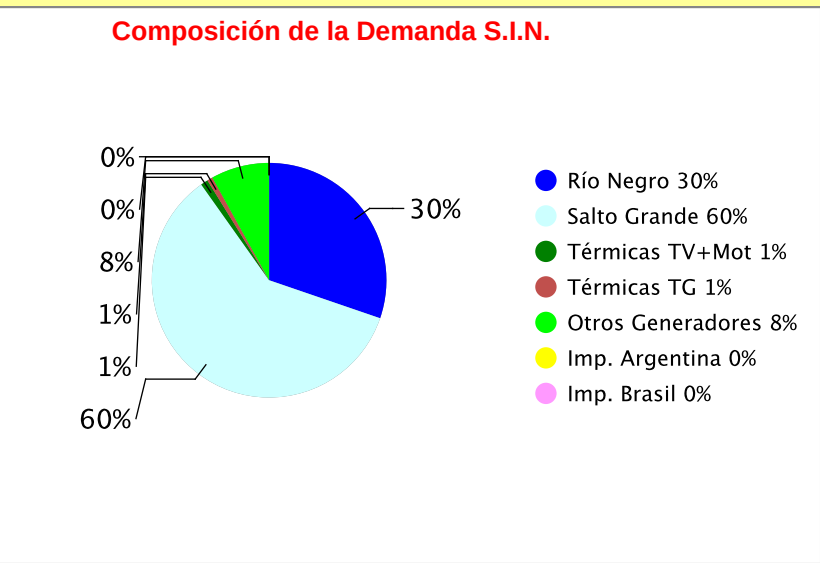


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

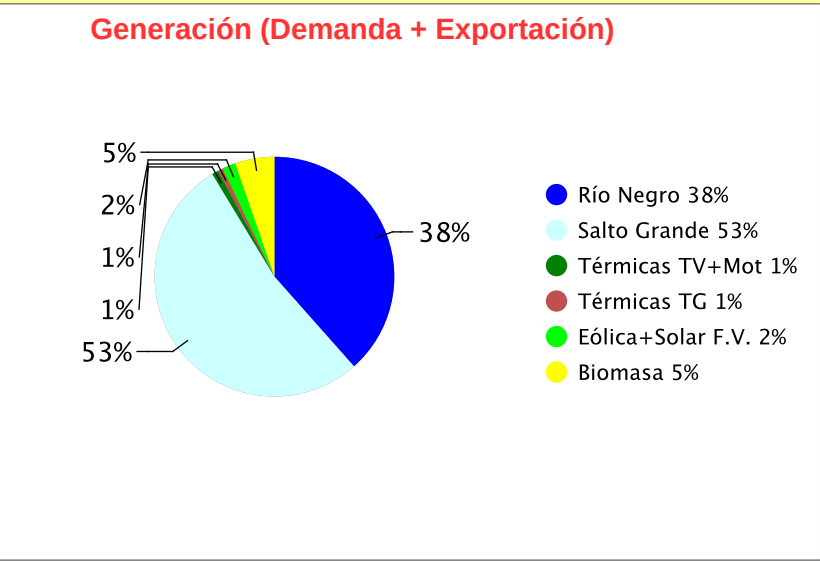



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

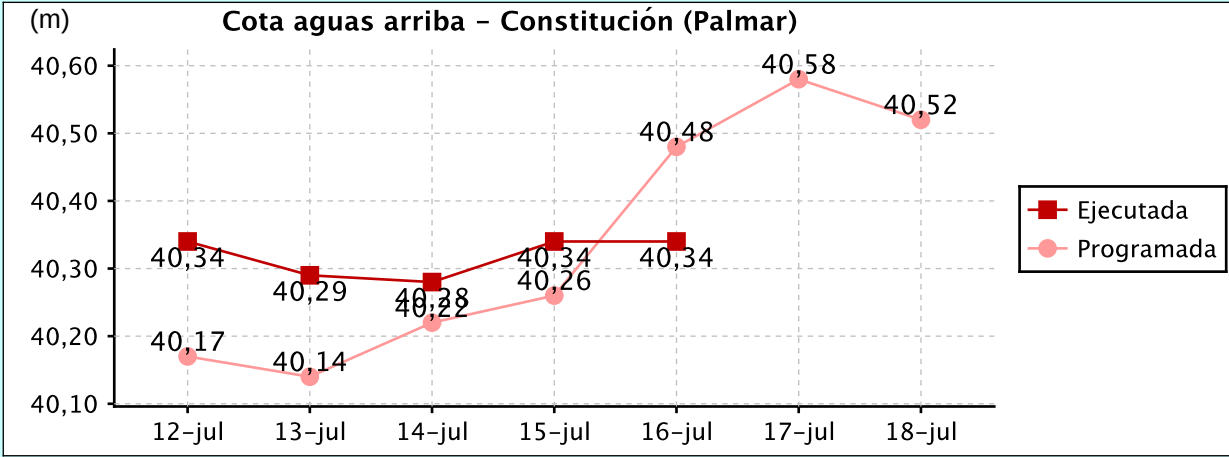
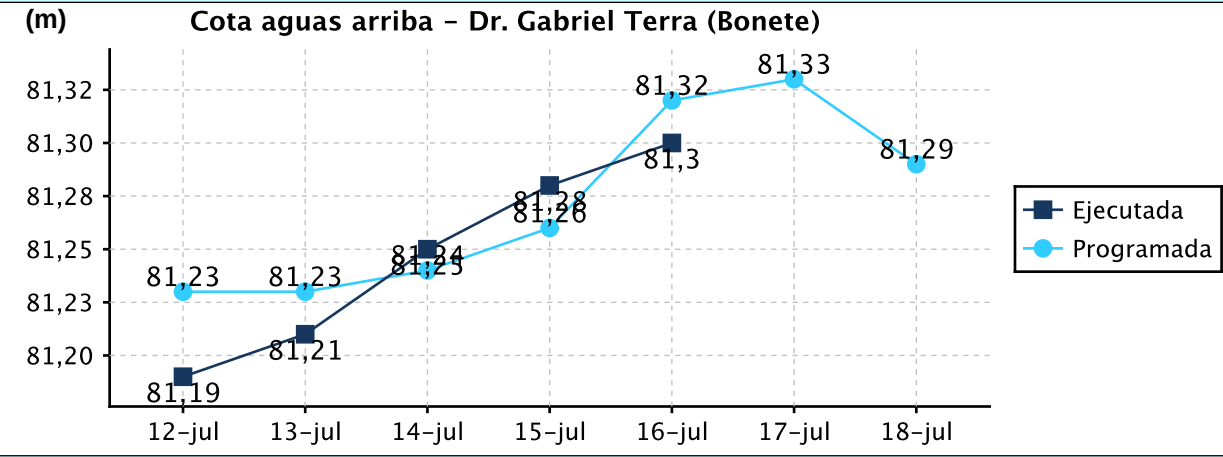


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,32	81,3
Baygorria	54,17	54,3
Palmar	40,48	40,34
SGU	35,38	35,33

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

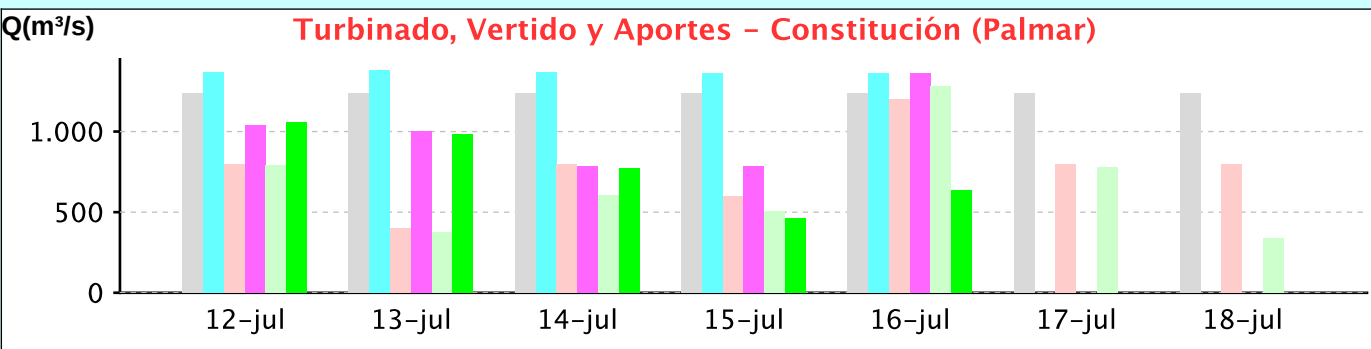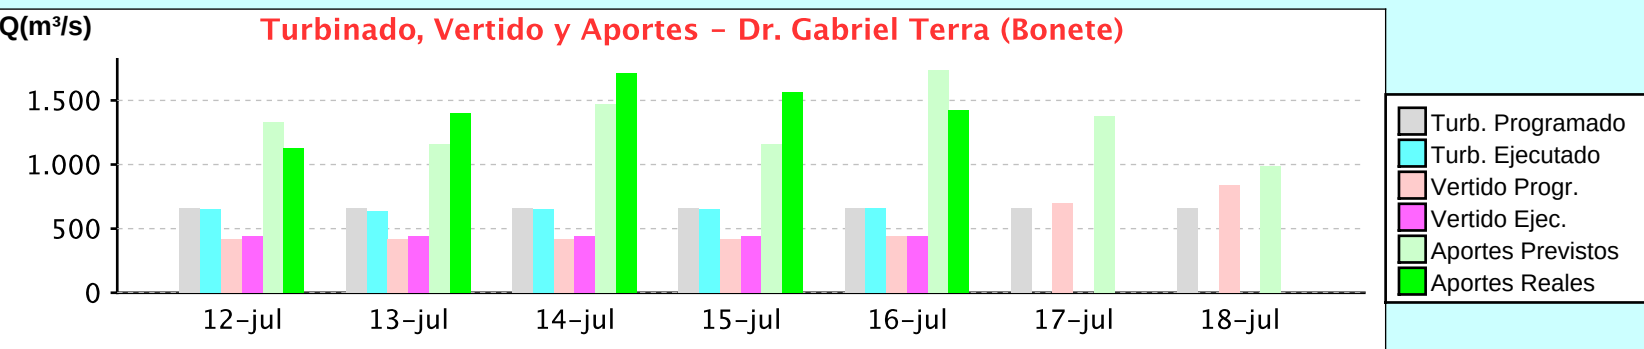

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

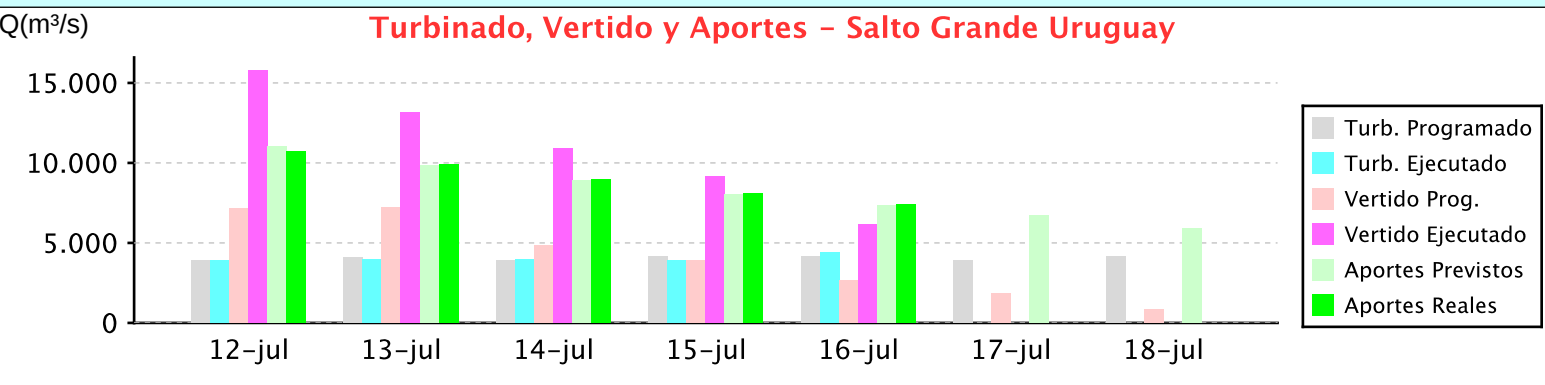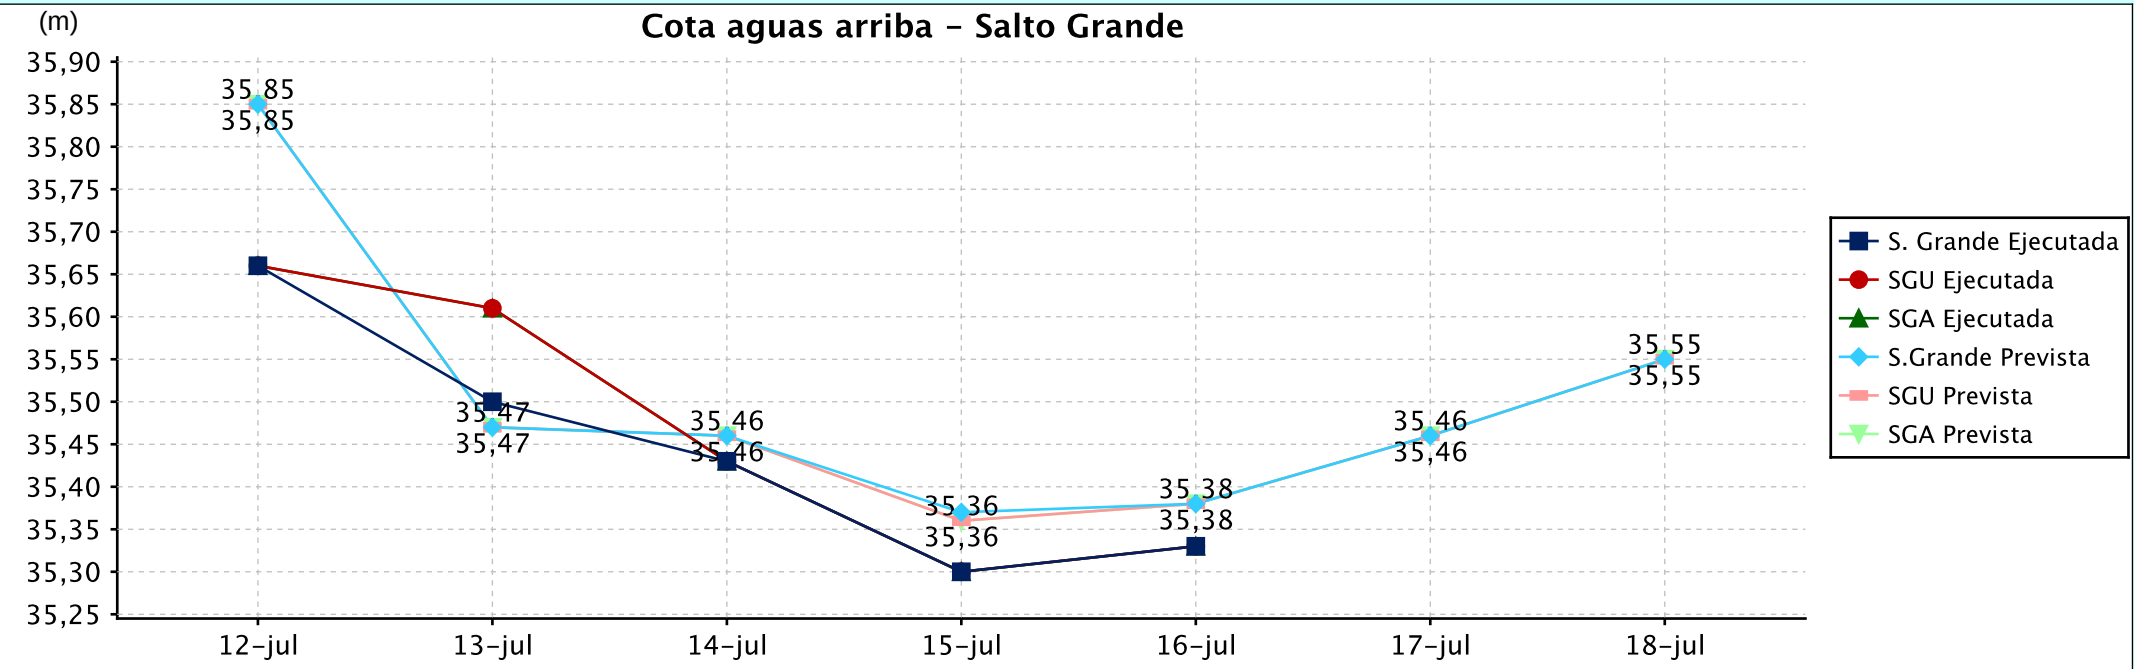

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,33
Cota Vista Arg	35,33
Cota real	35,33
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	661	658
Baygorria	794	772
Palmar	1.237	1.362
SGU	4.169	4.397

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.734	1.423
Baygorria	482	513
Palmar	1.282	635
SGU	7.350	7.408

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	444
Baygorria	800	755
Palmar	1.200	1.362
SGU	2.647	6.178

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 169 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

17/07/2014 15:39
