



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 19 de julio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-53
Central P. del Tigre	0
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.239
C. Baygorria	2.114
C. Palmar	7.869
C. Salto Grande	20.341
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.684
TOTAL Generación	37.185

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	9.279
Hidráulica	9.279
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	9.279



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.906
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.470
Diferencia (MWh)	-1.564
Ejecutada - Programada	-5,31 %

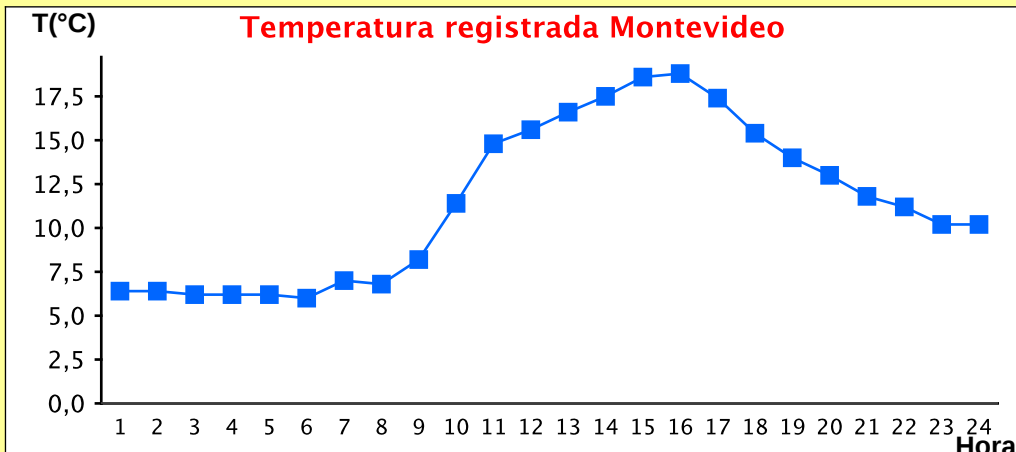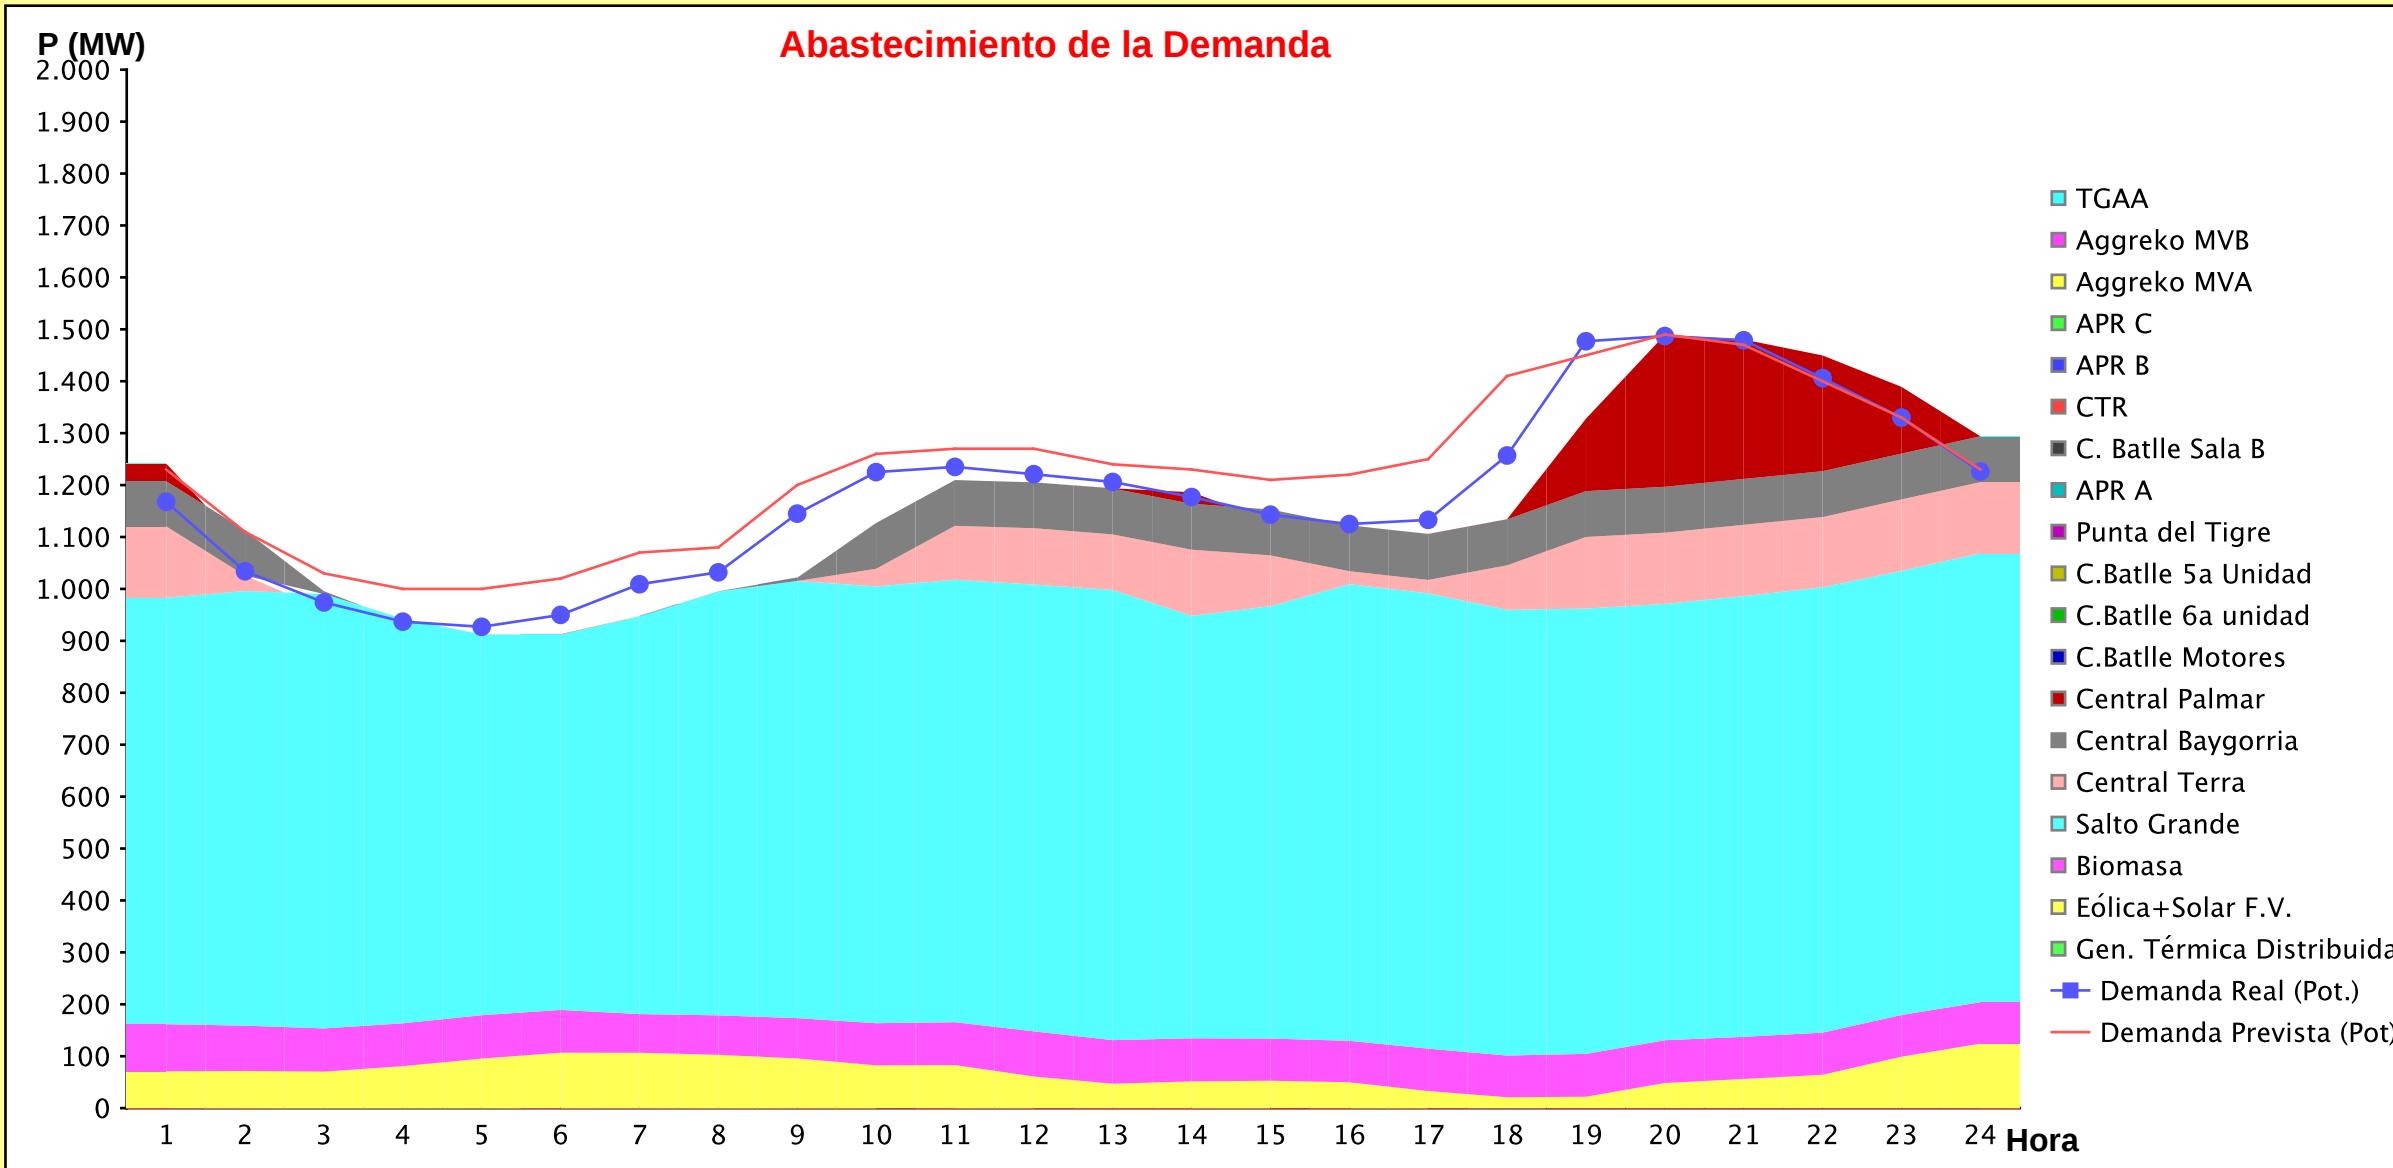


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1257,15 Hora 10:23
Potencia mínima:	950,46 Hora 04:29
Pico noche:	1531,36 Hora 20:07

Generación Media (MW)	
Eólica	70,8
Biomasa	85,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

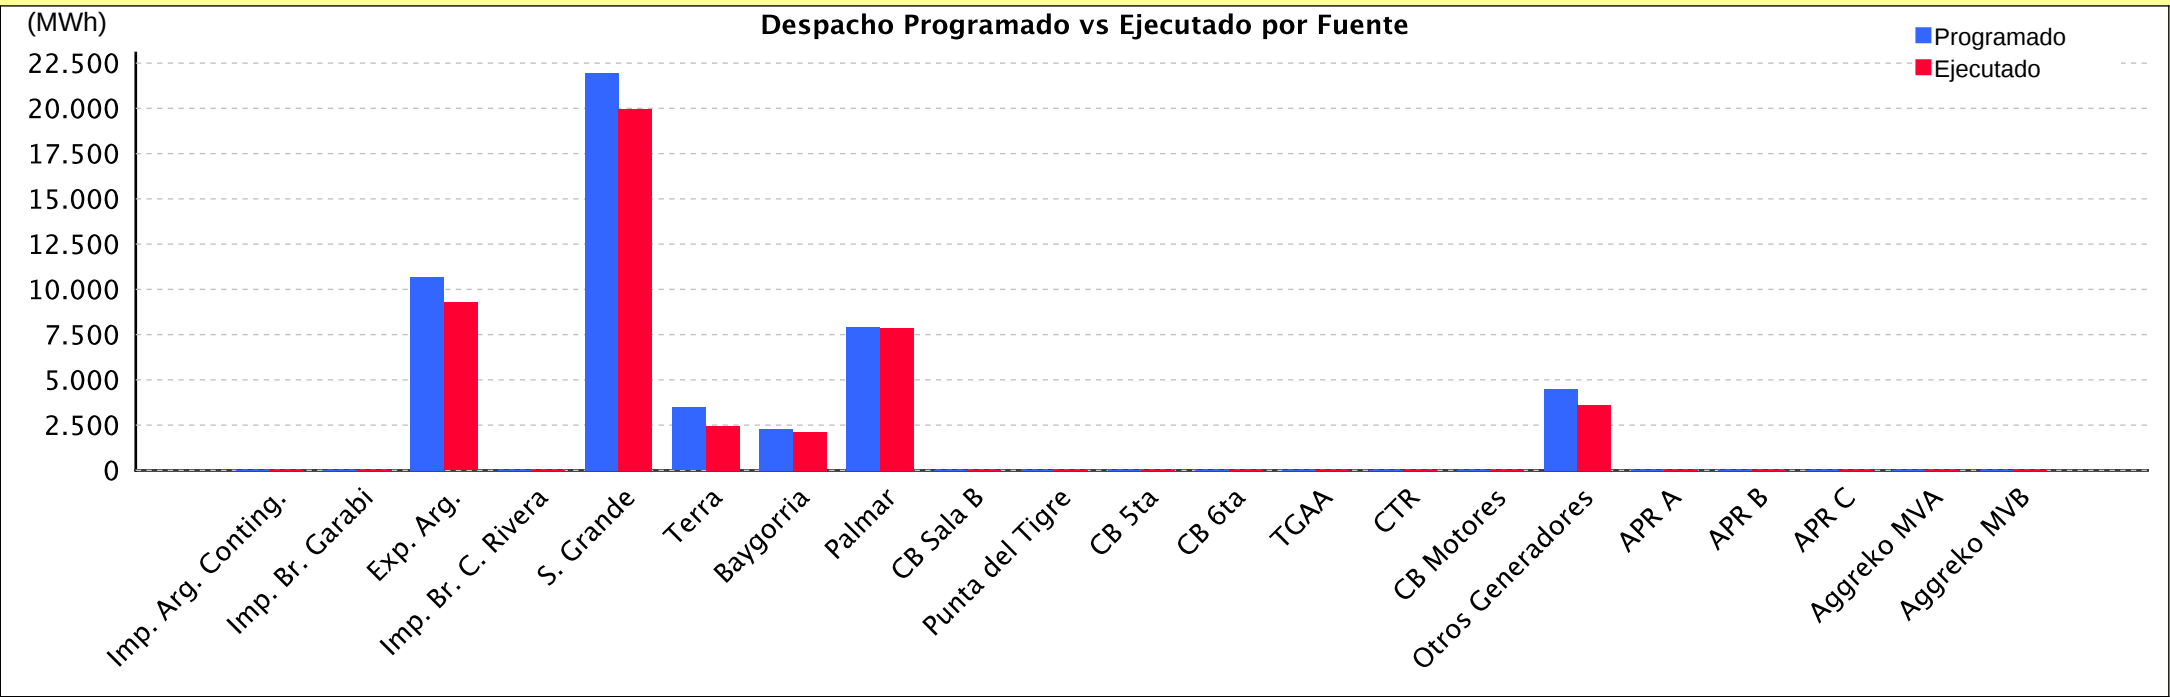
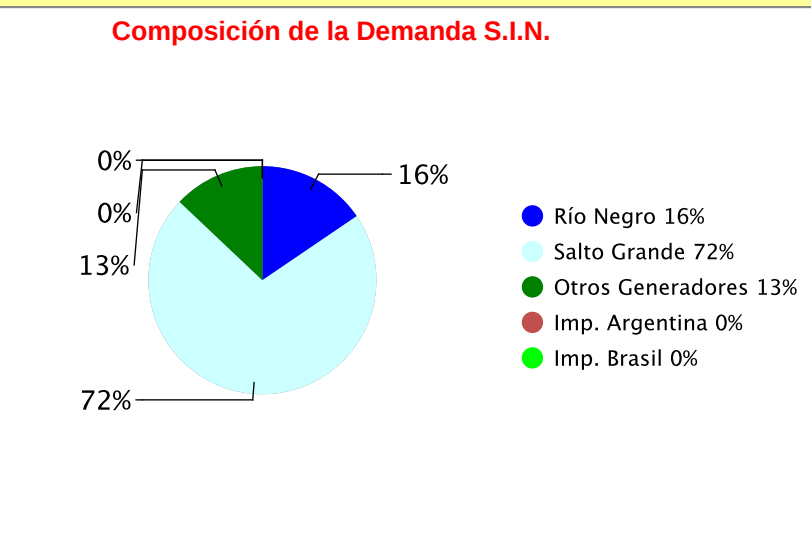


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

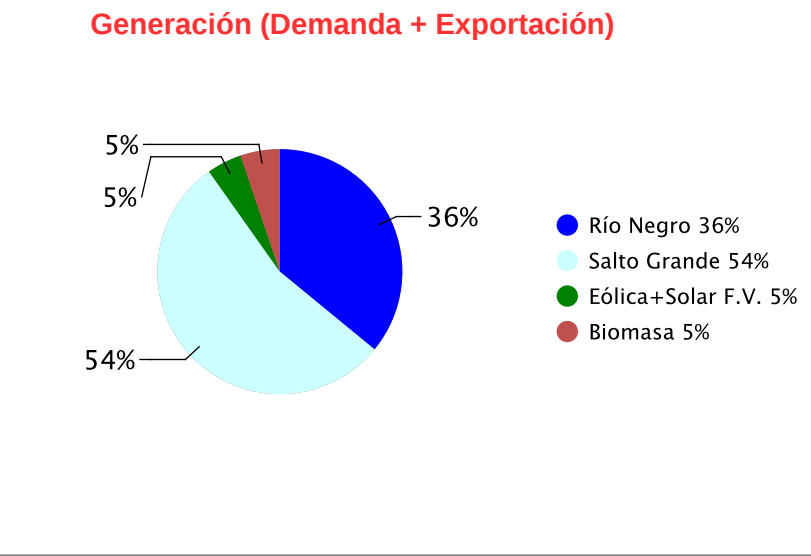



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

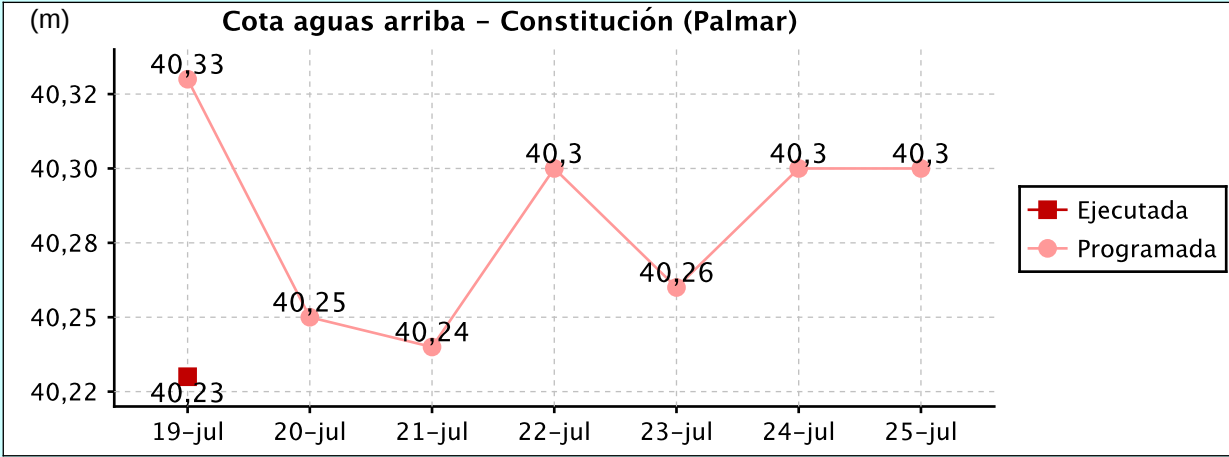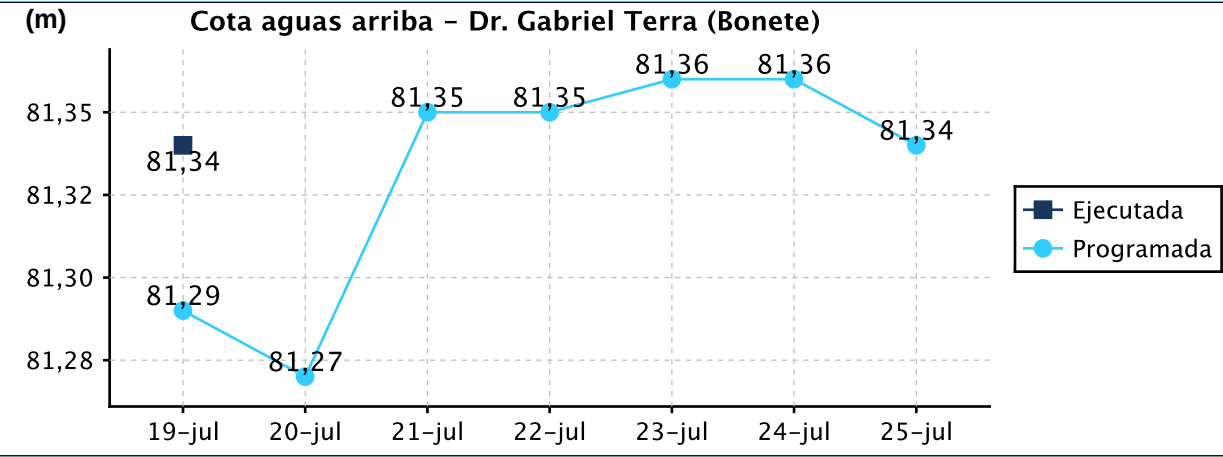


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,29	81,34
Baygorria	54,20	54,21
Palmar	40,33	40,23
SGU	35,56	35,5

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

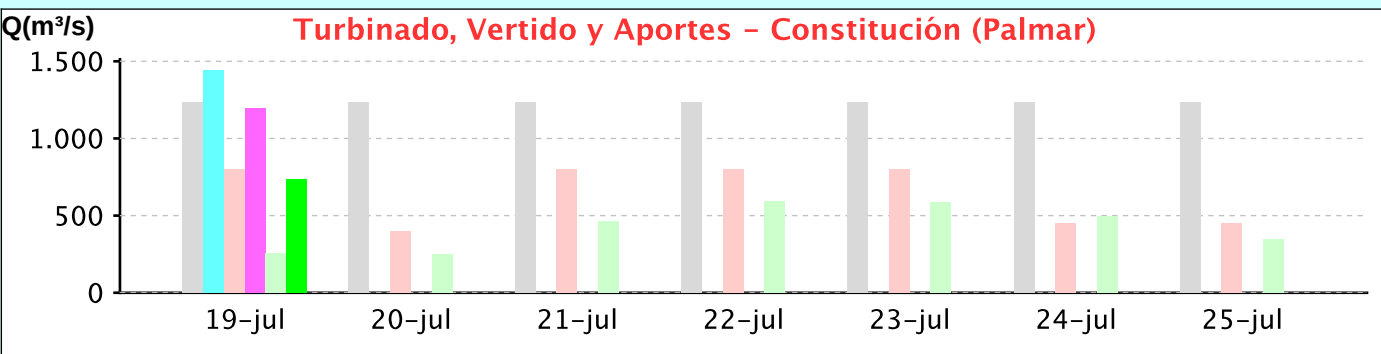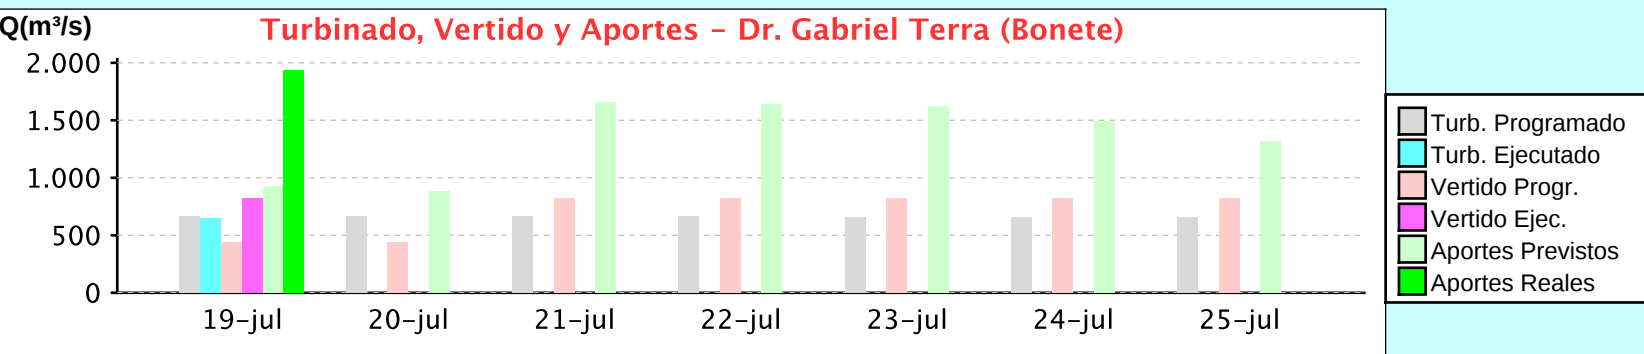

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

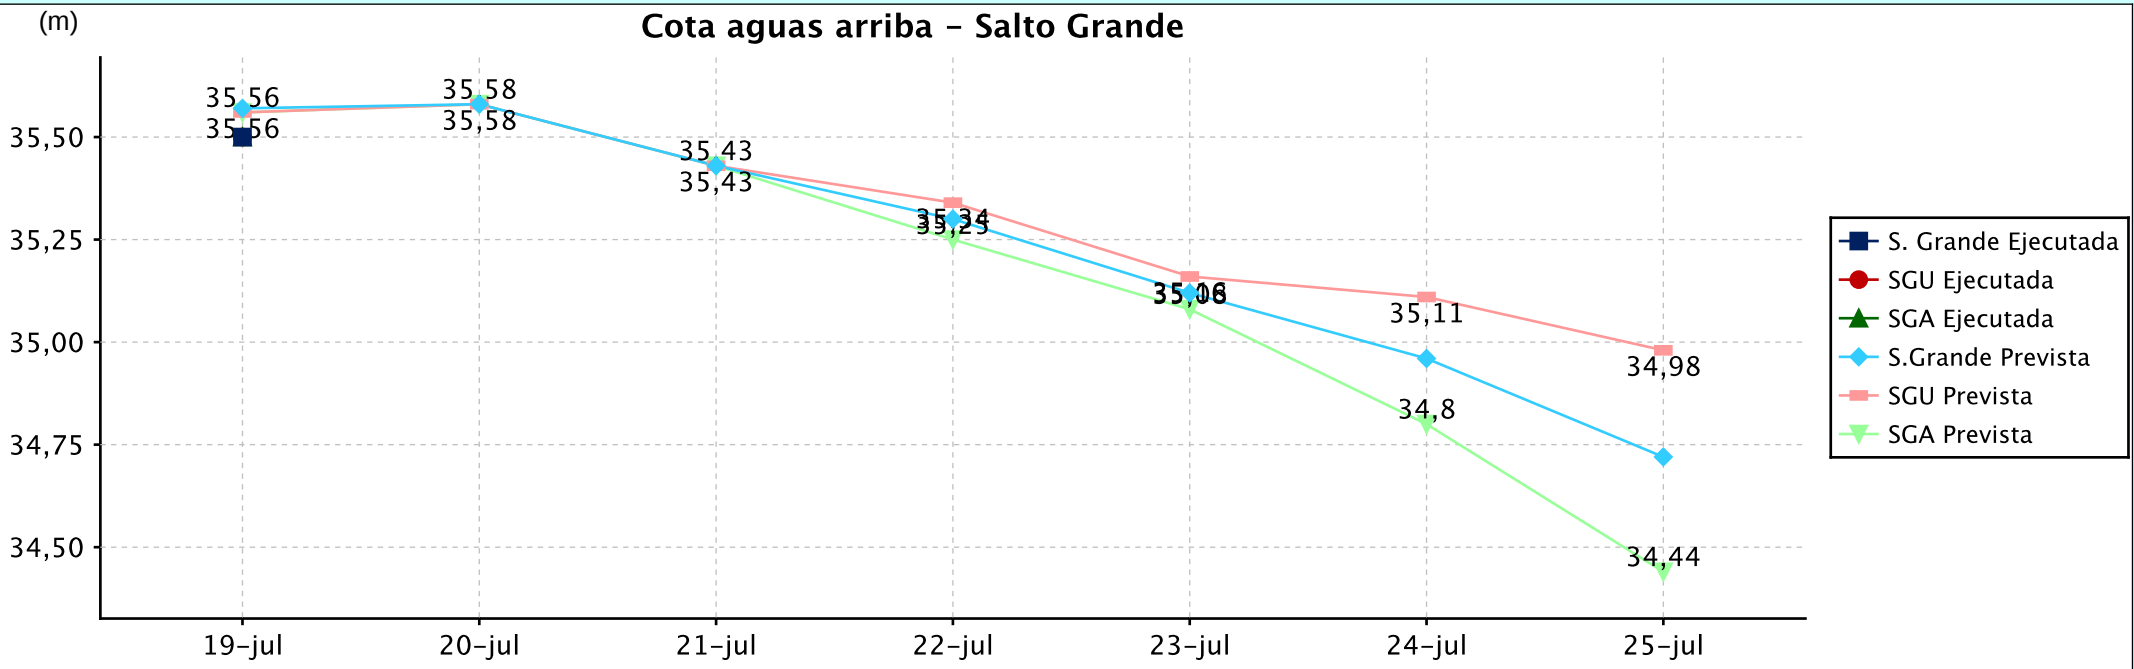


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	661	644
Baygorria	846	817
Palmar	1.237	1.441
SGU	4.175	4.350

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	927	1.934
Baygorria	143	242
Palmar	255	737
SGU	5.025	5.325

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	819
Baygorria	250	834
Palmar	800	1.197
SGU	0	1.228

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

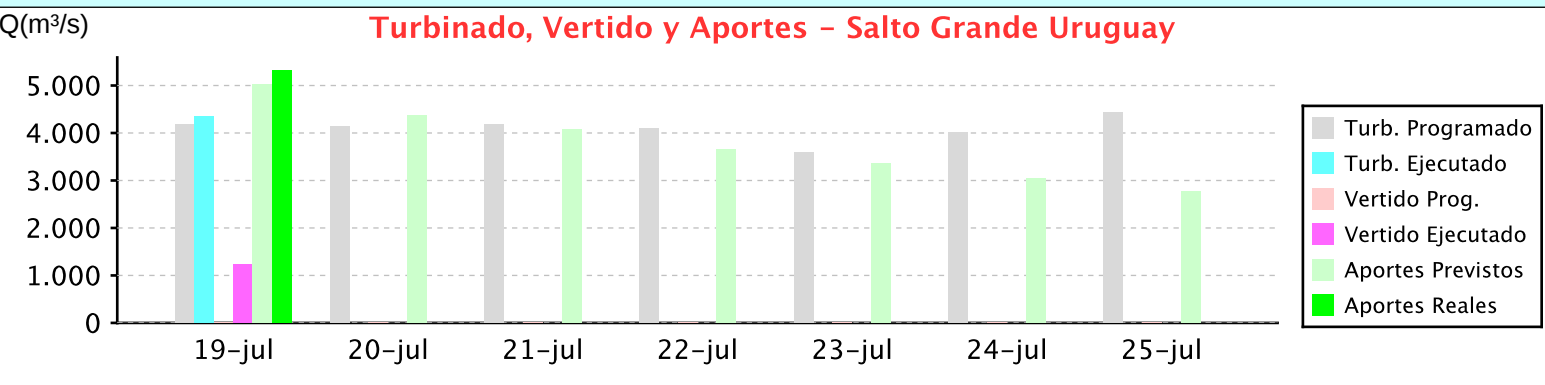

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,50
Cota Vista Arg	35,50
Cota real	35,50
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

OBSERVACIONES
