




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


lunes 21 de julio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-40
Central P. del Tigre	2
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.256
C. Baygorria	1.925
C. Palmar	7.867
C. Salto Grande	20.902
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.421
TOTAL Generación	39.324



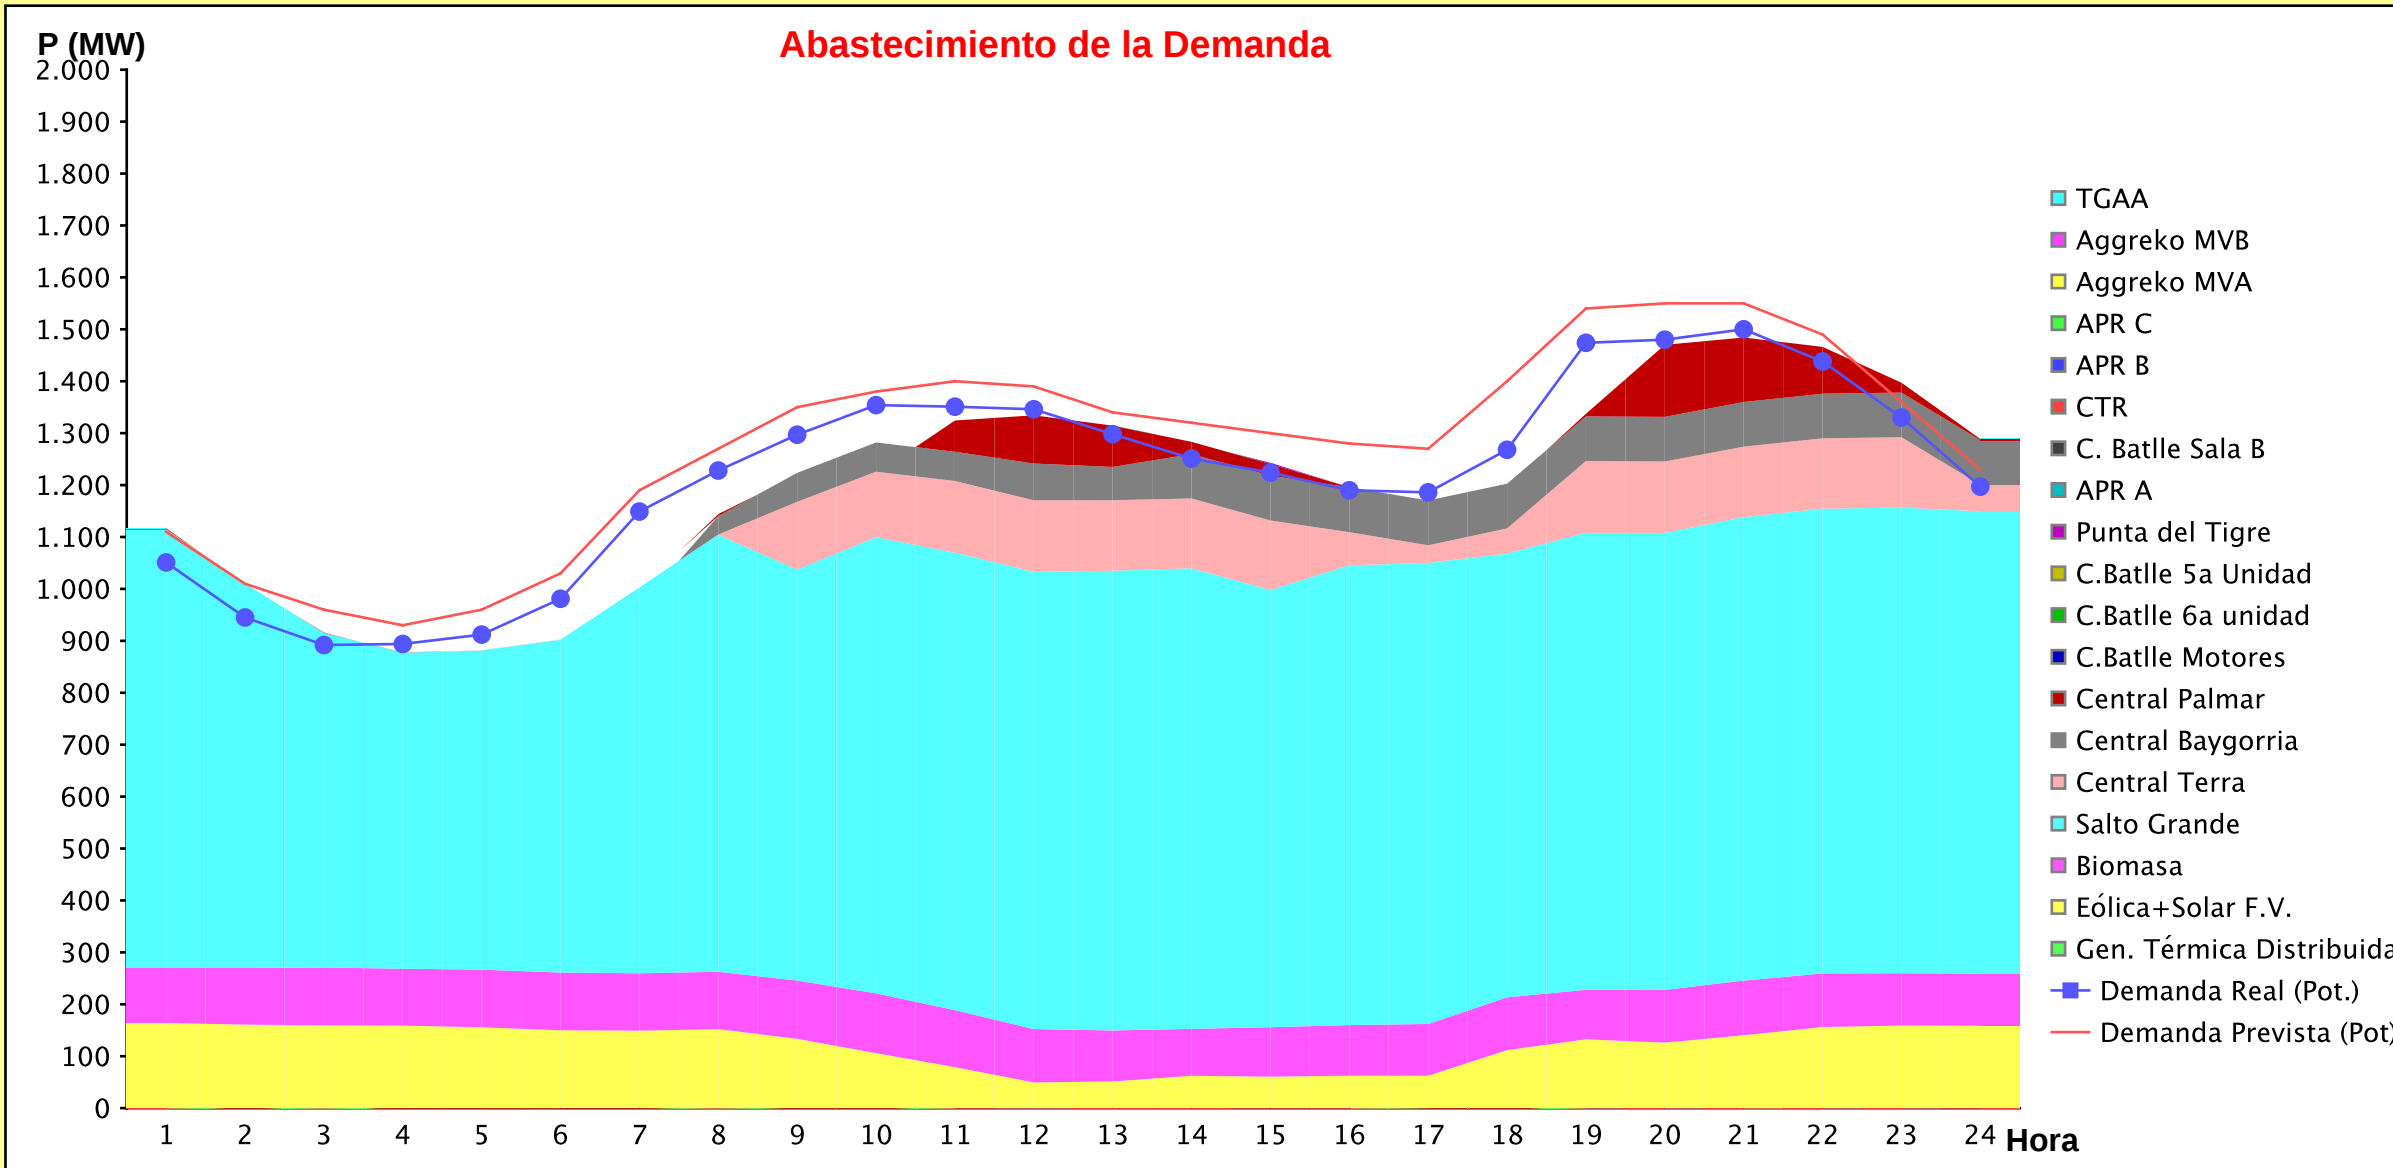


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	10.520
Hidráulica	10.520
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	10.520

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.804
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	30.610
Diferencia (MWh)	-1.806
Ejecutada - Programada	-5.90 %


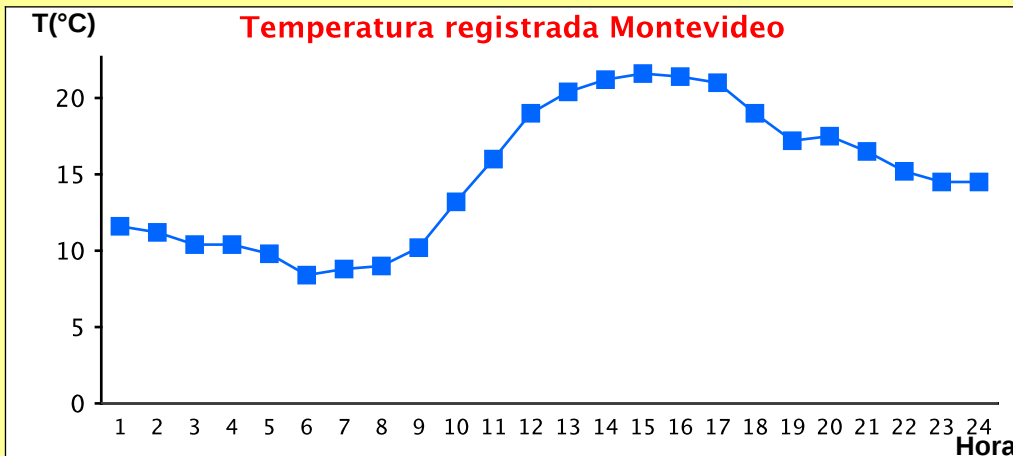


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1383,33 Hora 10:42
Potencia mínima:	902,81 Hora 03:24
Pico noche:	1536,55 Hora 20:58
Generación Media (MW)	
Eólica	121,2
Biomasa	104,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

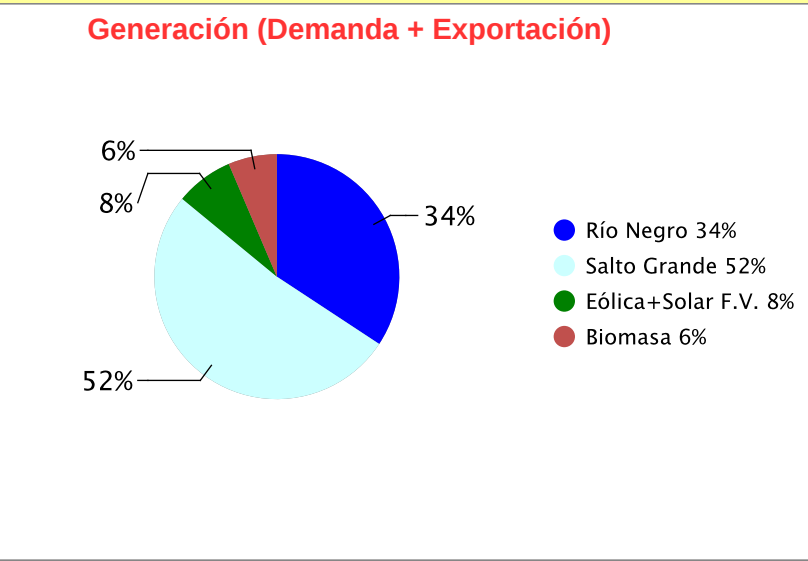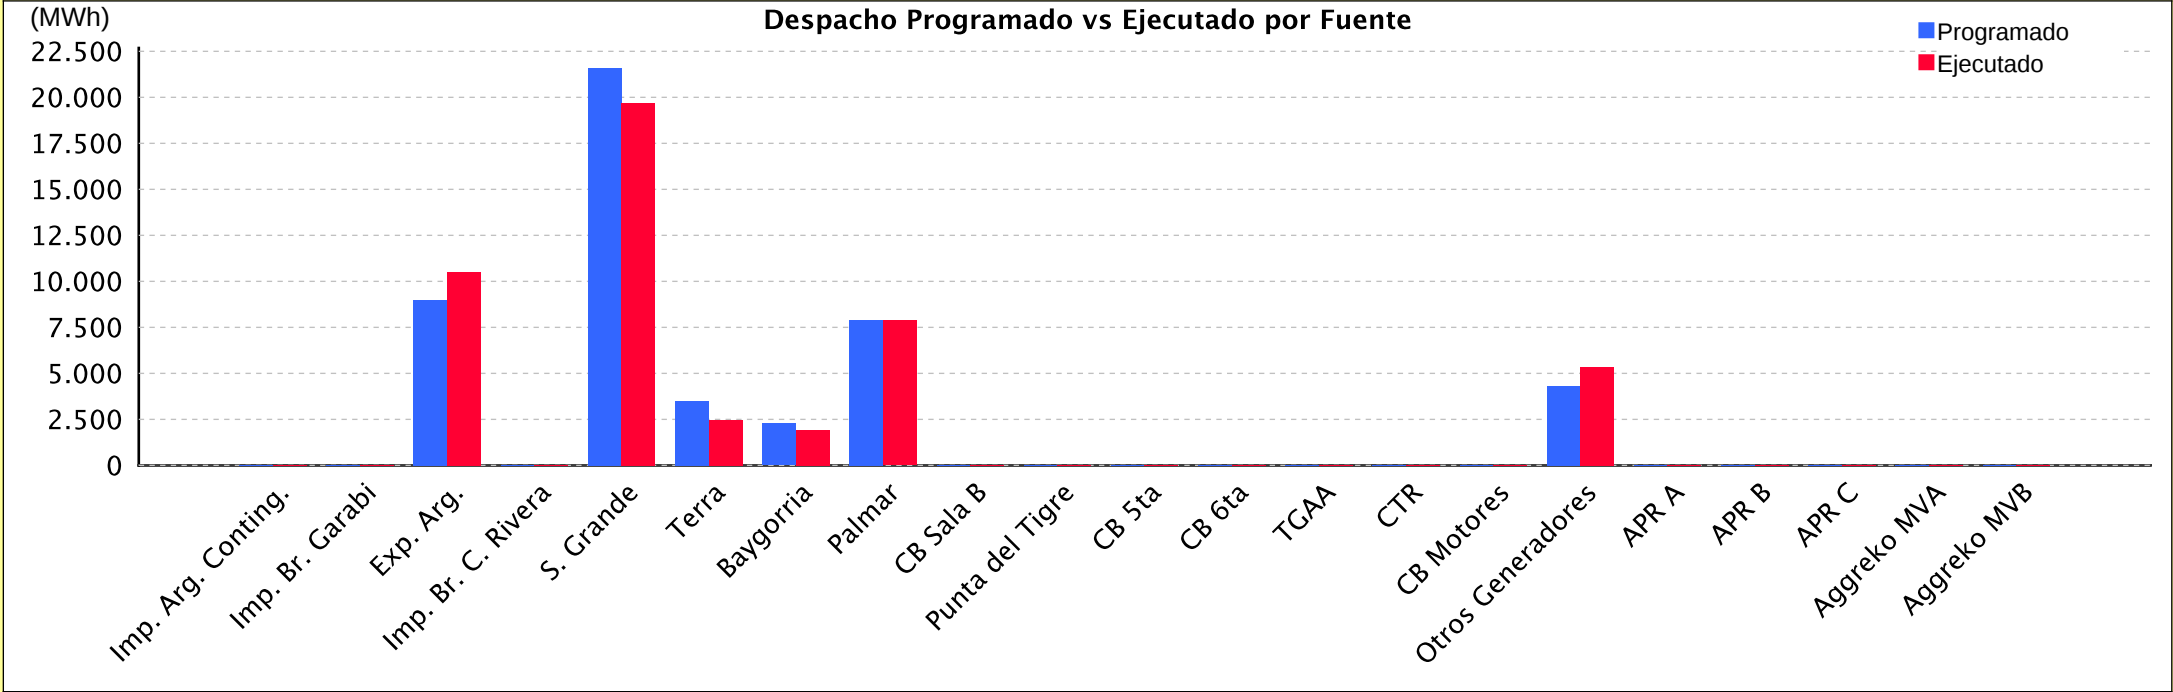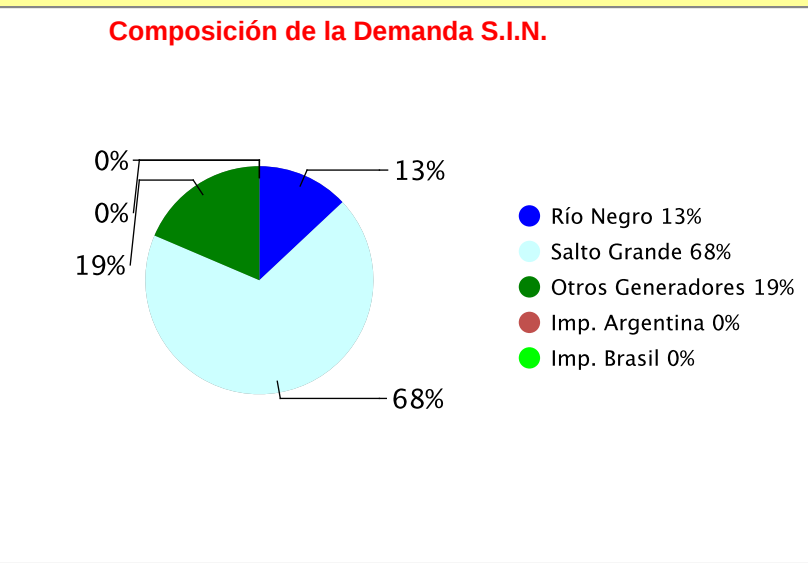



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

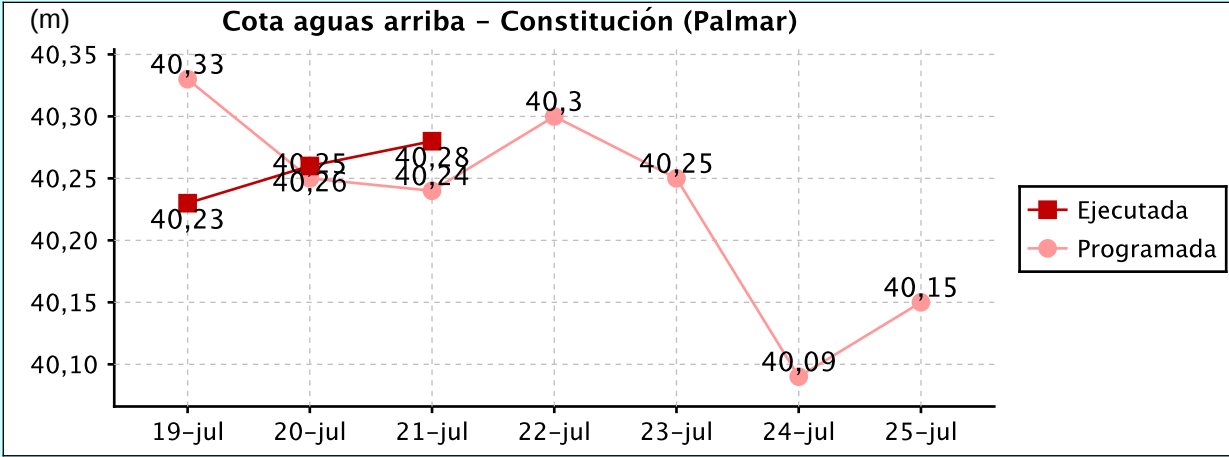
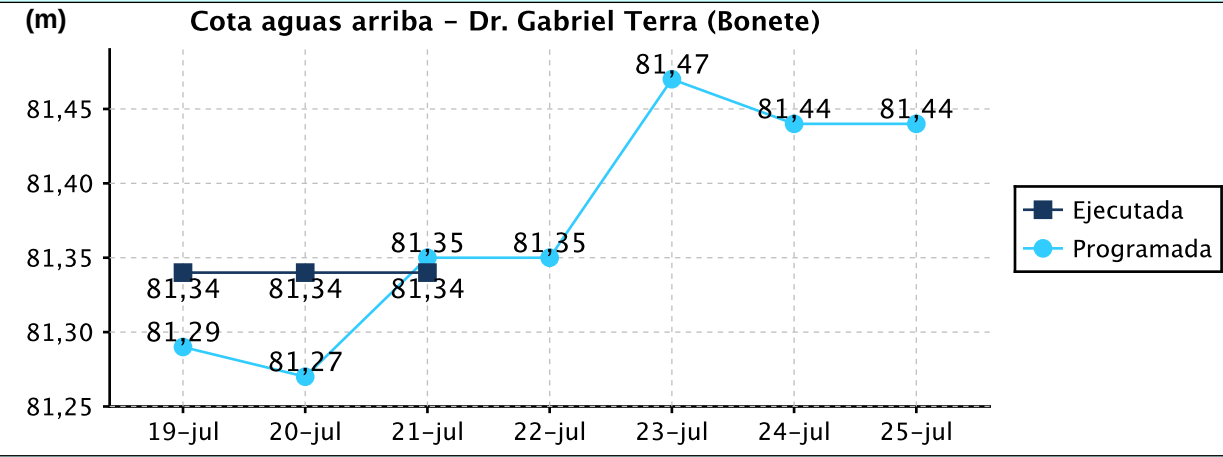


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,35	81,34
Baygorria	54,03	54,21
Palmar	40,24	40,28
SGU	35,43	35,4

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

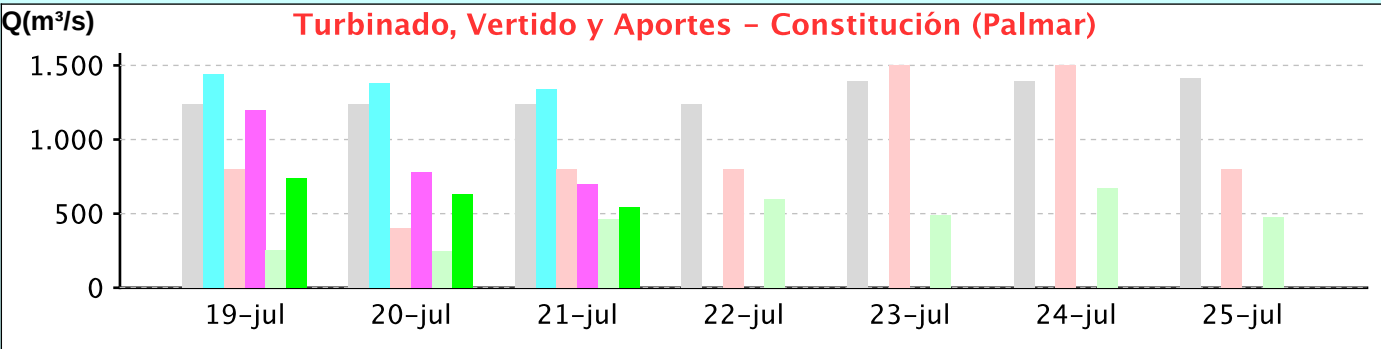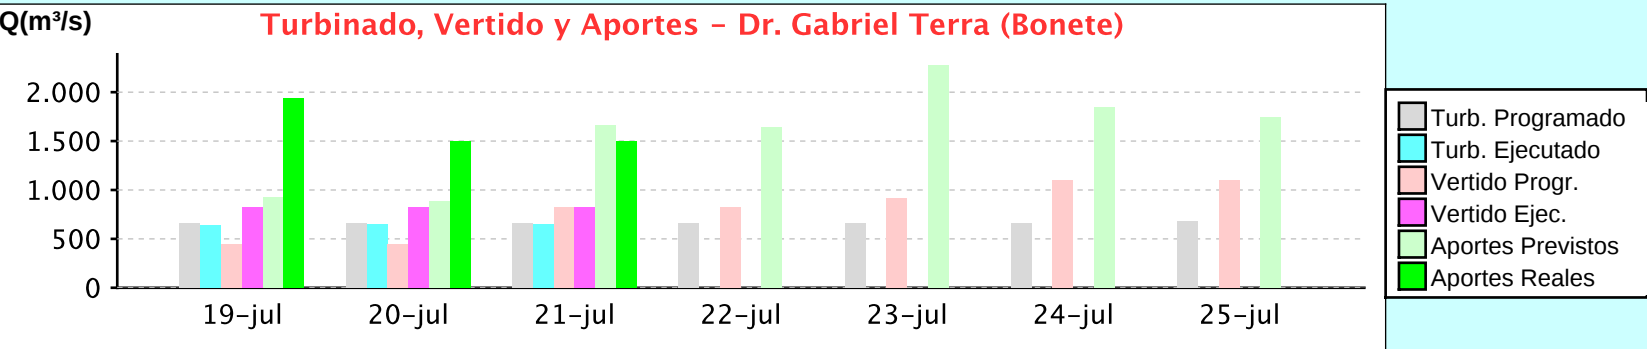

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

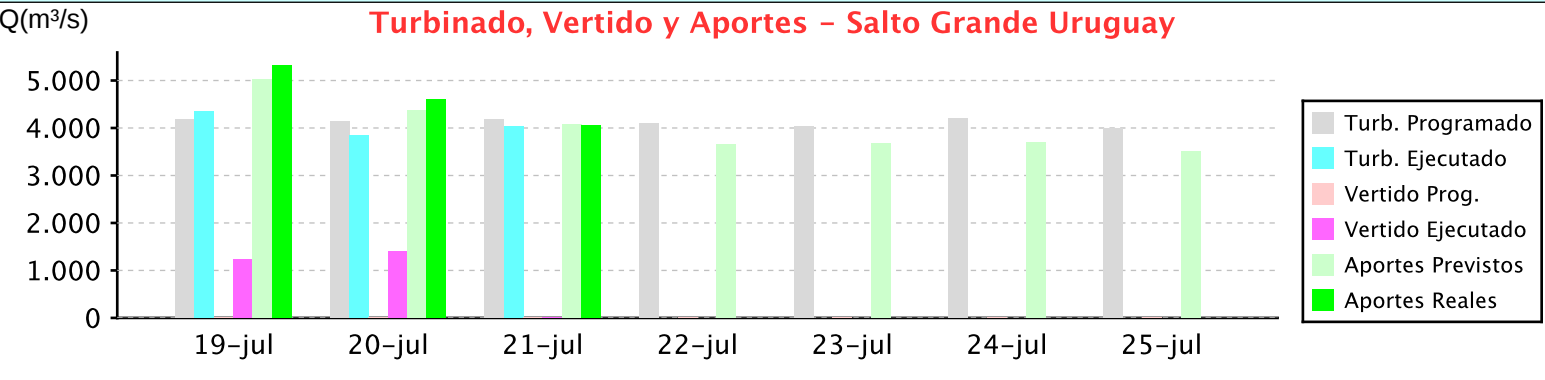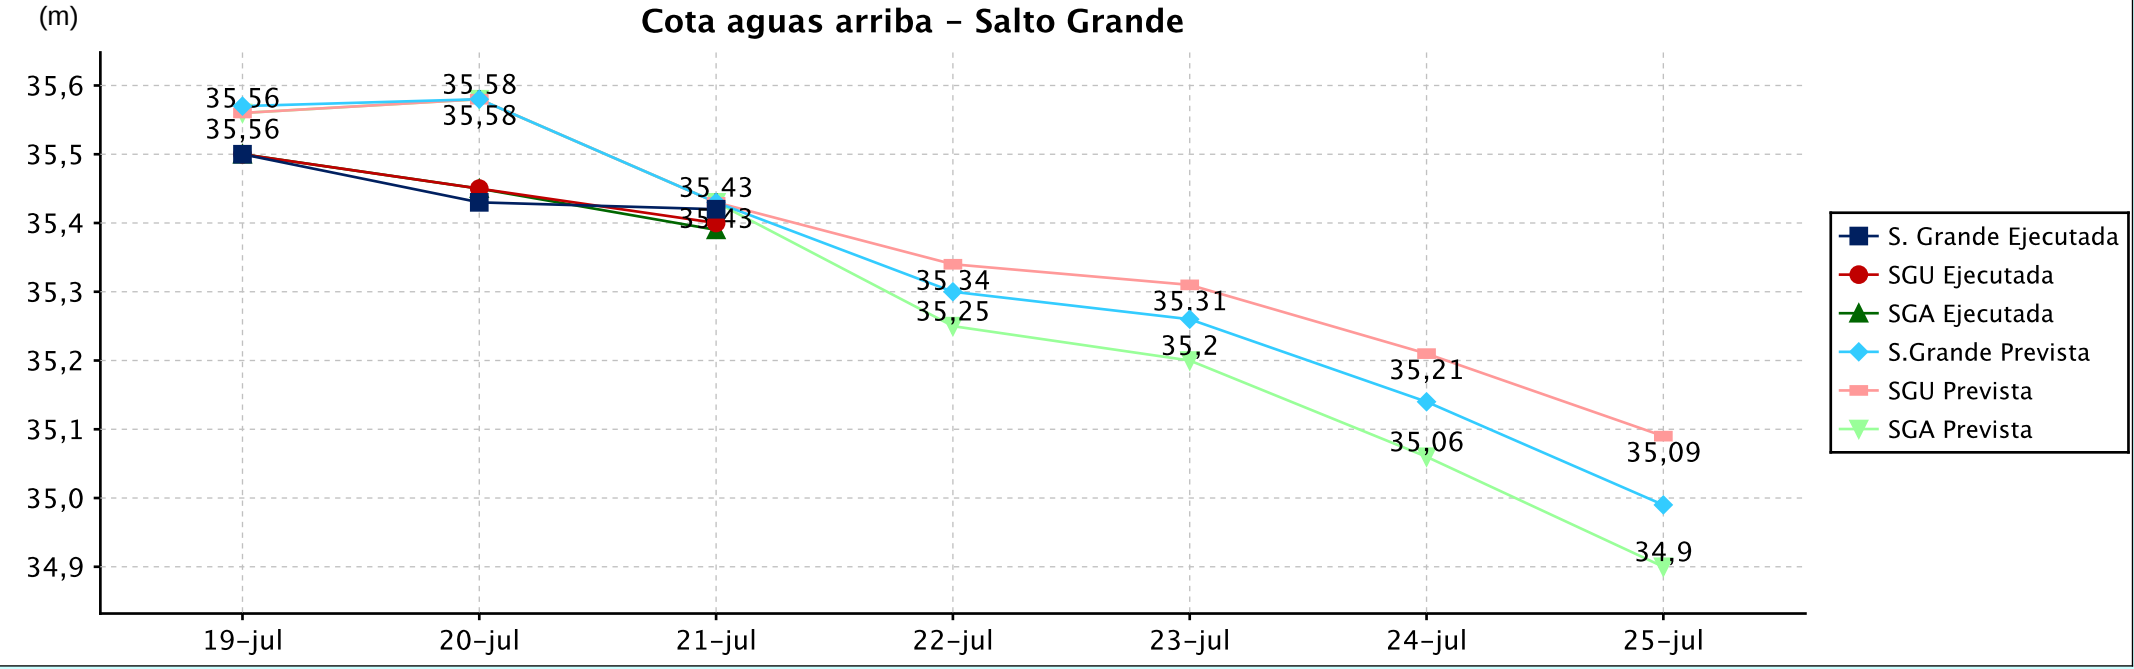

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,40
Cota Vista Arg	35,39
Cota real	35,42

Dif. Energ. (U-A)	347
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	661	646
Baygorria	846	734
Palmar	1.237	1.339
SGU	4.184	4.025

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.657	1.499
Baygorria	0	154
Palmar	463	544
SGU	4.075	4.064

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	820	821
Baygorria	830	834
Palmar	800	698
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
