



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 22 de julio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	287
APR A	-2
APR B	225
APR C	-0
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.270
C. Baygorria	2.014
C. Palmar	7.873
C. Salto Grande	19.753
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.635
TOTAL Generación	37.005

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	5.889
Hidráulica	5.889
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	5.889



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.116
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.230
Diferencia (MWh)	-114
Ejecutada - Programada	-0,36 %

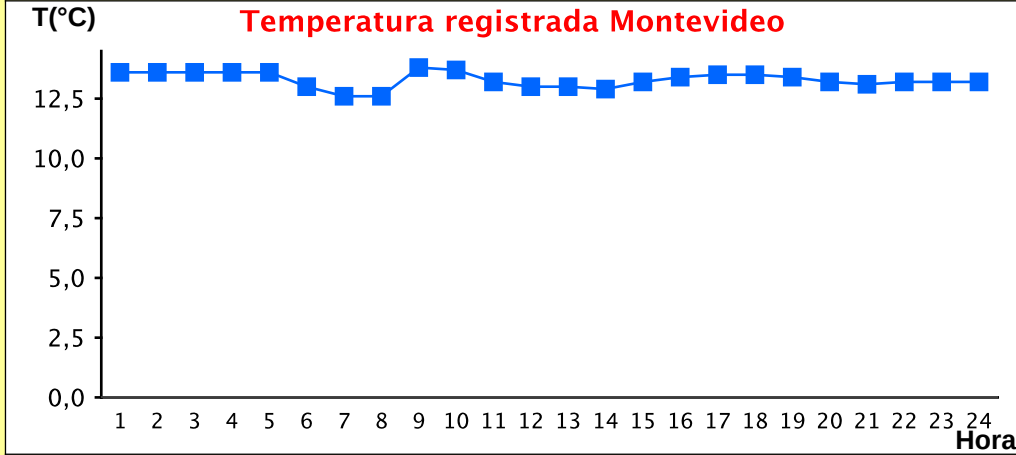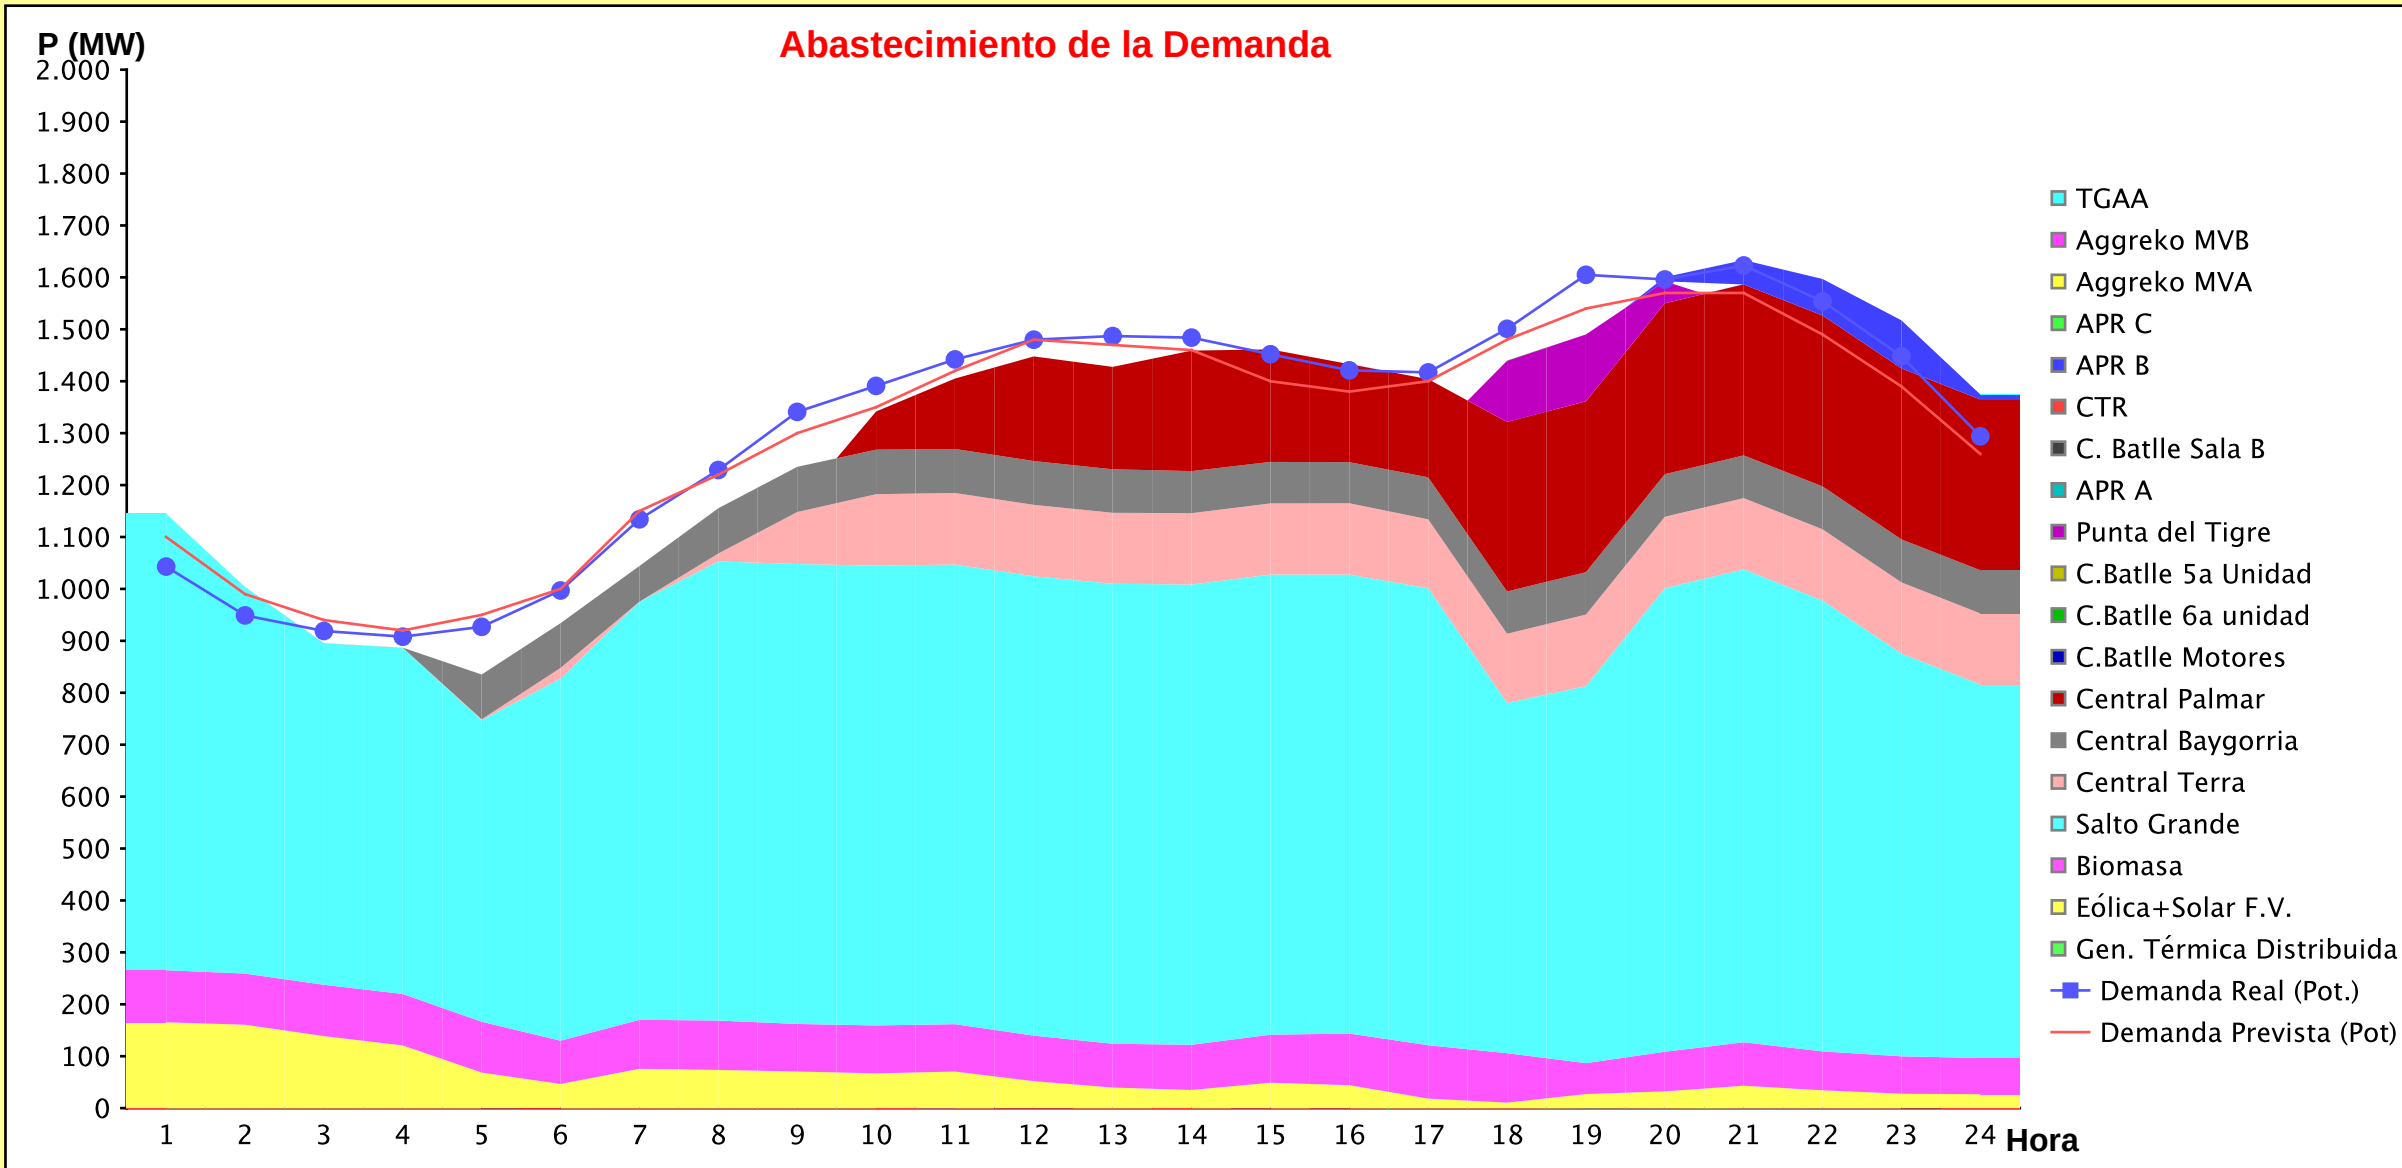


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1521,48 Hora 13:10
Potencia mínima:	901,09 Hora 03:50
Pico noche:	1647,17 Hora 21:01

Generación Media (MW)	
Eólica	63,3
Biomasa	88,8
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

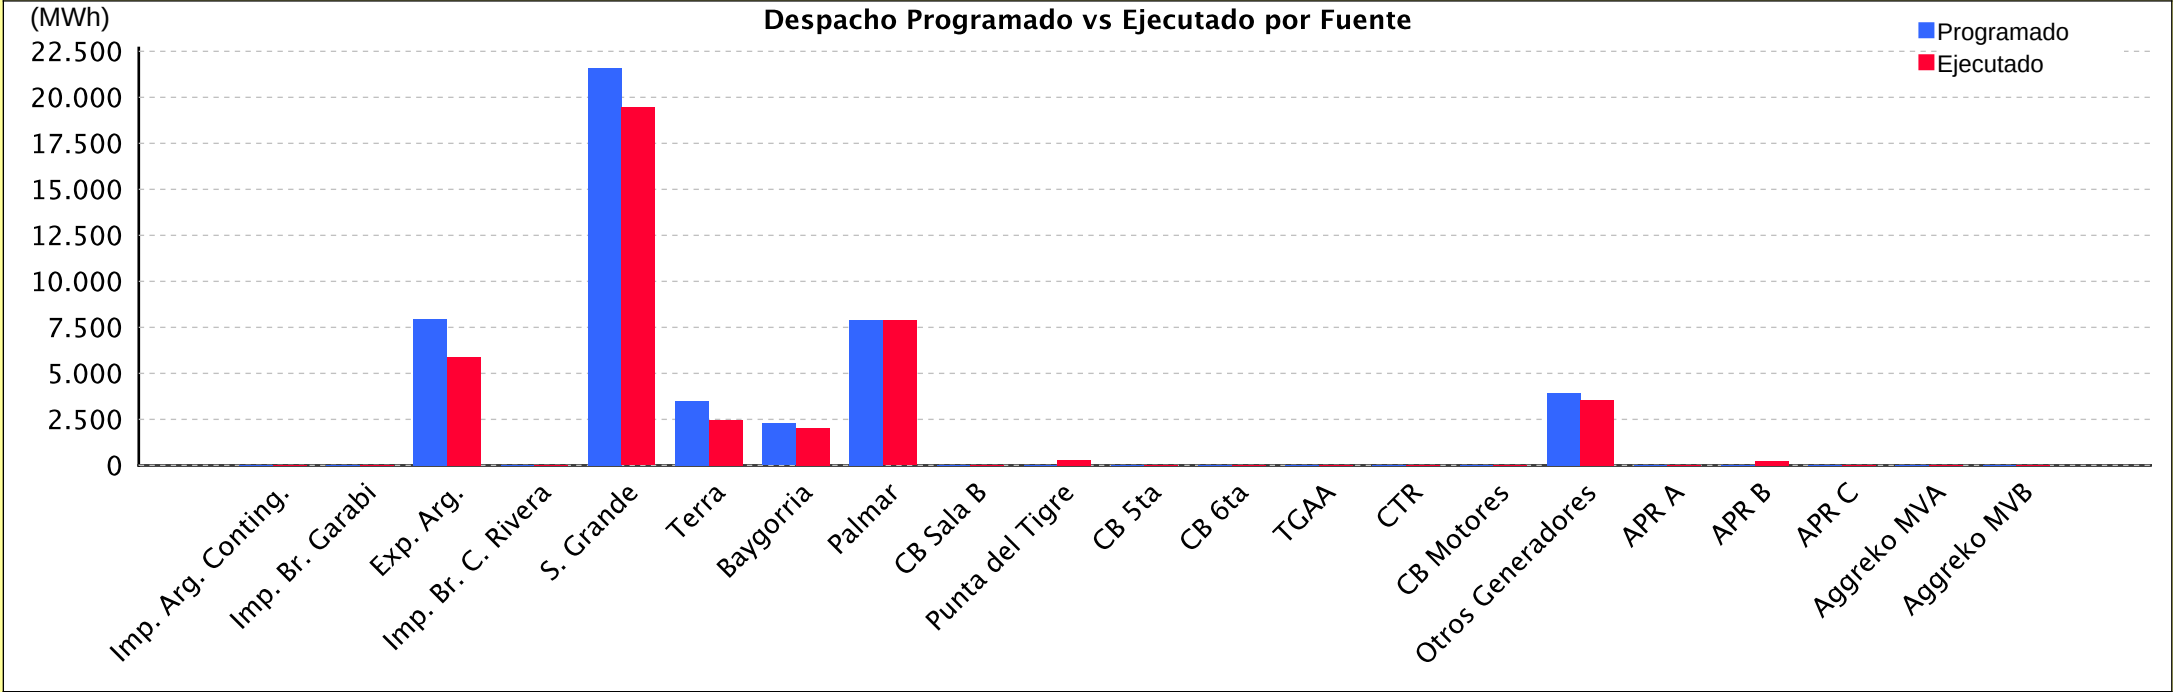
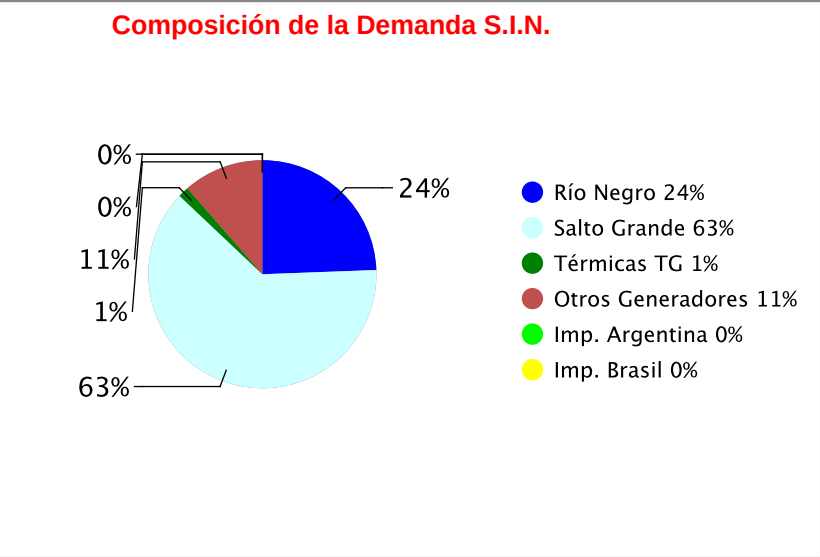


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

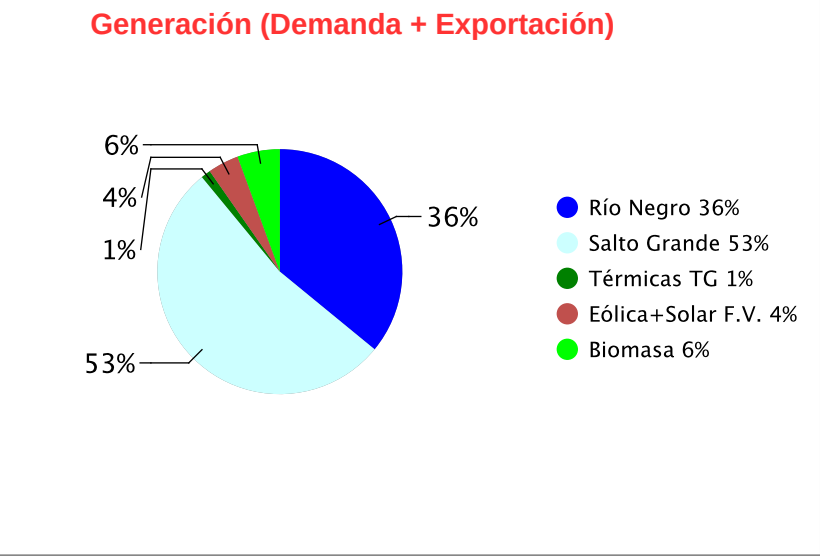



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

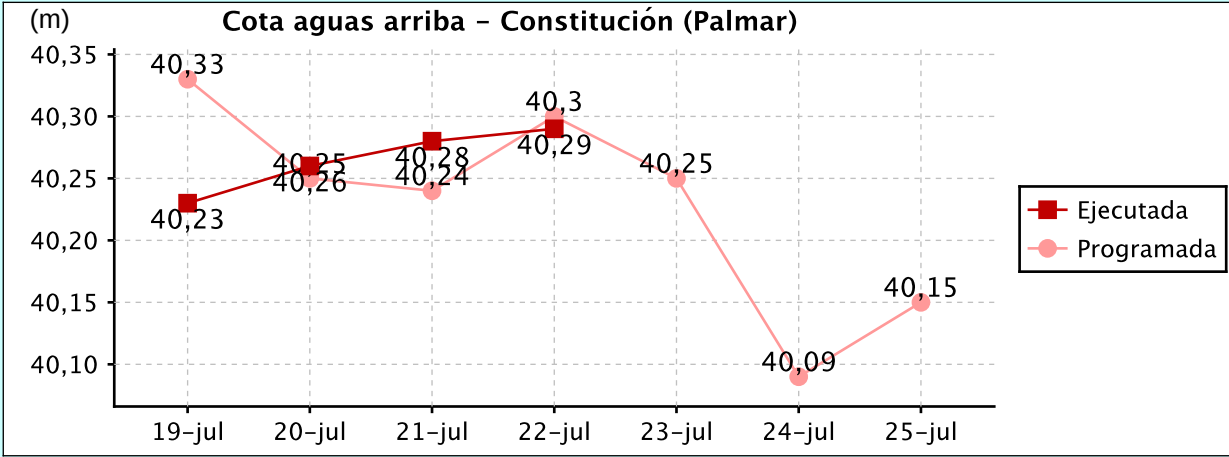
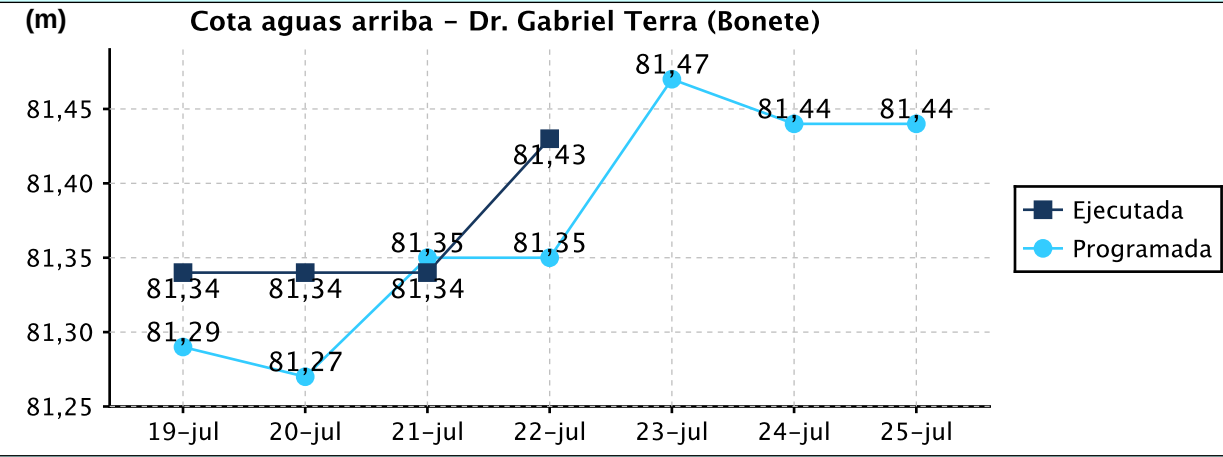


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,35	81,43
Baygorria	54,09	54,21
Palmar	40,30	40,29
SGU	35,34	35,41

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

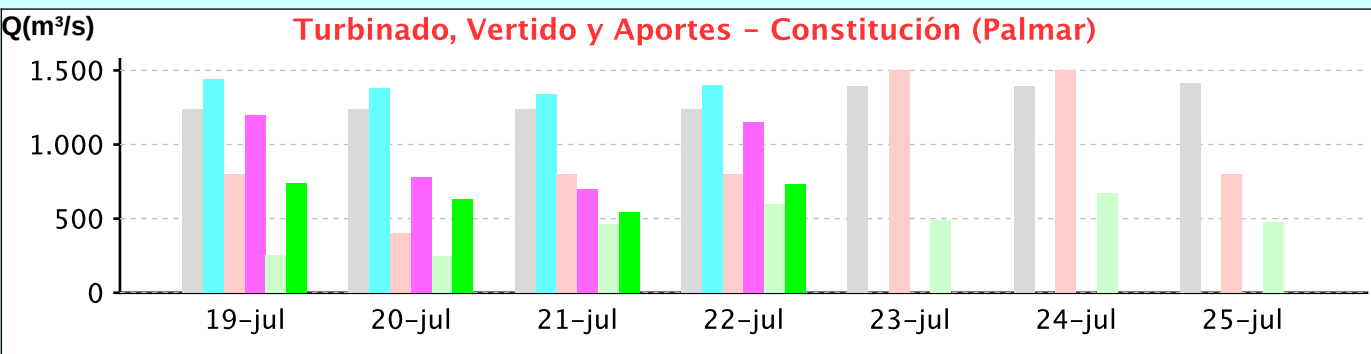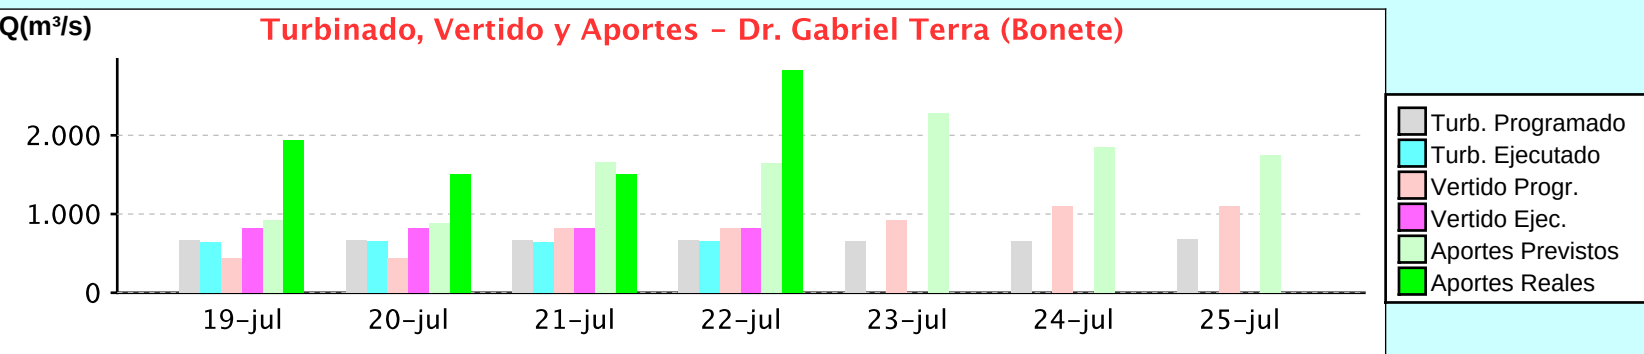

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

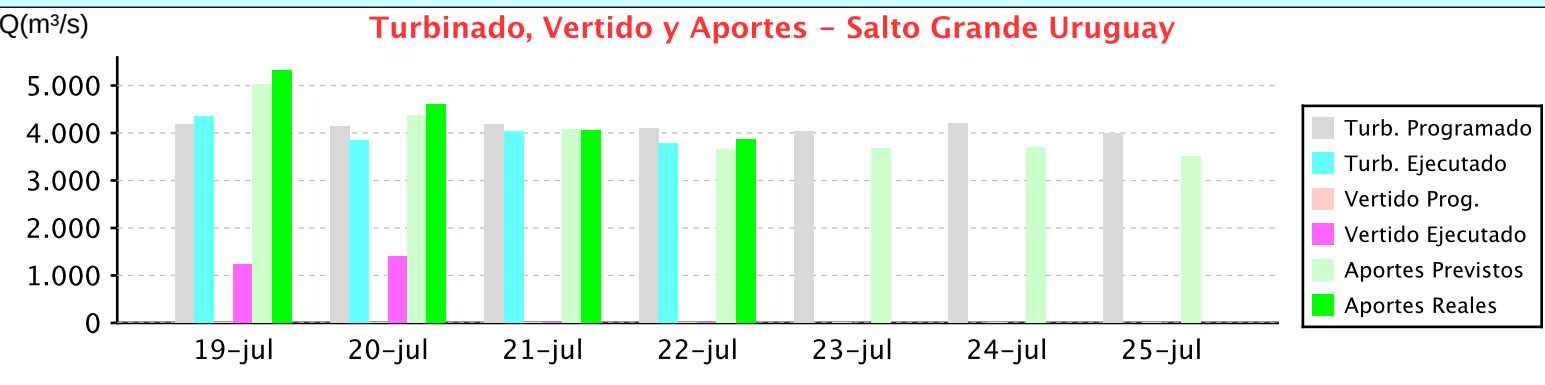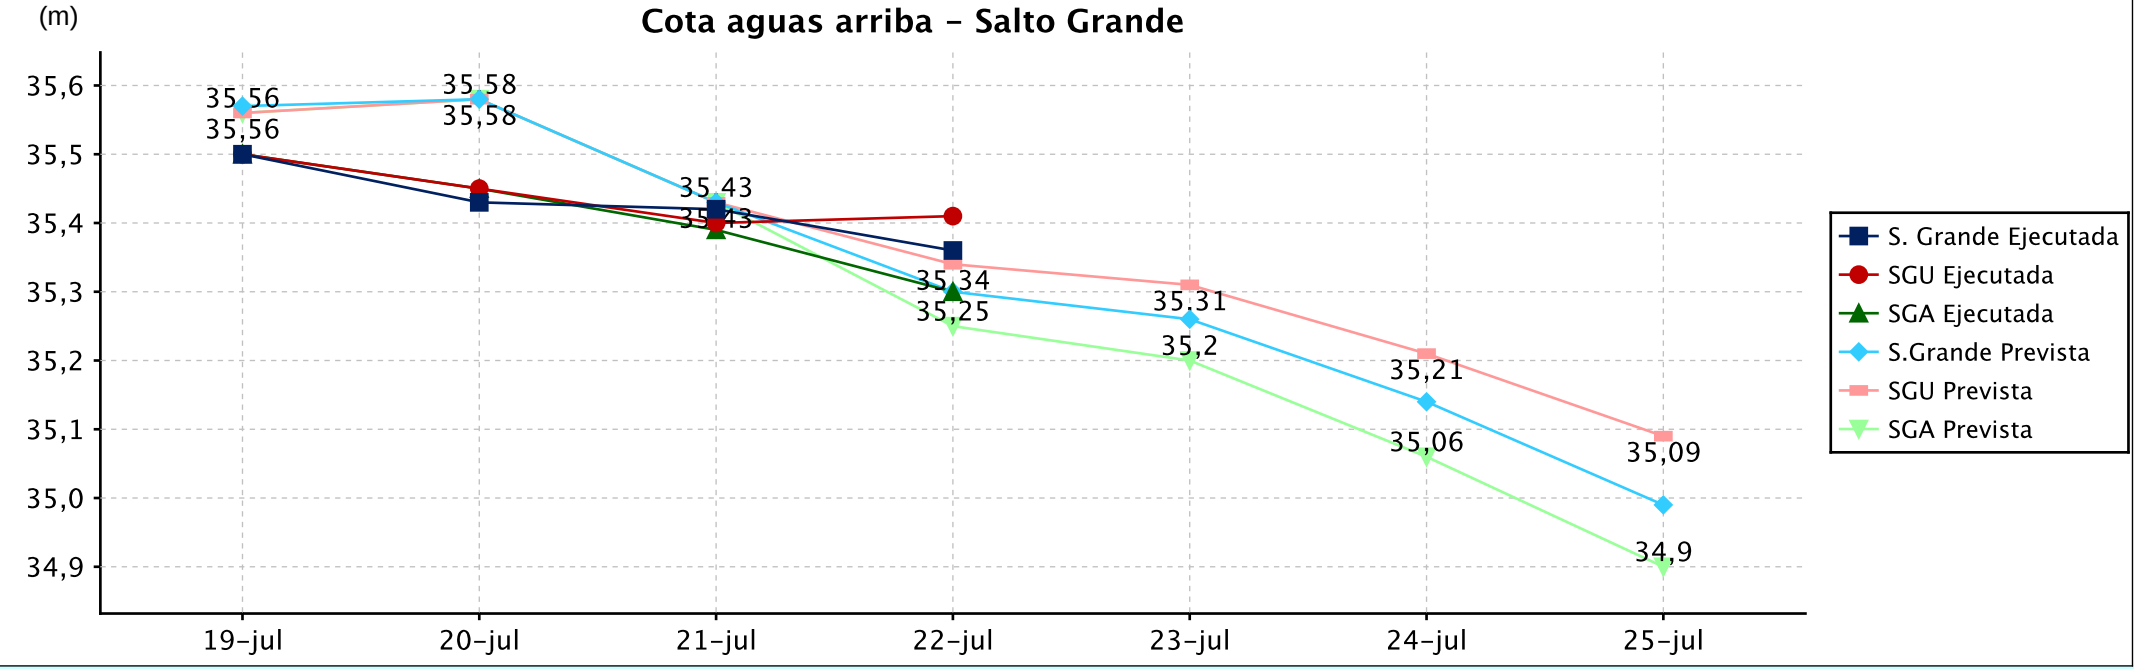

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,41
Cota Vista Arg	35,30
Cota real	35,36

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	2.606
---------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	661	648
Baygorria	846	789
Palmar	1.237	1.398
SGU	4.107	3.788

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.641	2.824
Baygorria	0	400
Palmar	595	734
SGU	3.650	3.857

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	820	825
Baygorria	800	1.077
Palmar	800	1.151
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
