



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 23 de julio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-6
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.121
C. Baygorria	1.968
C. Palmar	7.897
C. Salto Grande	21.065
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.293
TOTAL Generación	39.277

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	6.969
Hidráulica	6.969
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	6.969




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	32.308
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.230
Diferencia (MWh)	1.078
Ejecutada - Programada	3,45 %

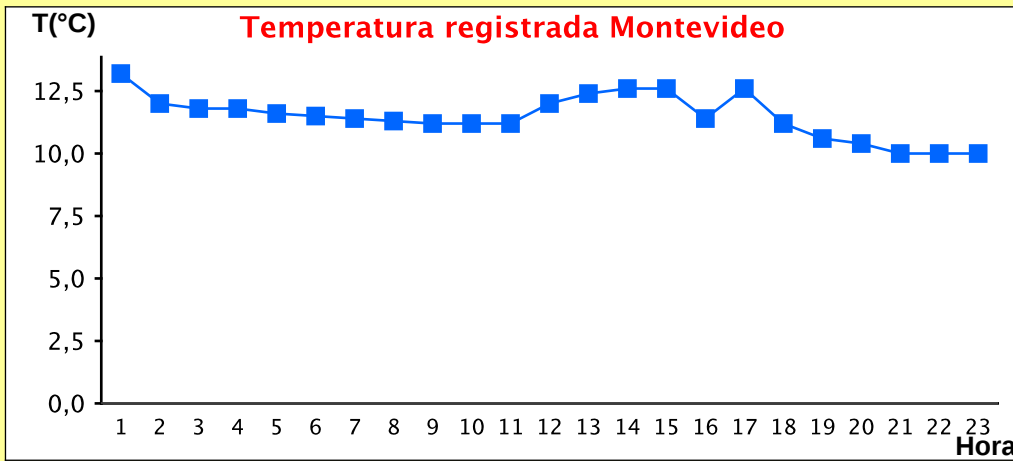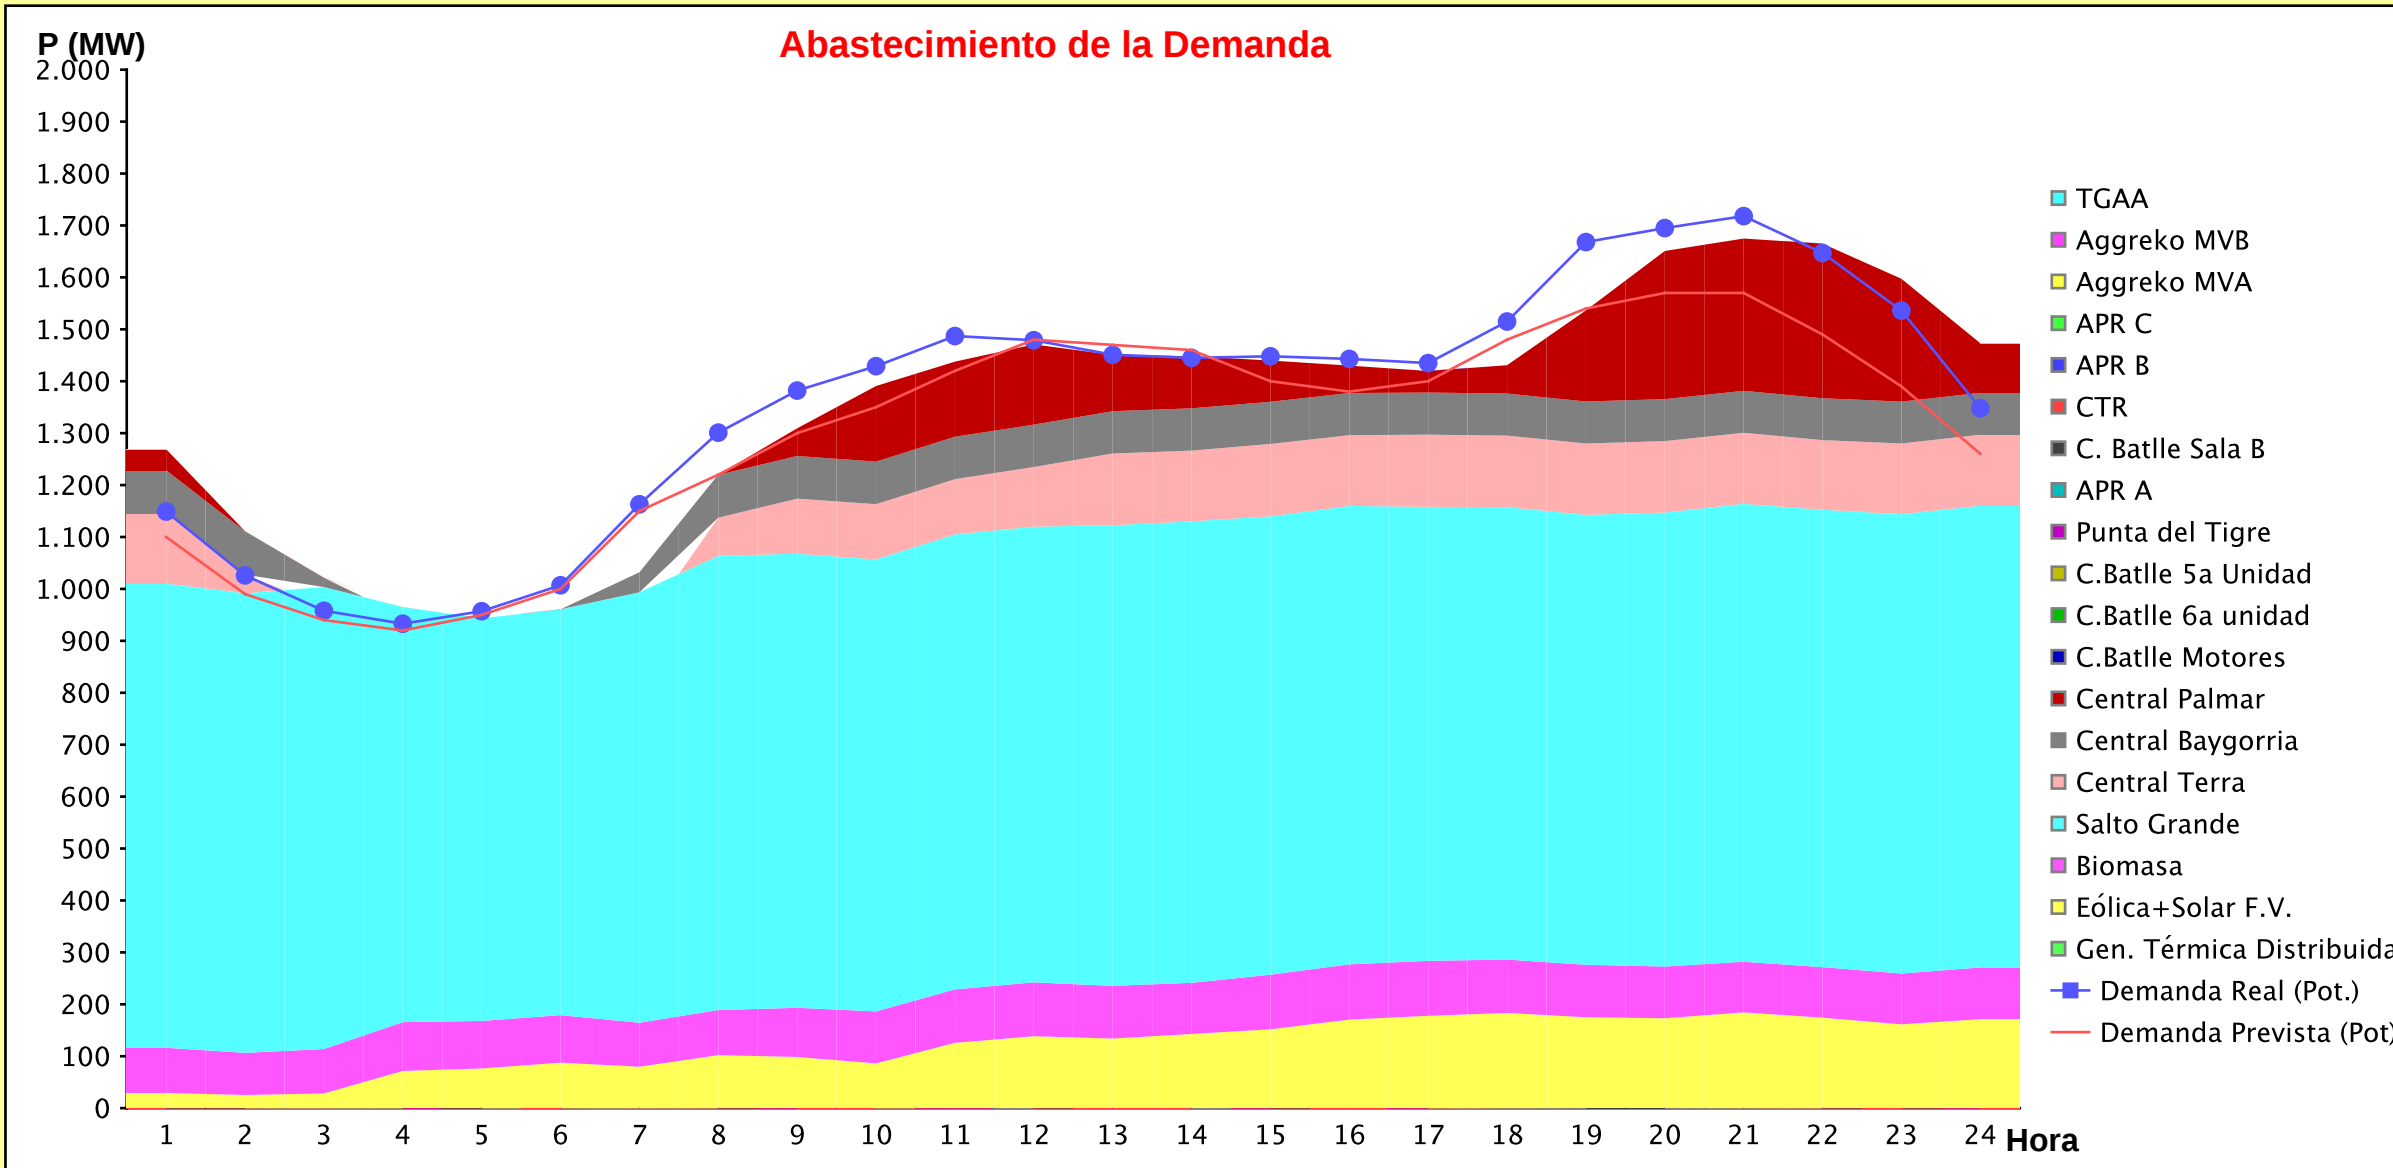



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1526,51 Hora 11:37
Potencia mínima:	946,37 Hora 04:08
Pico noche:	1754,7 Hora 20:35

Generación Media (MW)	
Eólica	123,2
Biomasa	96,7
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

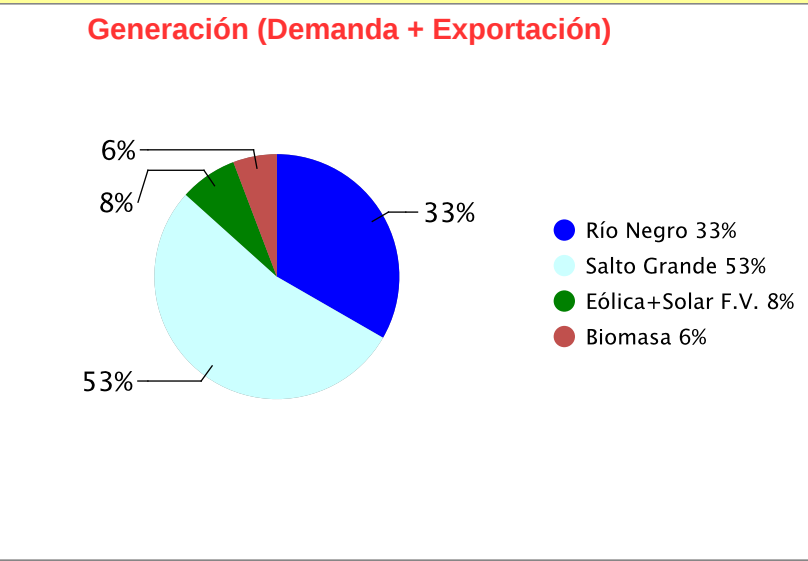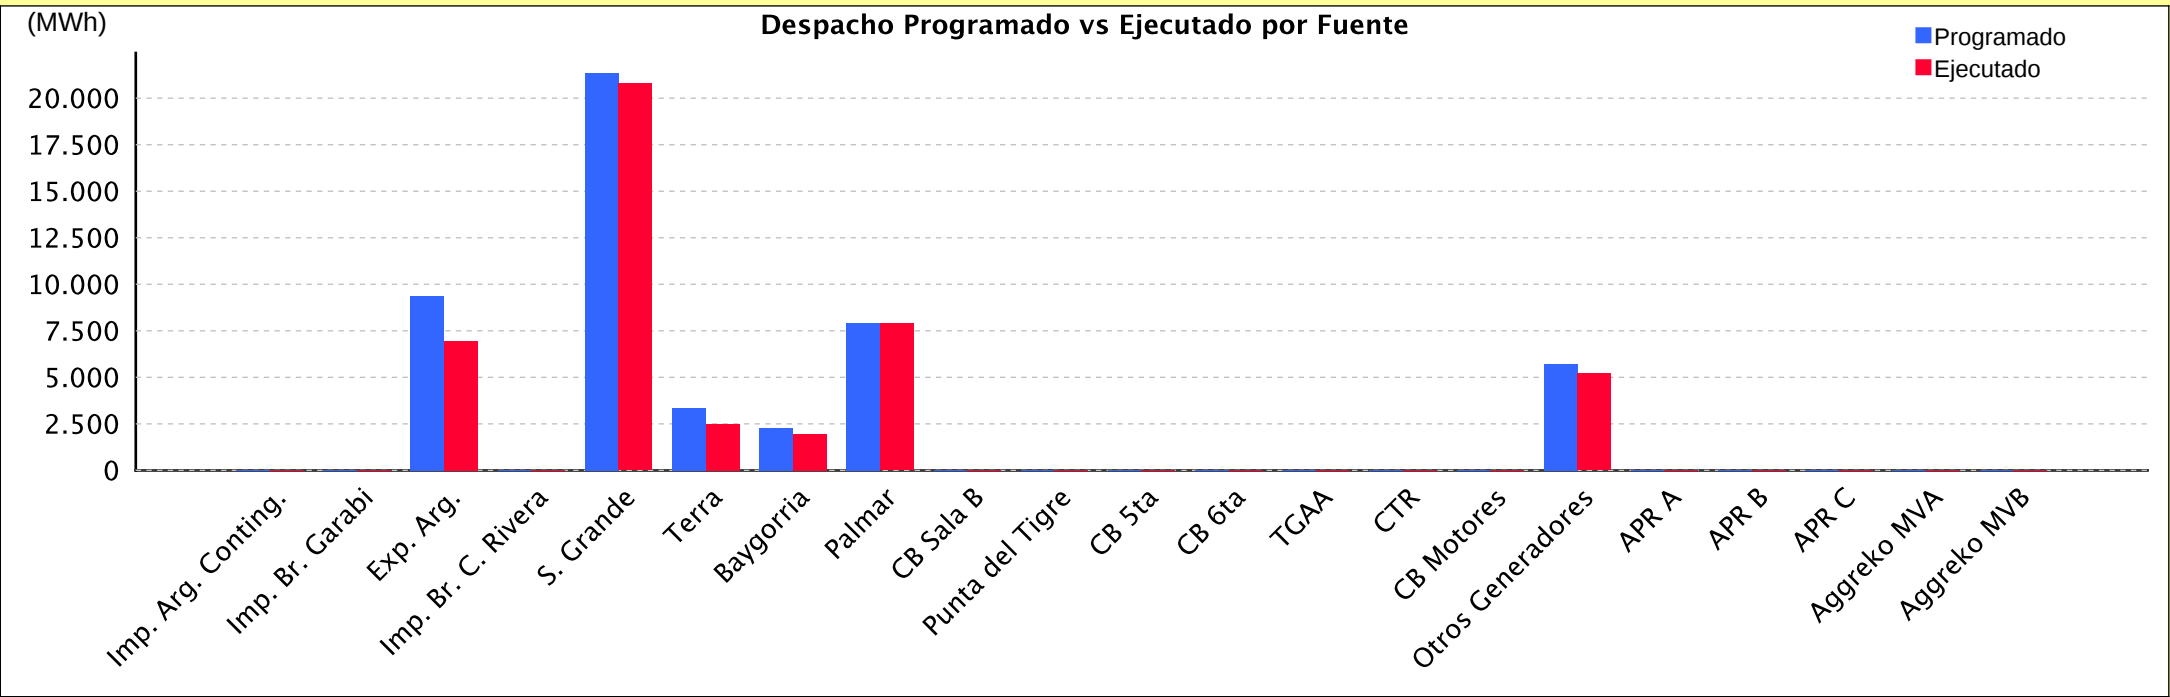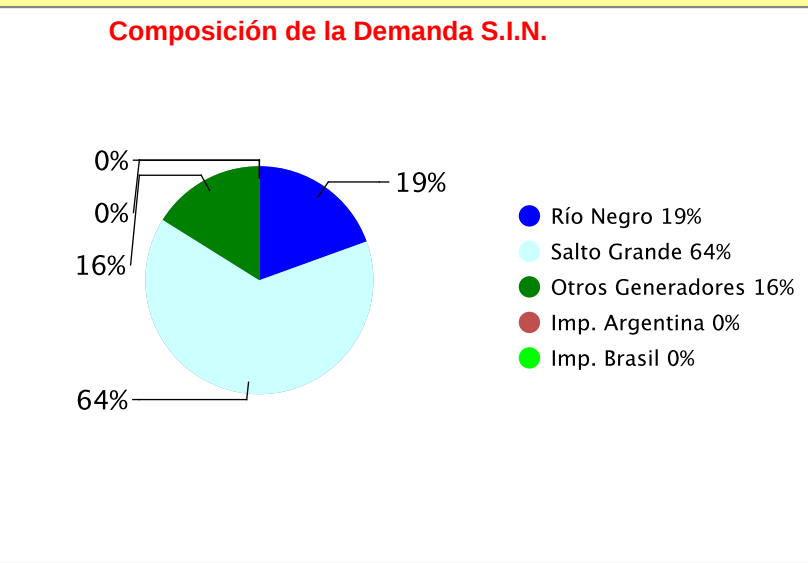



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

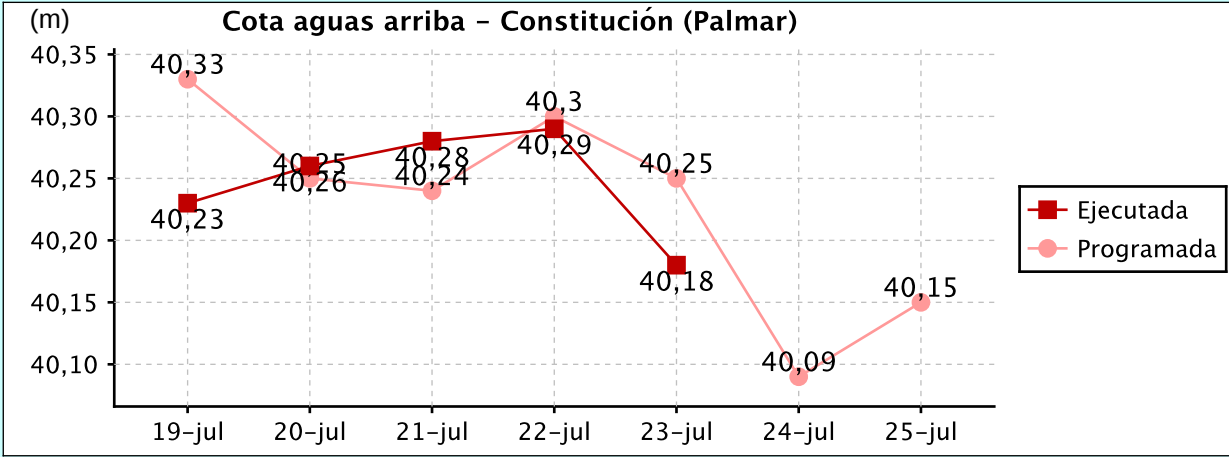
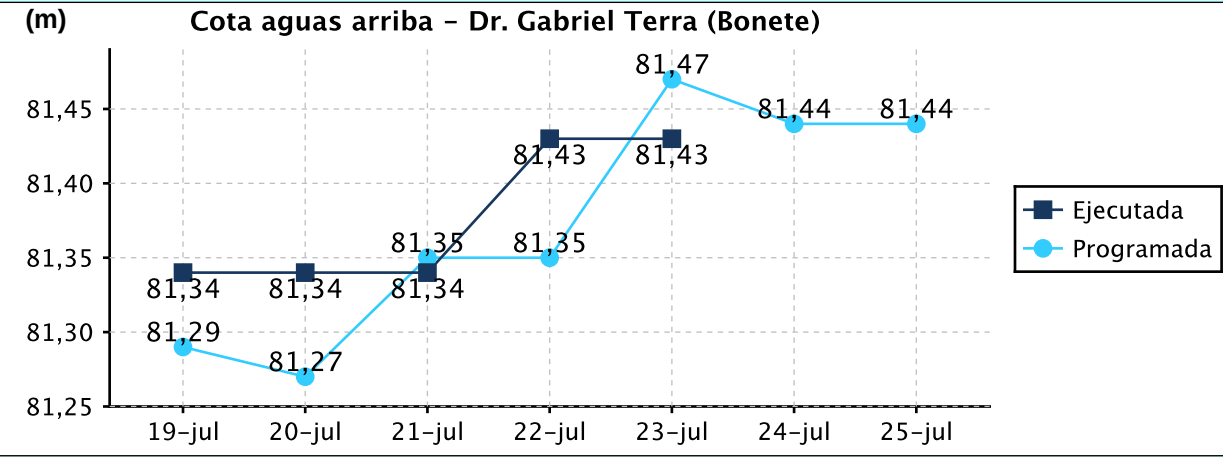


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,47	81,43
Baygorria	54,18	54,12
Palmar	40,25	40,18
SGU	35,31	35,28

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

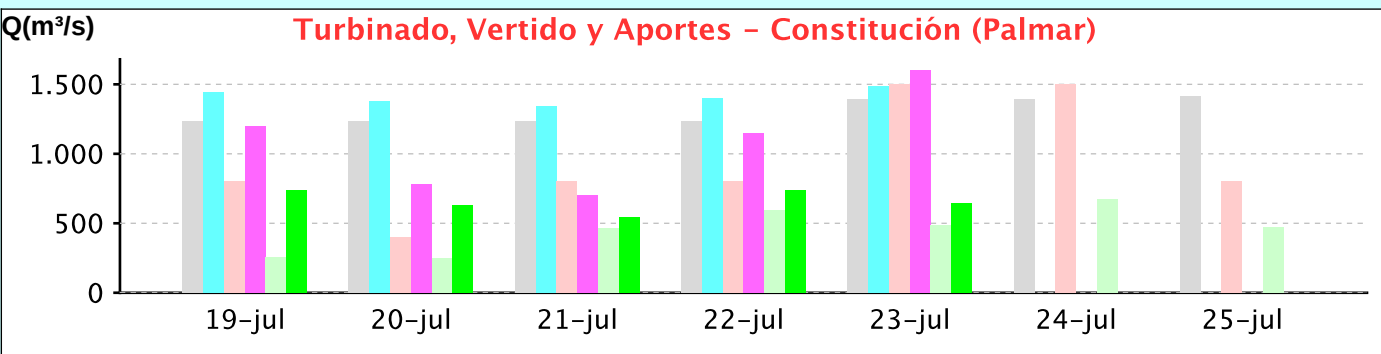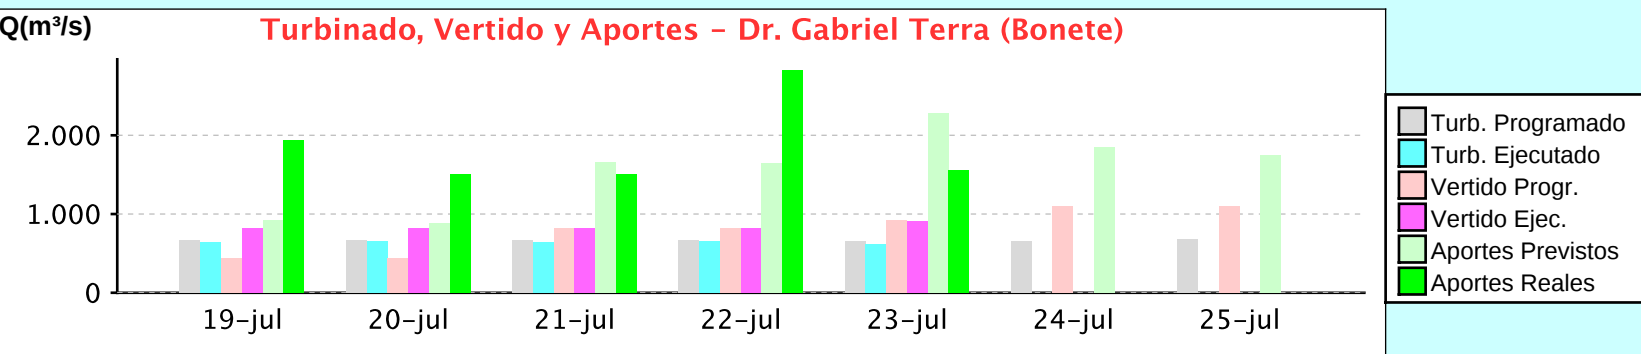

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

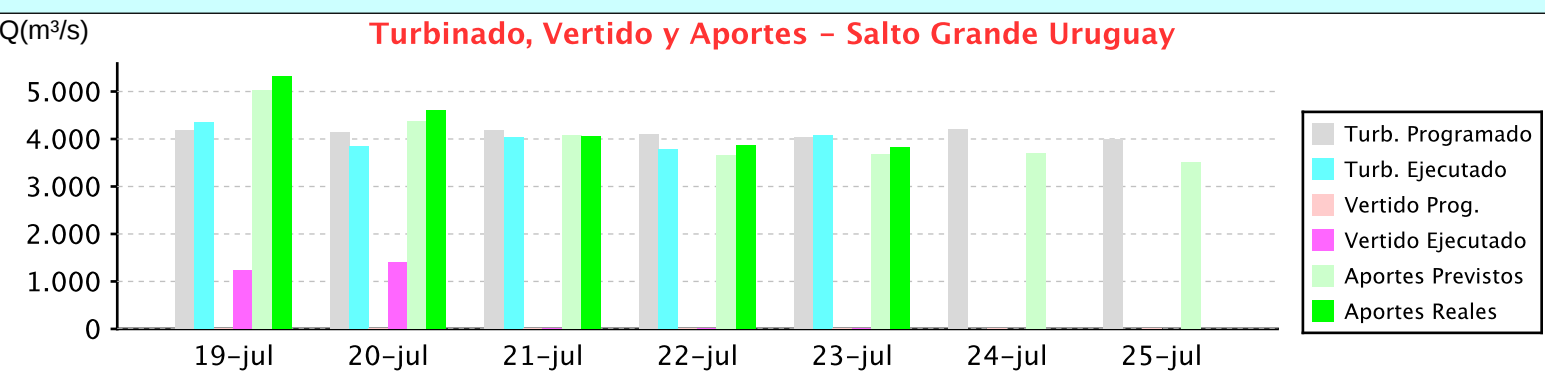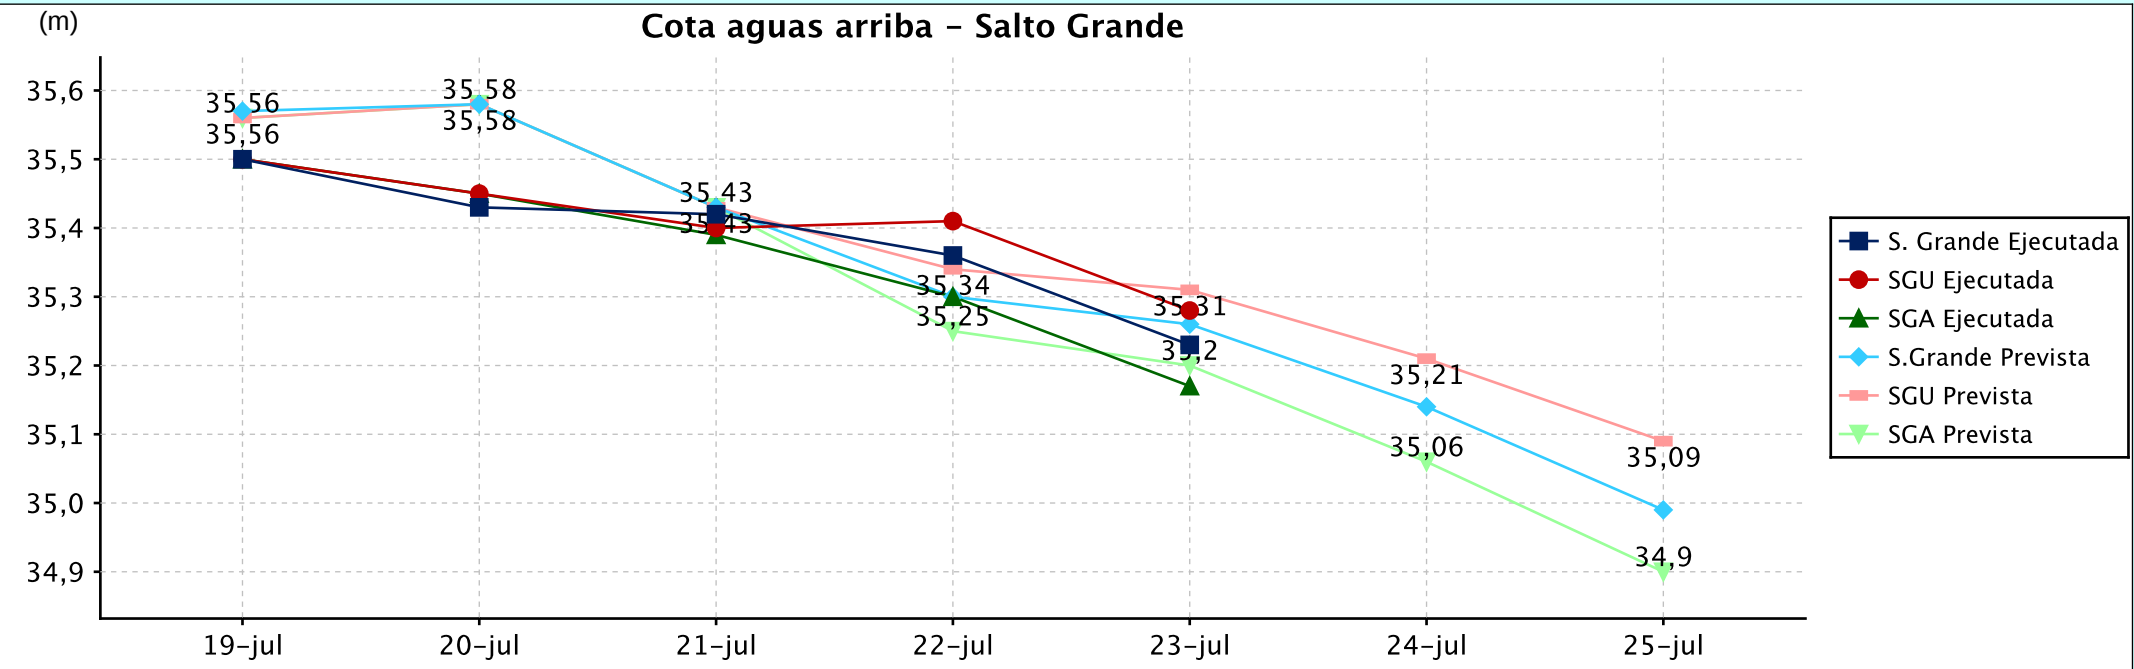

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,28
Cota Vista Arg	35,17
Cota real	35,23
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	2.687

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	656	621
Baygorria	864	783
Palmar	1.390	1.486
SGU	4.040	4.079

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.274	1.560
Baygorria	624	460
Palmar	486	647
SGU	3.675	3.822

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	920	907
Baygorria	1.400	1.314
Palmar	1.500	1.600
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
