




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO  
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 25 de julio de 2014


| Generación Térmica    |        |
|-----------------------|--------|
| Central Battle        | 180    |
| Sala B                | -4     |
| 5ta.                  | 0      |
| 6ta.                  | 0      |
| Motores               | 184    |
| Central La Tablada    | -45    |
| Central P. del Tigre  | 45     |
| APR A                 | -2     |
| APR B                 | -3     |
| APR C                 | 0      |
| Aggreko               | -2     |
| Aggreko MVA           | -1     |
| Aggreko MVB           | -1     |
| Central Maldonado     | 0      |
| Generación Hidráulica |        |
| C.G.Terra             | 3.260  |
| C. Baygorria          | 2.019  |
| C. Palmar             | 7.872  |
| C. Salto Grande       | 21.176 |
| Importación (MWh)     |        |
| Argentina             | 0      |
| Contingente           | 0      |
| Brasil                | 0      |
| Rivera                | 0      |
| SADI                  | 0      |
| Otros Generadores     |        |
| Otros Generadores     | 4.658  |
| TOTAL Generación      | 39.159 |

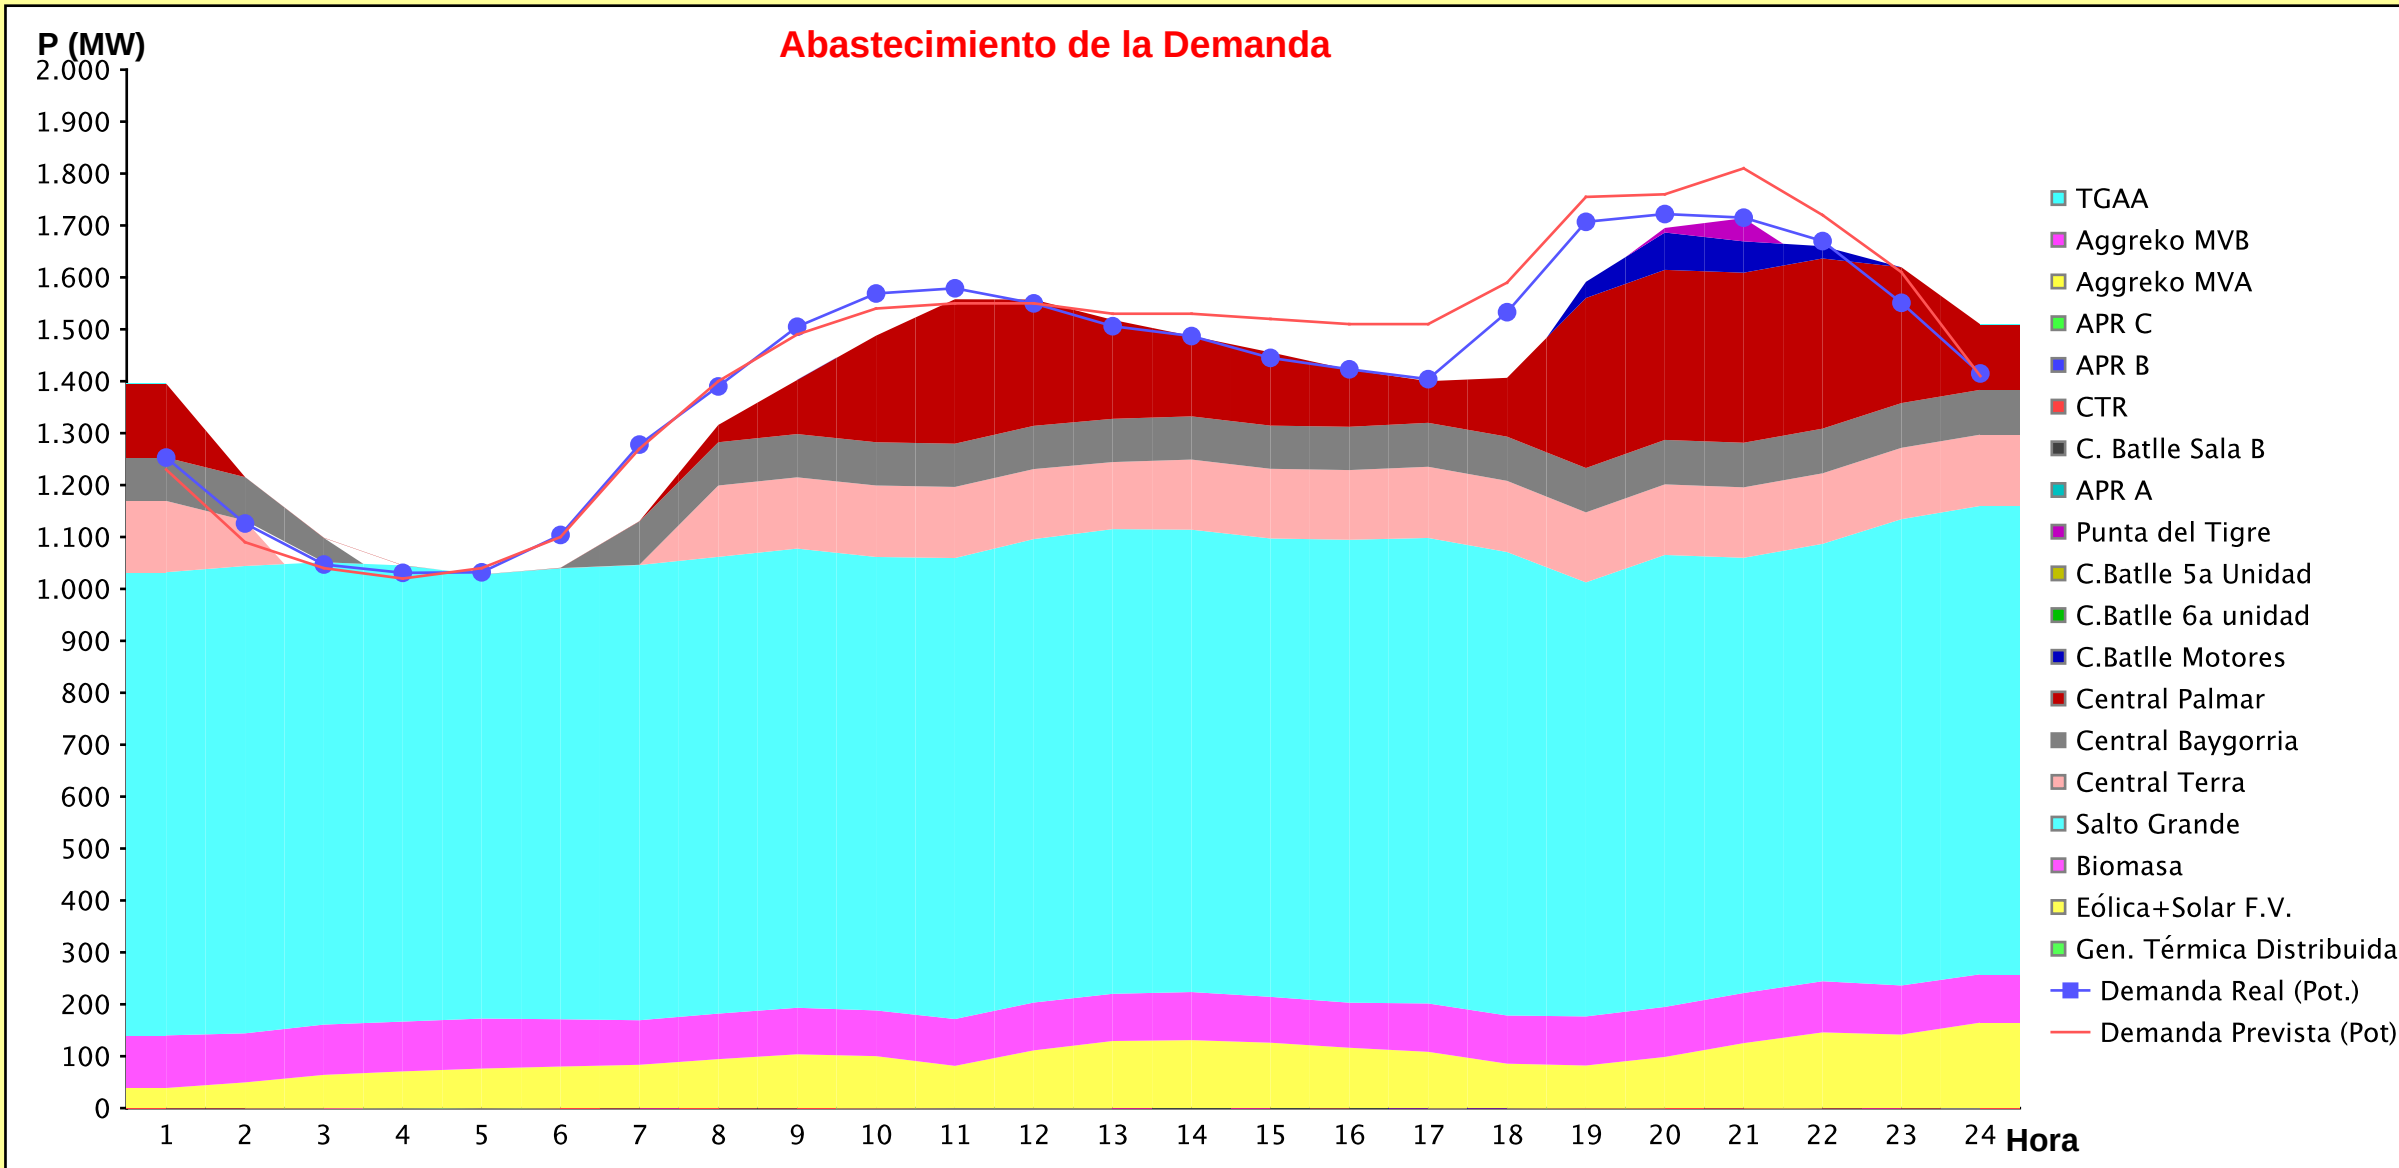

| Exportación (MWh)       |       |
|-------------------------|-------|
| Exportación a Arg.      | 5.451 |
| Hidráulica              | 5.451 |
| Térmica                 | 0     |
| Exportación a Brasil    | 0     |
| TOTAL Exportación (MWh) | 5.451 |




|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)                              | 33.708 |
| (en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) |        |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Demanda Programada (MWh) | 34.575  |
| Diferencia (MWh)         | -867    |
| Ejecutada - Programada   | -2,51 % |

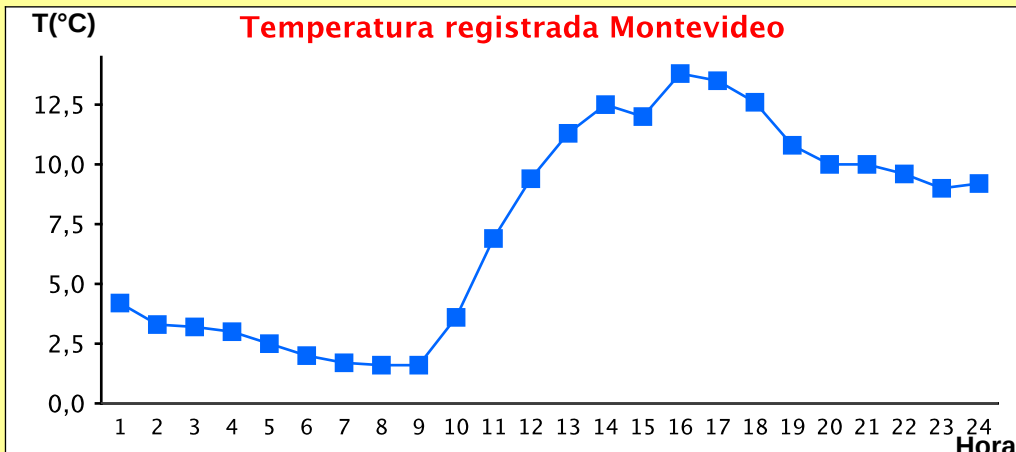



| Picos de Potencia (MW) |                    |
|------------------------|--------------------|
| Pico mediodía:         | 1607,35 Hora 11:20 |
| Potencia mínima:       | 1023,41 Hora 03:43 |
| Pico noche:            | 1762,87 Hora 20:41 |

| Generación Media (MW)  |       |
|------------------------|-------|
| Eólica                 | 100,5 |
| Biomasa                | 92,9  |
| Solar fotovoltaica     | 0,1   |
| Térmica distribuida    | 0,0   |
| Imp. Brasil Conversora | 0,0   |
| Imp. Argentina         | 0,0   |

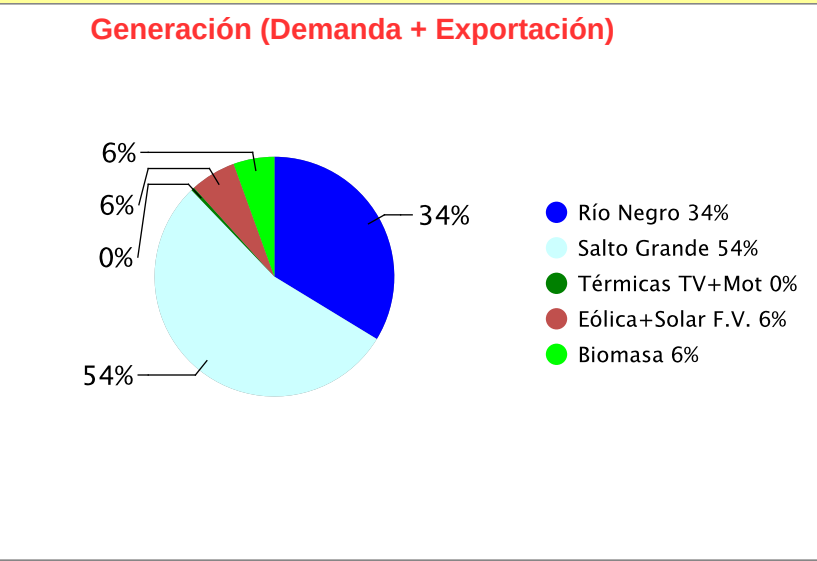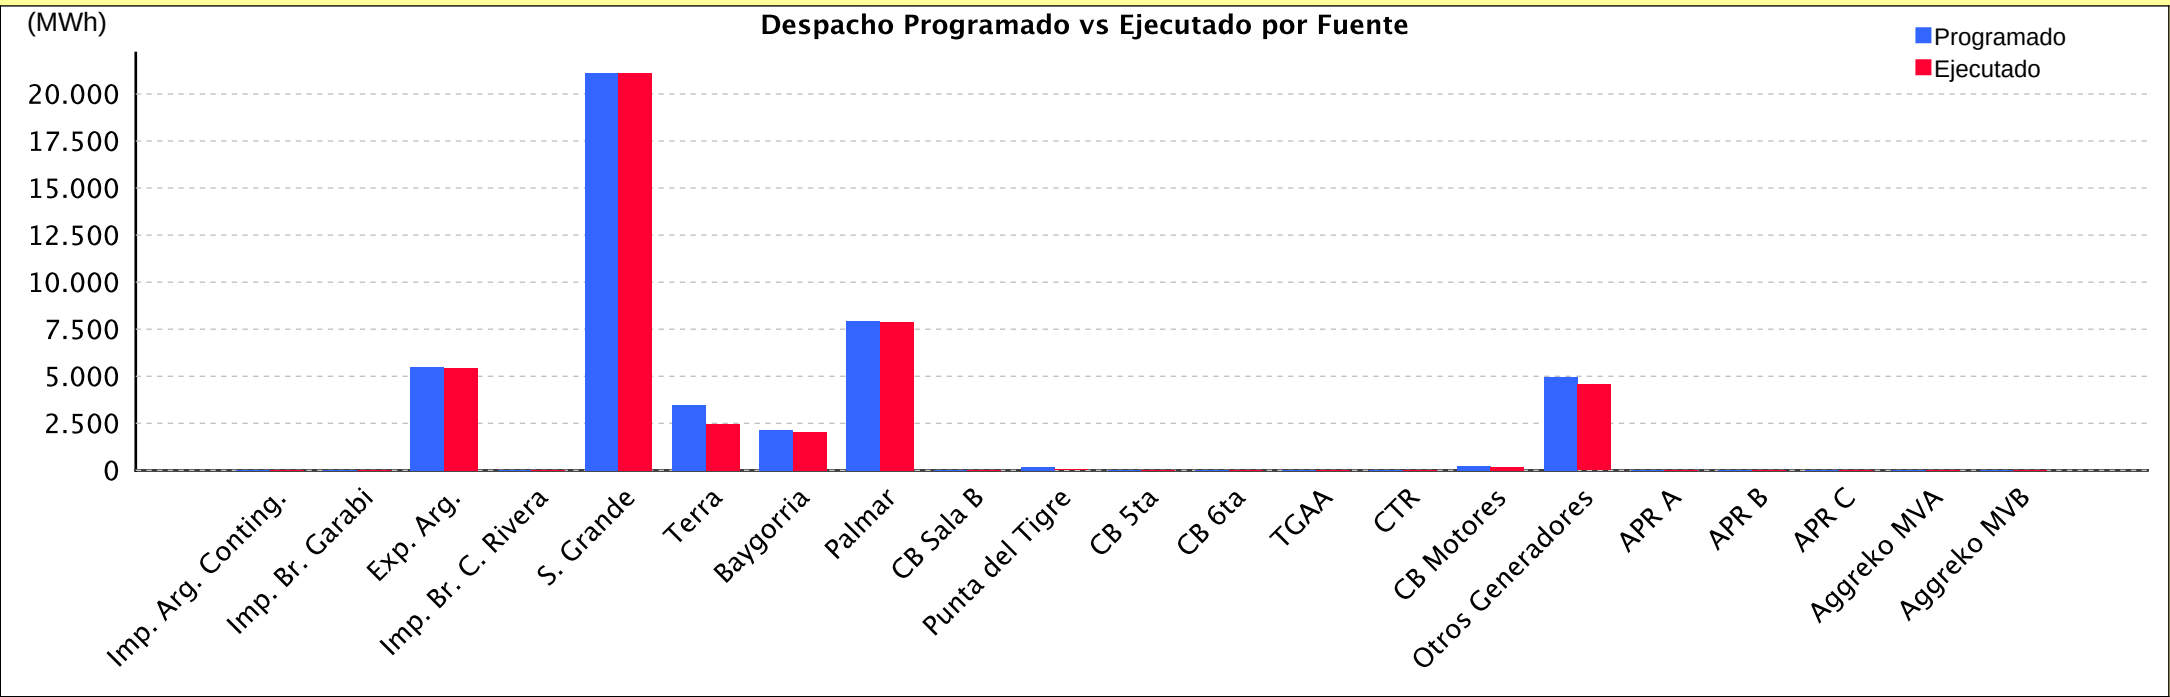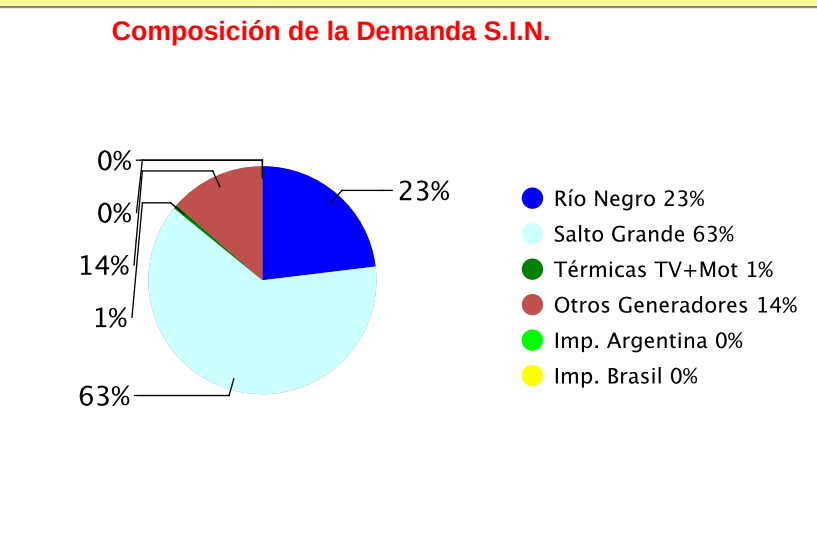



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

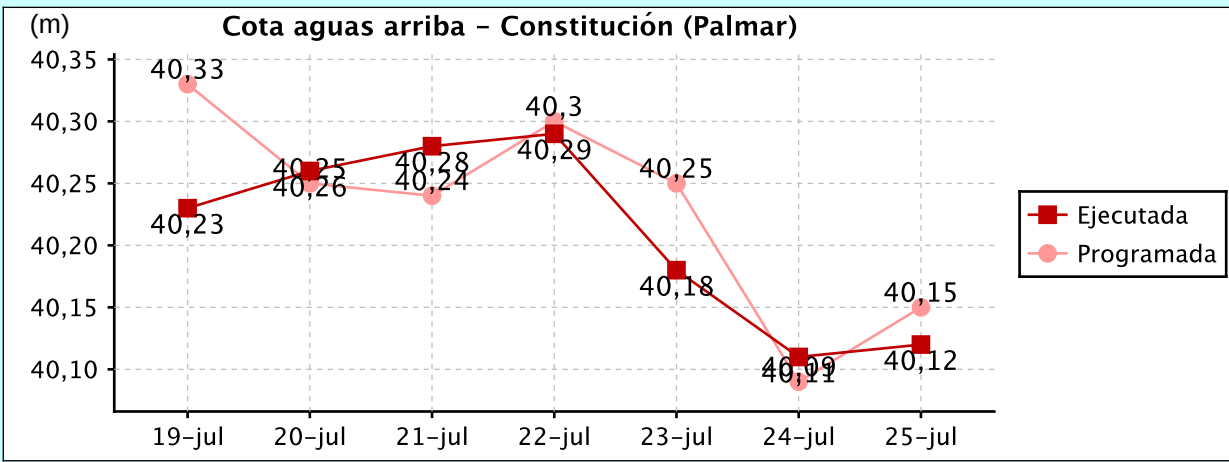
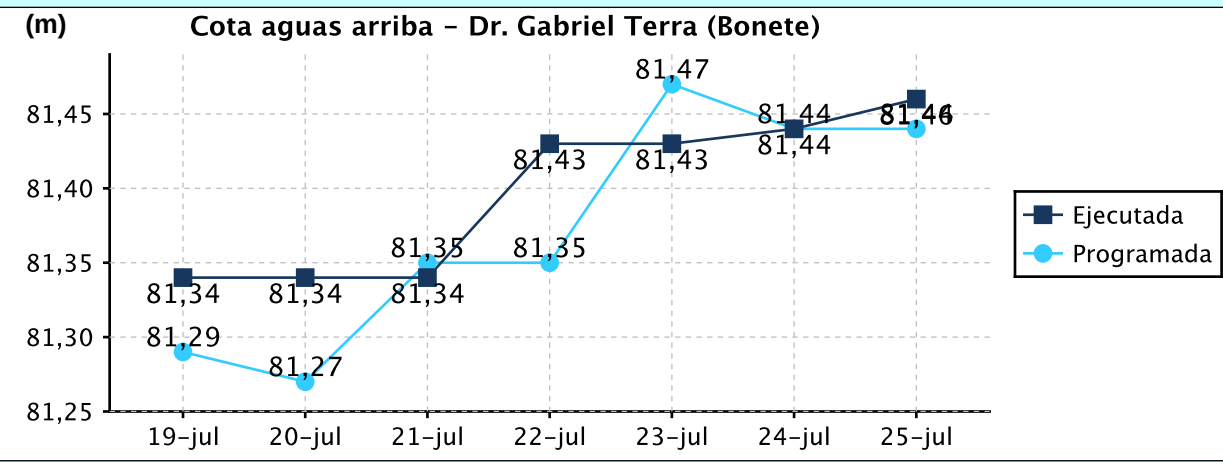


| COTA FINAL | Prevista | Ejecutada |
|------------|----------|-----------|
| Represa    | (m)      | (m)       |
| Terra      | 81,44    | 81,46     |
| Baygorria  | 54,05    | 54,17     |
| Palmar     | 40,15    | 40,12     |
| SGU        | 35,30    | 35,31     |

| Valores de Referencia (operación normal) |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Represa                                  | Cota Min m | Cota Max m |
| Terra                                    | 70         | 80,7       |
| Baygorria                                | 53         | 54,5       |
| Palmar                                   | 36         | 40         |
| Salto Grande                             | 30         | 35         |

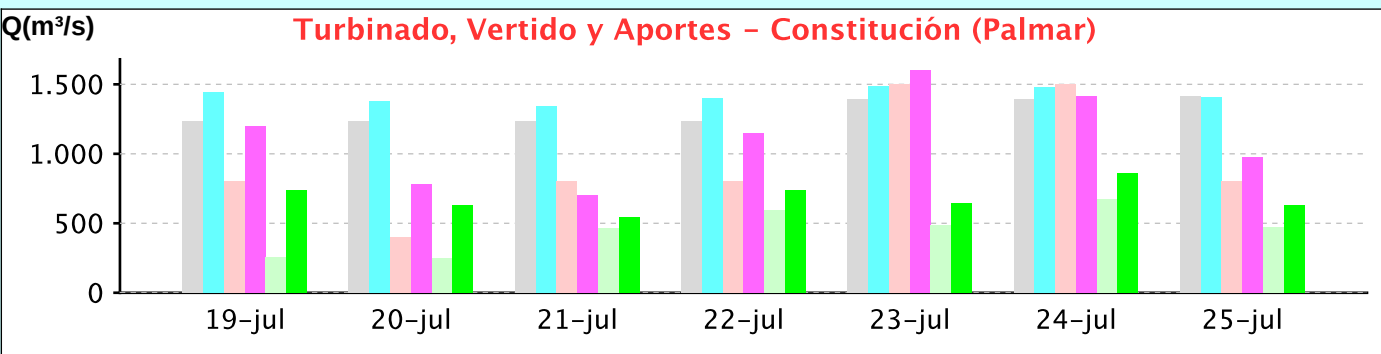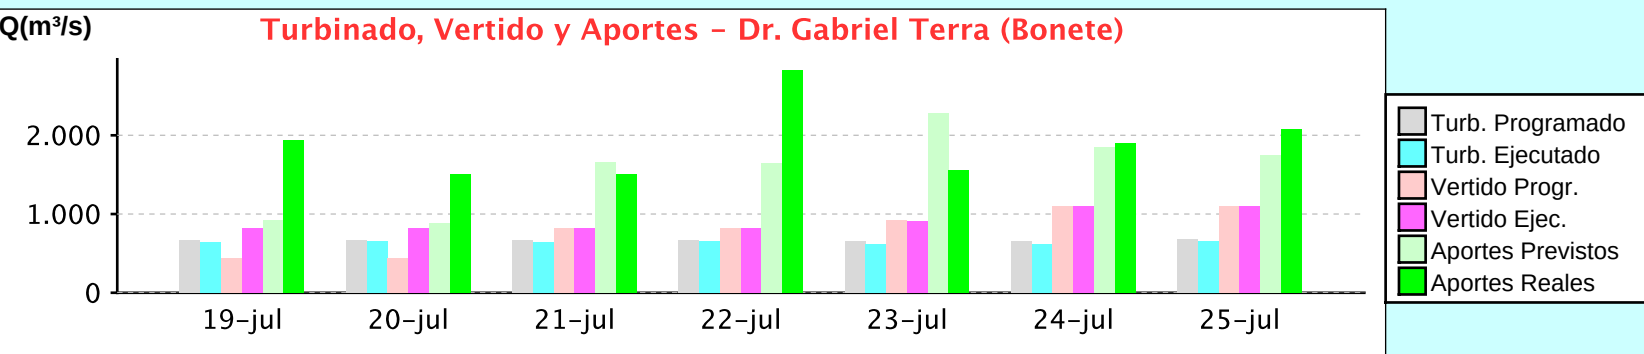

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

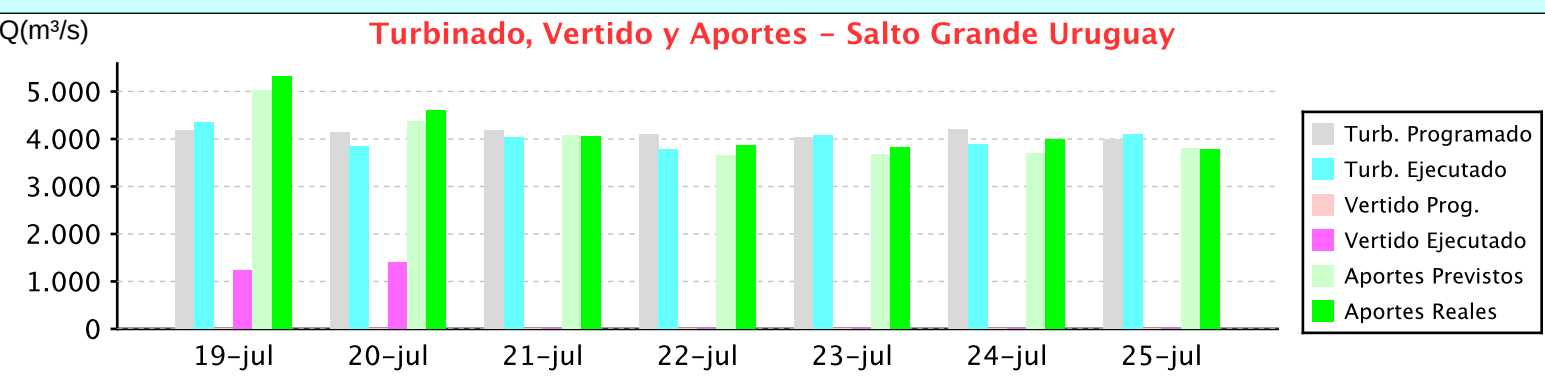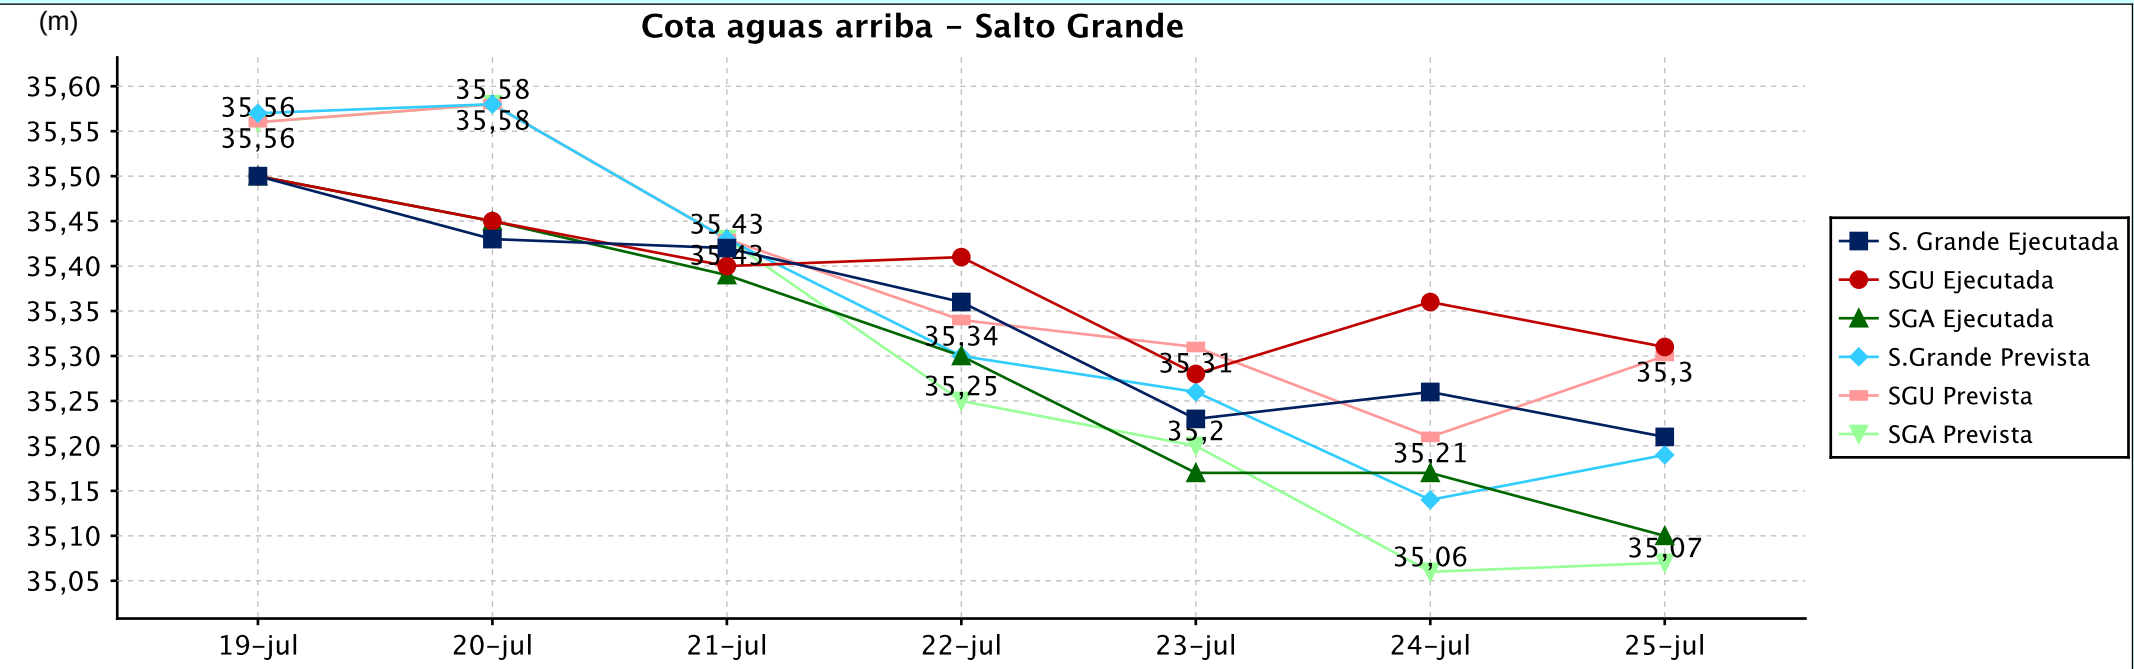

| VALORES CTM    |       |
|----------------|-------|
| Cotas          | (m)   |
| Cota Vista Uru | 35,31 |
| Cota Vista Arg | 35,10 |
| Cota real      | 35,21 |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Dif. Energ. (U-A)<br>Acumulado MWh | 5.051 |
|------------------------------------|-------|

| TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 682      | 655       |
| Baygorria | 830      | 791       |
| Palmar    | 1.411    | 1.408     |
| SGU       | 3.997    | 4.101     |

| APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
|-----------------|-----------|--------|
| Represa         | (m³/s)    | (m³/s) |
| Terra           | 1.747     | 2.077  |
| Baygorria       | 61        | 89     |
| Palmar          | 473       | 626    |
| SGU             | 3.800     | 3.776  |

| VERTIDO   | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 1.100    | 1.101     |
| Baygorria | 1.100    | 1.012     |
| Palmar    | 800      | 972       |
| SGU       | 0        | 0         |

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
