



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 27 de julio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	187
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	191
Central La Tablada	-56
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.211
C. Baygorria	2.019
C. Palmar	7.847
C. Salto Grande	20.746
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.871
TOTAL Generación	36.810

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	6.669
Hidráulica	6.669
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	6.669




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.141
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.070
Diferencia (MWh)	71
Ejecutada - Programada	0,24 %

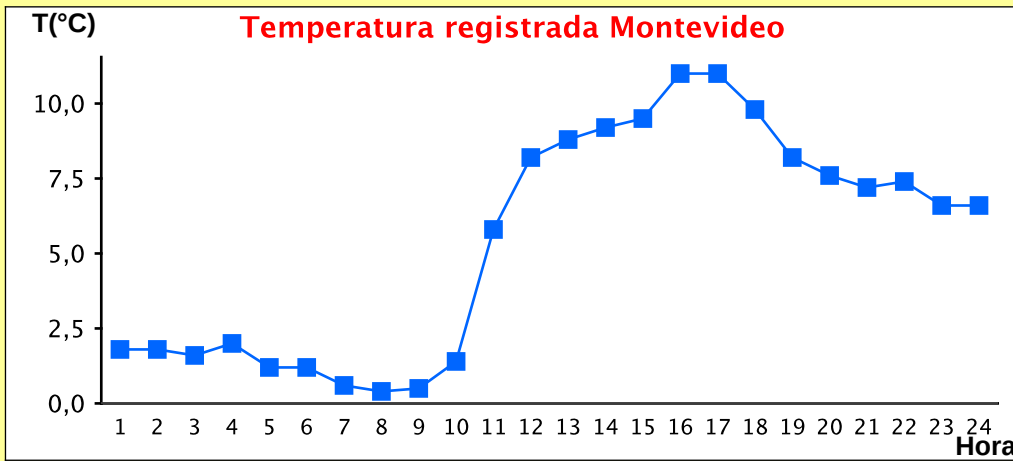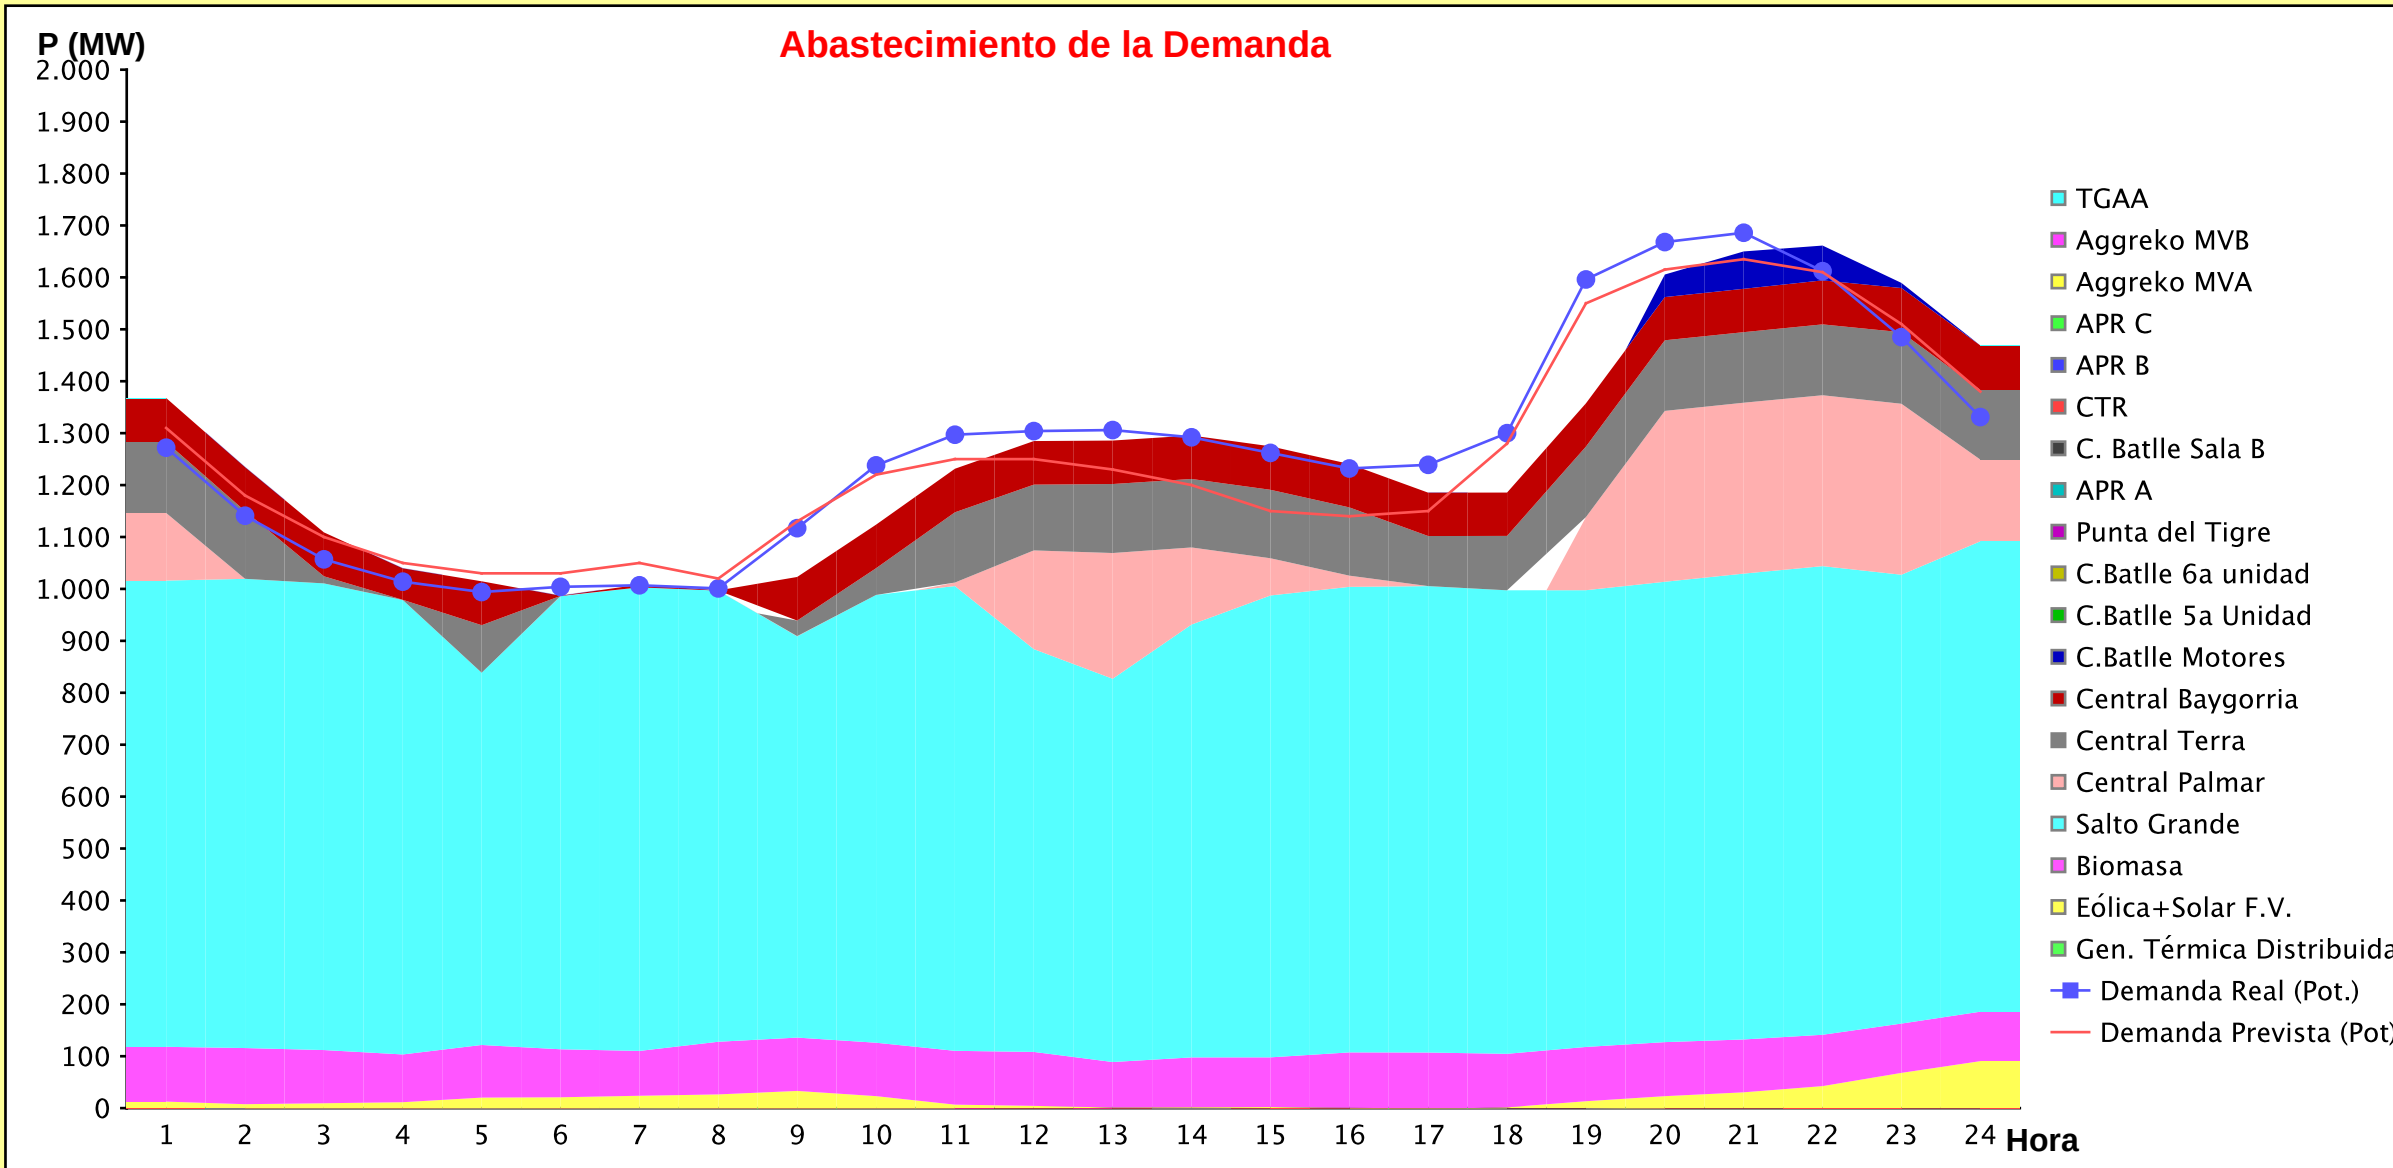



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1318,51 Hora 13:12
Potencia mínima:	981,78 Hora 07:45
Pico noche:	1696,82 Hora 20:40

Generación Media (MW)	
Eólica	20,3
Biomasa	100,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

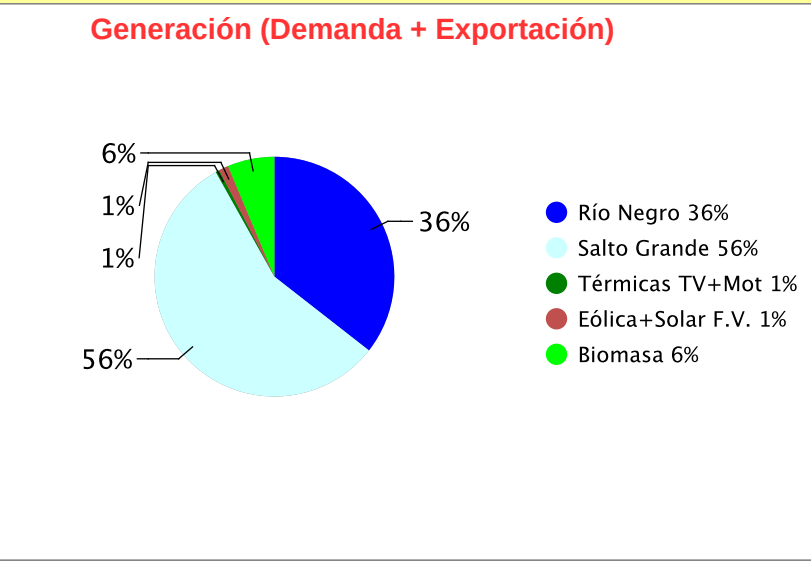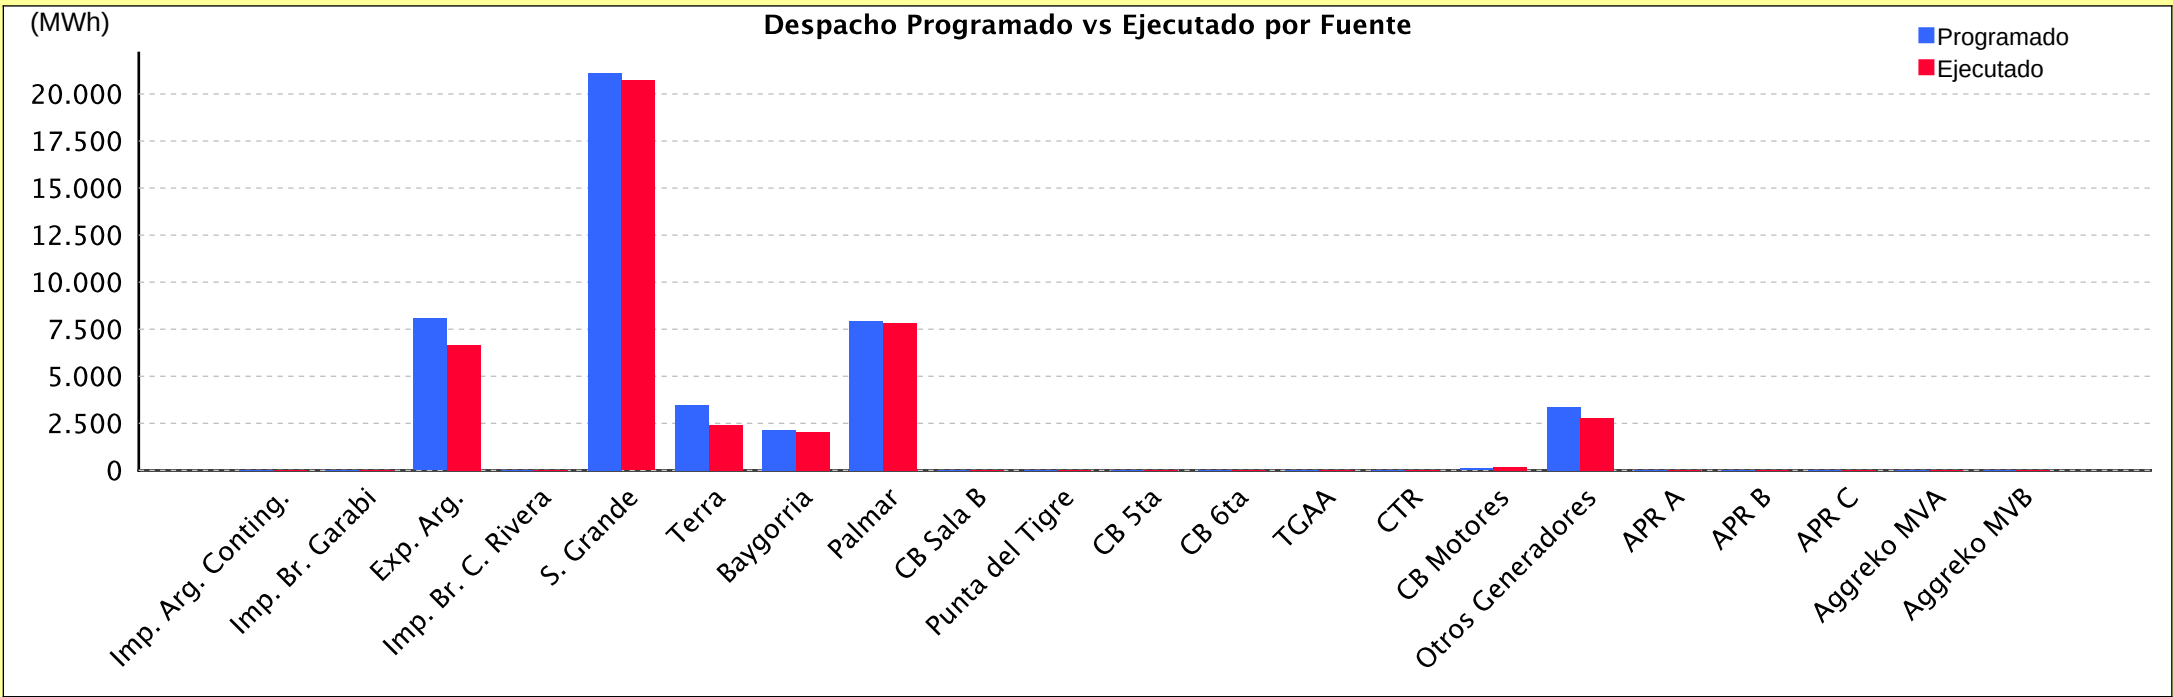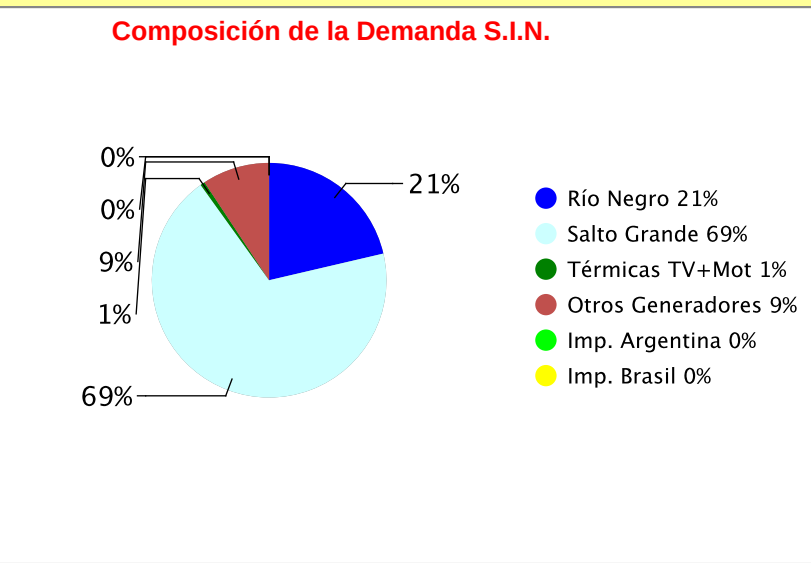



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

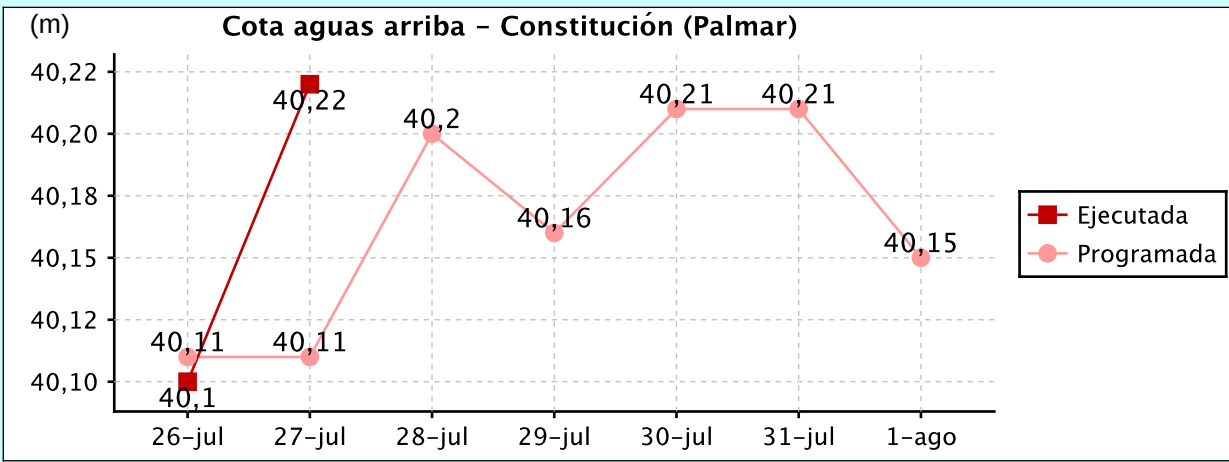
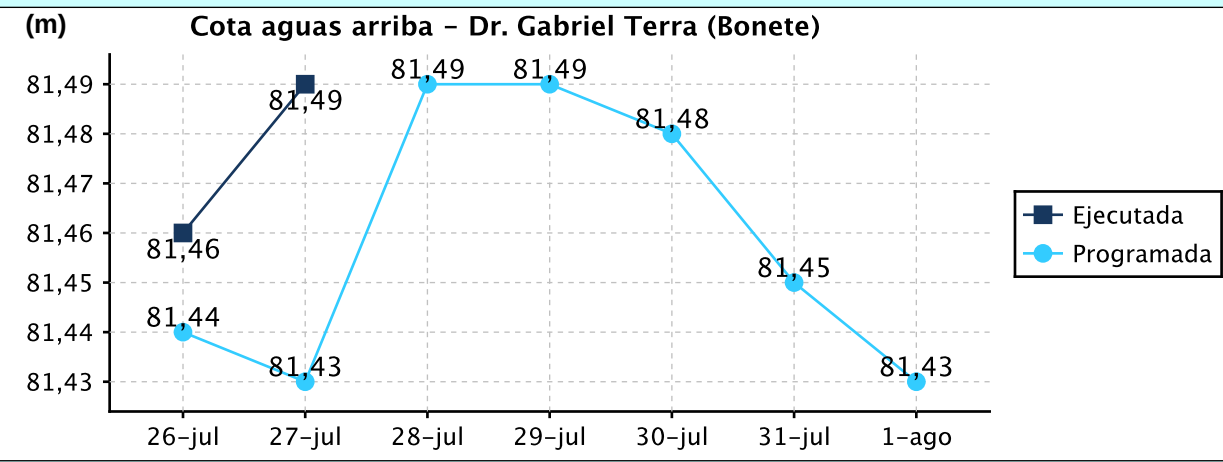


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,43	81,49
Baygorria	54,06	54,16
Palmar	40,11	40,22
SGU	35,13	35,33

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

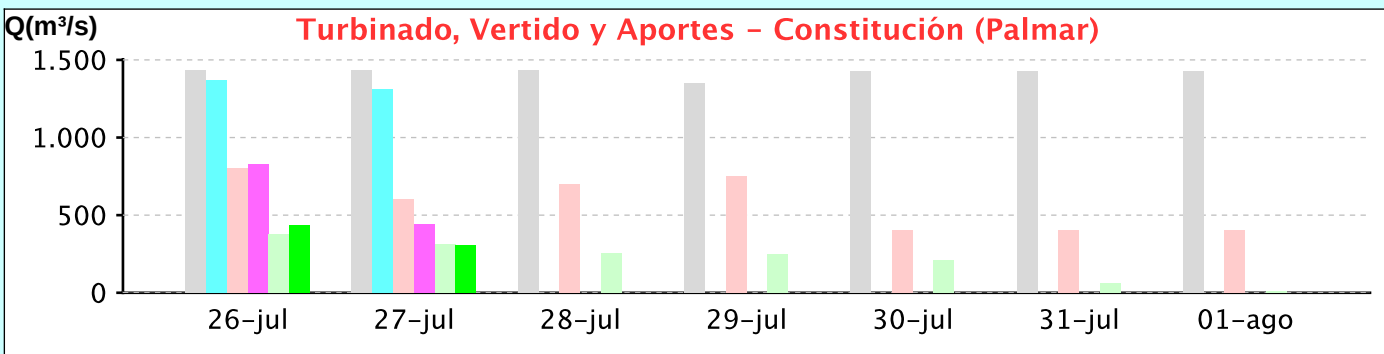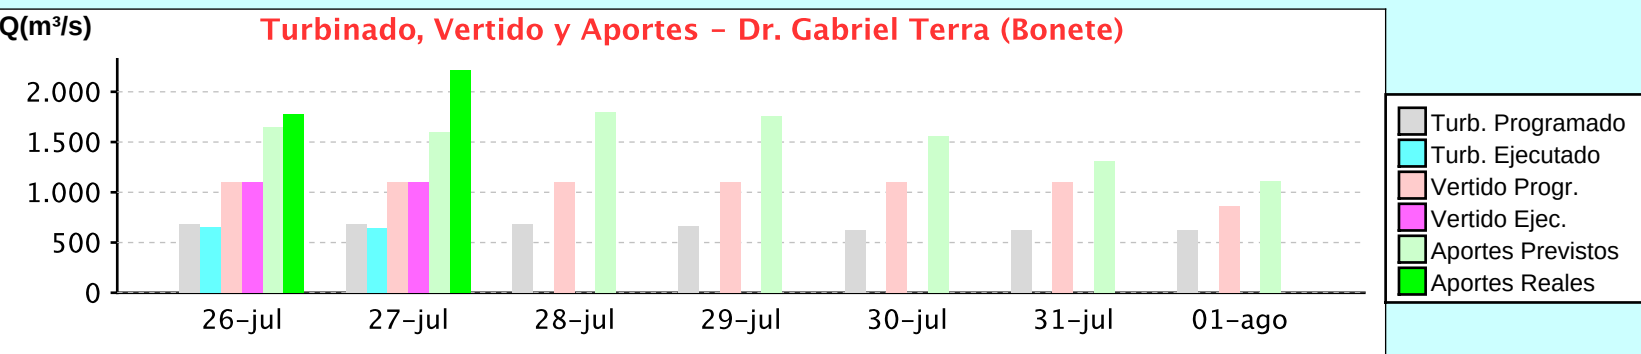

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

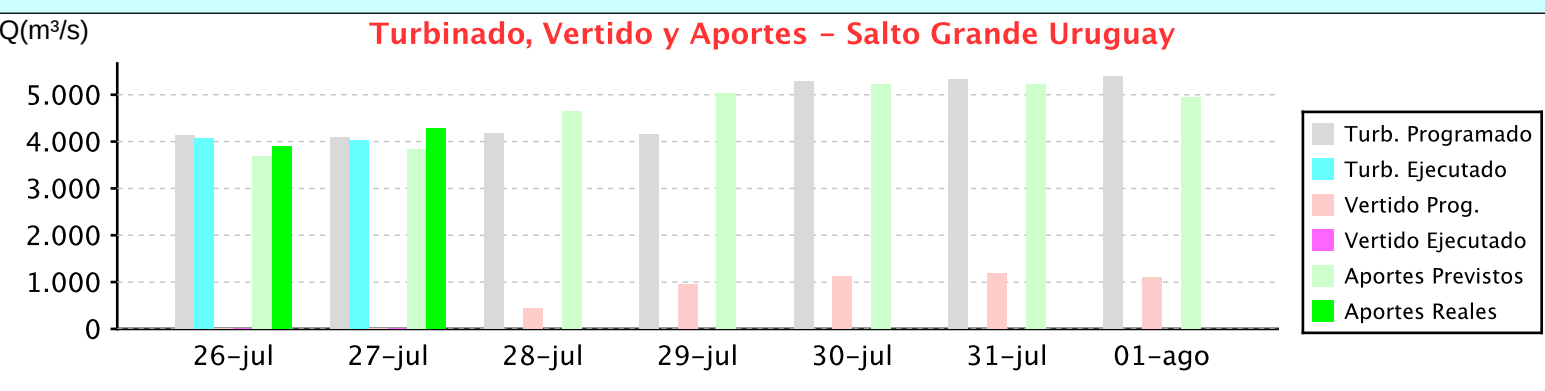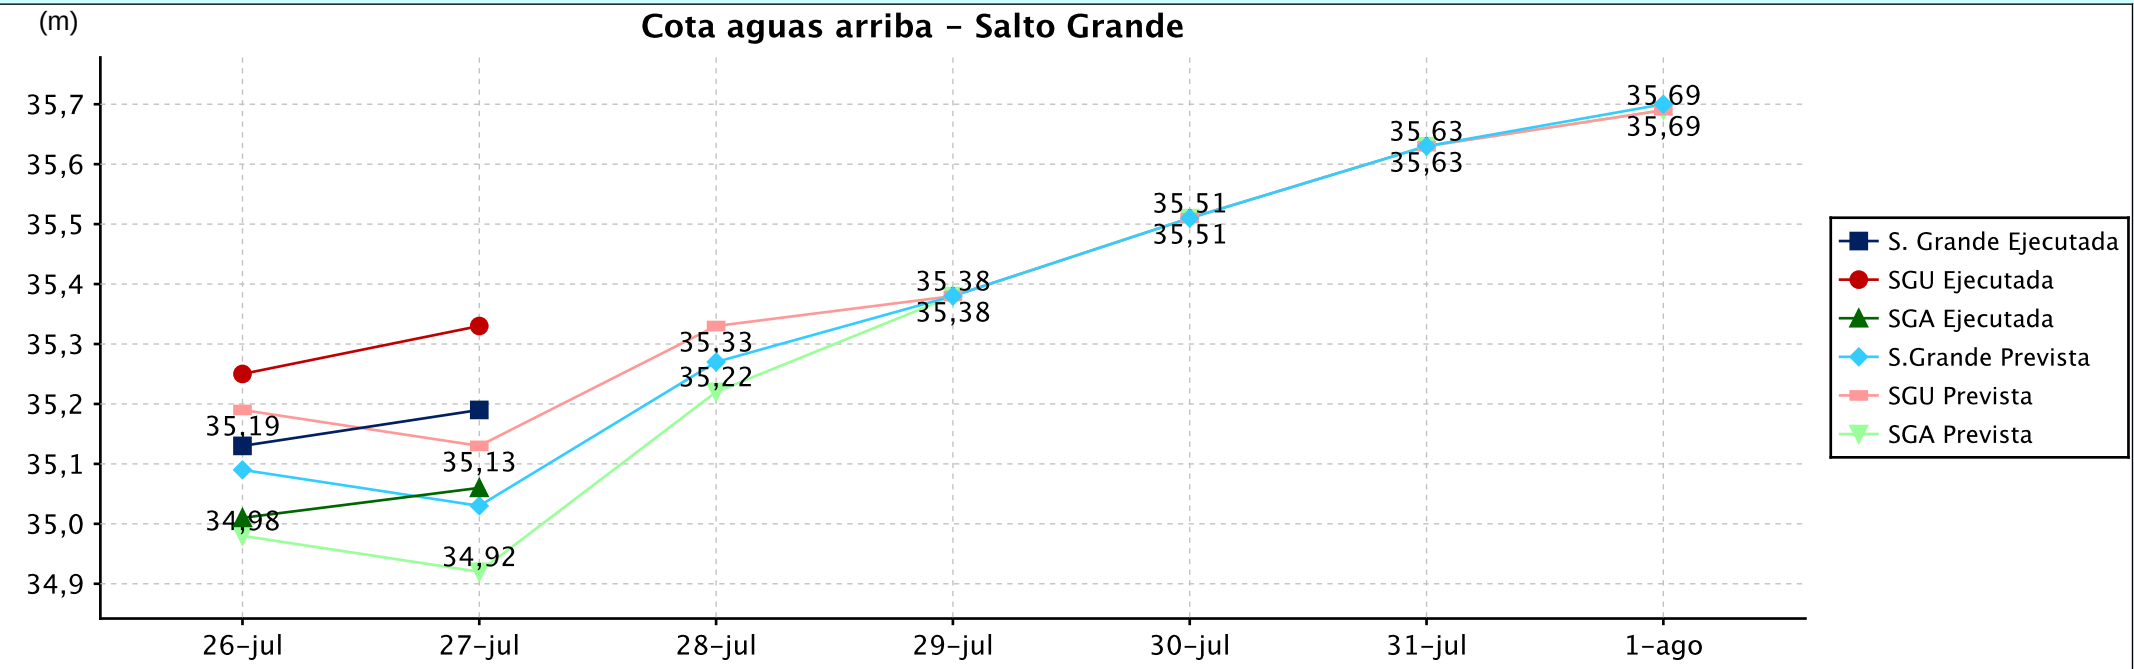

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,33
Cota Vista Arg	35,06
Cota real	35,19

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	6.543
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	684	639
Baygorria	833	785
Palmar	1.432	1.309
SGU	4.091	4.030

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.593	2.213
Baygorria	0	50
Palmar	310	304
SGU	3.825	4.276

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.100	1.102
Baygorria	930	1.069
Palmar	600	440
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
