



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 28 de julio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	90
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	94
Central La Tablada	-48
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.229
C. Baygorria	2.051
C. Palmar	7.872
C. Salto Grande	21.052
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.859
TOTAL Generación	41.088

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	5.592
Hidráulica	5.592
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	5.592




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	35.496
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	32.415
Diferencia (MWh)	3.081
Ejecutada - Programada	9,50 %

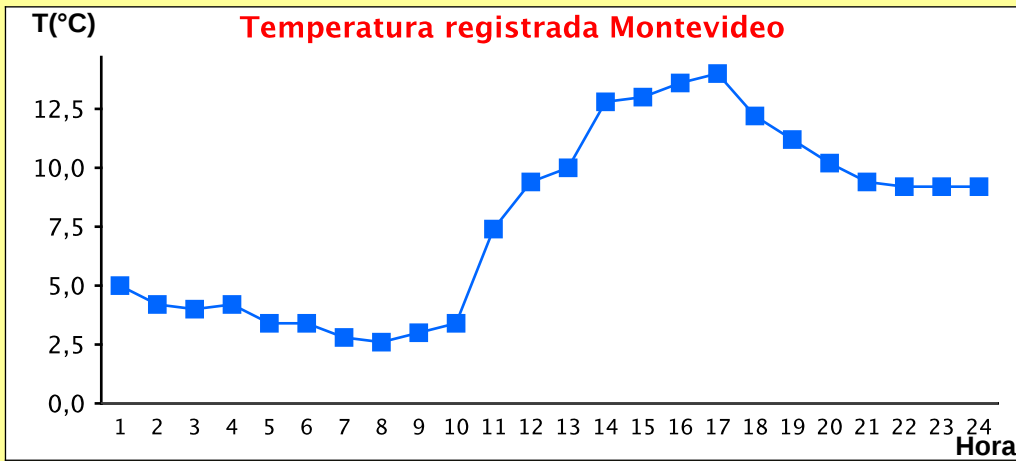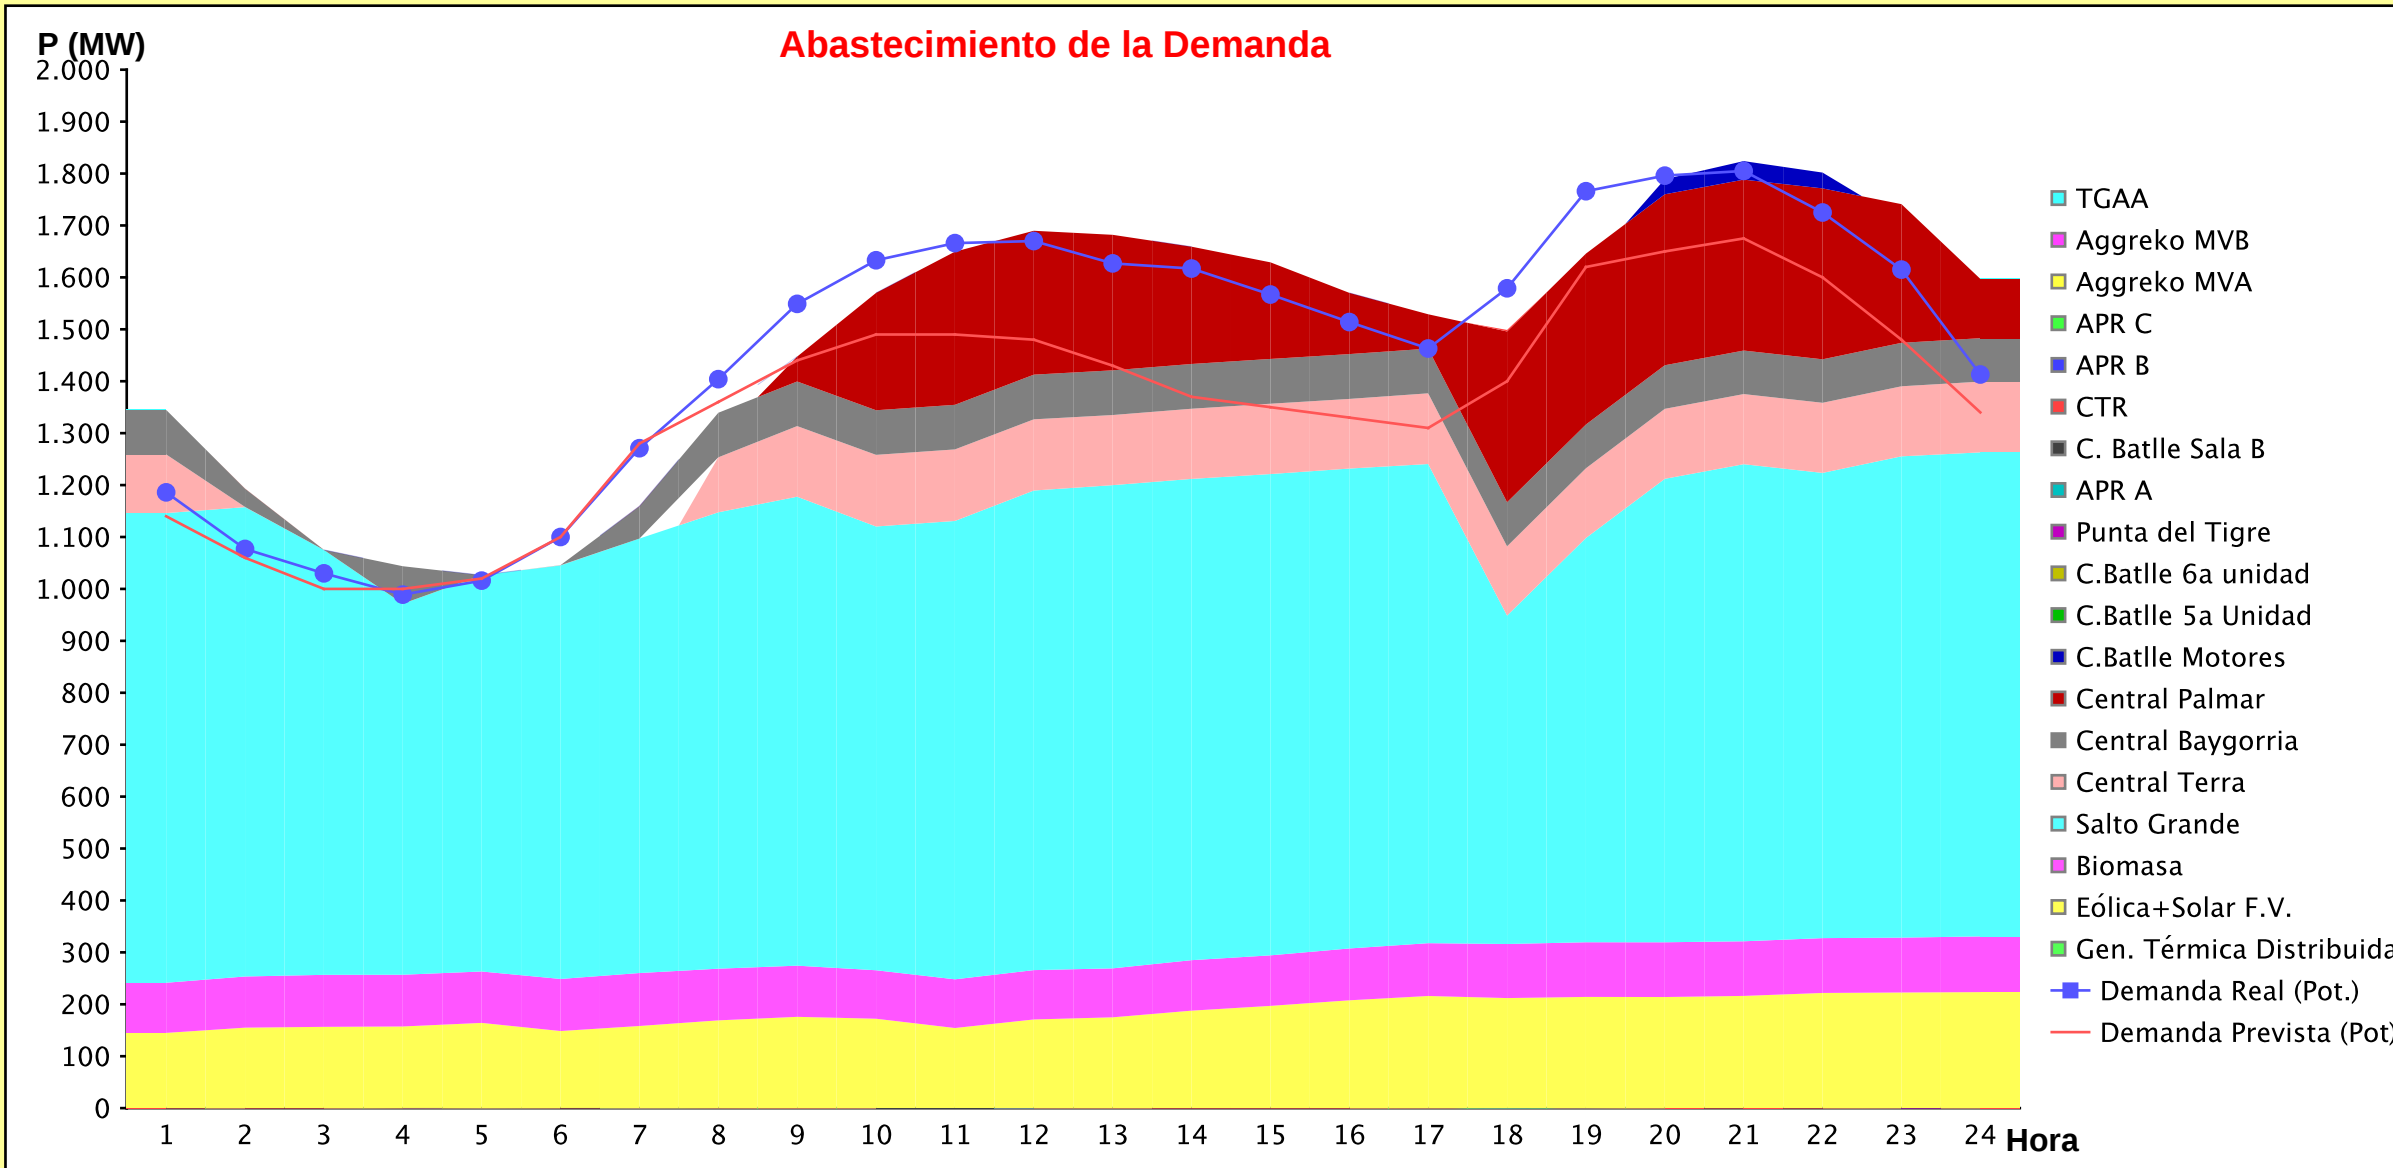



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1699,59 Hora 11:43
Potencia mínima:	988,15 Hora 04:01
Pico noche:	1821,53 Hora 20:40

Generación Media (MW)	
Eólica	185,0
Biomasa	100,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

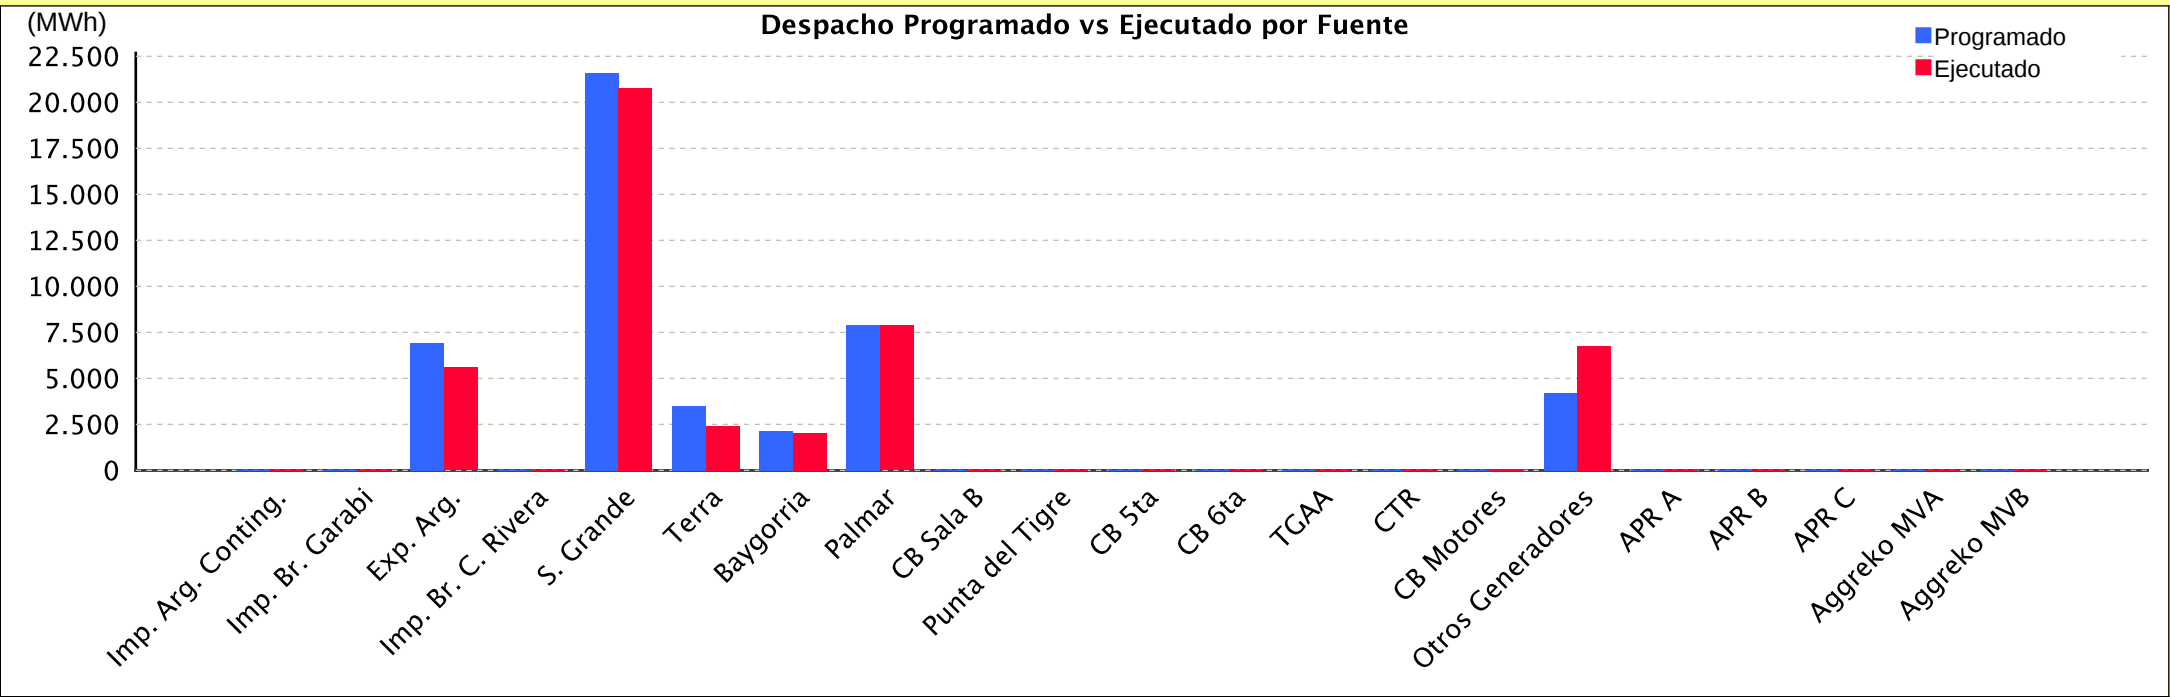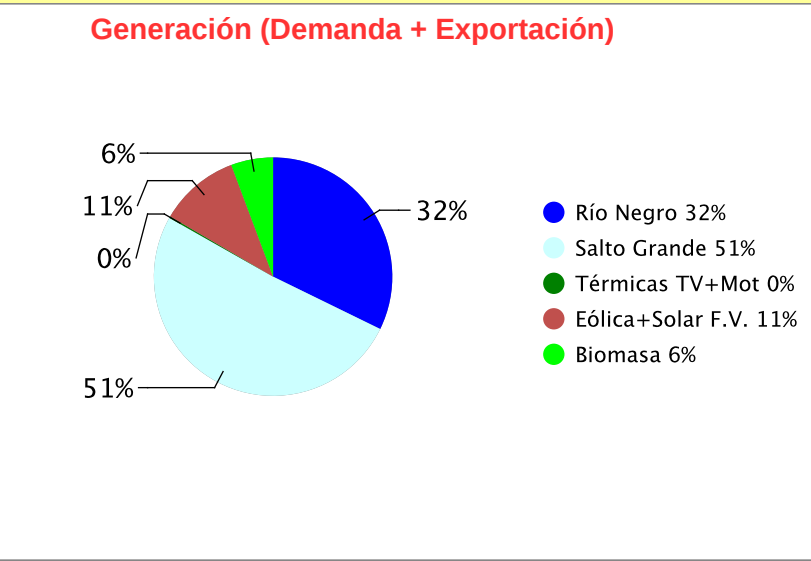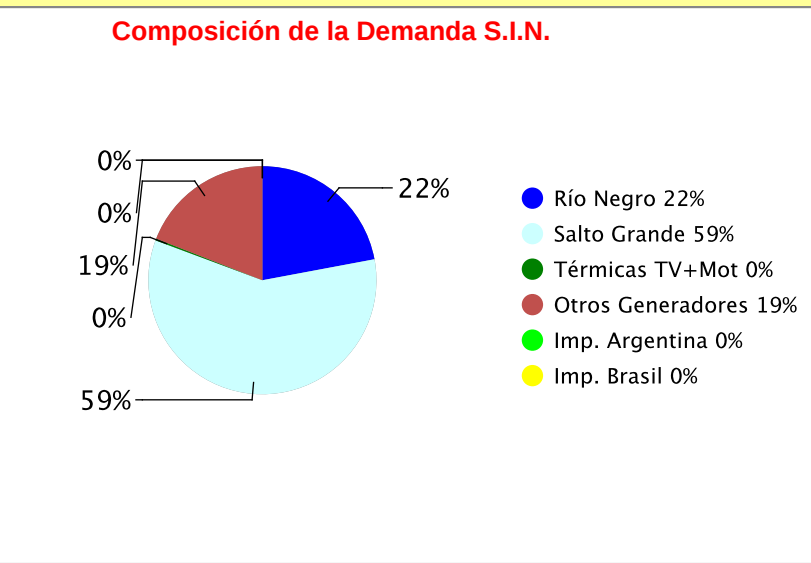



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

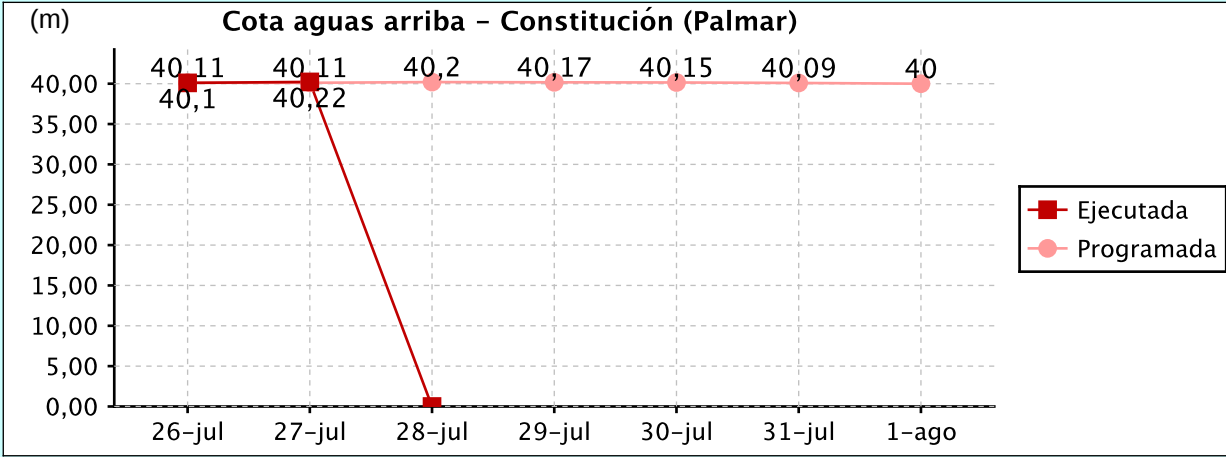
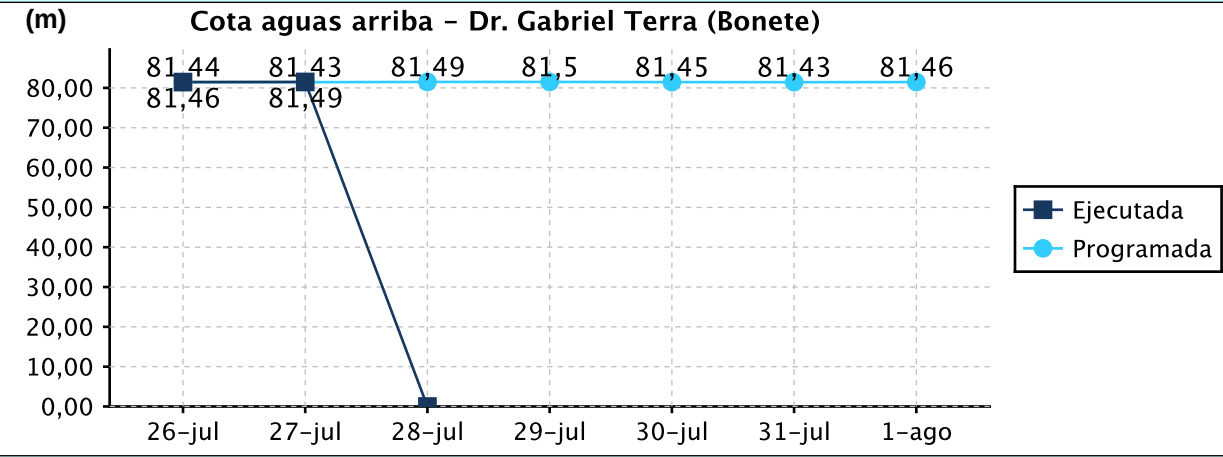


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
SGU	35,33	35,29
Terra	81,49	0
Baygorria	54,18	0
Palmar	40,20	0

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

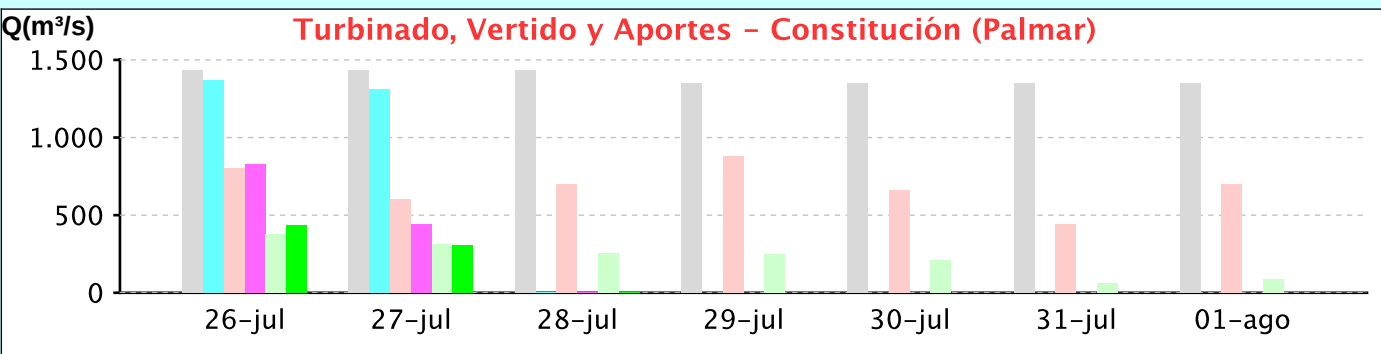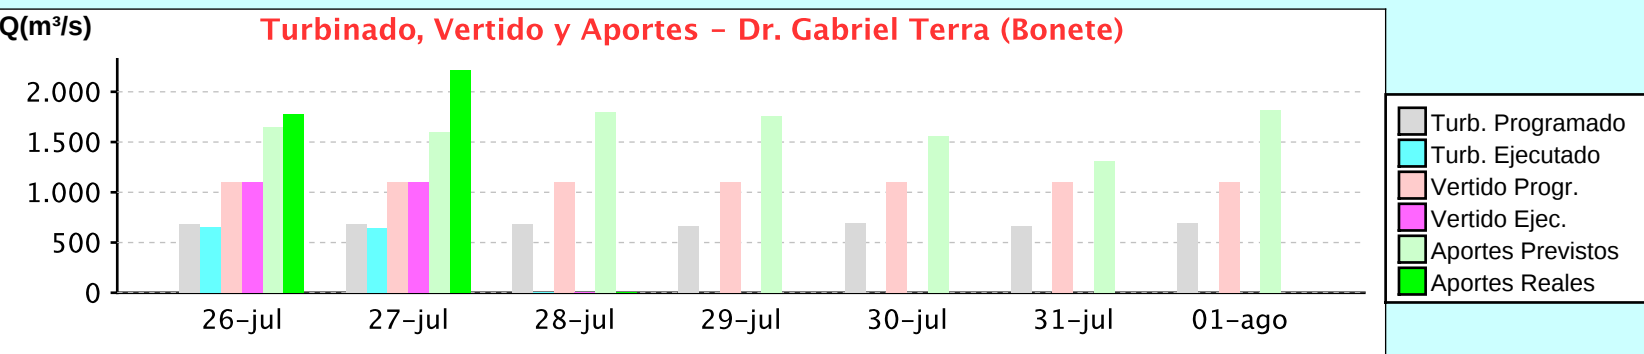

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

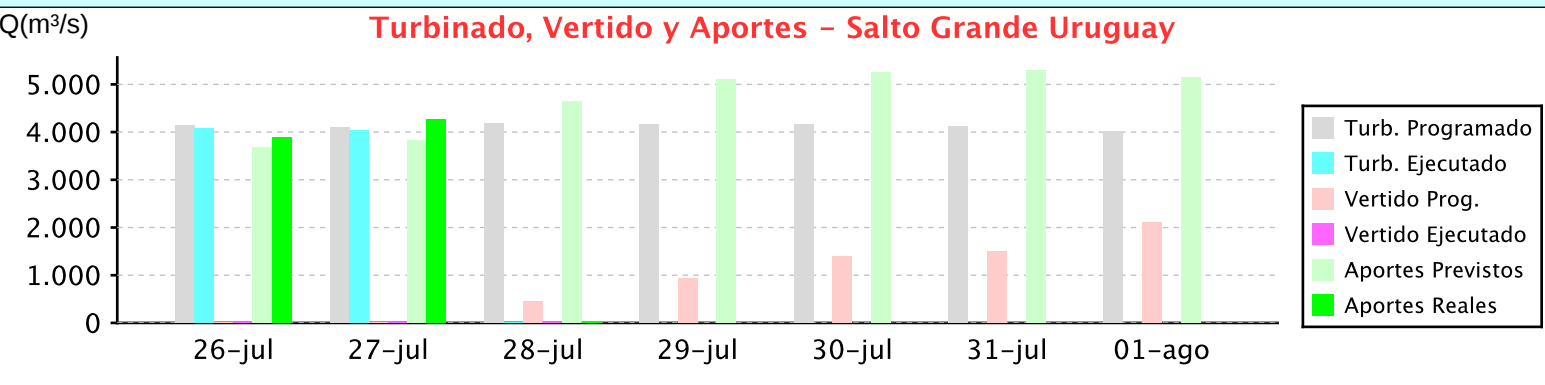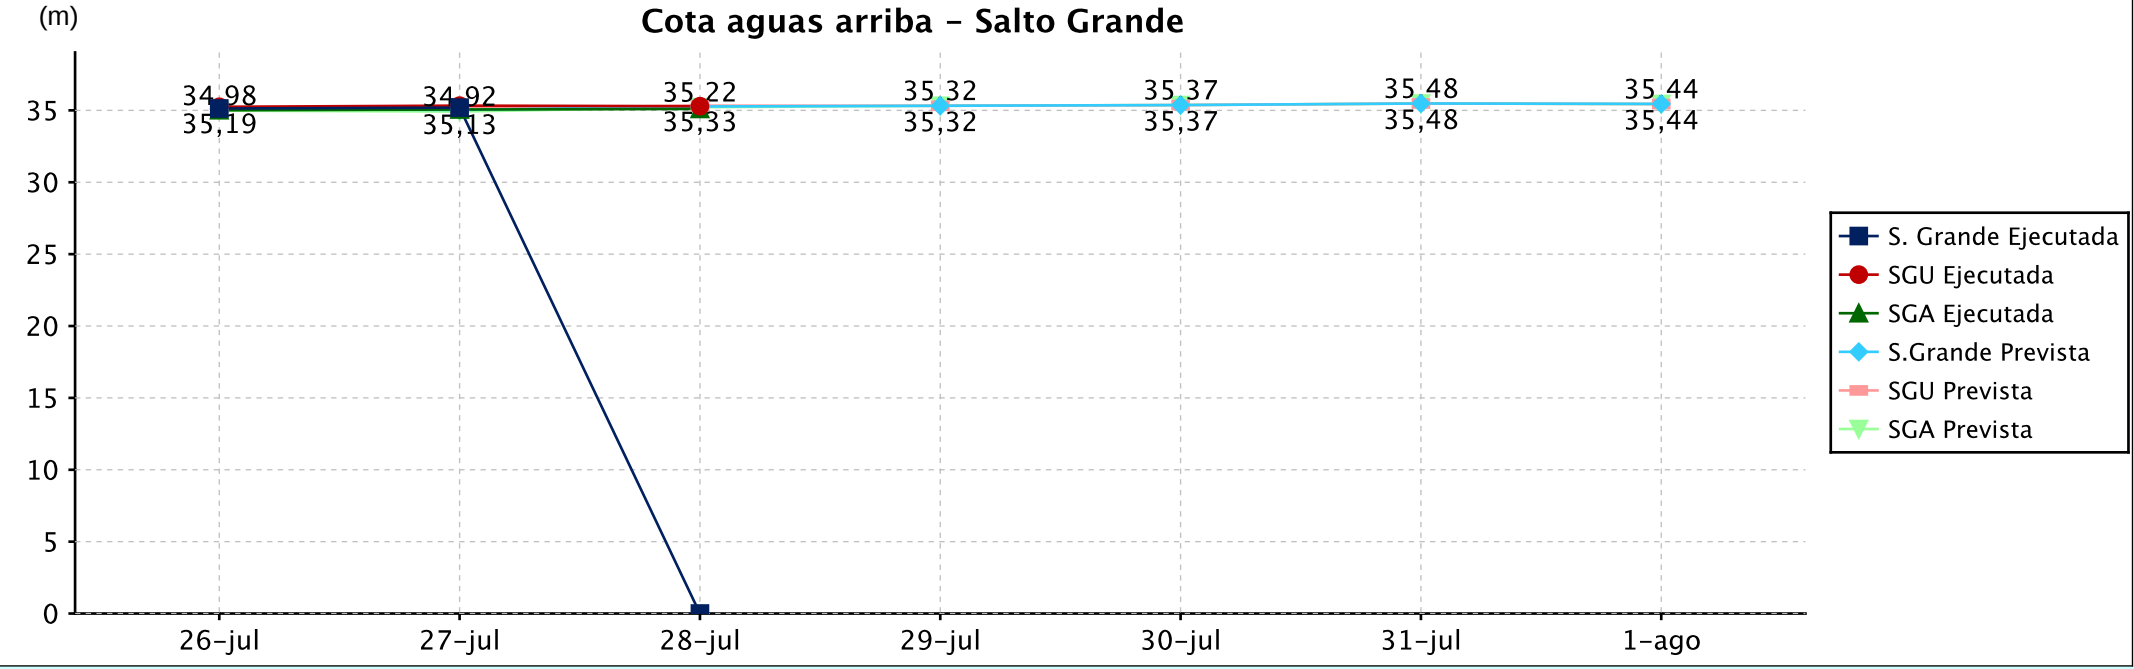

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,29
Cota Vista Arg	35,10
Cota real	0,00
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	4.488

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
SGU	4.184	0
Terra	684	0
Baygorria	833	0
Palmar	1.432	0

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
SGU	4.650	0
Terra	1.792	0
Baygorria	0	0
Palmar	253	0

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
SGU	448	0
Terra	1.100	0
Baygorria	930	0
Palmar	700	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
