



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)



ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 29 de julio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-7
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-3
Central La Tablada	-45
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.056
C. Baygorria	2.074
C. Palmar	7.893
C. Salto Grande	22.196
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.557
TOTAL Generación	41.713




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	8.598
Hidráulica	8.598
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	8.598

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	33.115
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	34.940
Diferencia (MWh)	-1.825
Ejecutada - Programada	-5,22 %

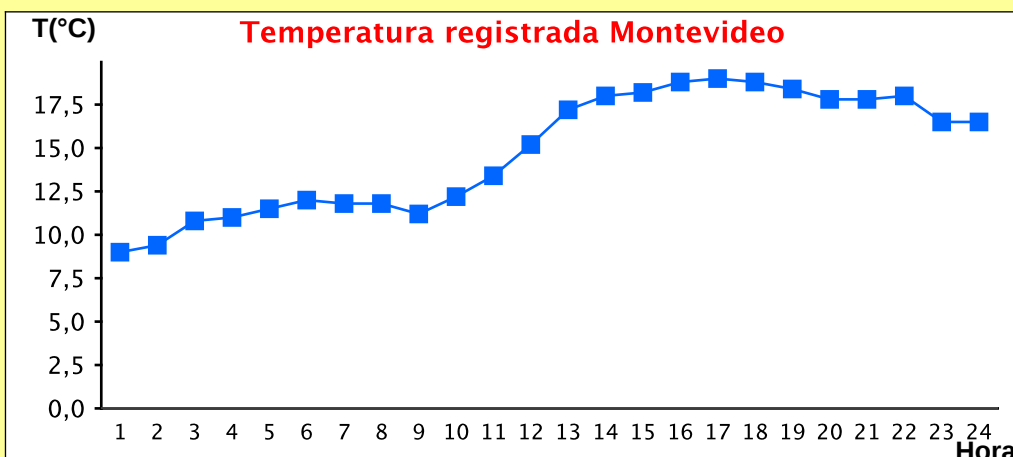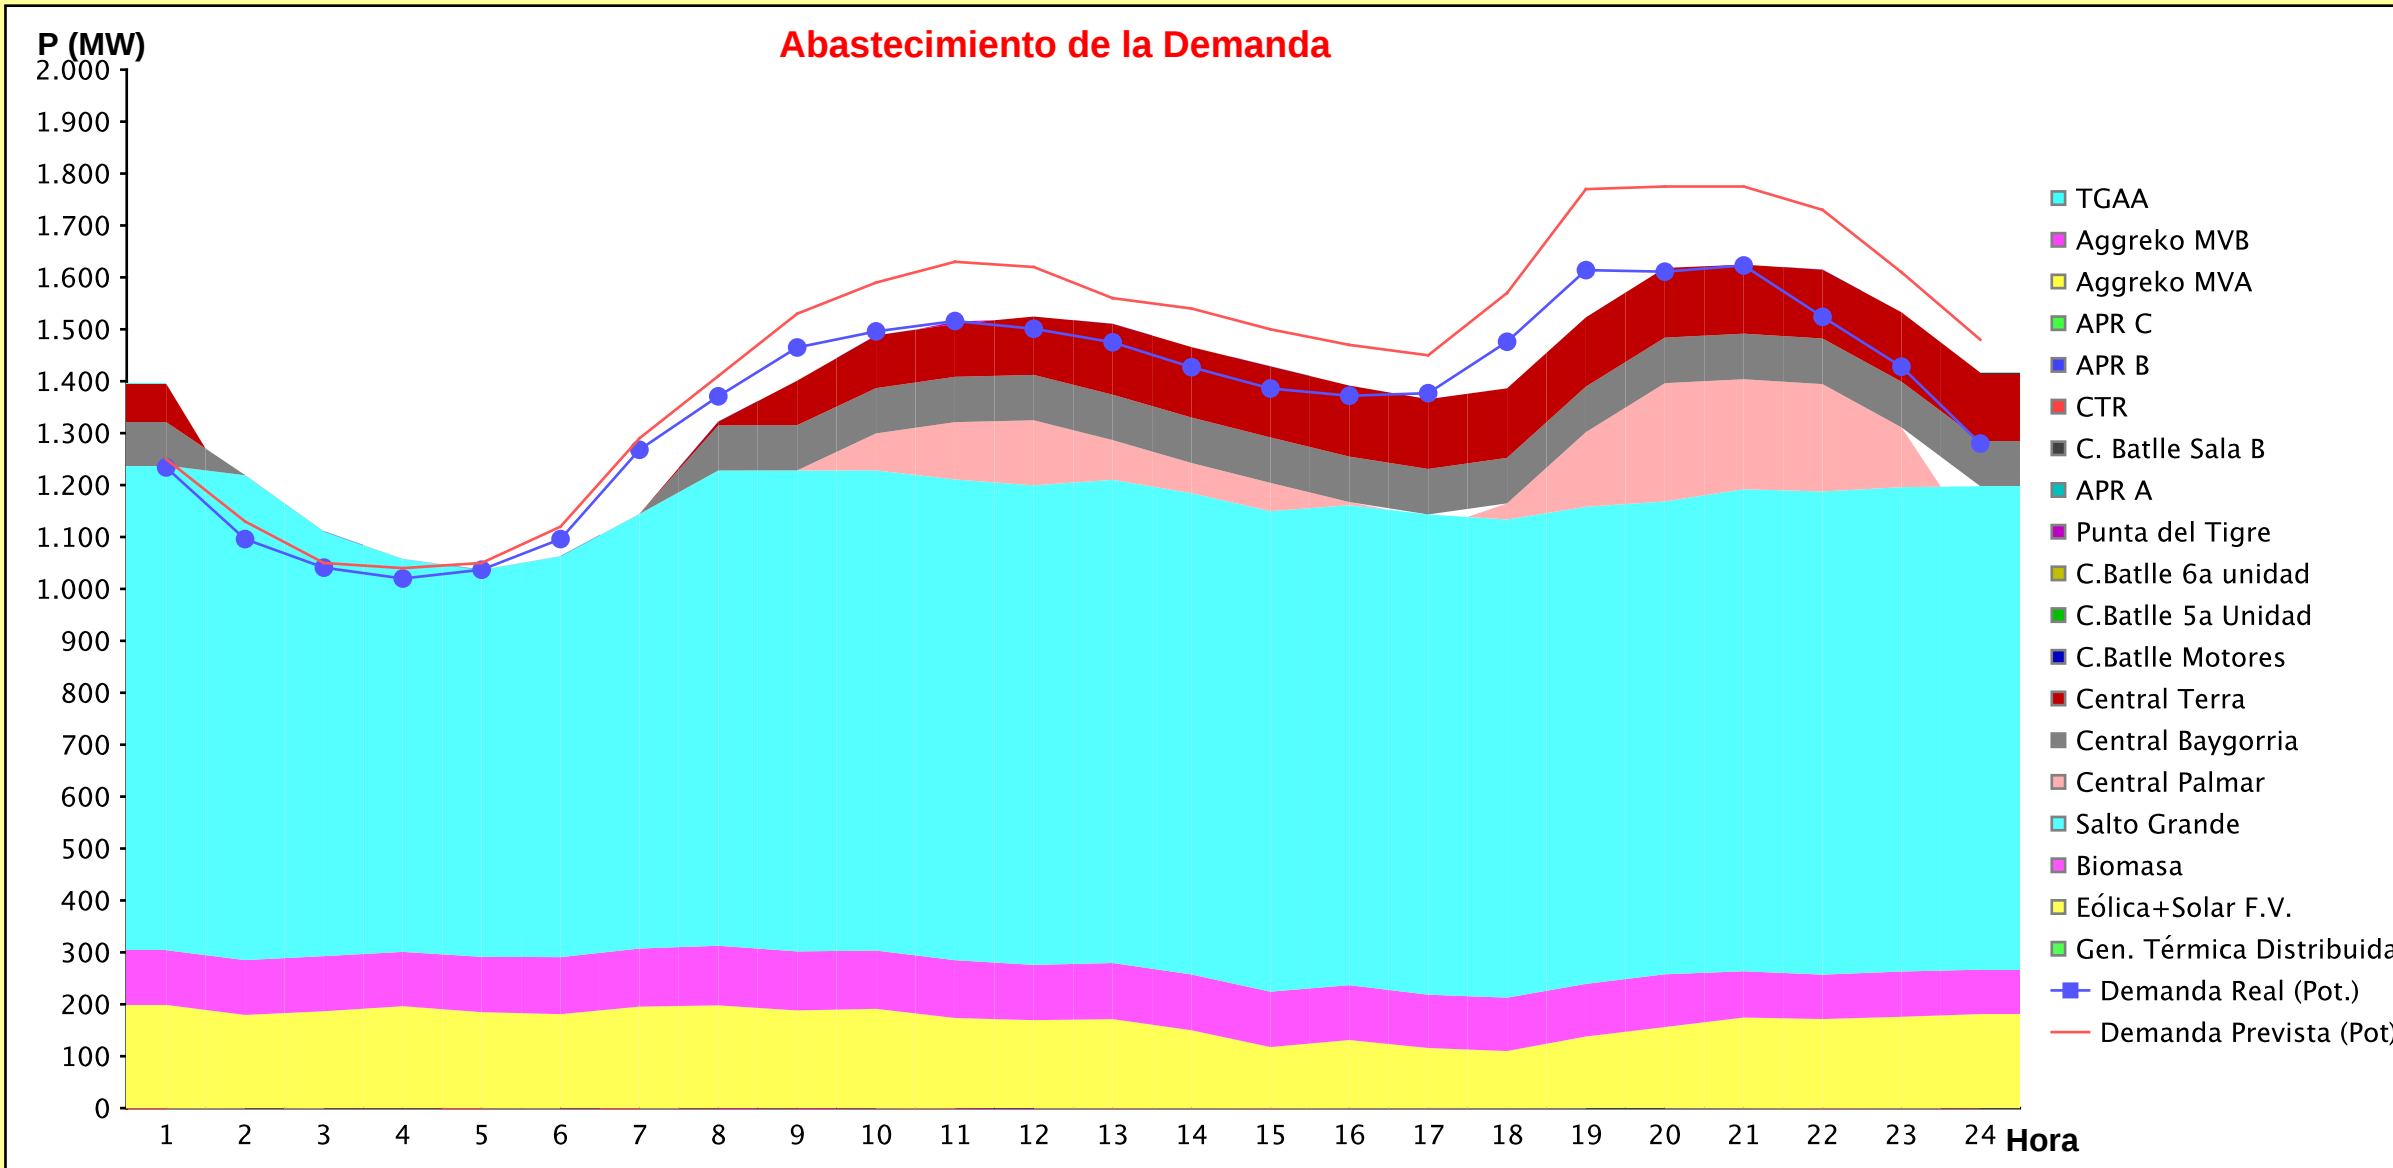



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1542,12 Hora 11:46
Potencia mínima:	1004,38 Hora 04:06
Pico noche:	1639,14 Hora 21:01

Generación Media (MW)	
Eólica	168,4
Biomasa	104,1
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

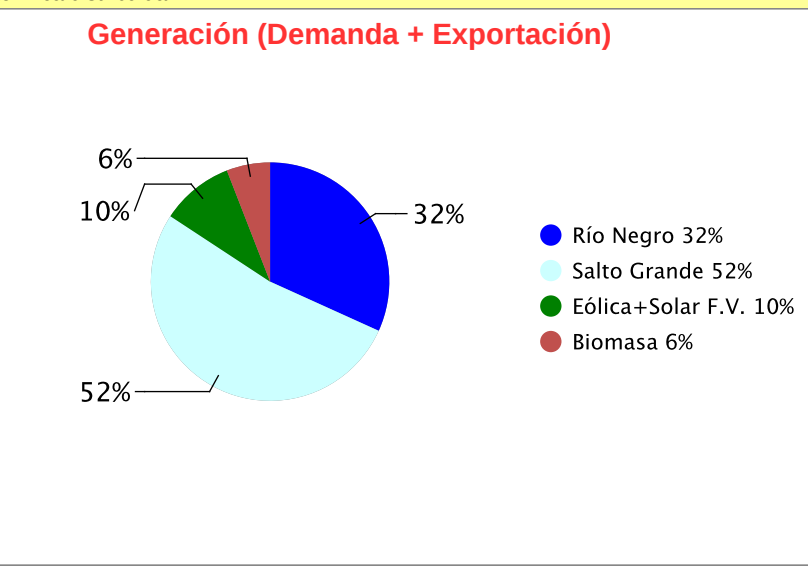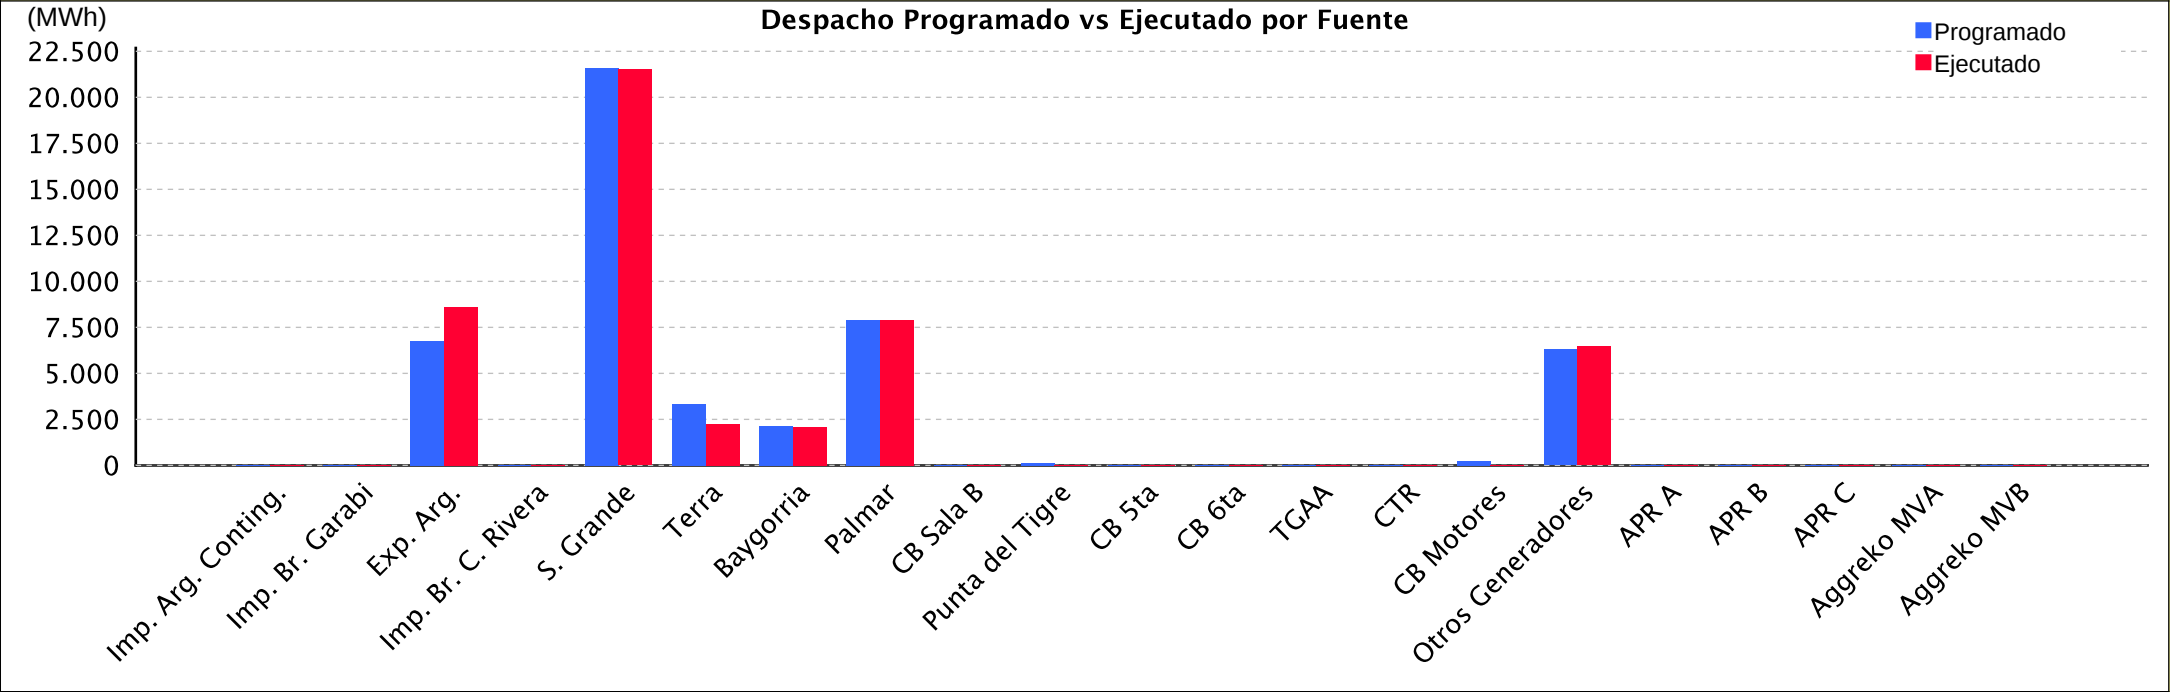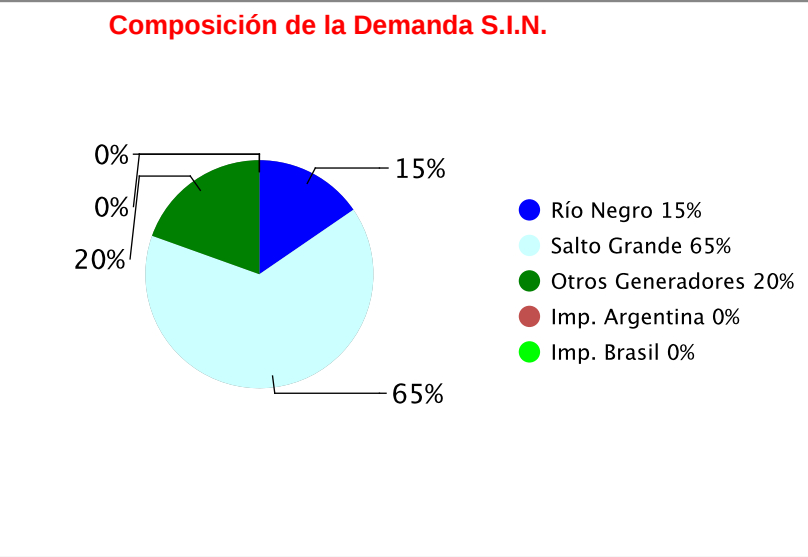



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

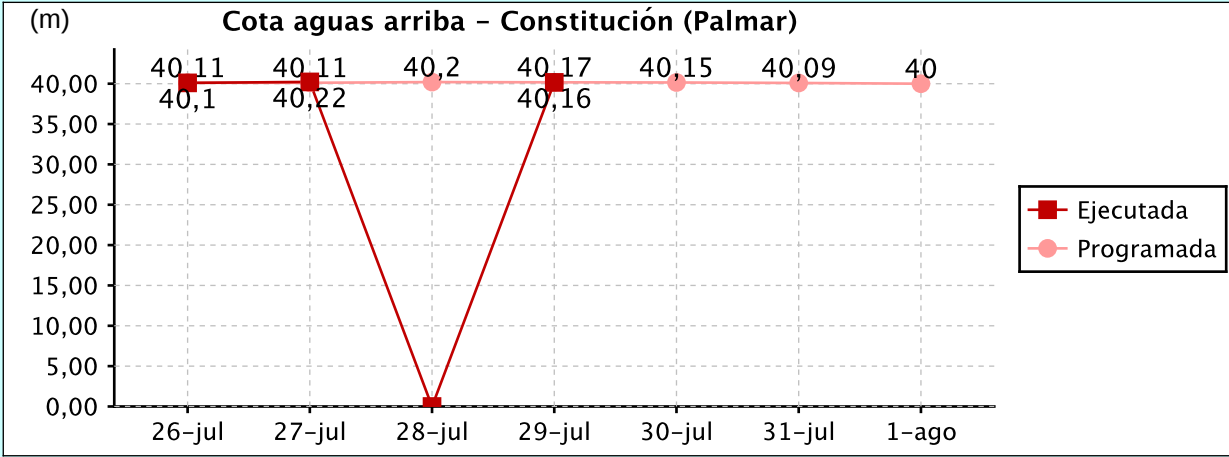
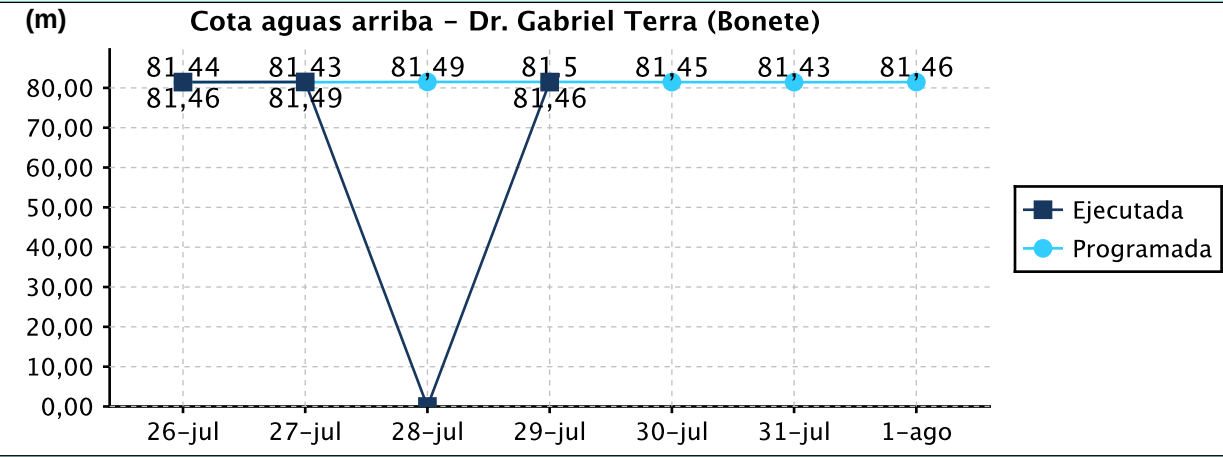


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,50	81,46
Baygorria	54,26	54,25
Palmar	40,17	40,16
SGU	35,32	35,29

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

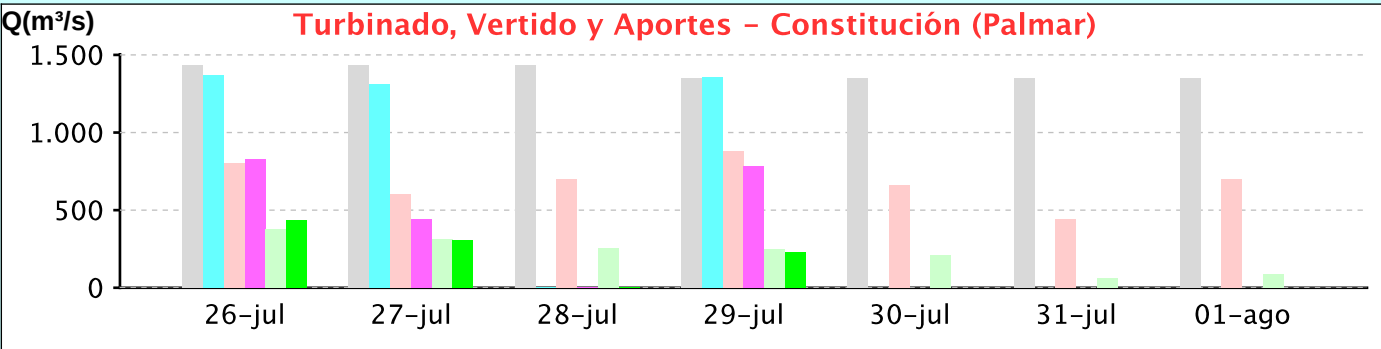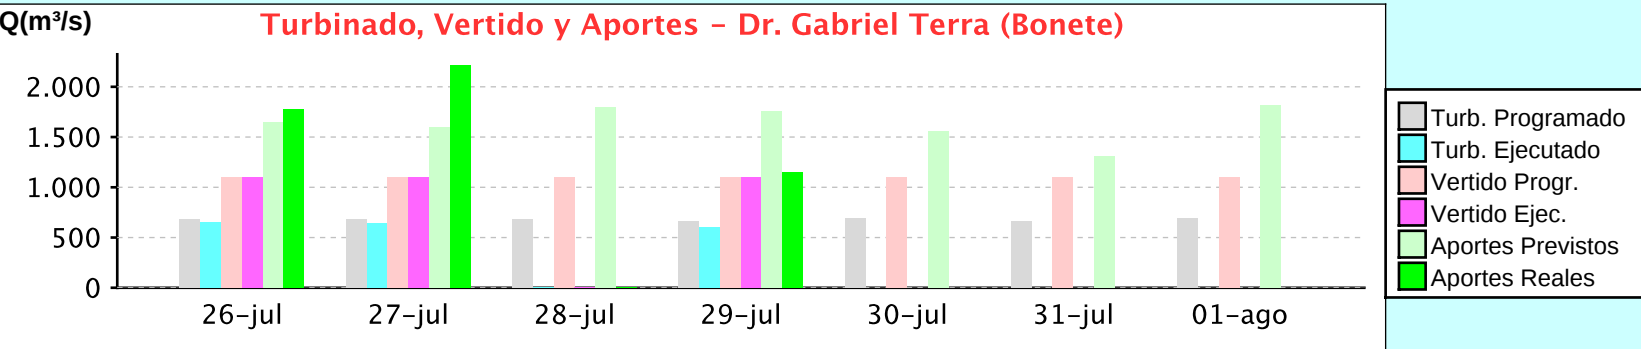

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

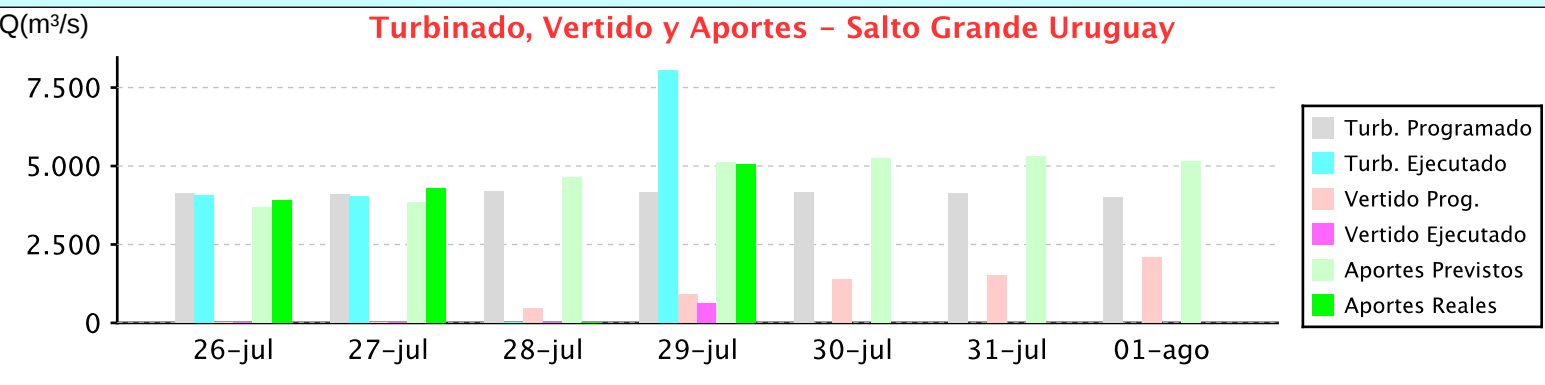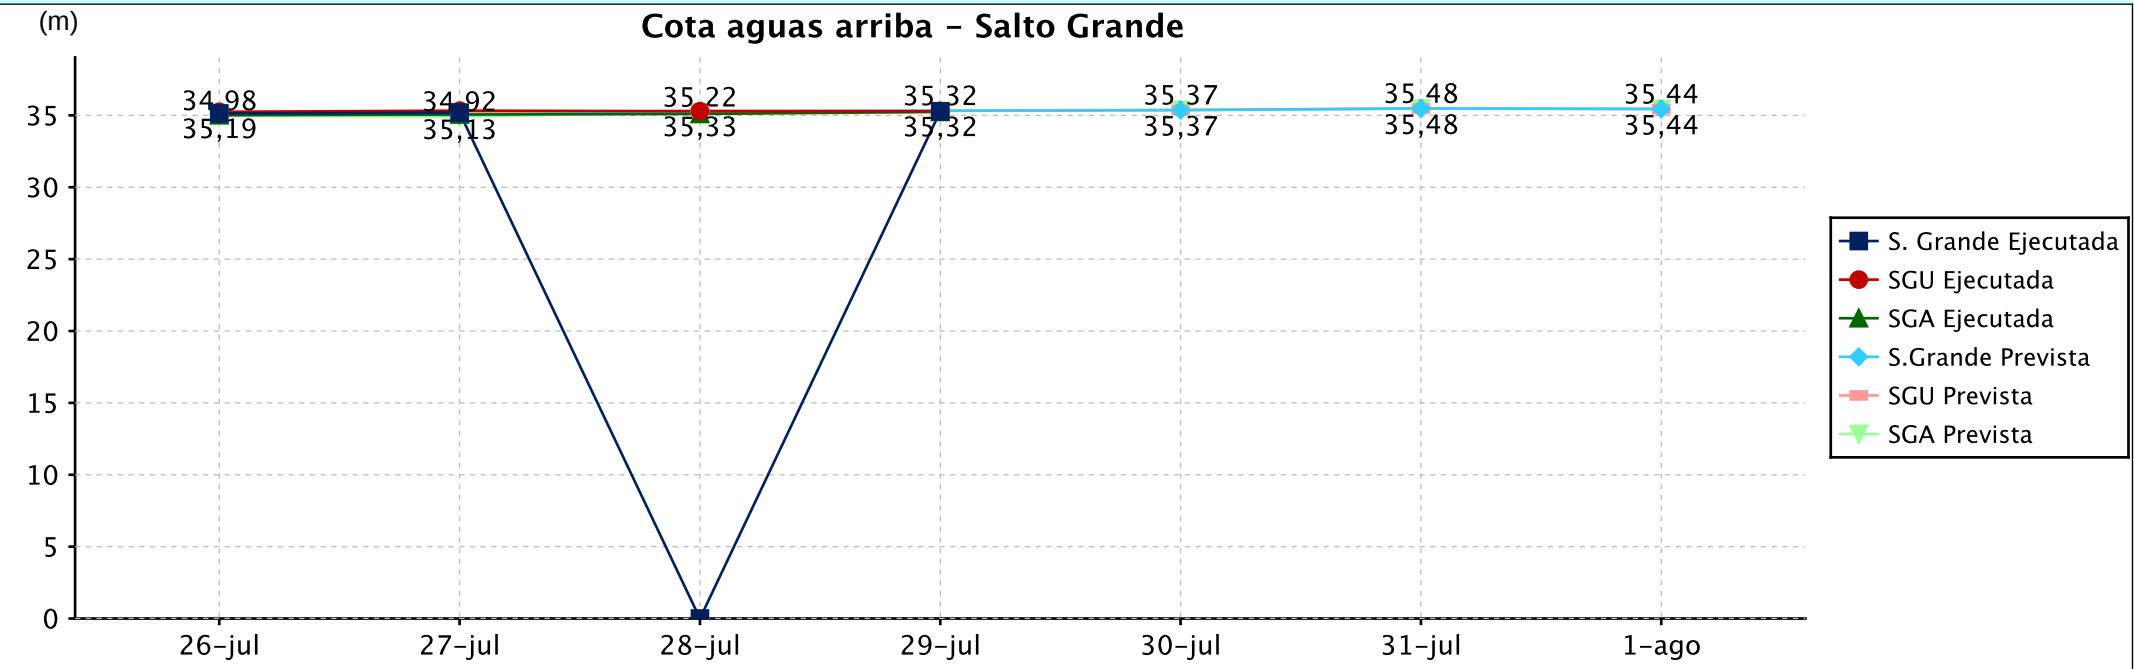

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,29
Cota Vista Arg	35,24
Cota real	35,28
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	1.090

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	666	606
Baygorria	827	794
Palmar	1.351	1.353
SGU	4.162	8.057

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.753	1.150
Baygorria	0	22
Palmar	246	230
SGU	5.100	5.054

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.100	1.102
Baygorria	970	906
Palmar	880	780
SGU	924	607

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
