



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 11 de agosto de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	217
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	221
Central La Tablada	21
Central P. del Tigre	116
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.227
C. Baygorria	2.066
C. Palmar	7.878
C. Salto Grande	14.875
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.275
TOTAL Generación	31.670

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.670
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.380
Diferencia (MWh)	2.290
Ejecutada - Programada	7,79 %

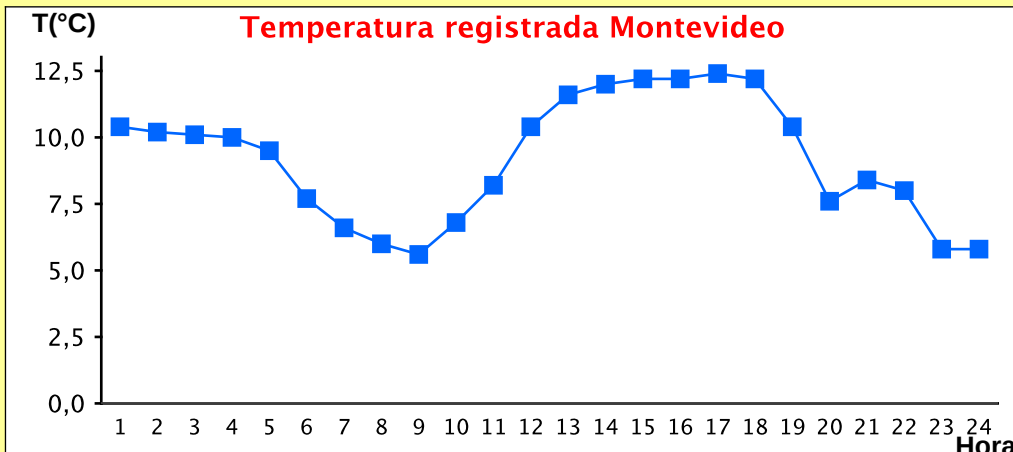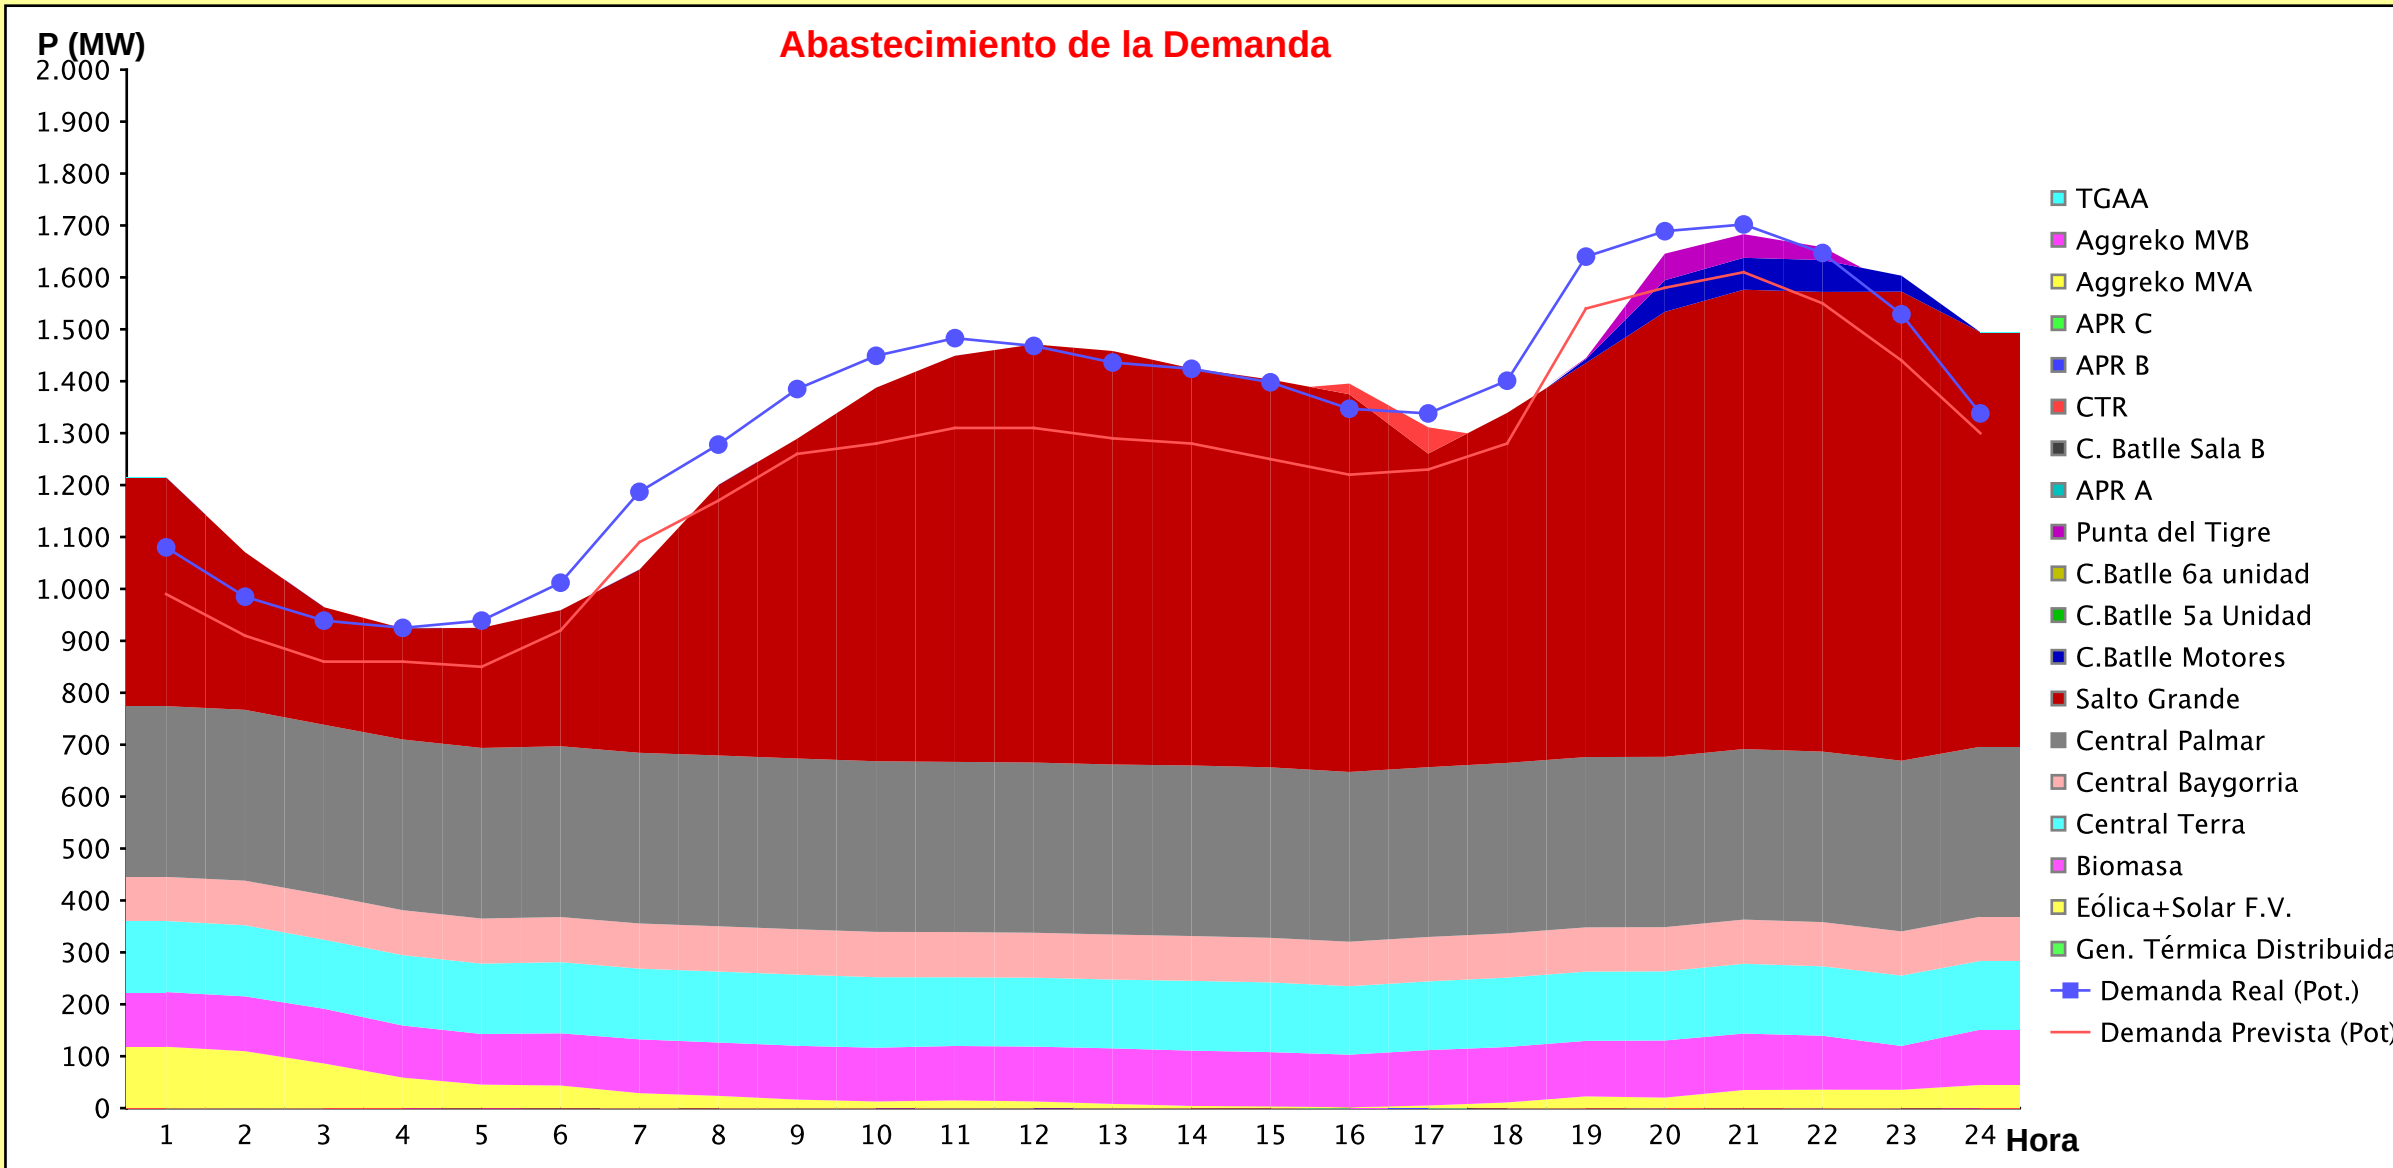



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1513,75 Hora 11:12
Potencia mínima:	923,72 Hora 03:18
Pico noche:	1720,92 Hora 21:08

Generación Media (MW)	
Eólica	34,6
Biomasa	104,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

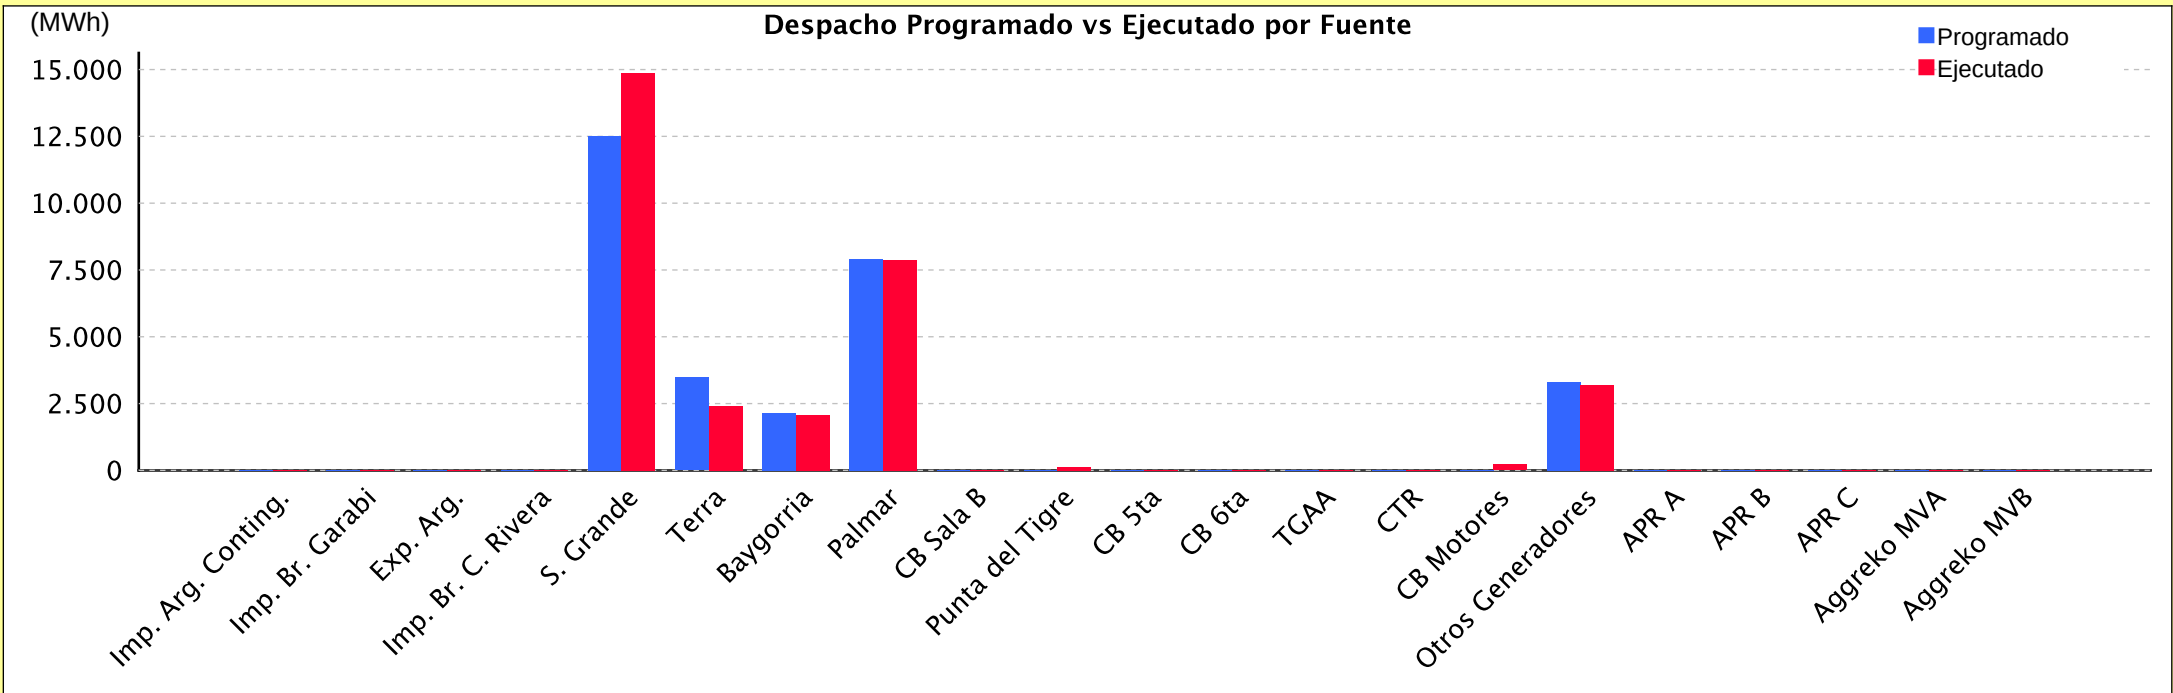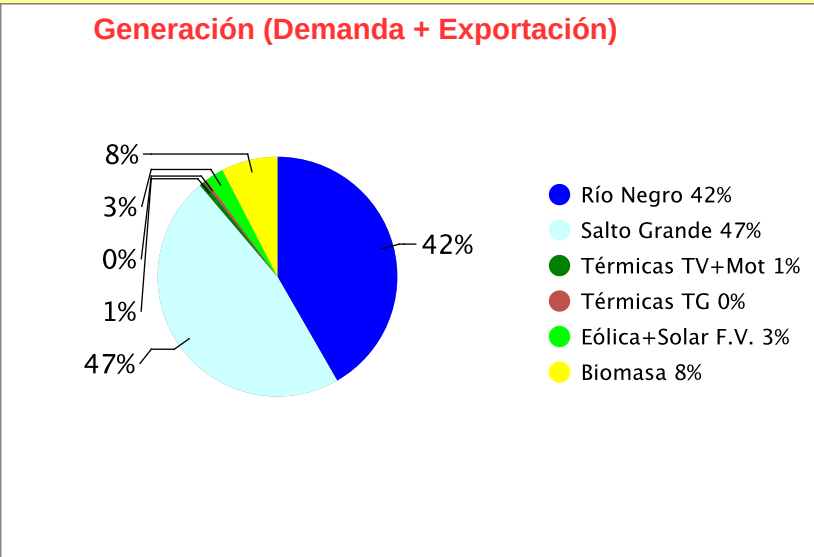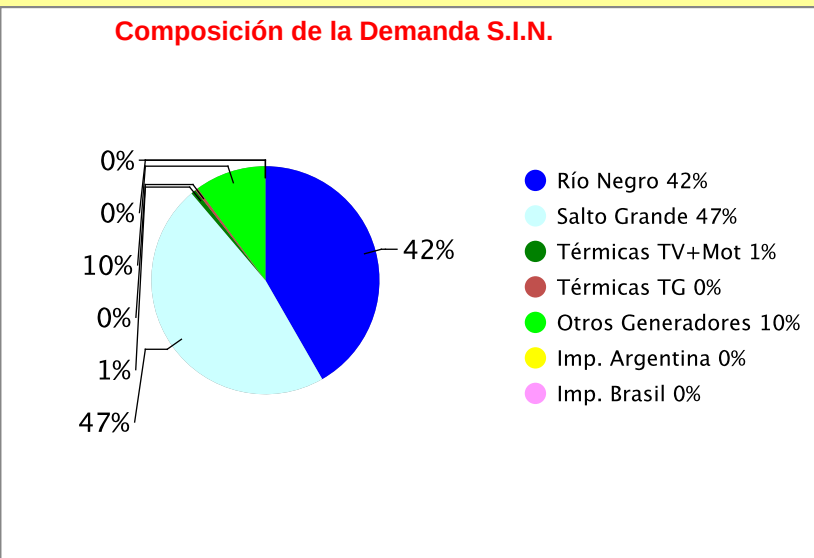



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

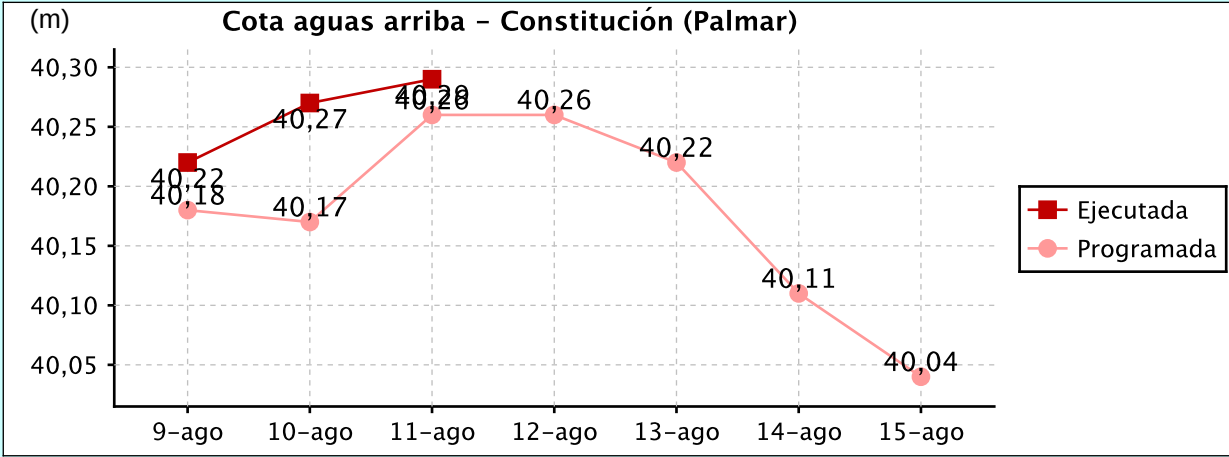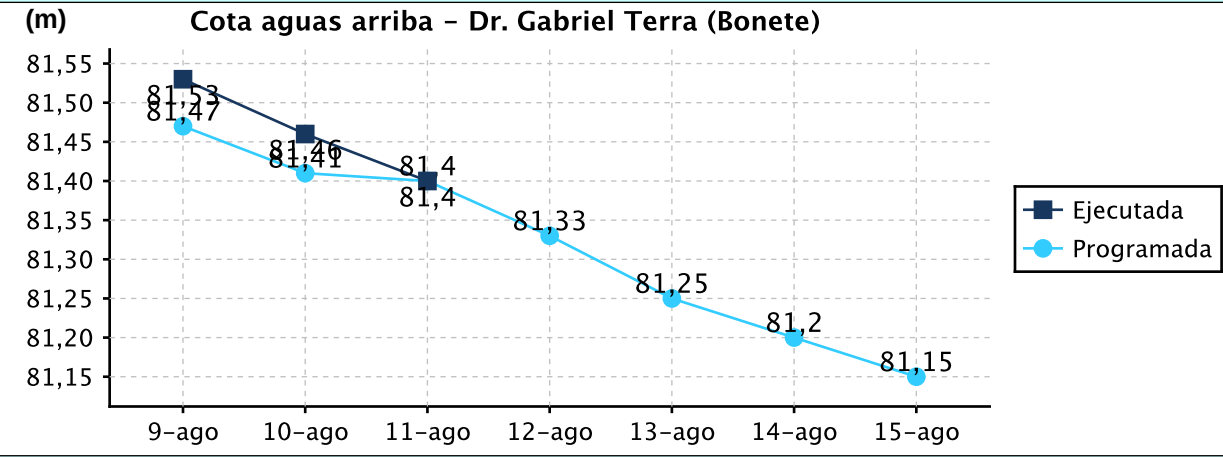


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,40	81,4
Baygorria	54,13	54,18
Palmar	40,26	40,29
SGU	35,52	35,39

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

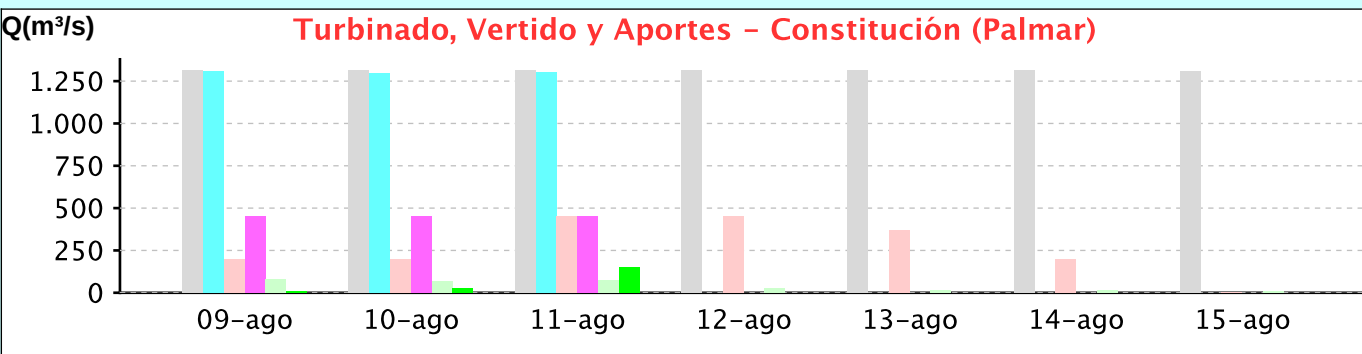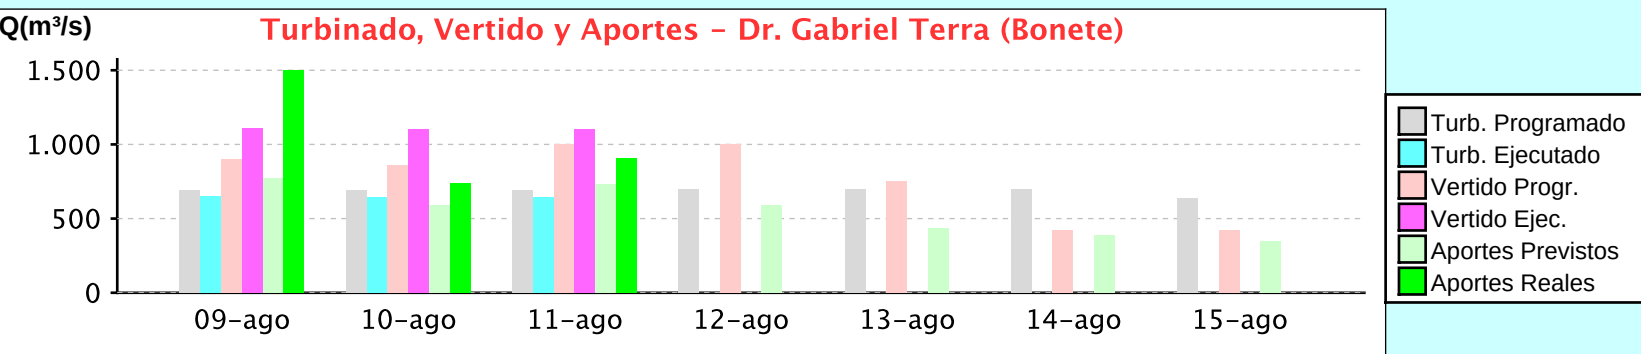

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

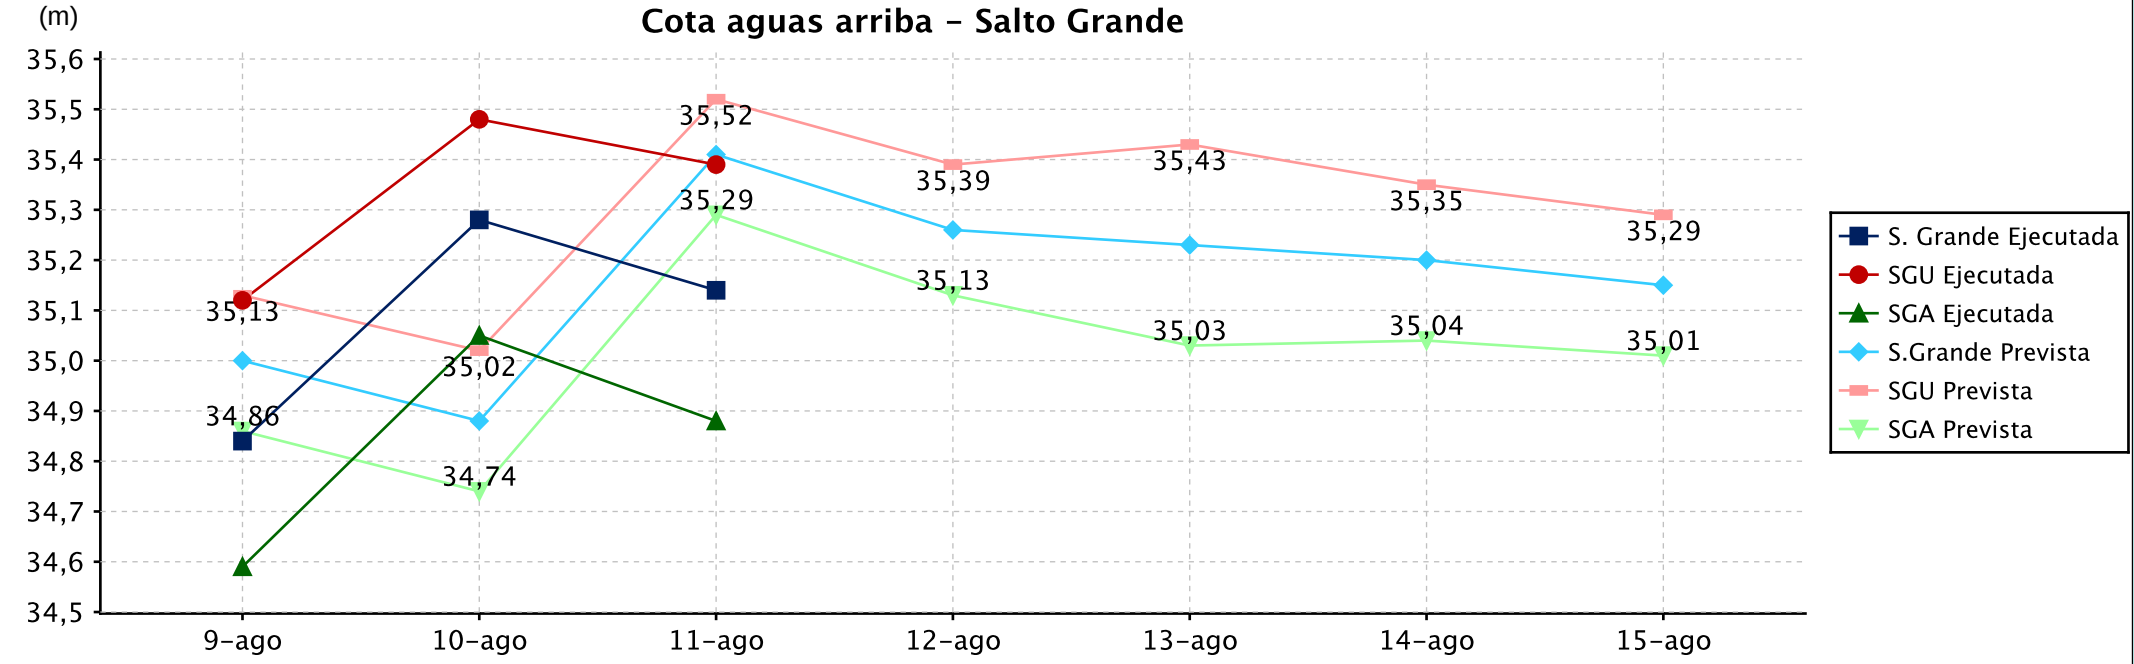


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	690	647
Baygorria	830	798
Palmar	1.313	1.303
SGU	2.256	2.758

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	729	908
Baygorria	0	-7
Palmar	76	149
SGU	2.850	2.856

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.000	1.099
Baygorria	860	886
Palmar	450	454
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

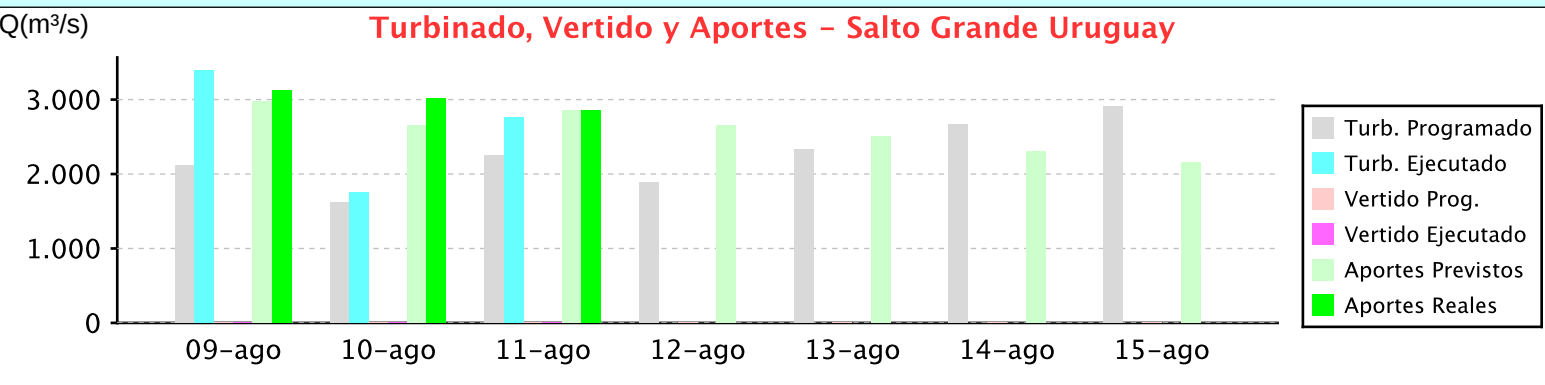

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,39
Cota Vista Arg	34,88
Cota real	35,14
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
12.336	

OBSERVACIONES
