



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO  
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 13 de agosto de 2014

| Generación Térmica    |        |
|-----------------------|--------|
| Central Battle        | 248    |
| Sala B                | -4     |
| 5ta.                  | 0      |
| 6ta.                  | 0      |
| Motores               | 251    |
| Central La Tablada    | -67    |
| Central P. del Tigre  | 93     |
| APR A                 | -2     |
| APR B                 | -3     |
| APR C                 | 0      |
| Aggreko               | -1     |
| Aggreko MVA           | -1     |
| Aggreko MVB           | -1     |
| Central Maldonado     | 0      |
| Generación Hidráulica |        |
| C.G.Terra             | 3.205  |
| C. Baygorria          | 2.108  |
| C. Palmar             | 7.887  |
| C. Salto Grande       | 13.768 |
| Importación (MWh)     |        |
| Argentina             | 0      |
| Contingente           | 0      |
| Brasil                | 0      |
| Rivera                | 0      |
| SADI                  | 0      |
| Otros Generadores     |        |
| Otros Generadores     | 5.986  |
| TOTAL Generación      | 33.221 |

| Exportación (MWh)       |   |
|-------------------------|---|
| Exportación a Arg.      | 0 |
| Hidráulica              | 0 |
| Térmica                 | 0 |
| Exportación a Brasil    | 0 |
| TOTAL Exportación (MWh) | 0 |




|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)                              | 33.221 |
| (en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) |        |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Demanda Programada (MWh) | 32.290 |
| Diferencia (MWh)         | 931    |
| Ejecutada - Programada   | 2,88 % |

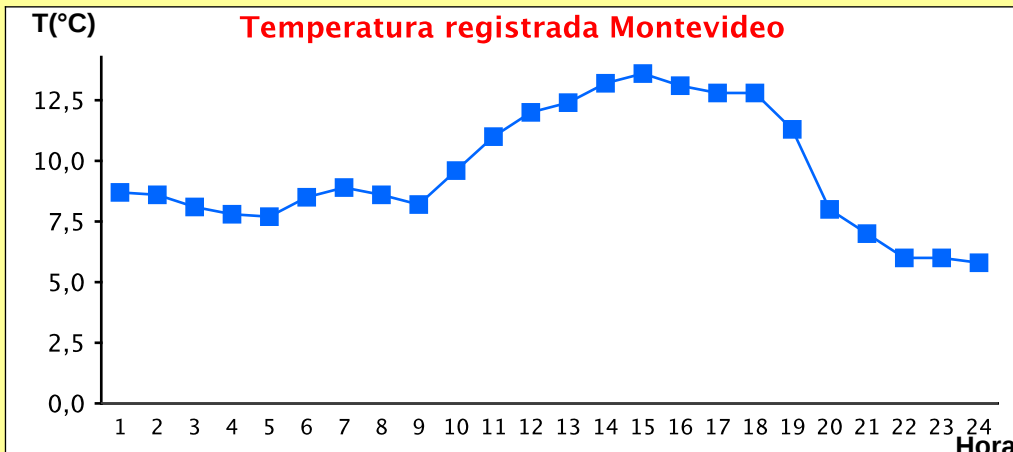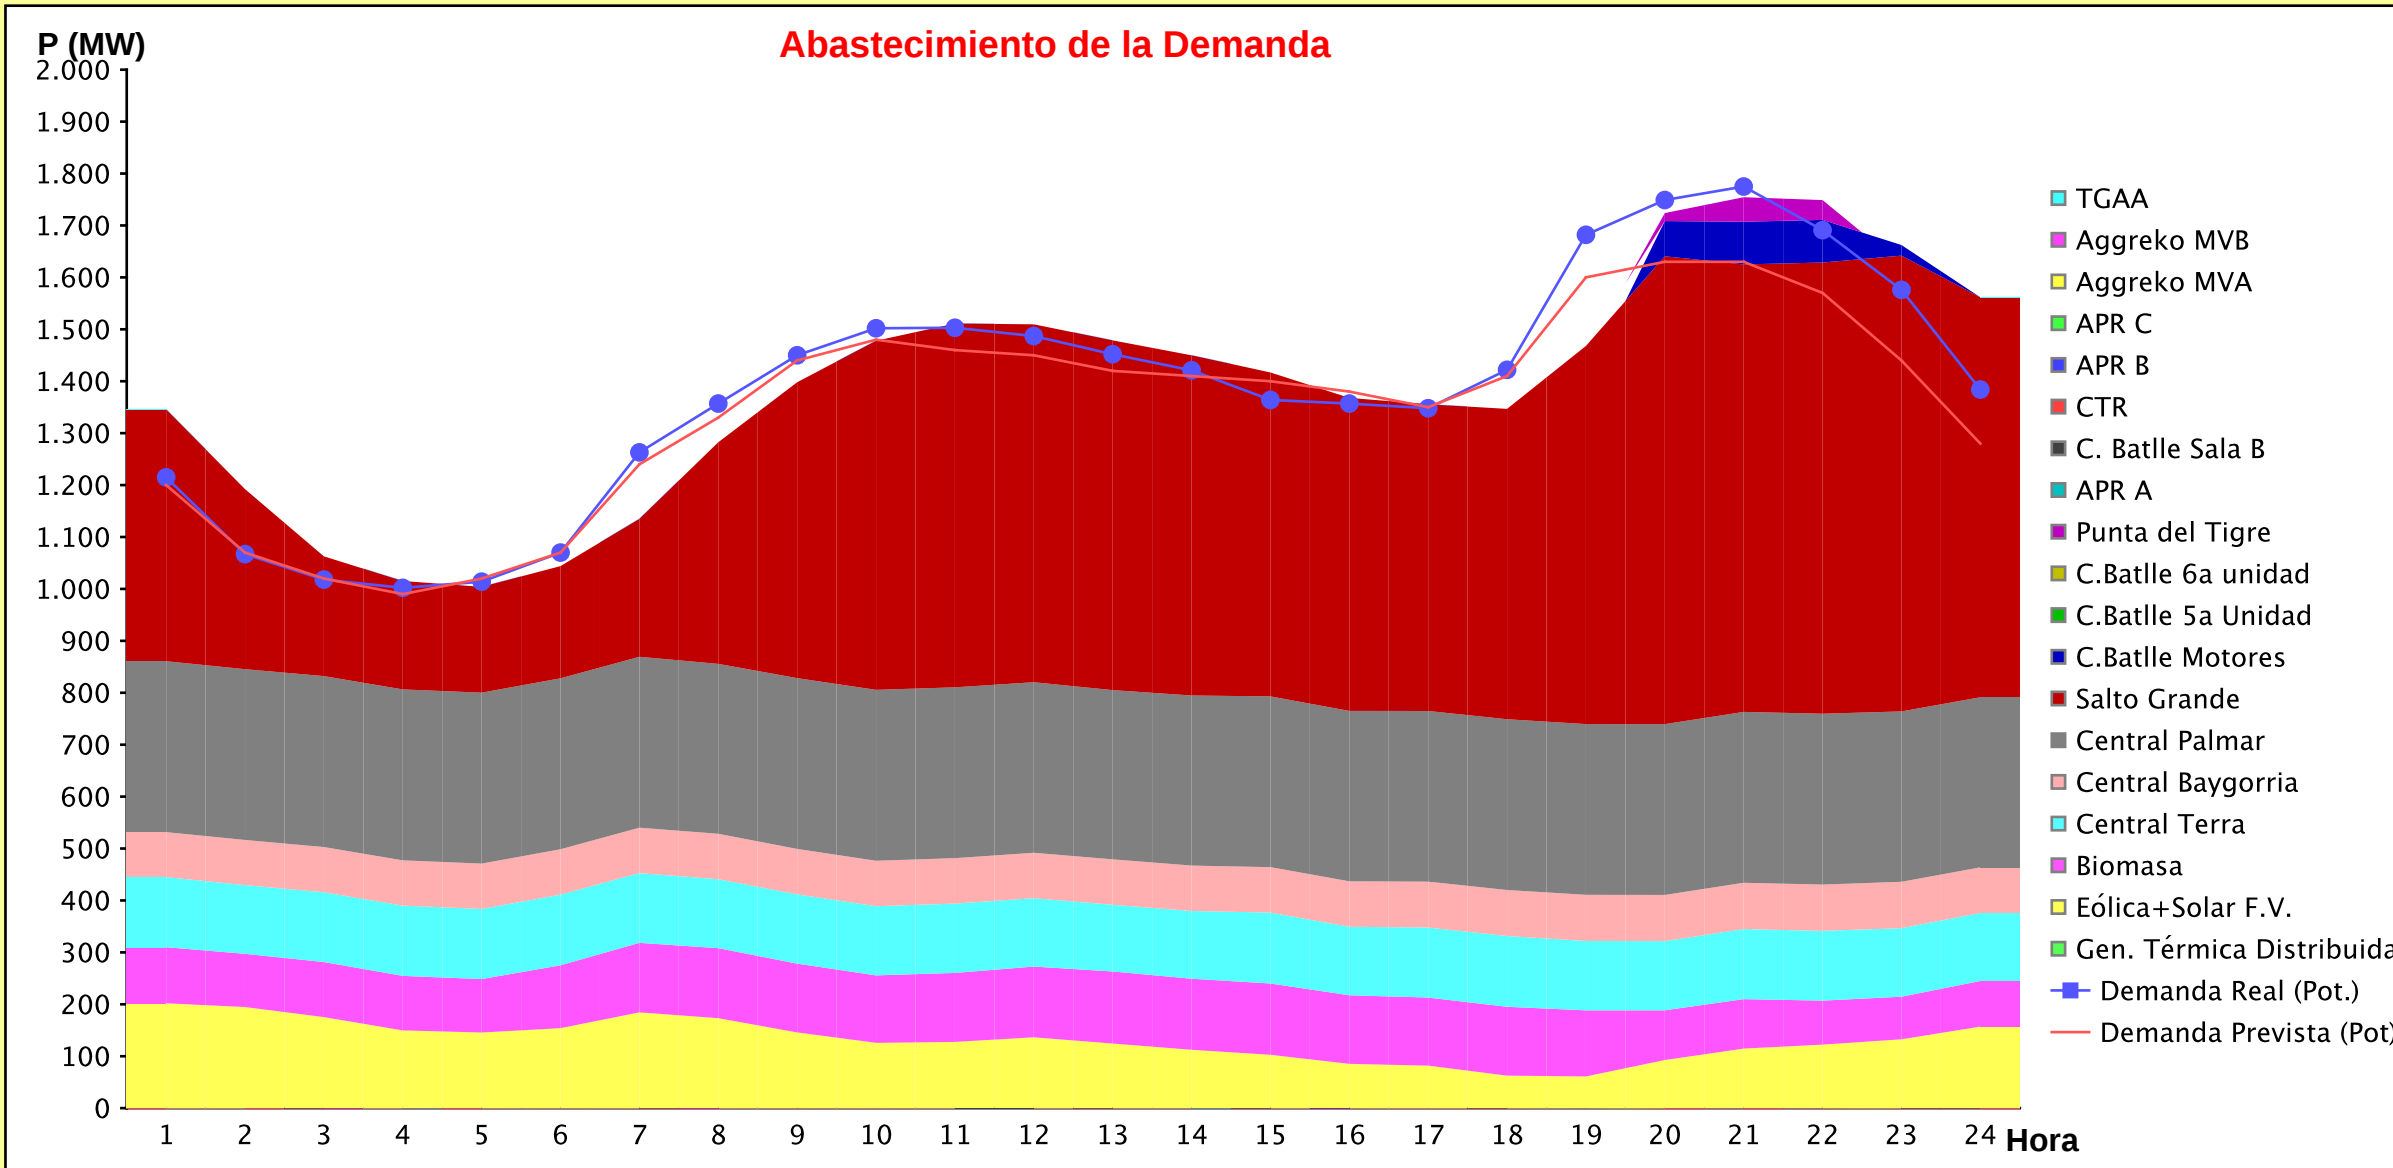



| Picos de Potencia (MW) |                    |
|------------------------|--------------------|
| Pico mediodía:         | 1513,8 Hora 11:11  |
| Potencia mínima:       | 1010,89 Hora 03:34 |
| Pico noche:            | 1776,77 Hora 21:02 |

| Generación Media (MW)  |       |
|------------------------|-------|
| Eólica                 | 132,2 |
| Biomasa                | 117,9 |
| Solar fotovoltaica     | 0,1   |
| Térmica distribuida    | 0,0   |
| Imp. Brasil Conversora | 0,0   |
| Imp. Argentina         | 0,0   |

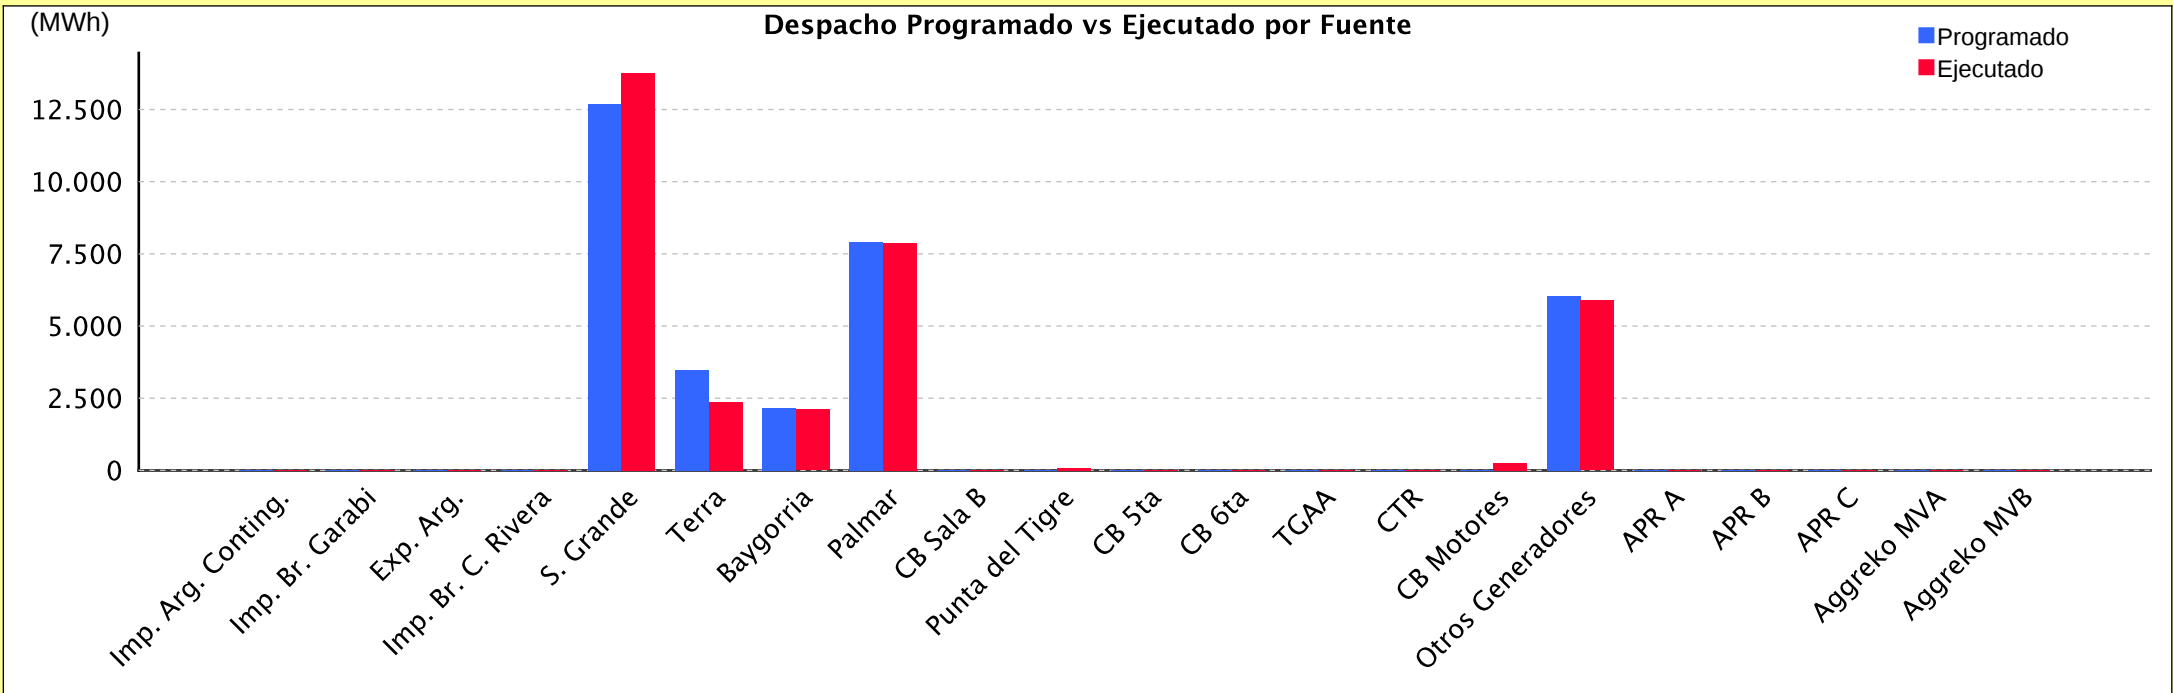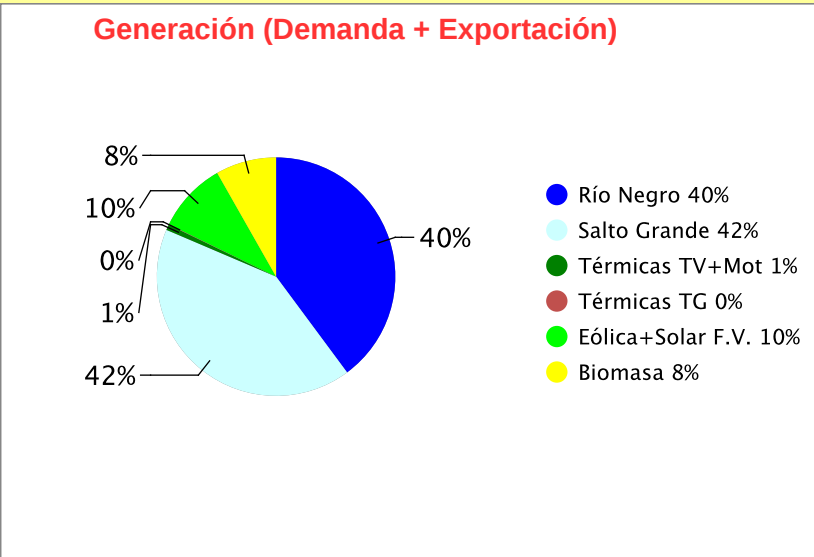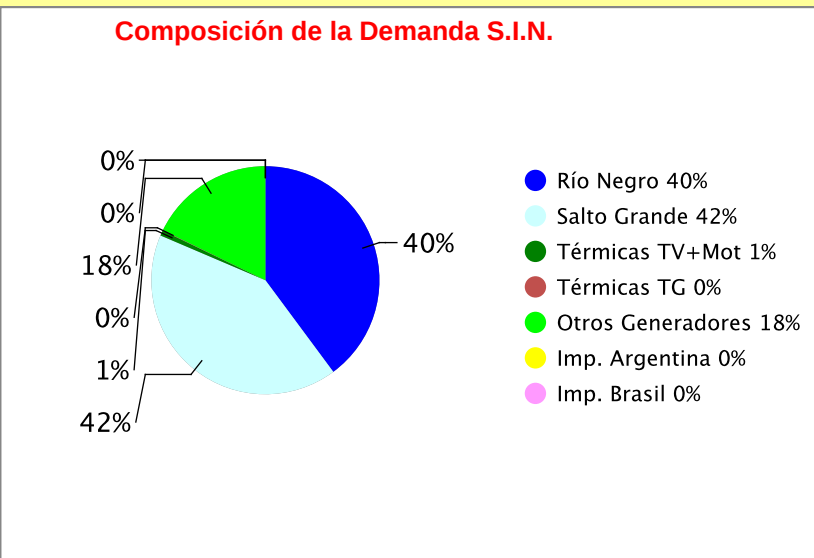



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

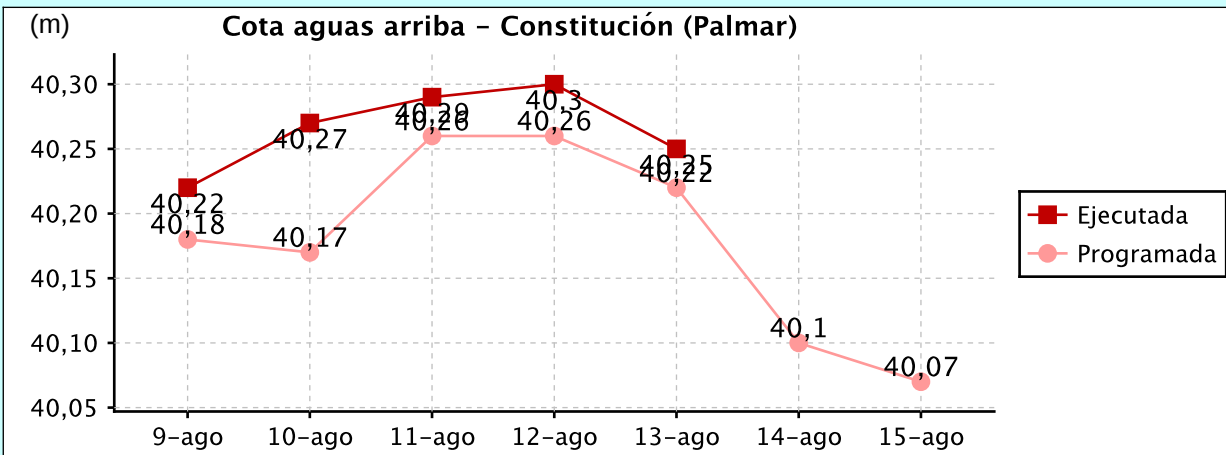
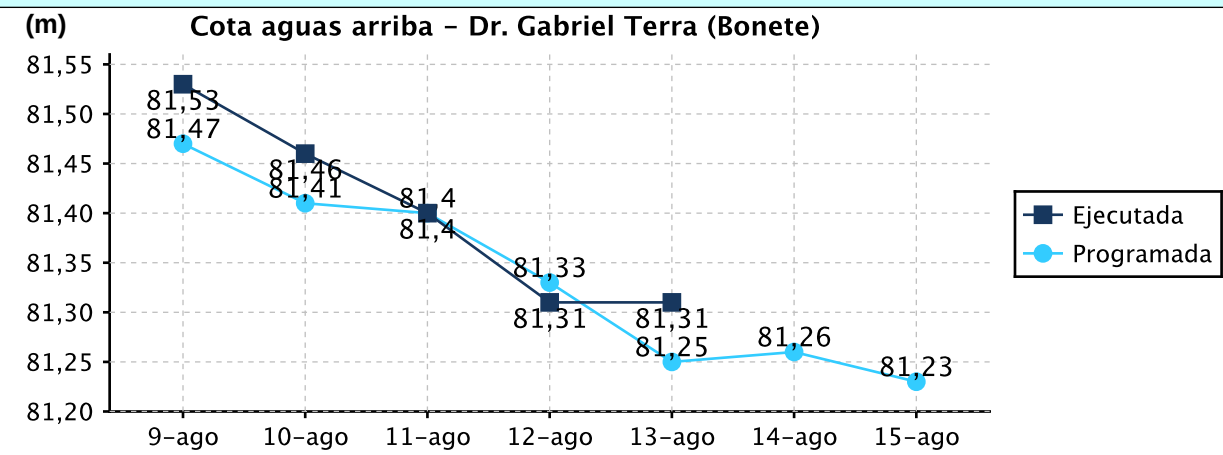


| COTA FINAL | Prevista | Ejecutada |
|------------|----------|-----------|
| Represa    | (m)      | (m)       |
| Terra      | 81,25    | 81,31     |
| Baygorria  | 54,14    | 54,17     |
| Palmar     | 40,22    | 40,25     |
| SGU        | 35,43    | 35,85     |

| Valores de Referencia (operación normal) |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Represa                                  | Cota Min m | Cota Max m |
| Terra                                    | 70         | 80,7       |
| Baygorria                                | 53         | 54,5       |
| Palmar                                   | 36         | 40         |
| Salto Grande                             | 30         | 35         |

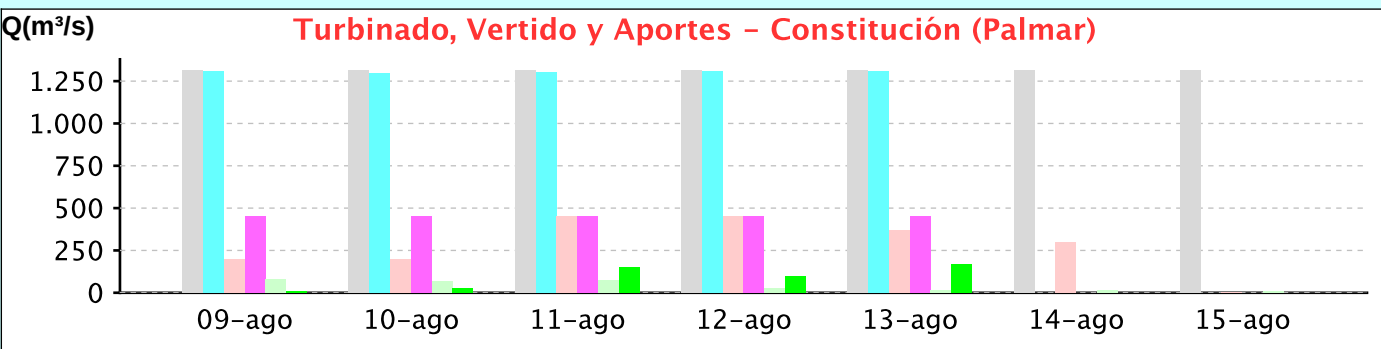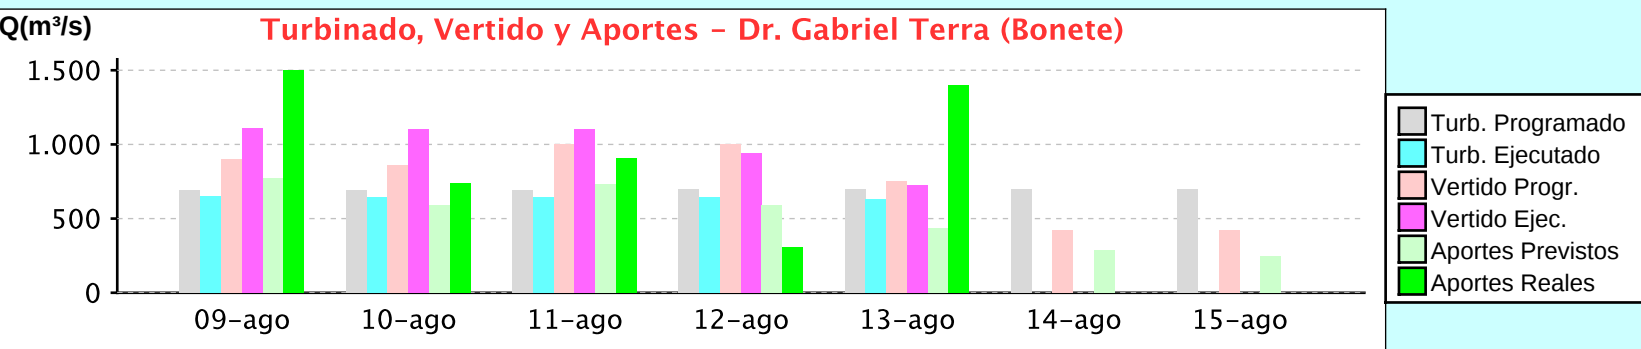

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

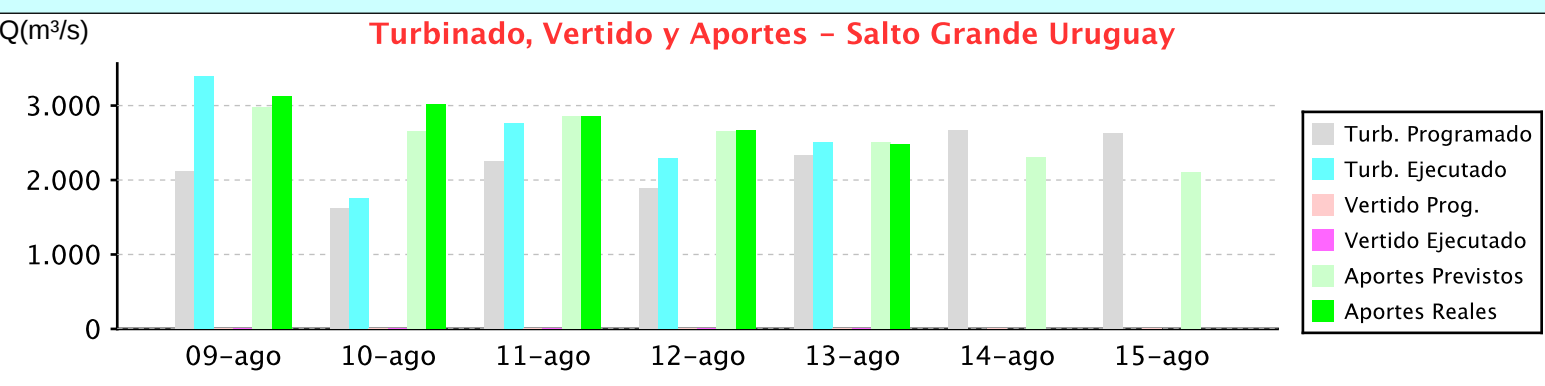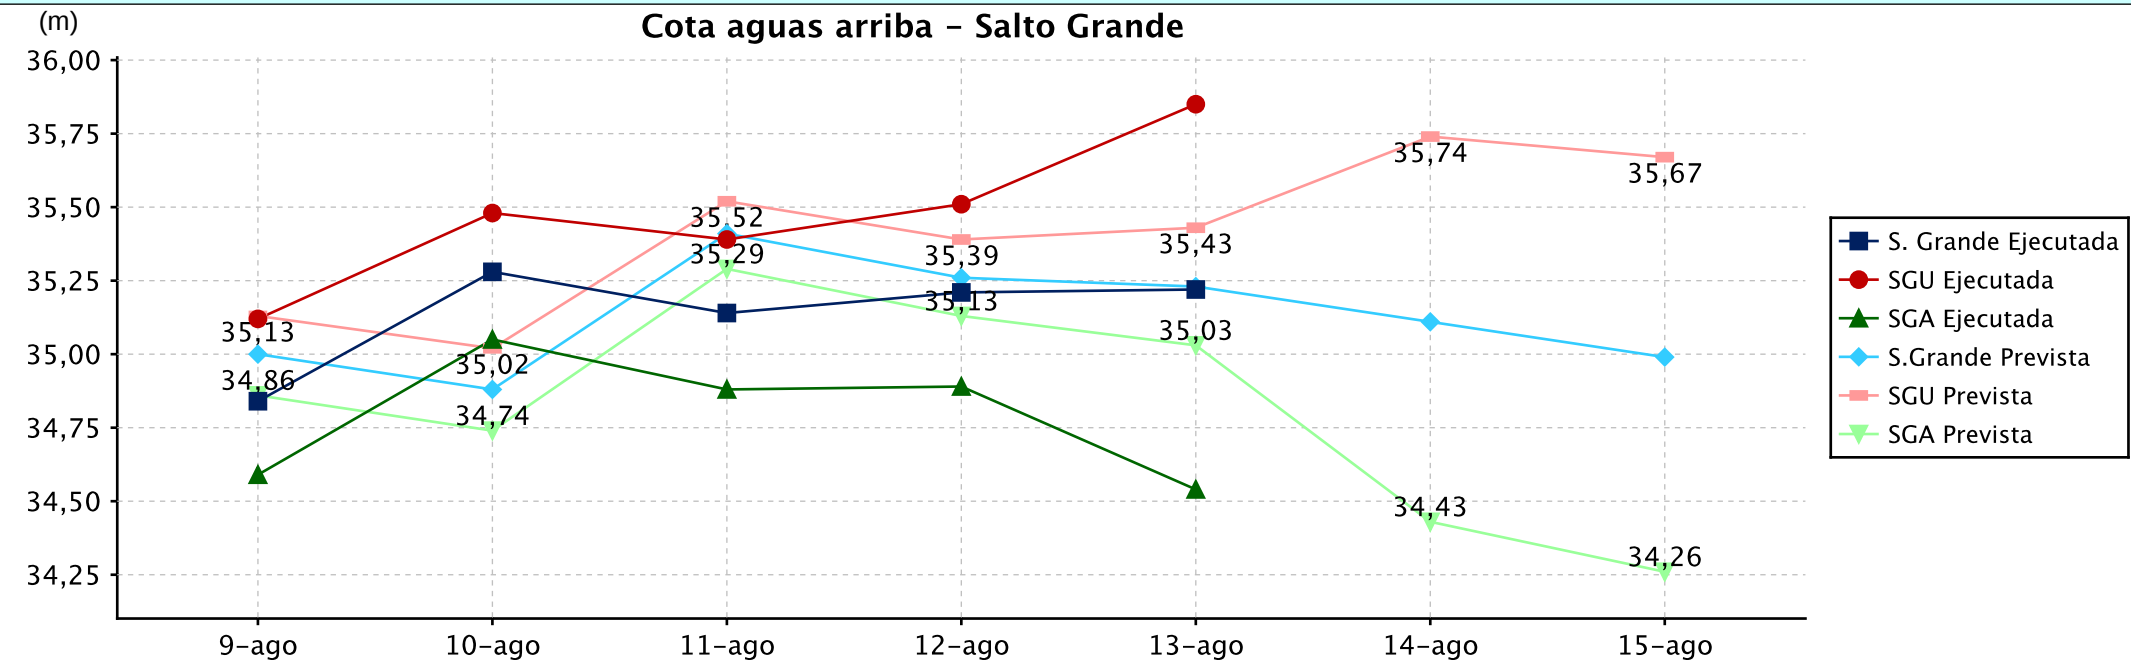

| VALORES CTM                        |        |
|------------------------------------|--------|
| Cotas                              | (m)    |
| Cota Vista Uru                     | 35,85  |
| Cota Vista Arg                     | 34,54  |
| Cota real                          | 35,22  |
| Dif. Energ. (U-A)<br>Acumulado MWh | 31.422 |

| TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 697      | 634       |
| Baygorria | 838      | 810       |
| Palmar    | 1.312    | 1.308     |
| SGU       | 2.333    | 2.501     |

| APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
|-----------------|-----------|--------|
| Represa         | (m³/s)    | (m³/s) |
| Terra           | 436       | 1.399  |
| Baygorria       | 0         | 148    |
| Palmar          | 16        | 167    |
| SGU             | 2.500     | 2.475  |

| VERTIDO   | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 750      | 724       |
| Baygorria | 595      | 642       |
| Palmar    | 370      | 454       |
| SGU       | 0        | 0         |

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
