



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 15 de agosto de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-8
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-5
Central La Tablada	-78
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.348
C. Baygorria	2.184
C. Palmar	7.886
C. Salto Grande	12.573
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.059
TOTAL Generación	31.949

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.949
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	33.310
Diferencia (MWh)	-1.361
Ejecutada - Programada	-4,09 %

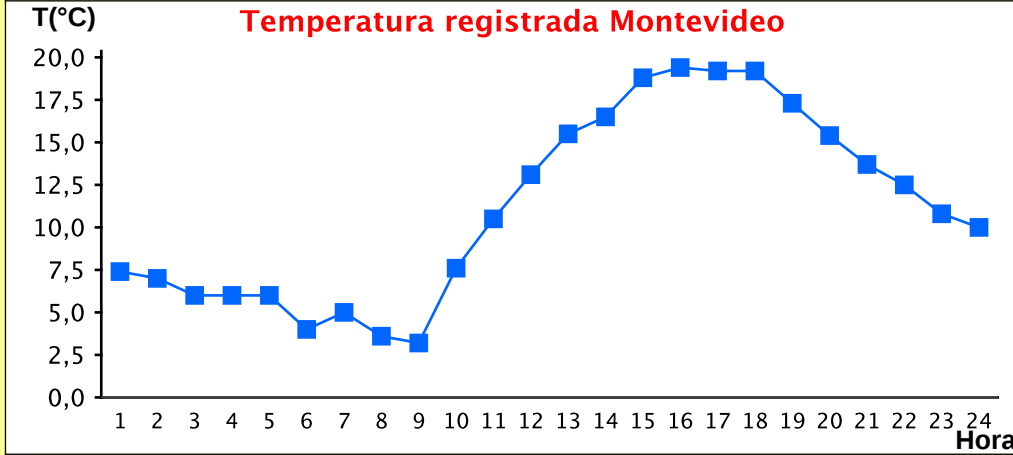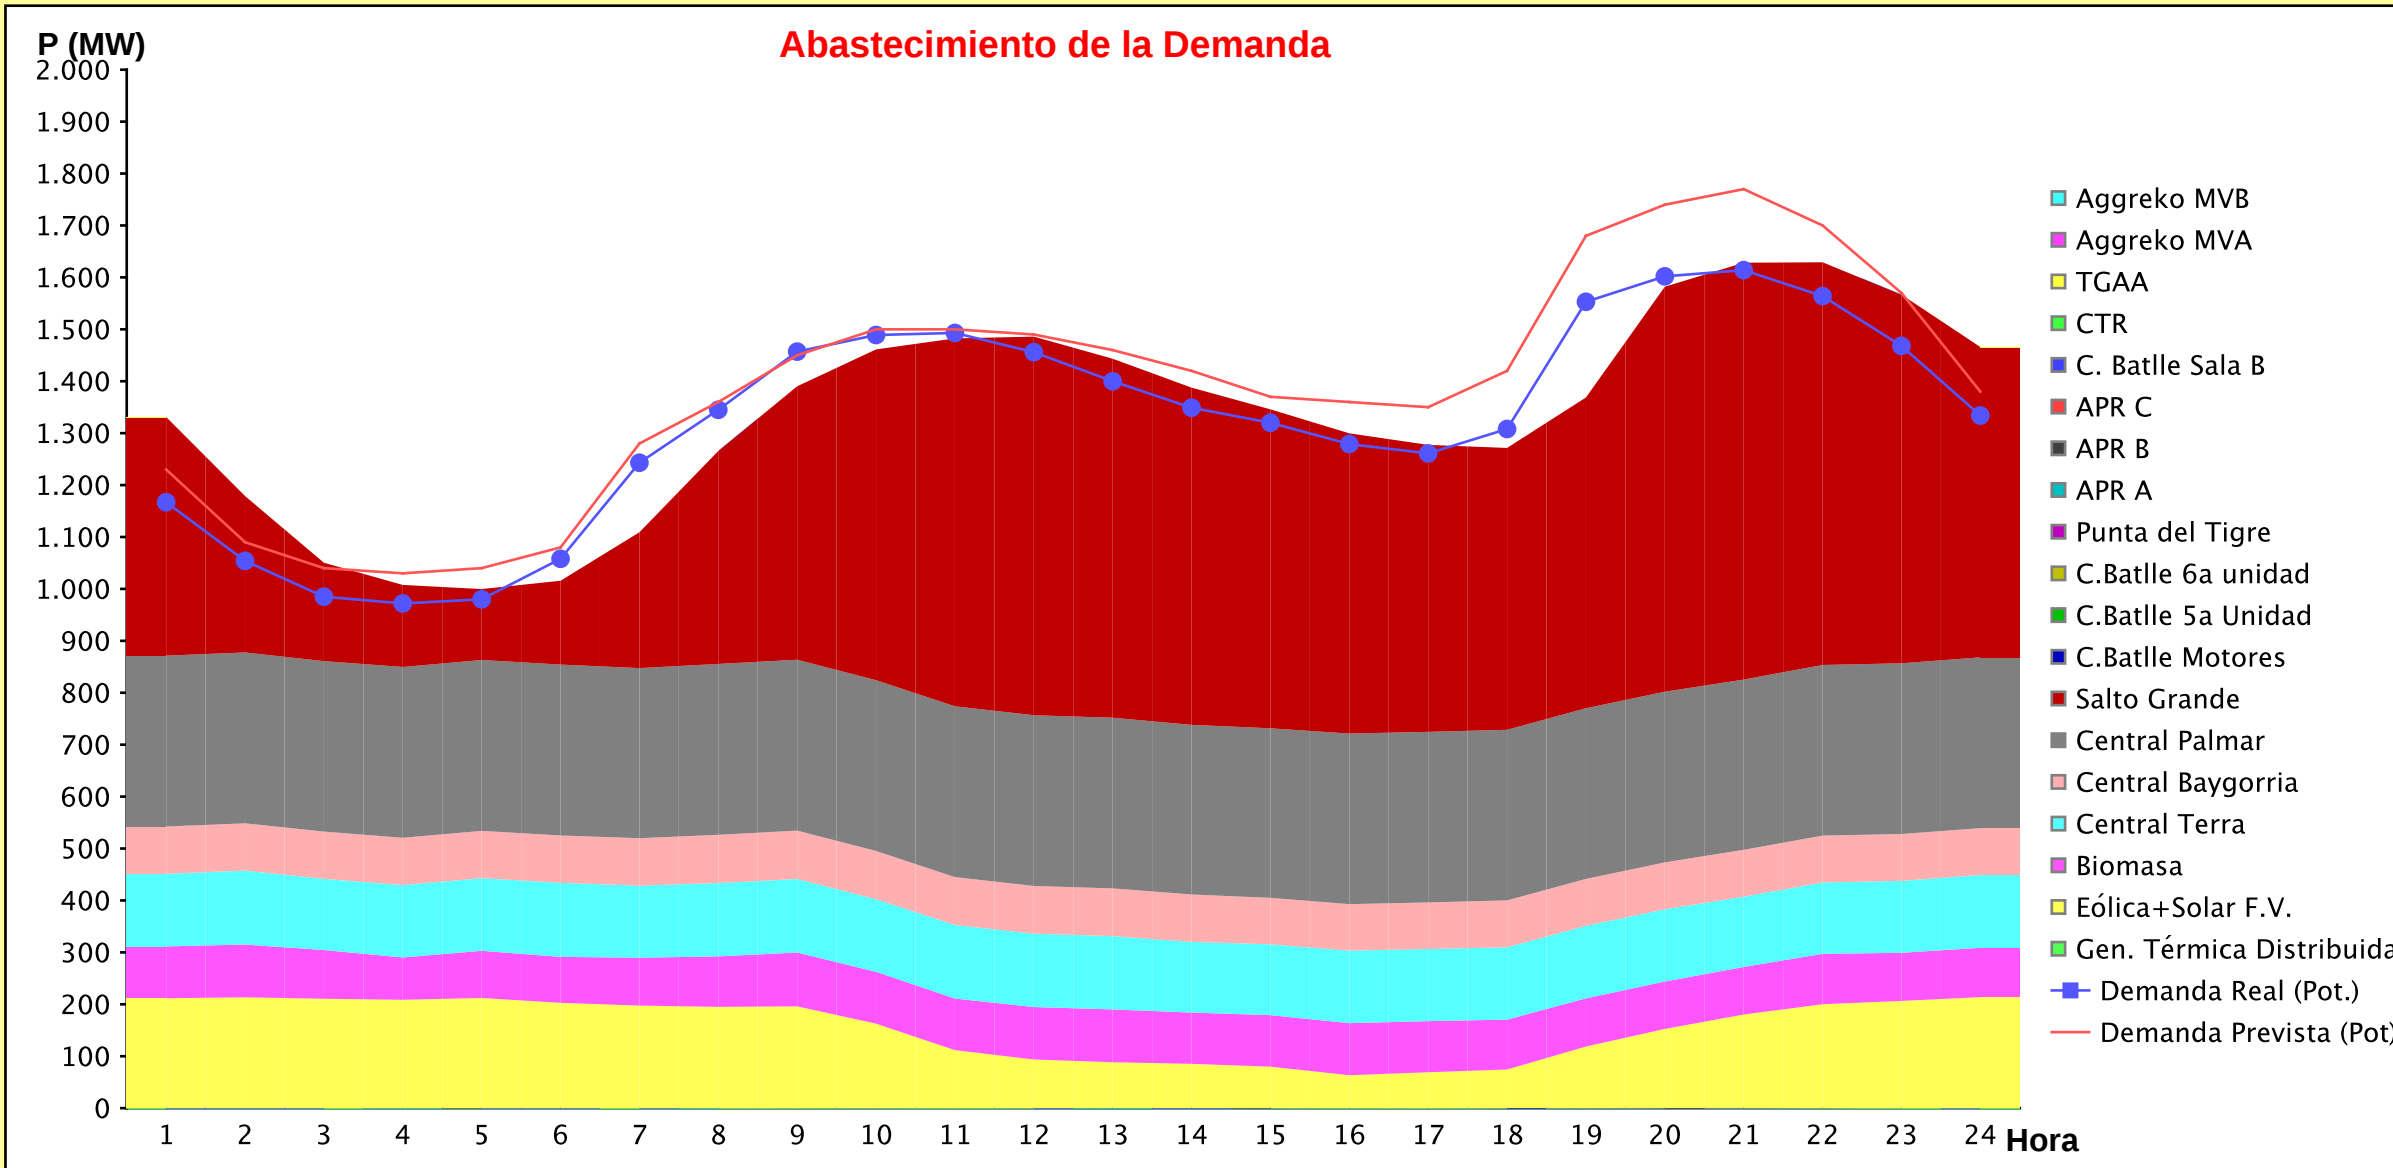



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1505,81 Hora 10:26
Potencia mínima:	986,48 Hora 04:01
Pico noche:	1626,38 Hora 21:08

Generación Media (MW)	
Eólica	156,7
Biomasa	96,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

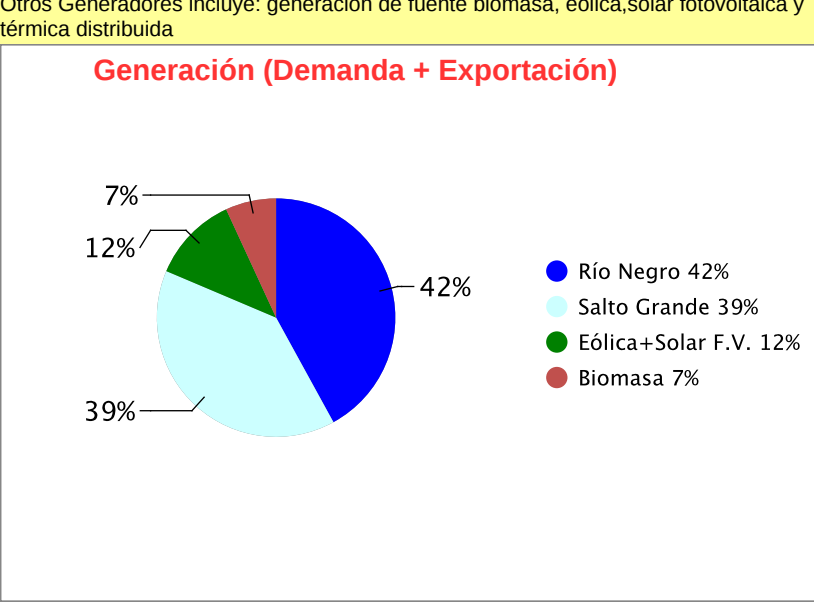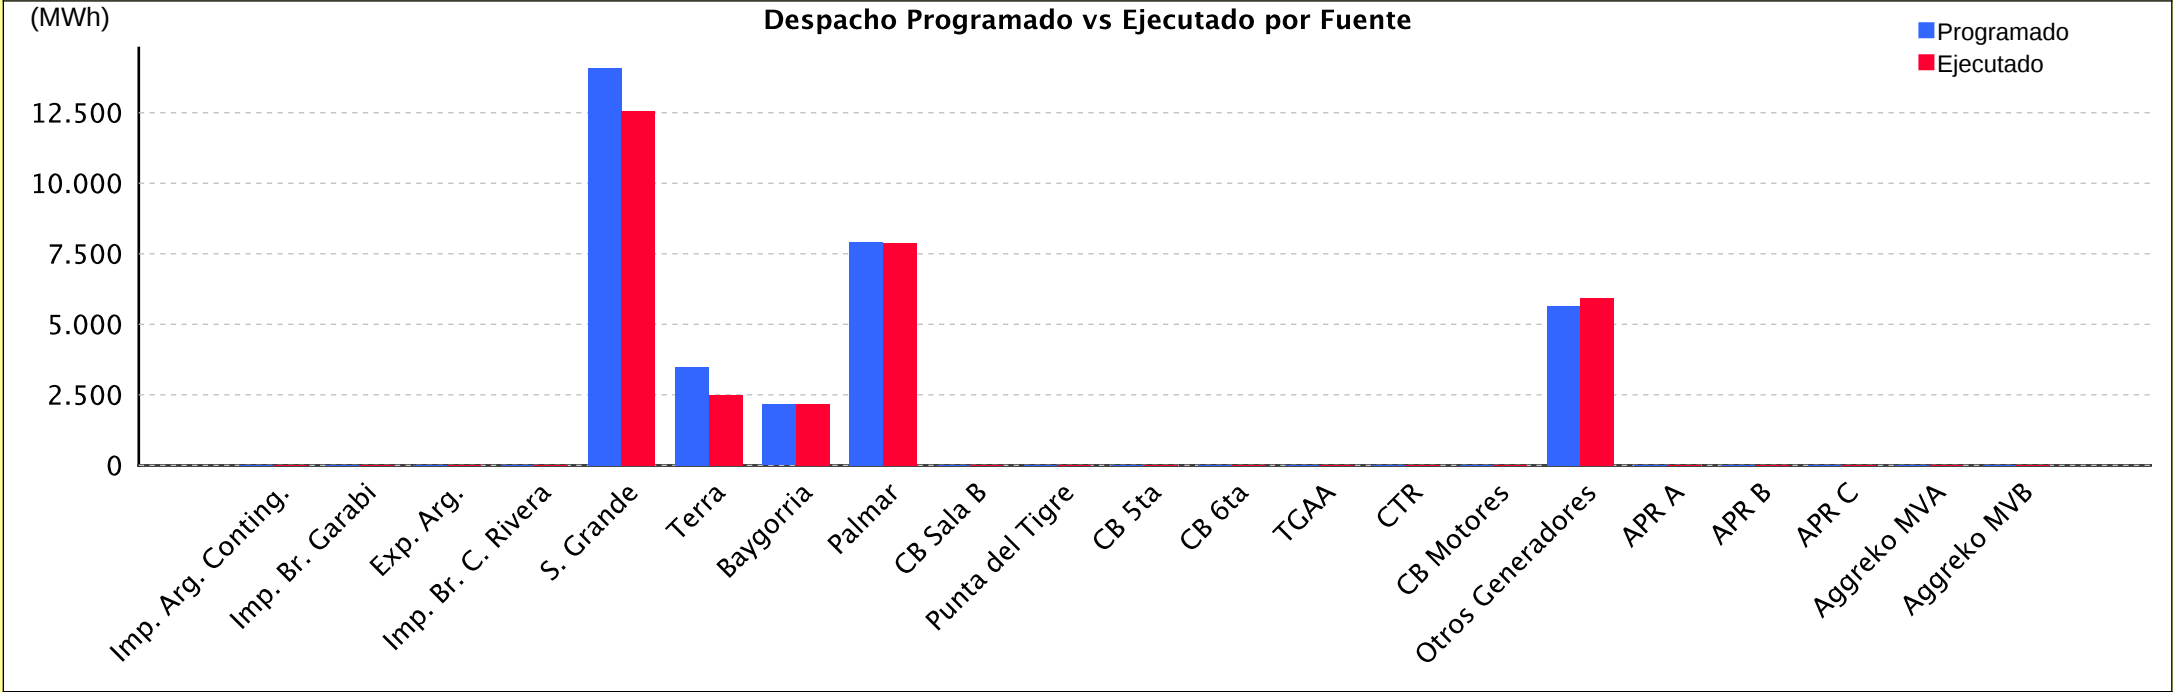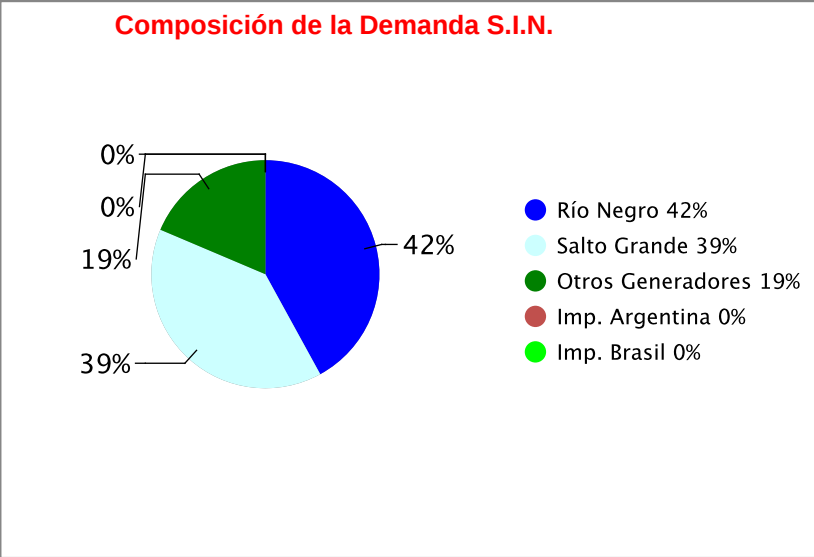



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

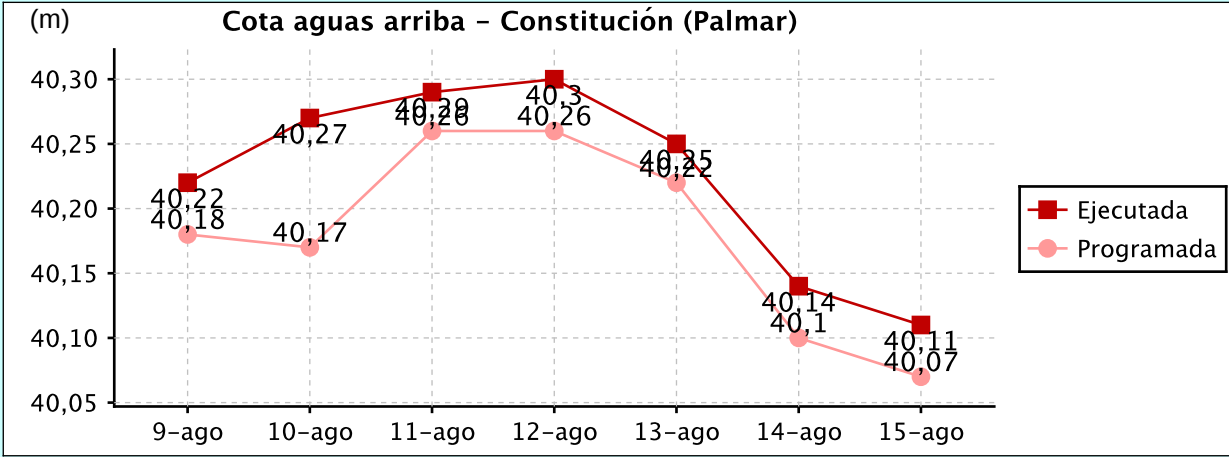
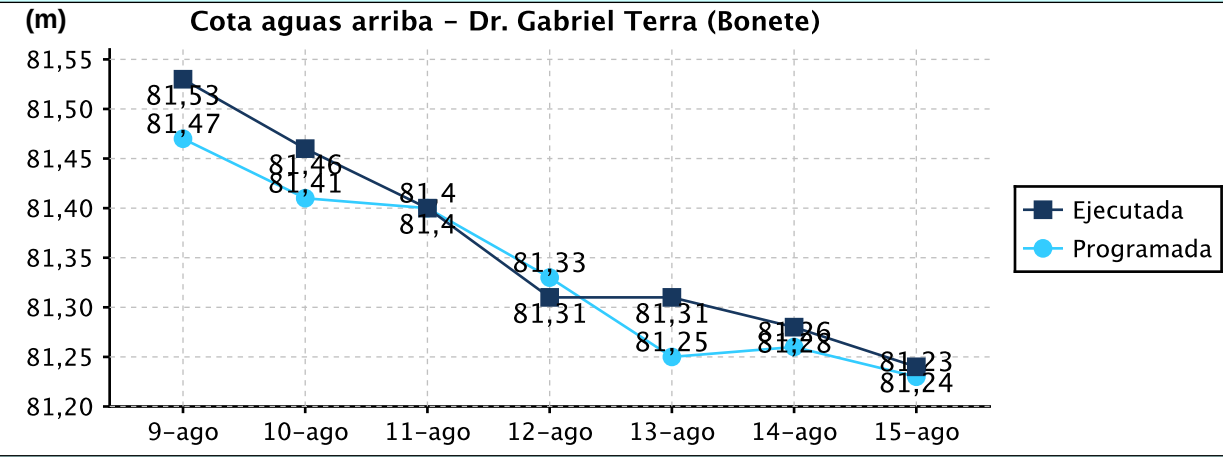


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,23	81,24
Baygorria	54,21	54,25
Palmar	40,07	40,11
SGU	35,67	35,72

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

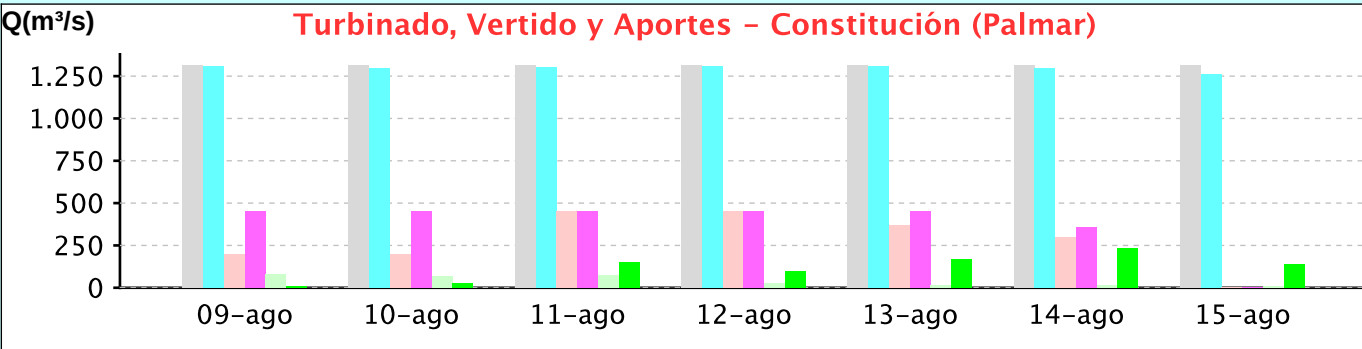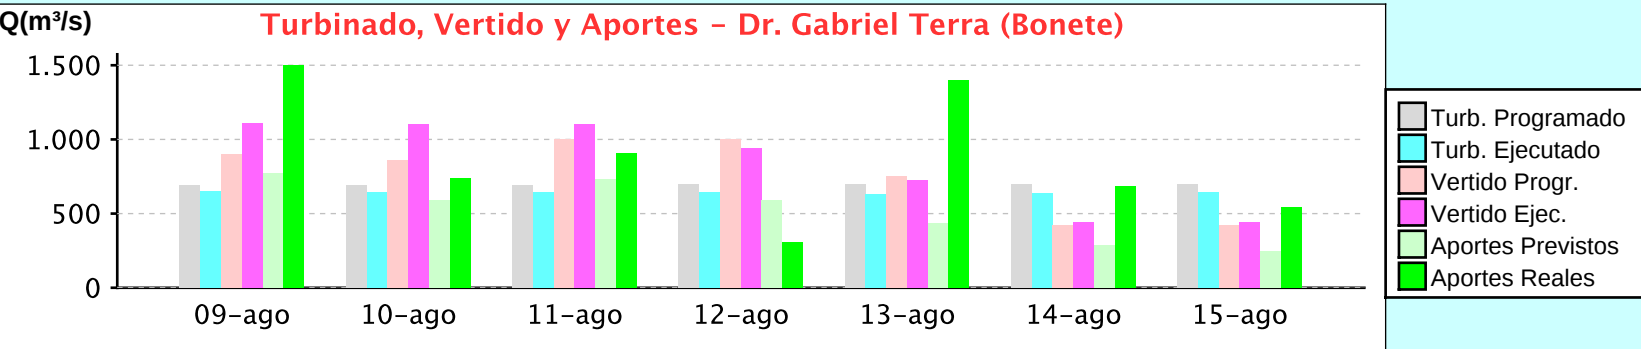

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

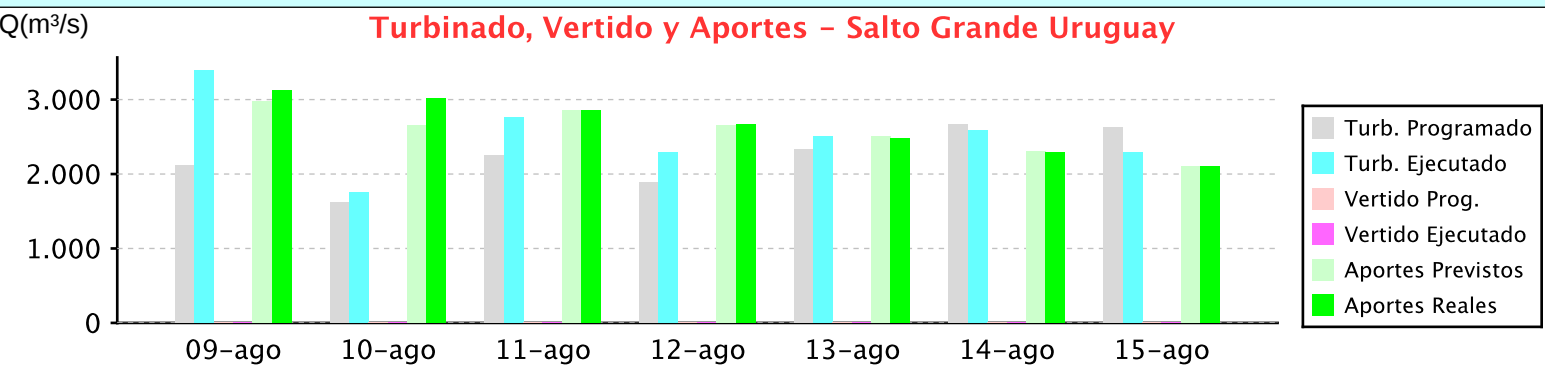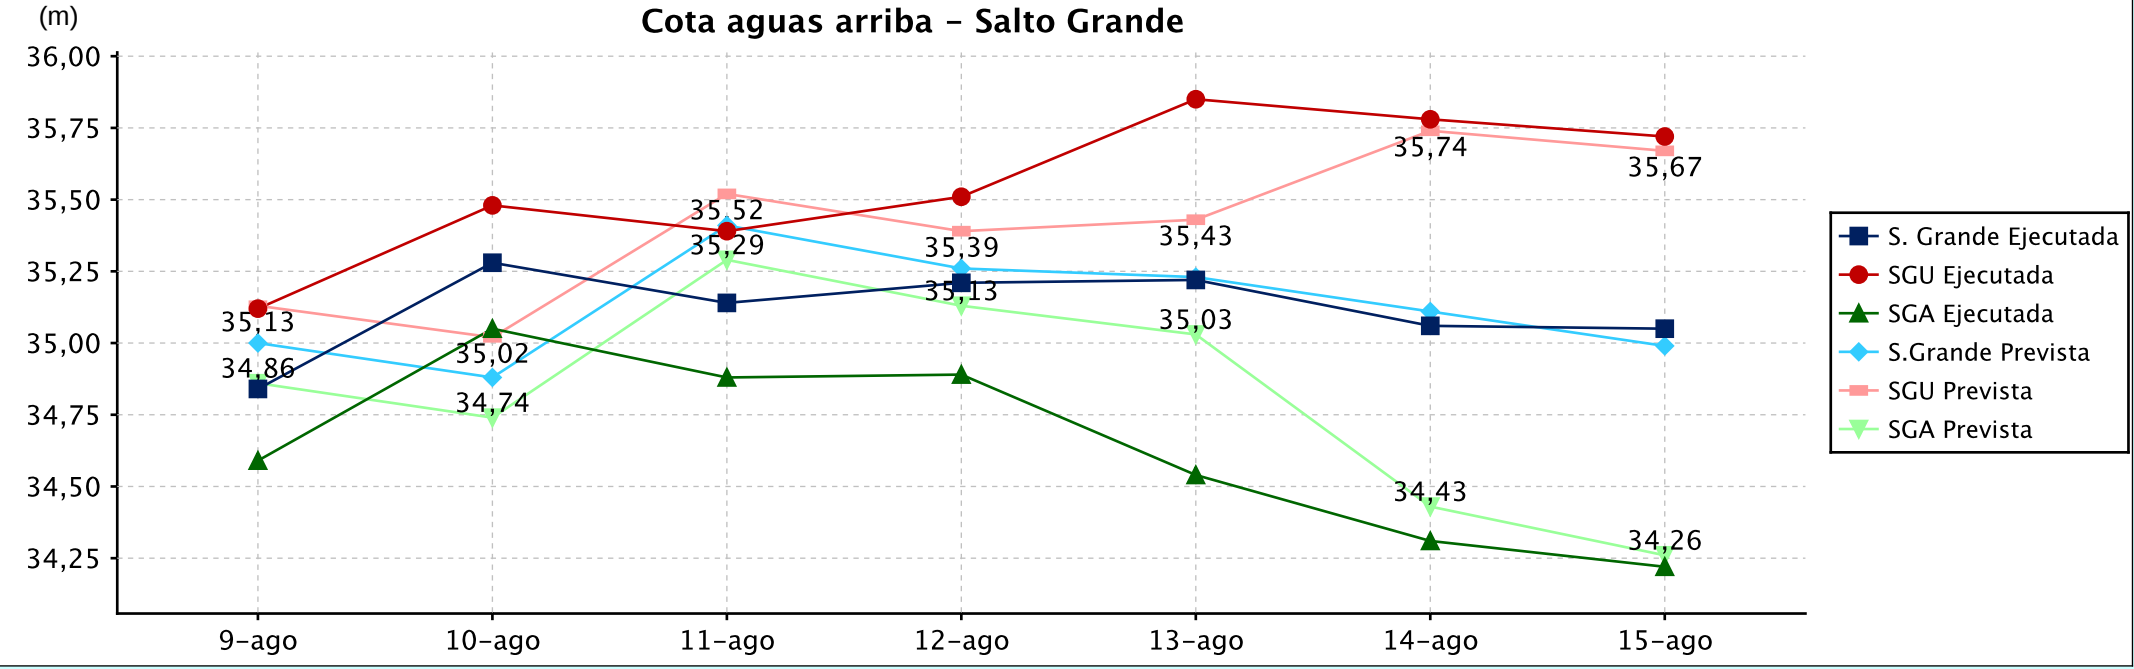

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,72
Cota Vista Arg	34,22
Cota real	35,05
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	34.991

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	695	647
Baygorria	836	806
Palmar	1.312	1.258
SGU	2.621	2.290

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	245	540
Baygorria	0	11
Palmar	11	139
SGU	2.100	2.104

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	420	443
Baygorria	265	240
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
