




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 16 de agosto de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-87
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.331
C. Baygorria	2.181
C. Palmar	7.888
C. Salto Grande	11.259
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.609
TOTAL Generación	29.165

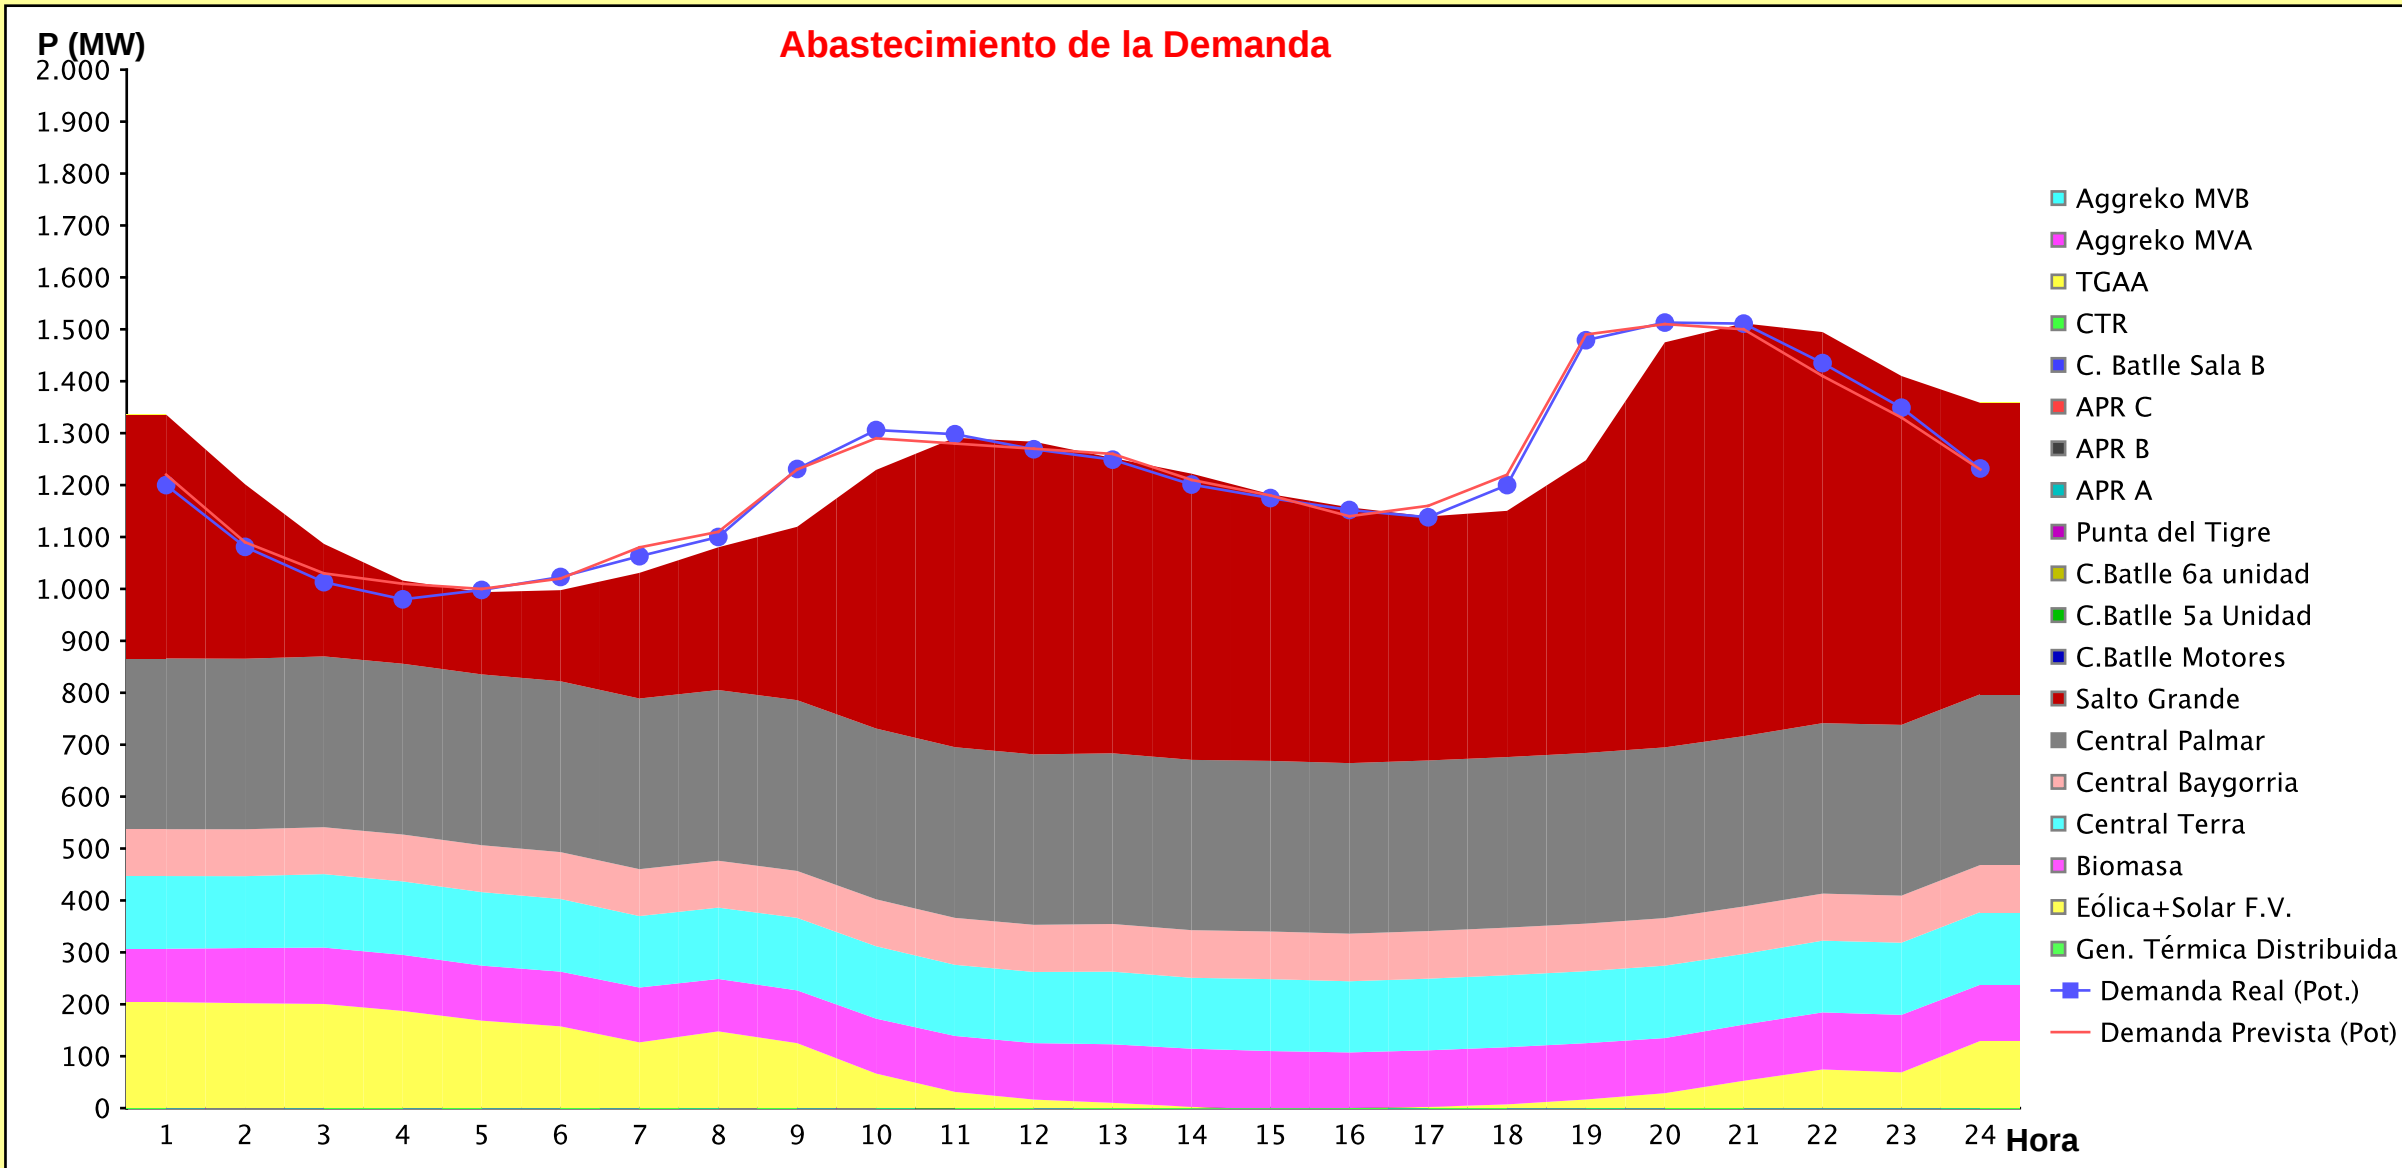

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.165
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.270
Diferencia (MWh)	-105
Ejecutada - Programada	-0,36 %

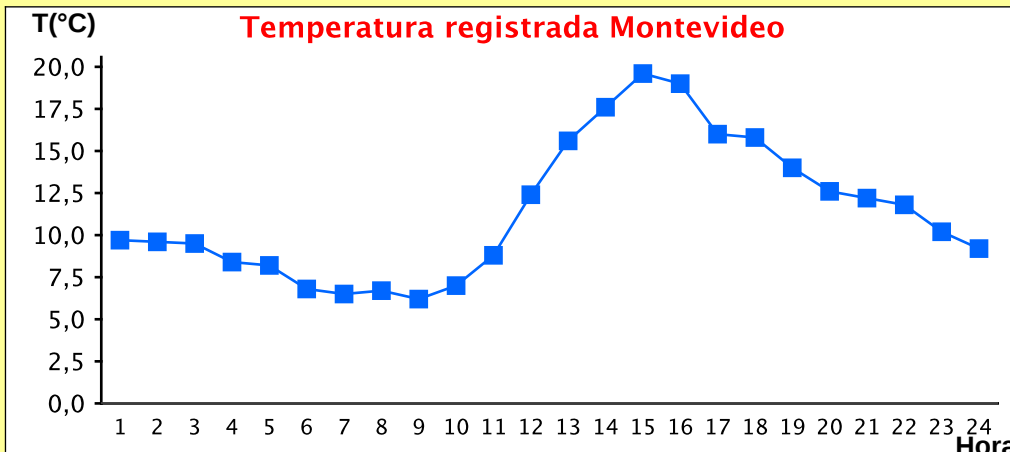



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1316,22 Hora 10:27
Potencia mínima:	965,24 Hora 03:56
Pico noche:	1517,27 Hora 20:47

Generación Media (MW)	
Eólica	85,1
Biomasa	107,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

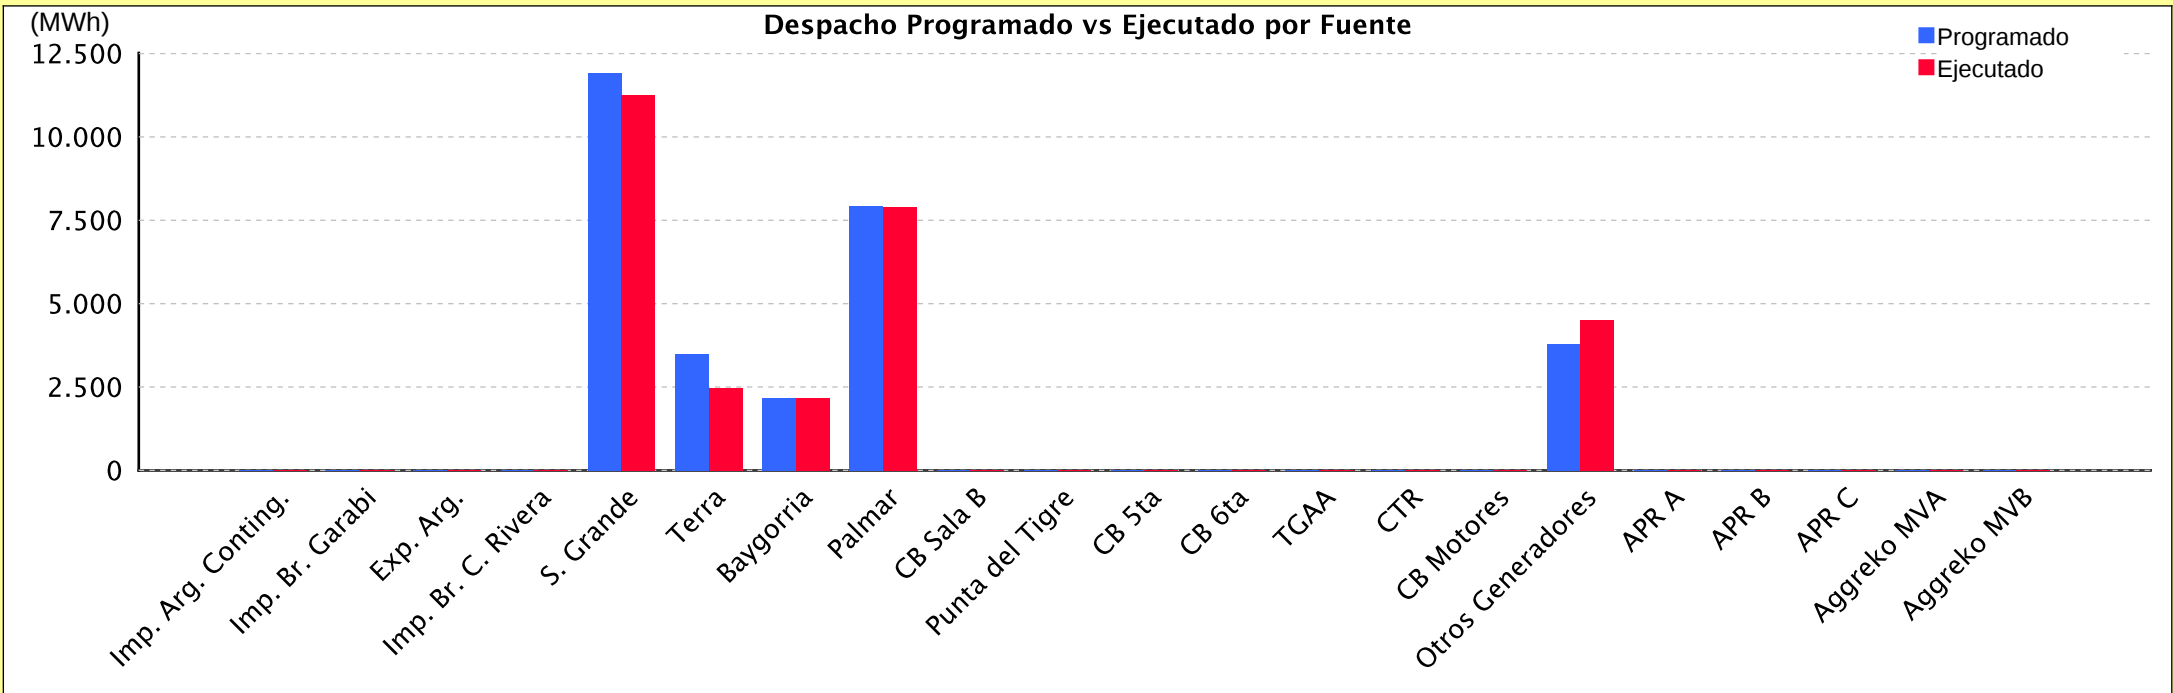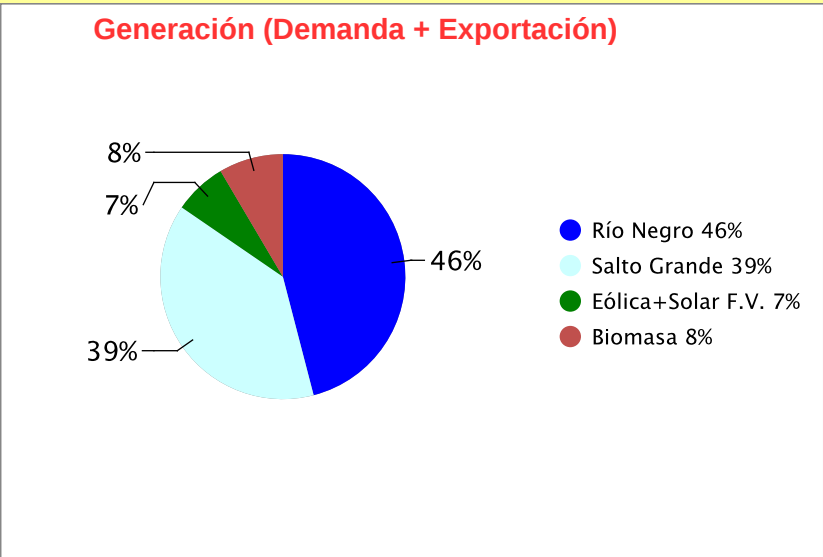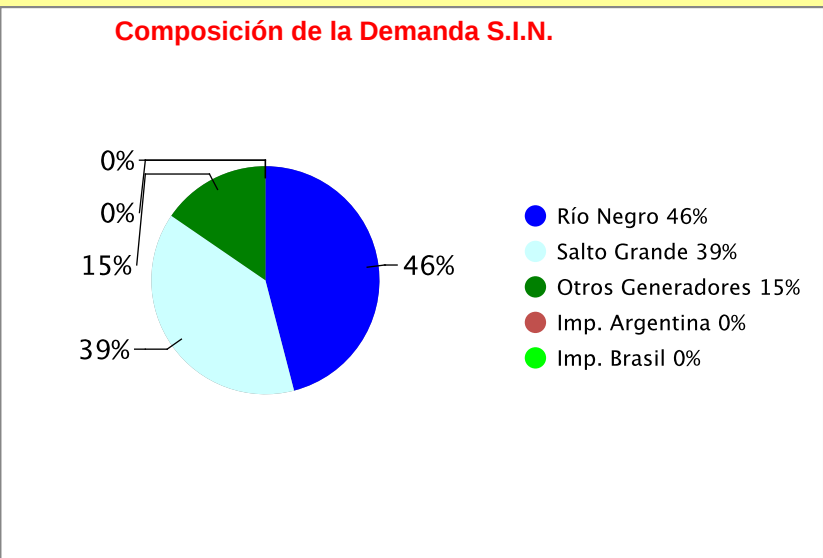



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

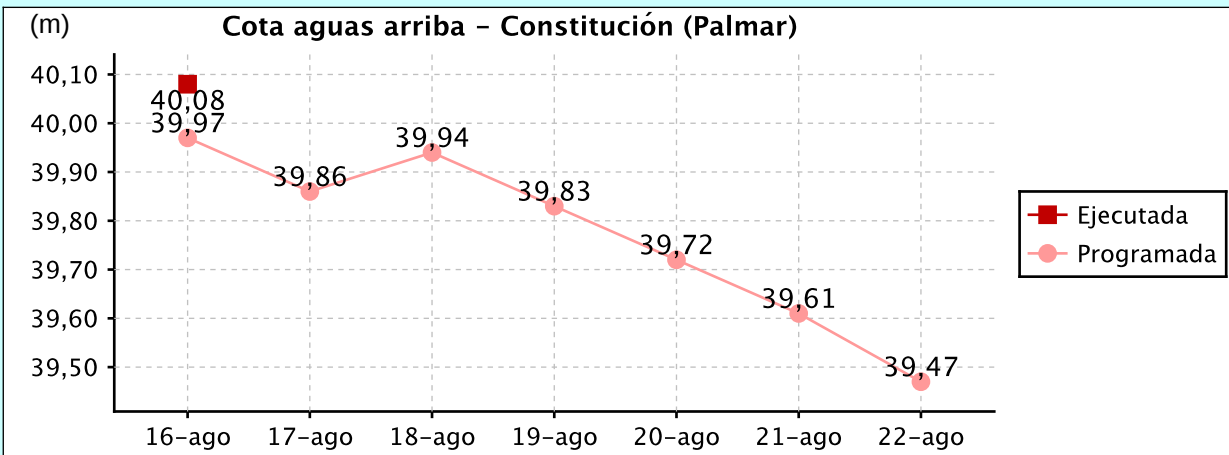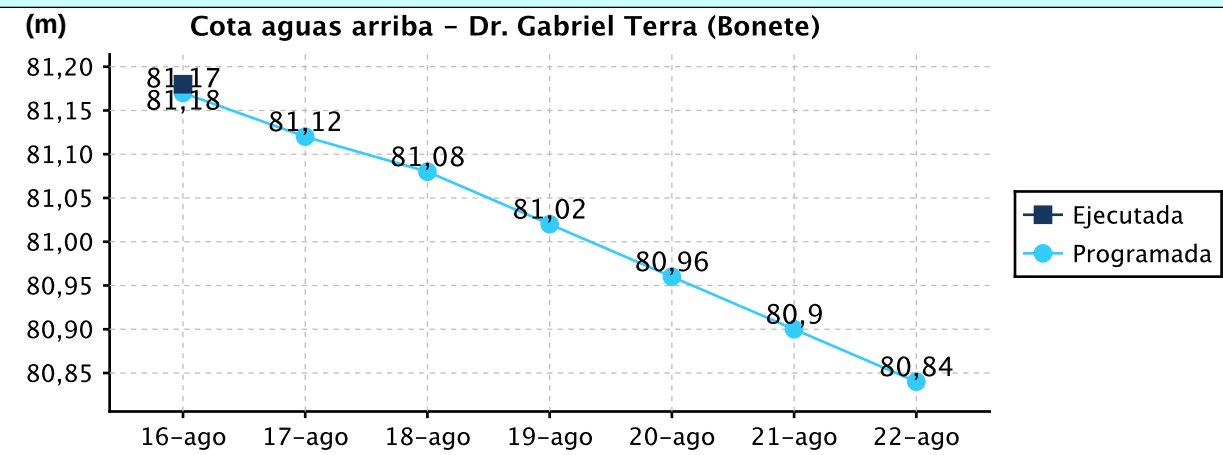


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,17	81,18
Baygorria	54,23	54,22
Palmar	39,97	40,08
SGU	35,70	35,76

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

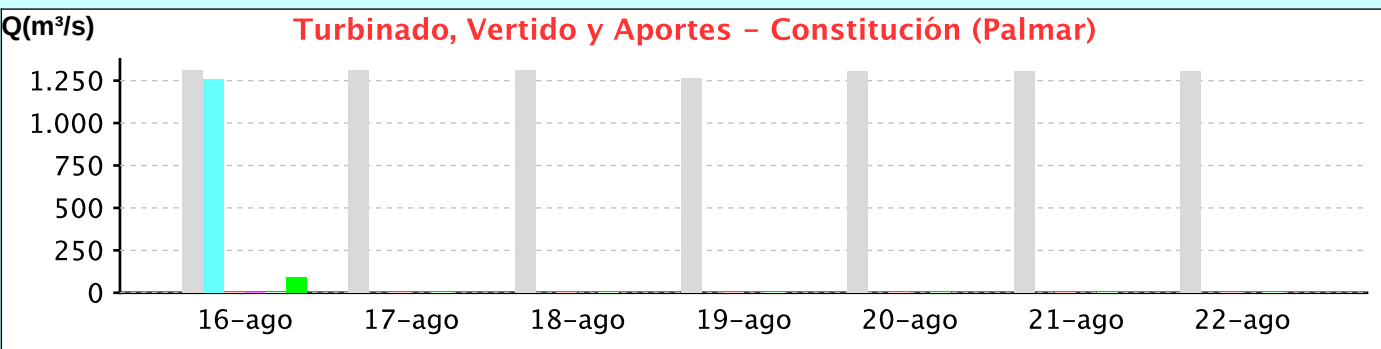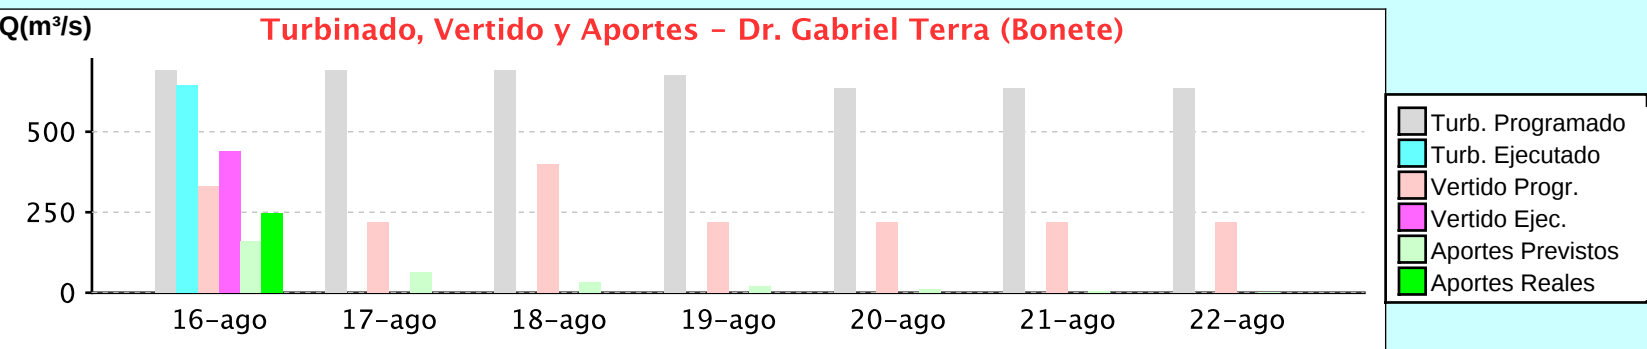

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

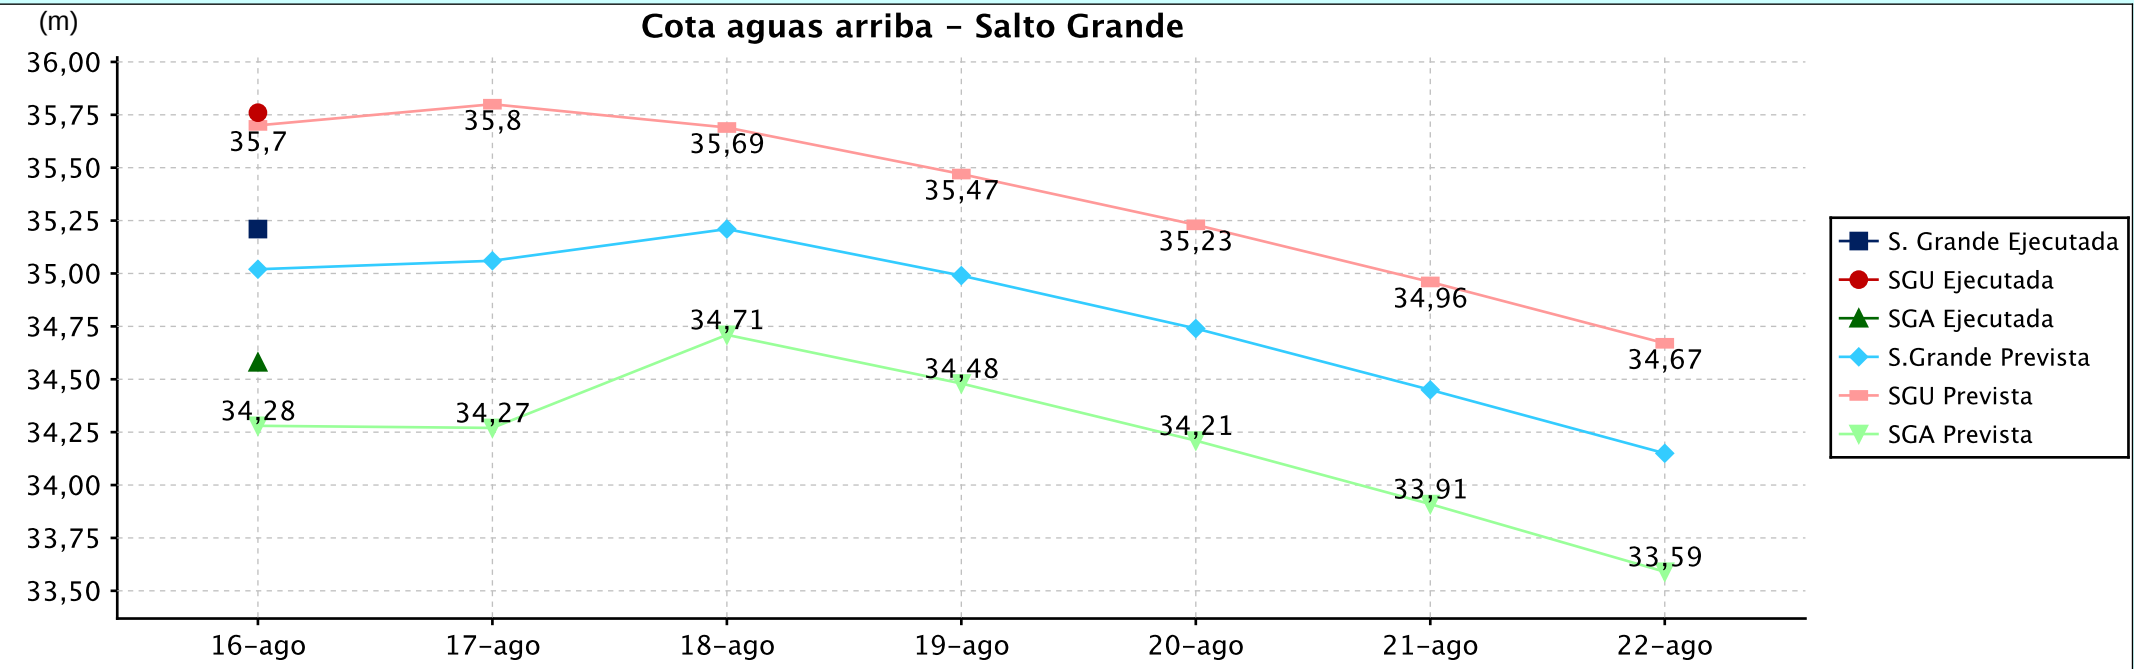


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	690	646
Baygorria	831	803
Palmar	1.310	1.261
SGU	2.147	2.747

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	160	247
Baygorria	0	-32
Palmar	0	94
SGU	1.900	1.346

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	330	440
Baygorria	160	278
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

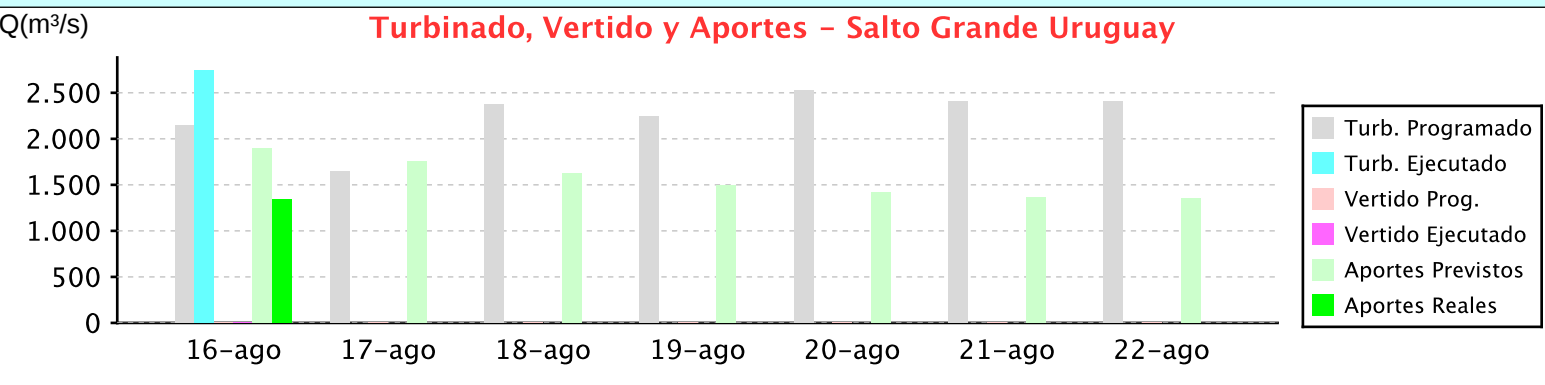

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,76
Cota Vista Arg	34,58
Cota real	35,21
Dif. Energ. (U-A)	
Acumulado MWh	28.120

OBSERVACIONES
