



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 18 de agosto de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-83
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.349
C. Baygorria	2.198
C. Palmar	7.903
C. Salto Grande	11.440
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.534
TOTAL Generación	28.323

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.323
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.910
Diferencia (MWh)	-3.587
Ejecutada - Programada	-11,24 %

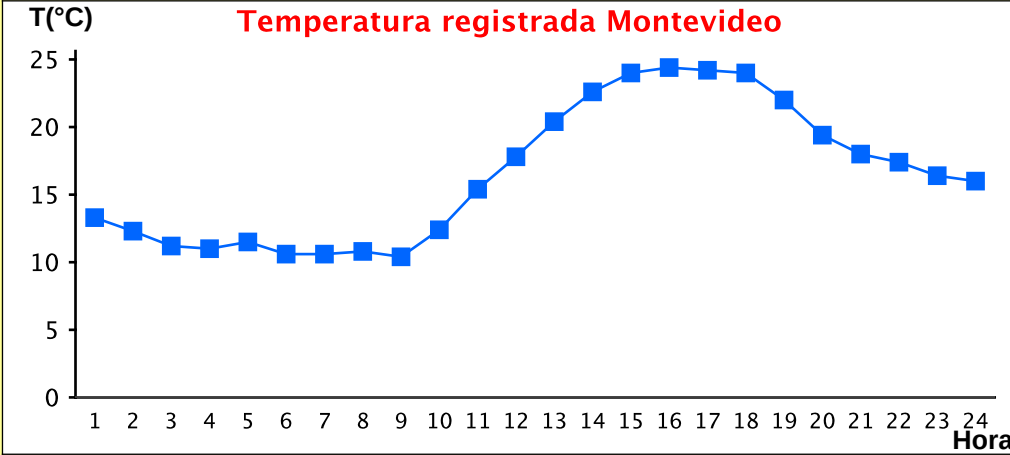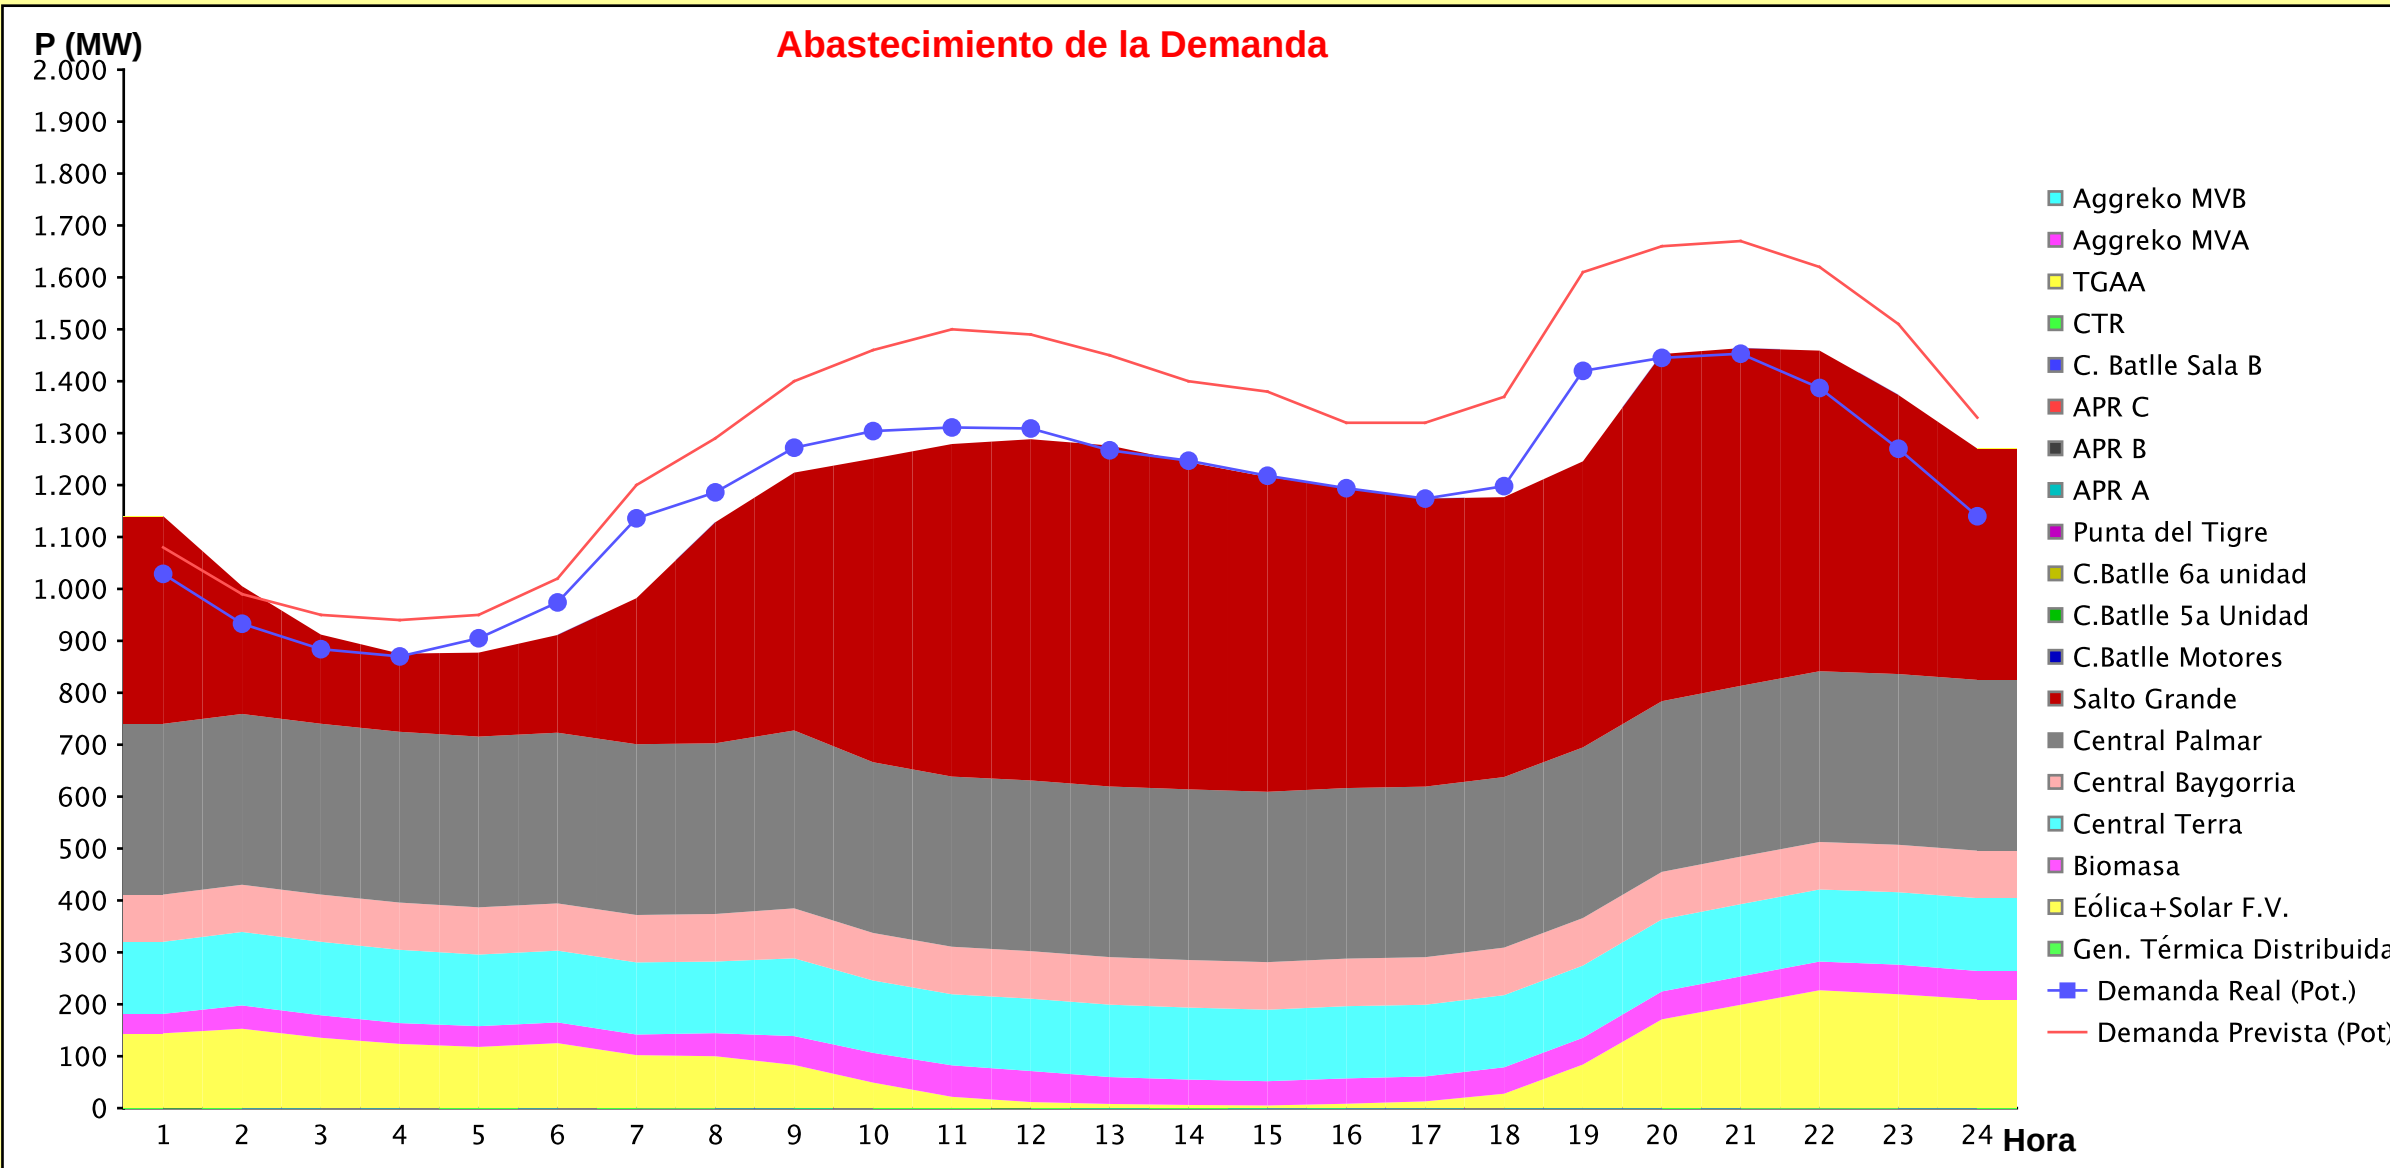



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1326,75 Hora 11:22
Potencia mínima:	864,88 Hora 04:00
Pico noche:	1456,71 Hora 20:55

Generación Media (MW)	
Eólica	98,6
Biomasa	59,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

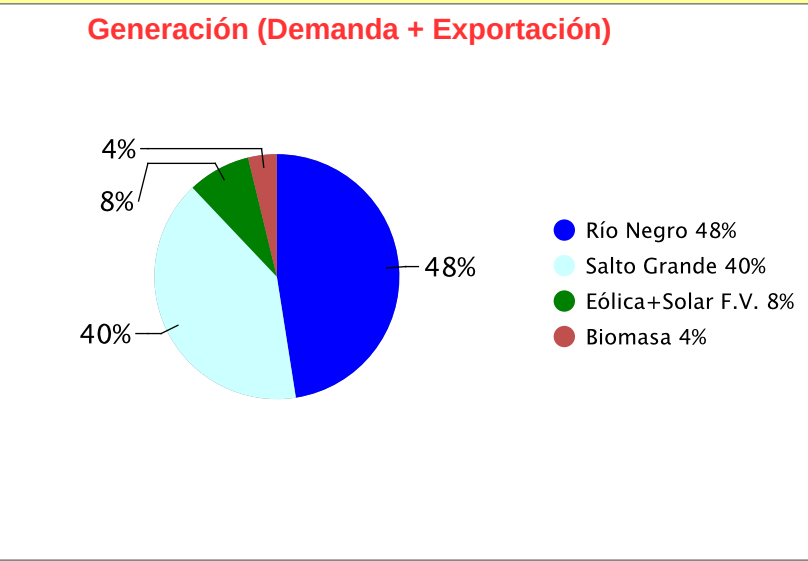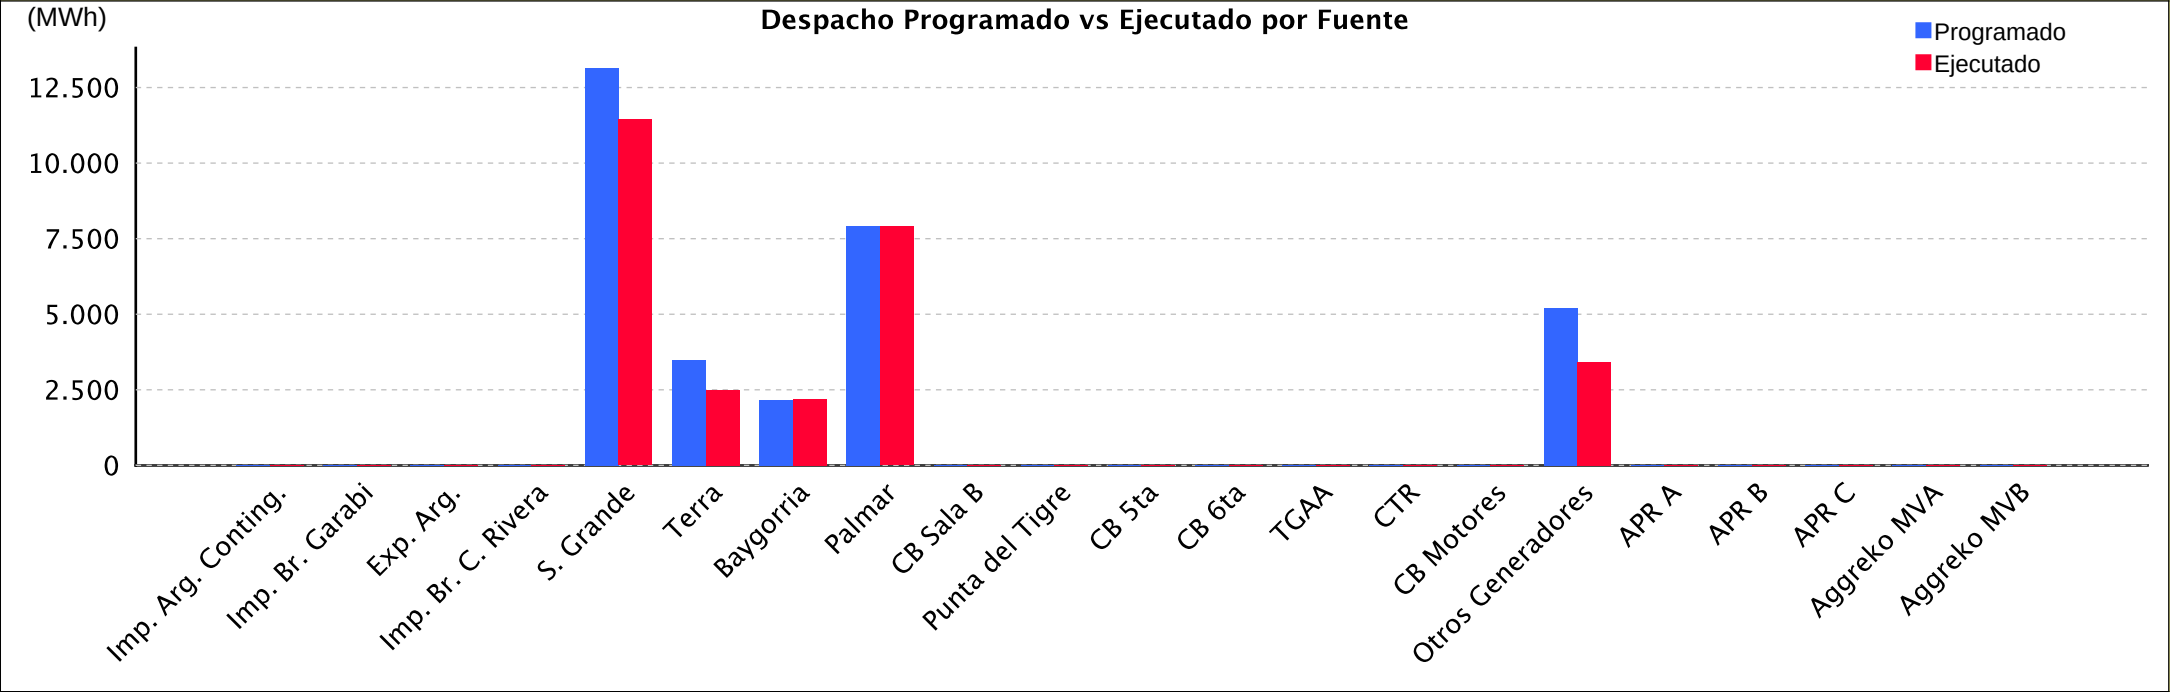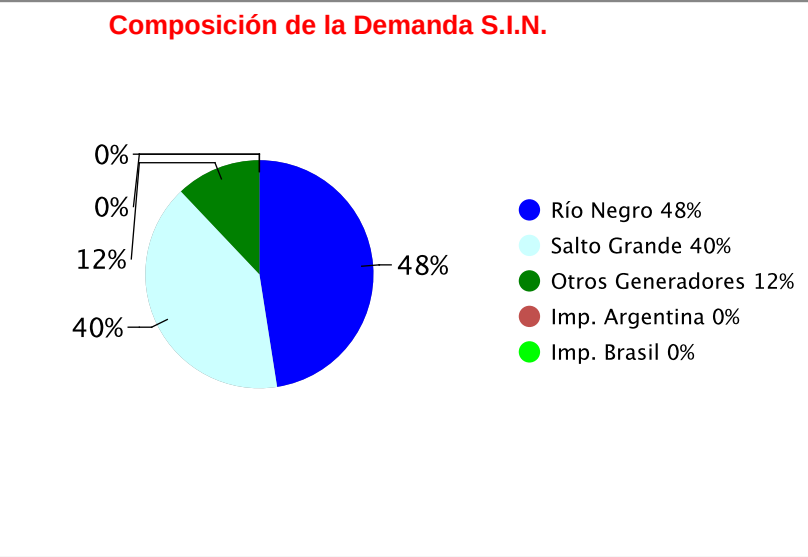



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

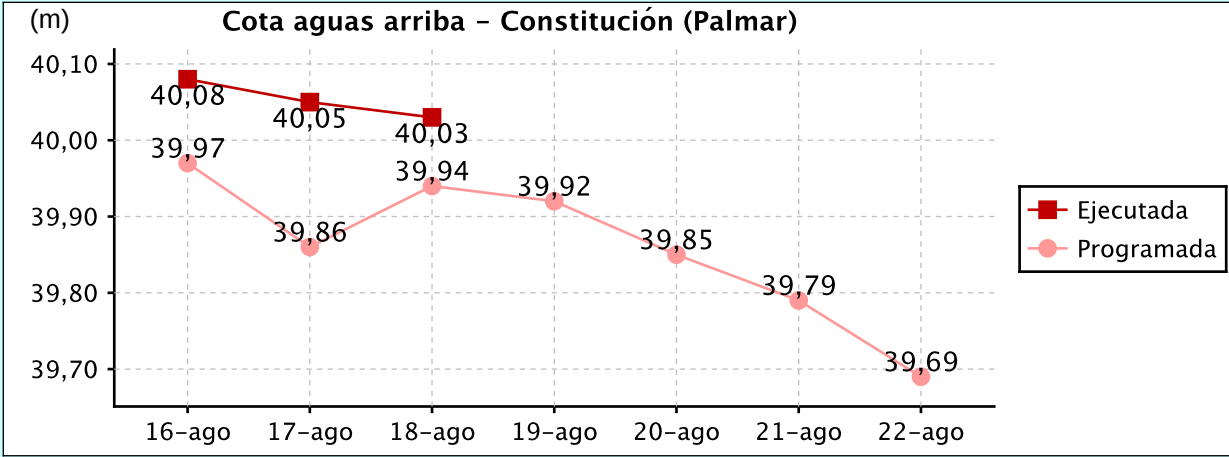
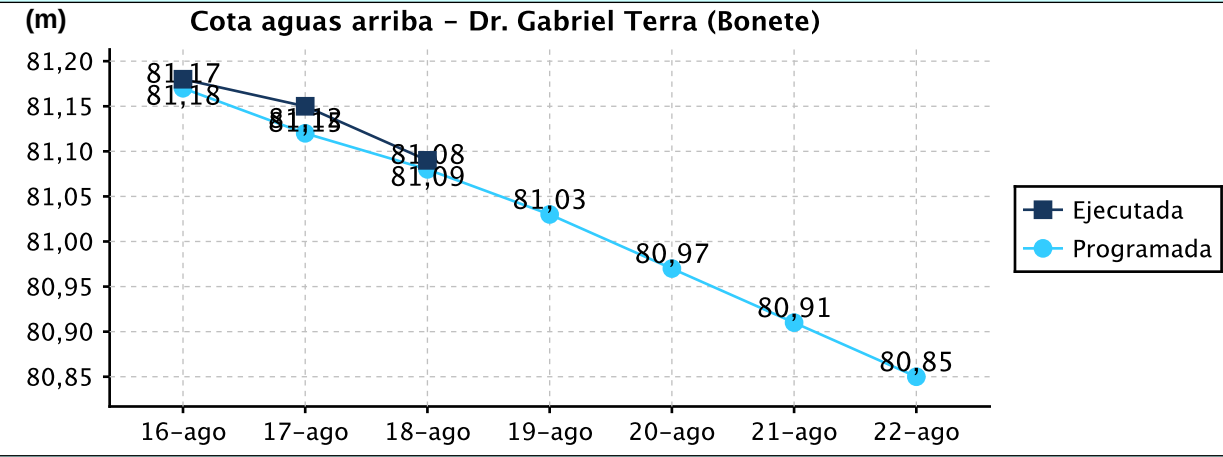


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,08	81,09
Baygorria	54,34	54,19
Palmar	39,94	40,03
SGU	35,69	35,85

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

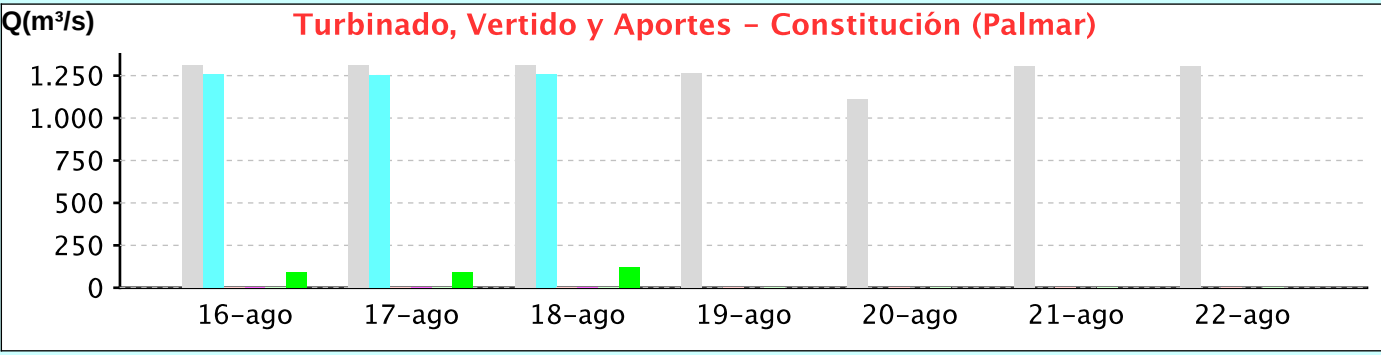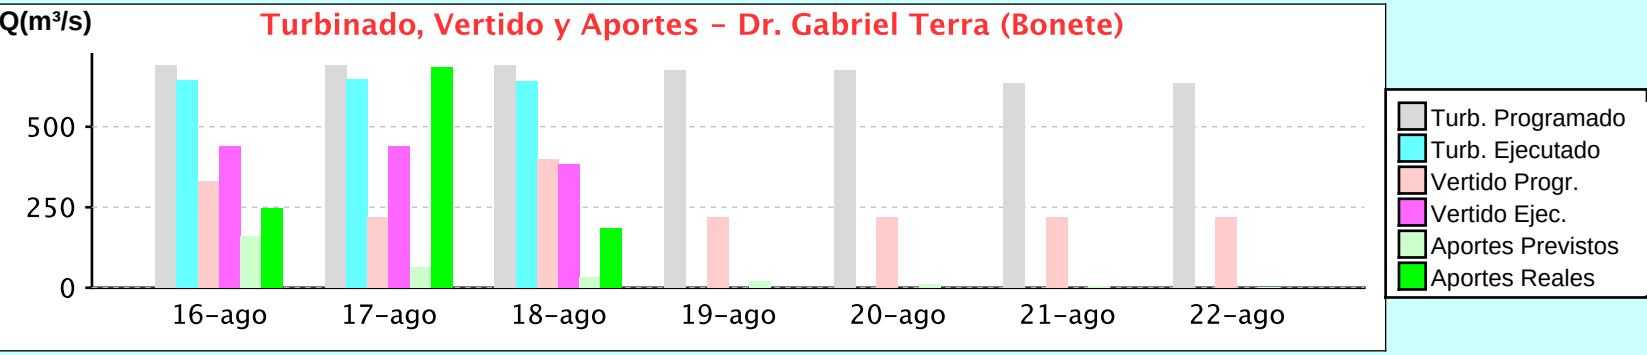

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

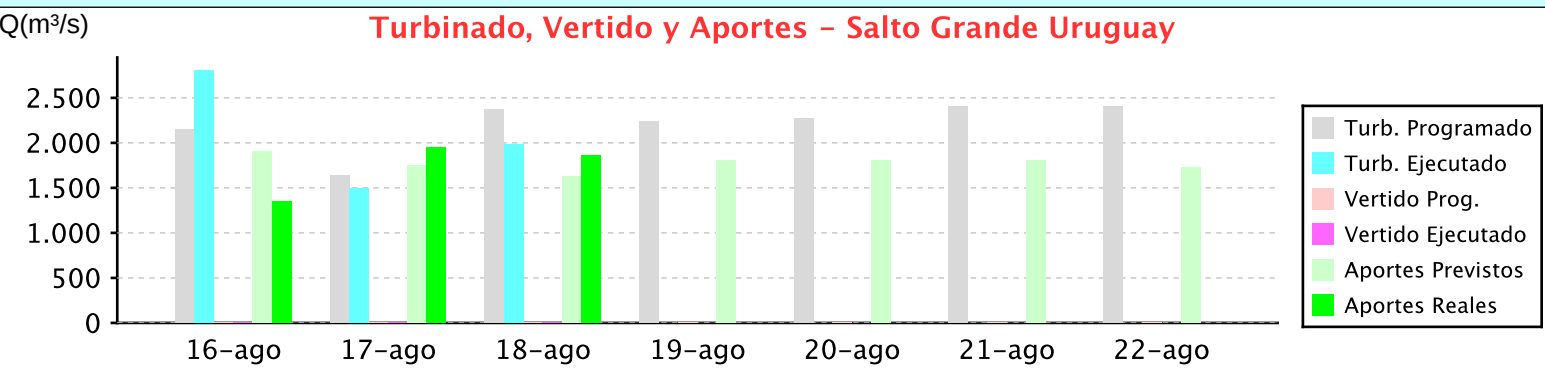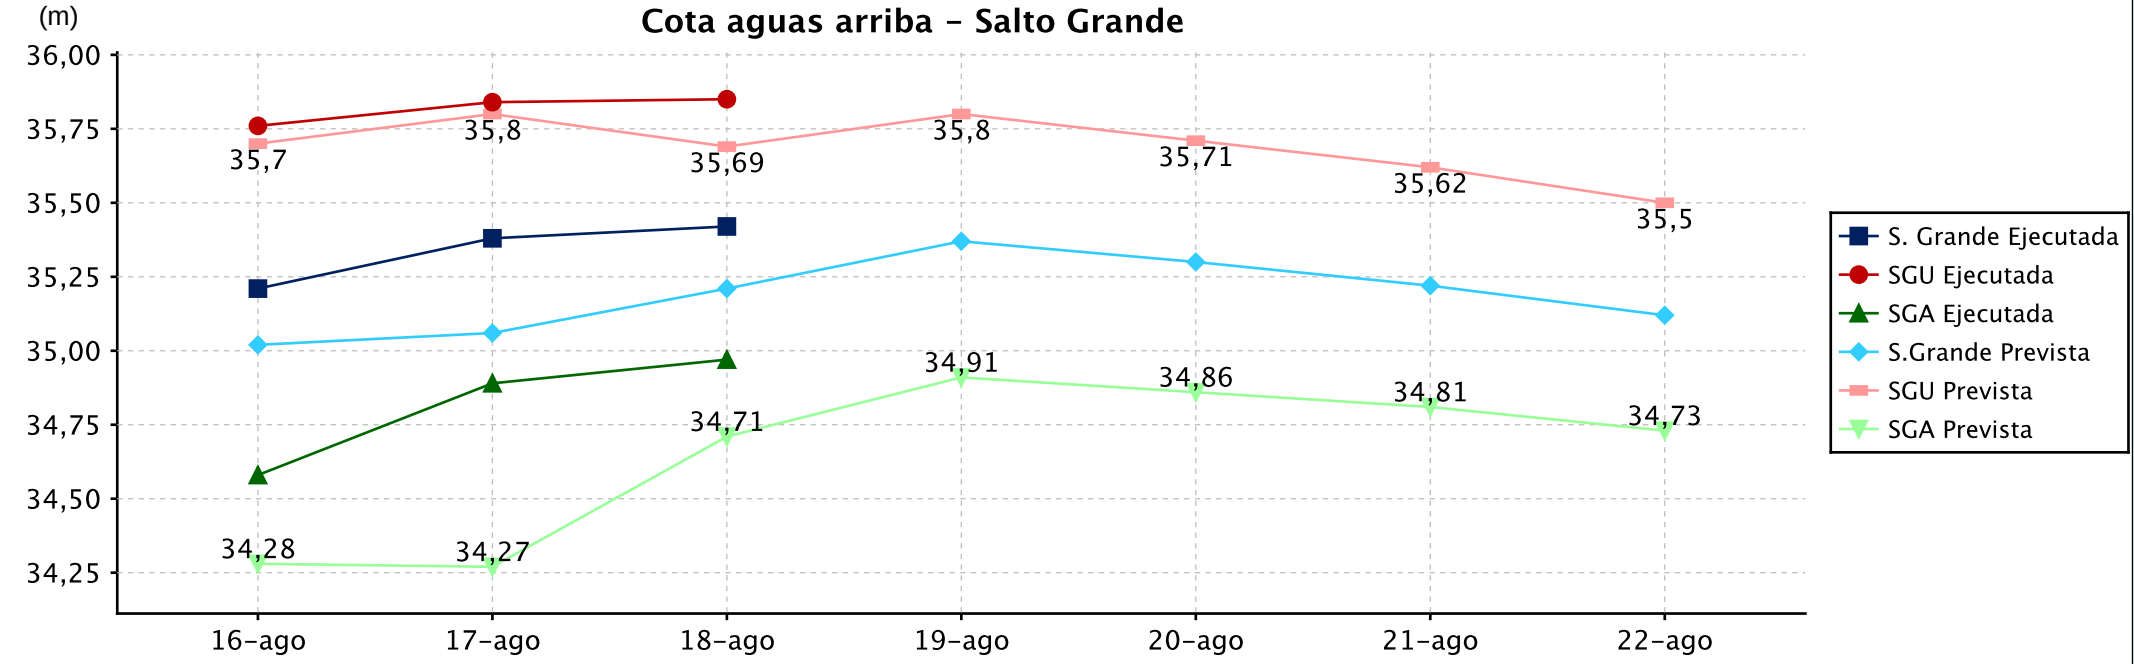

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,85
Cota Vista Arg	34,97
Cota real	35,42
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	21.600

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	690	642
Baygorria	831	809
Palmar	1.310	1.260
SGU	2.369	1.980

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	32	186
Baygorria	0	47
Palmar	0	122
SGU	1.629	1.858

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	400	383
Baygorria	100	278
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
