



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 19 de agosto de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-6
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-83
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	53
Aggreko MVA	26
Aggreko MVB	27
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.360
C. Baygorria	2.200
C. Palmar	7.888
C. Salto Grande	11.401
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.418
TOTAL Generación	28.219

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.219
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.520
Diferencia (MWh)	-1.301
Ejecutada - Programada	-4,41 %

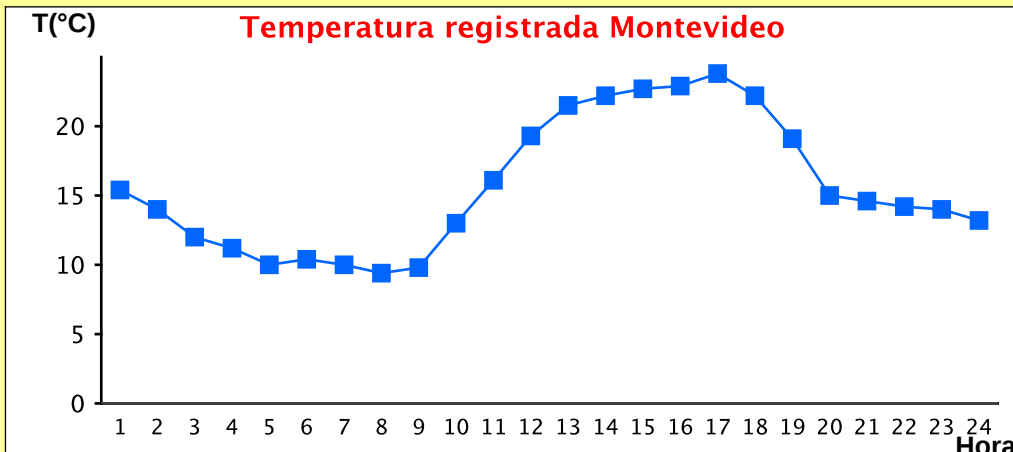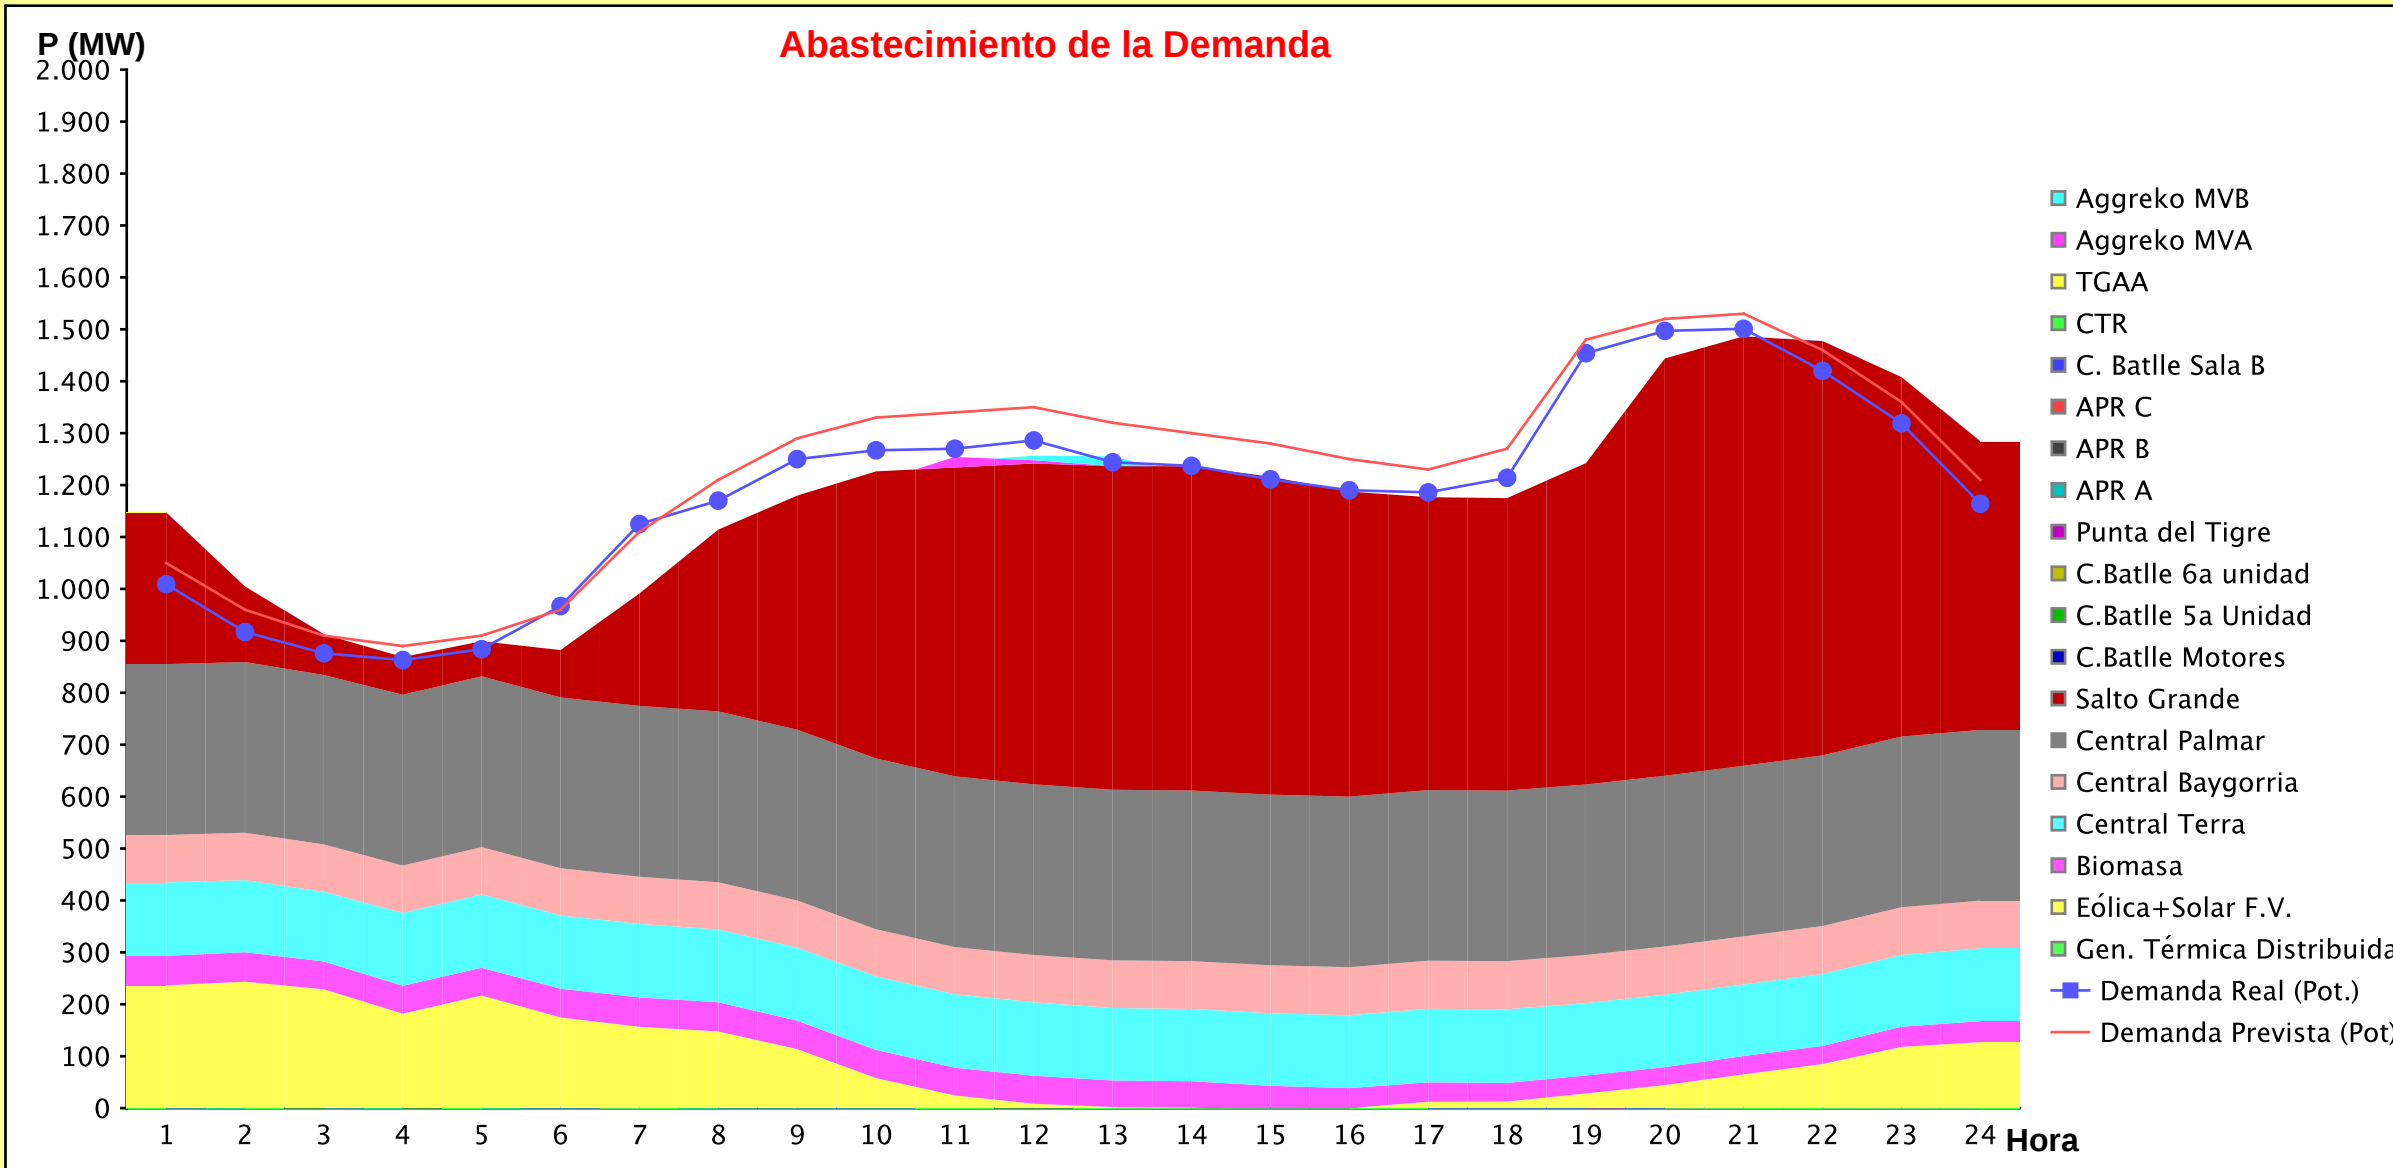



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1301,67 Hora 11:44
Potencia mínima:	849,34 Hora 03:35
Pico noche:	1508,57 Hora 21:01

Generación Media (MW)	
Eólica	96,0
Biomasa	50,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

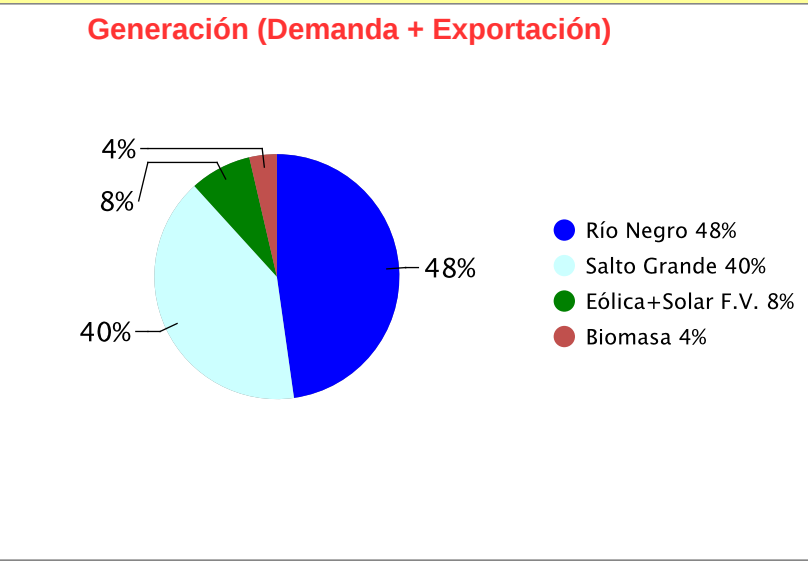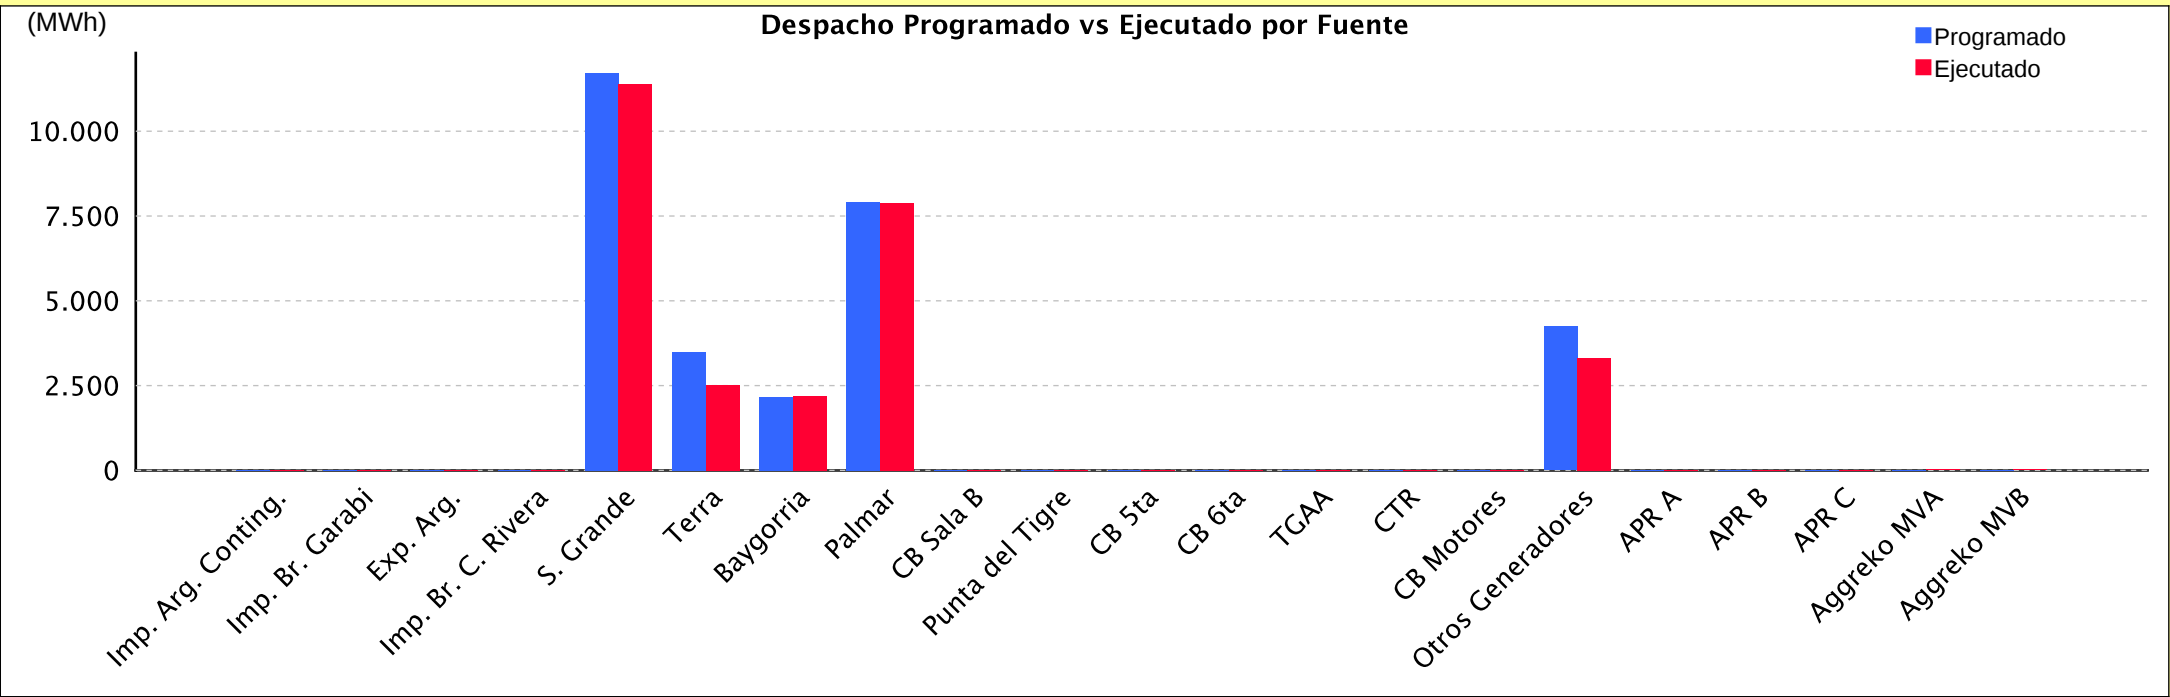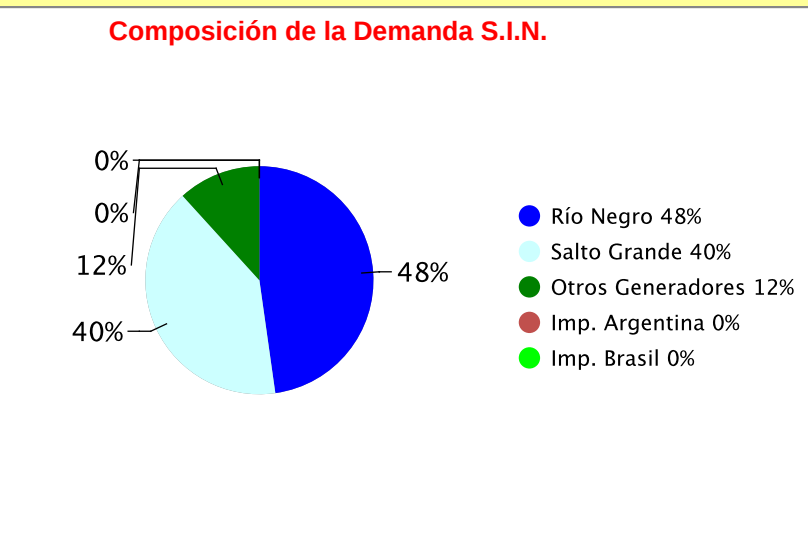



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

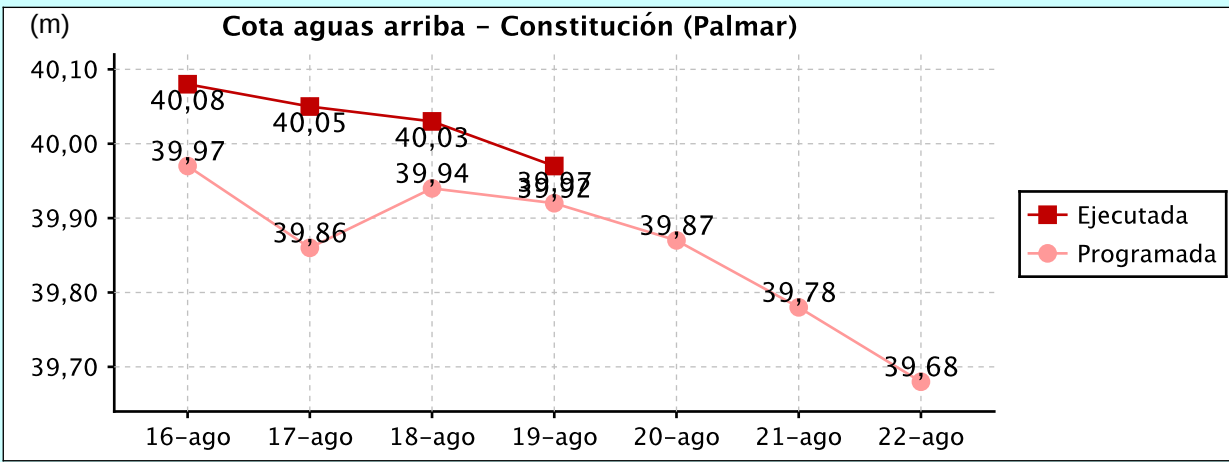
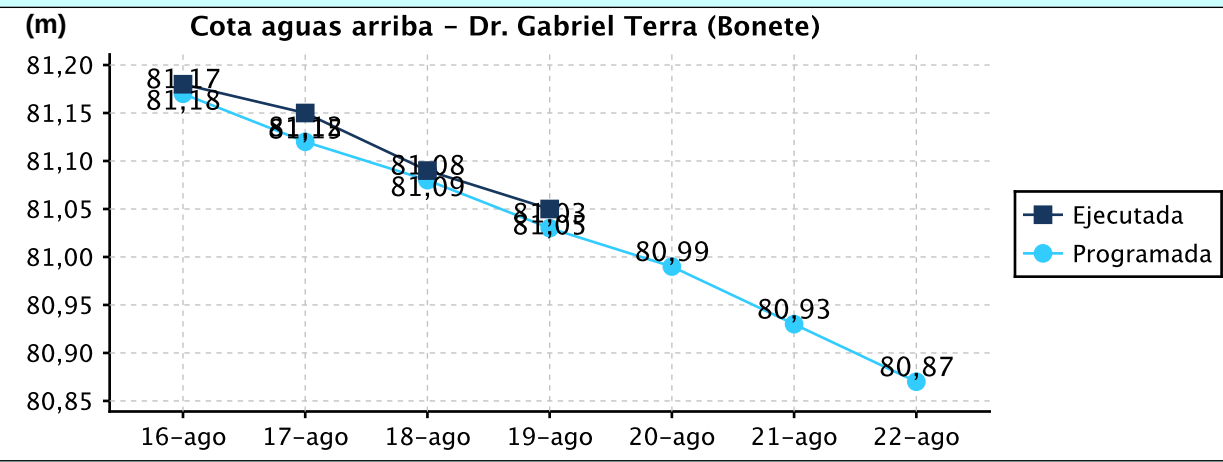


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,03	81,05
Baygorria	54,18	54,08
Palmar	39,92	39,97
SGU	35,80	35,79

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

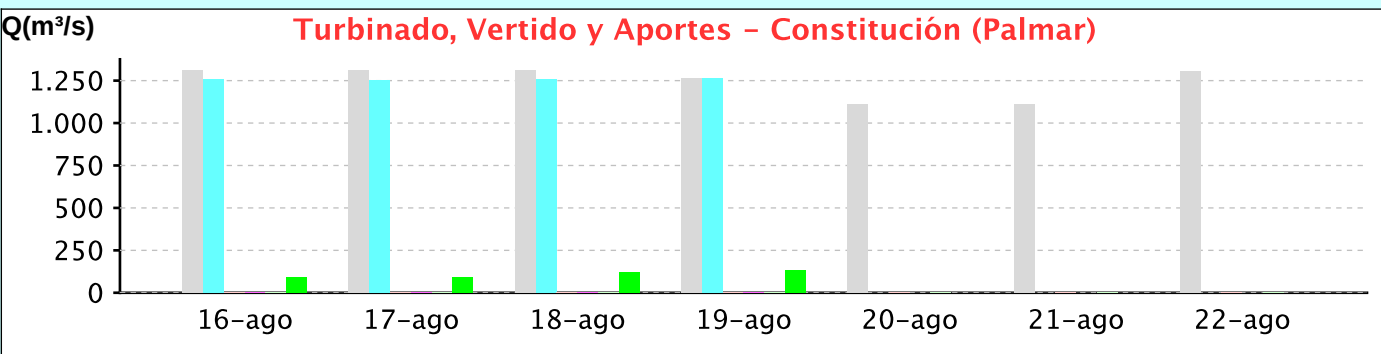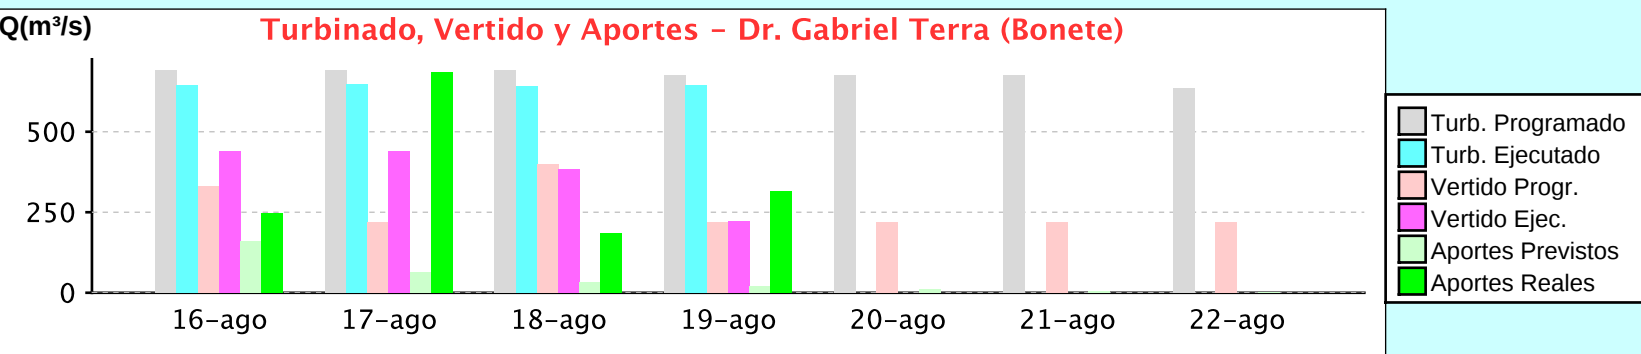

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

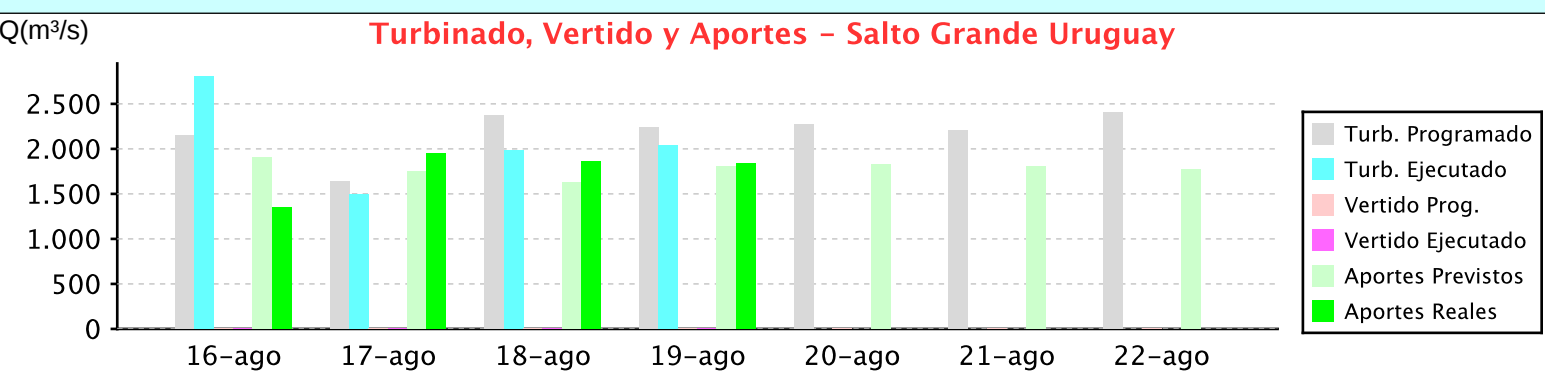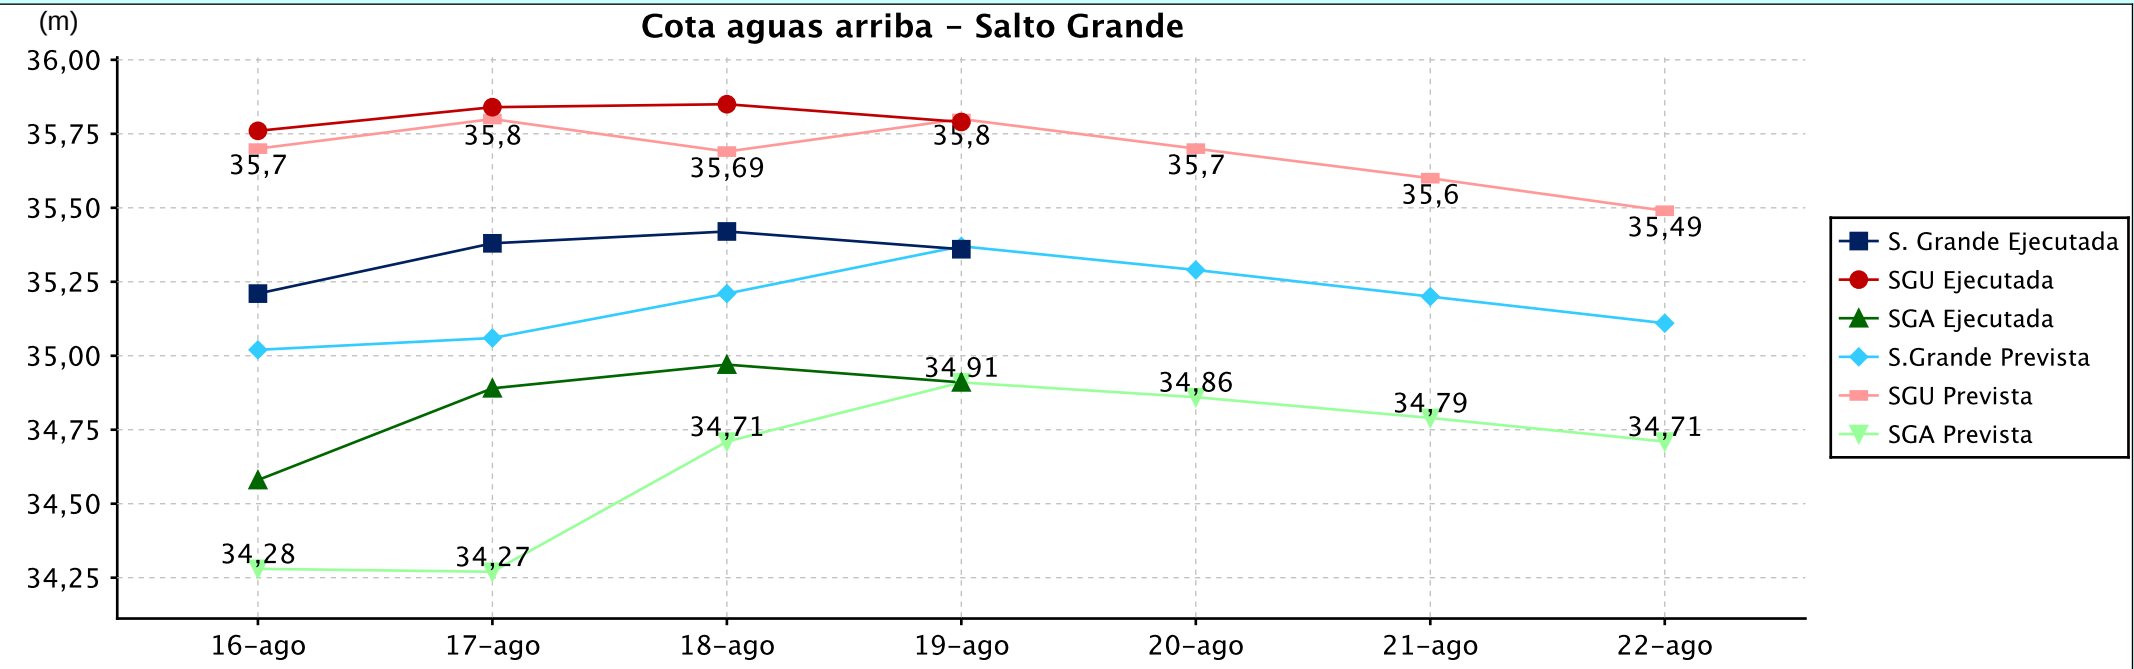

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,79
Cota Vista Arg	34,91
Cota real	35,36
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
21.327	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	675	644
Baygorria	795	808
Palmar	1.266	1.264
SGU	2.240	2.040

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	19	317
Baygorria	0	-55
Palmar	0	132
SGU	1.800	1.841

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	223
Baygorria	100	134
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
