



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 20 de agosto de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-85
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.360
C. Baygorria	2.218
C. Palmar	6.937
C. Salto Grande	11.903
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.905
TOTAL Generación	28.219

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.219
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.270
Diferencia (MWh)	-51
Ejecutada - Programada	-0,18 %

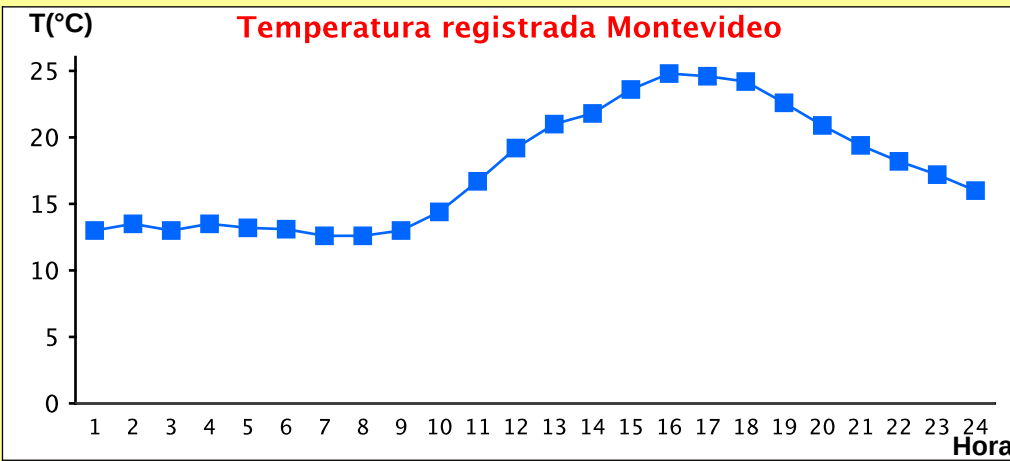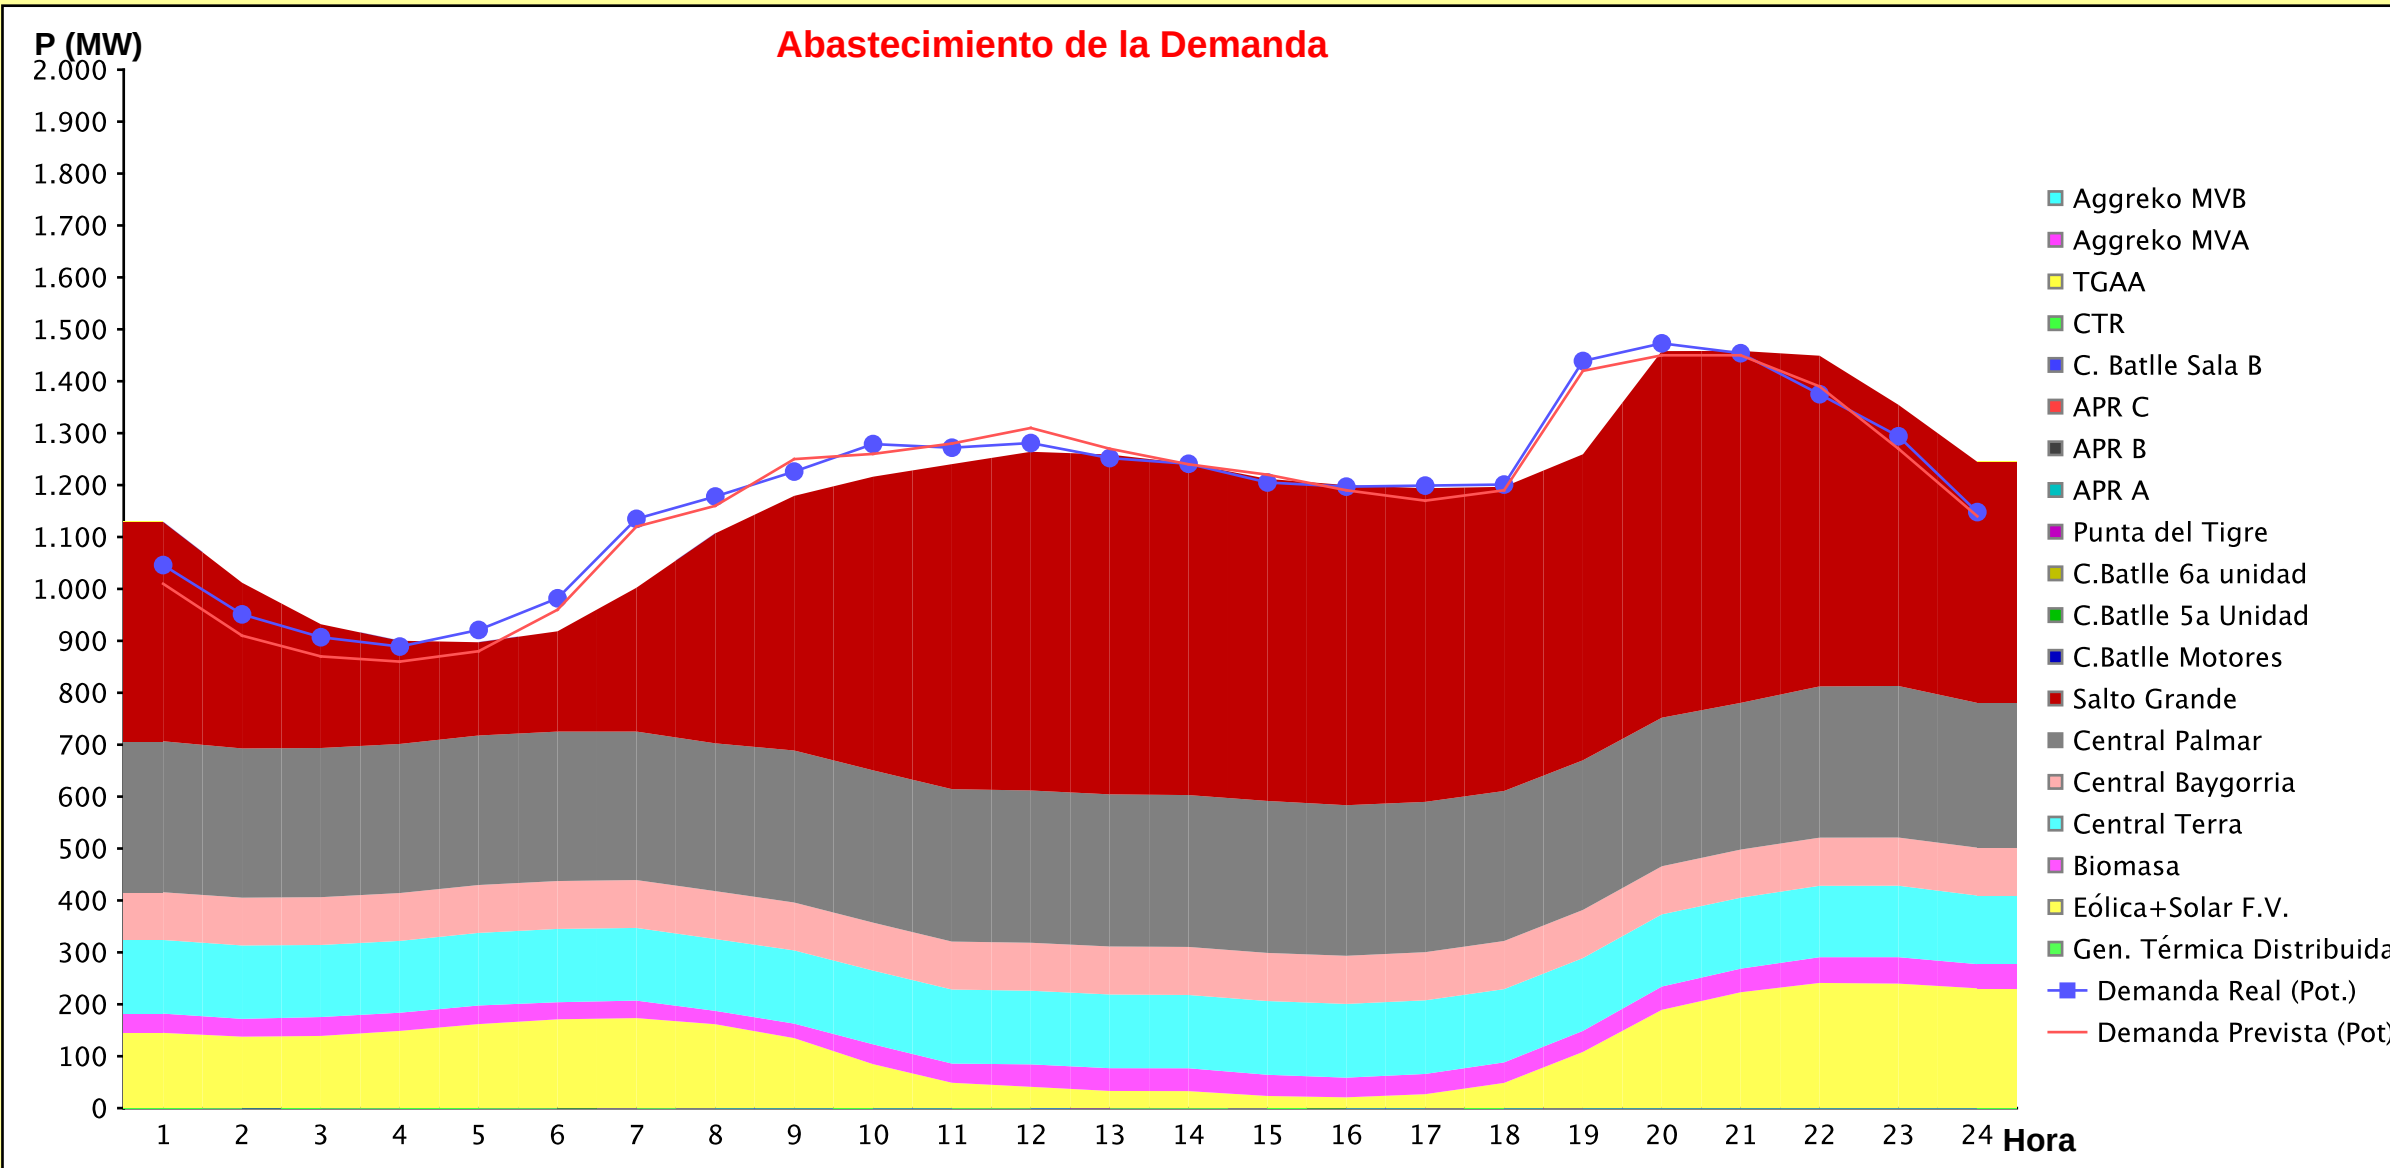


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1292,25 Hora 11:48
Potencia mínima:	877,62 Hora 03:33
Pico noche:	1476,69 Hora 19:56

Generación Media (MW)	
Eólica	123,9
Biomasa	43,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

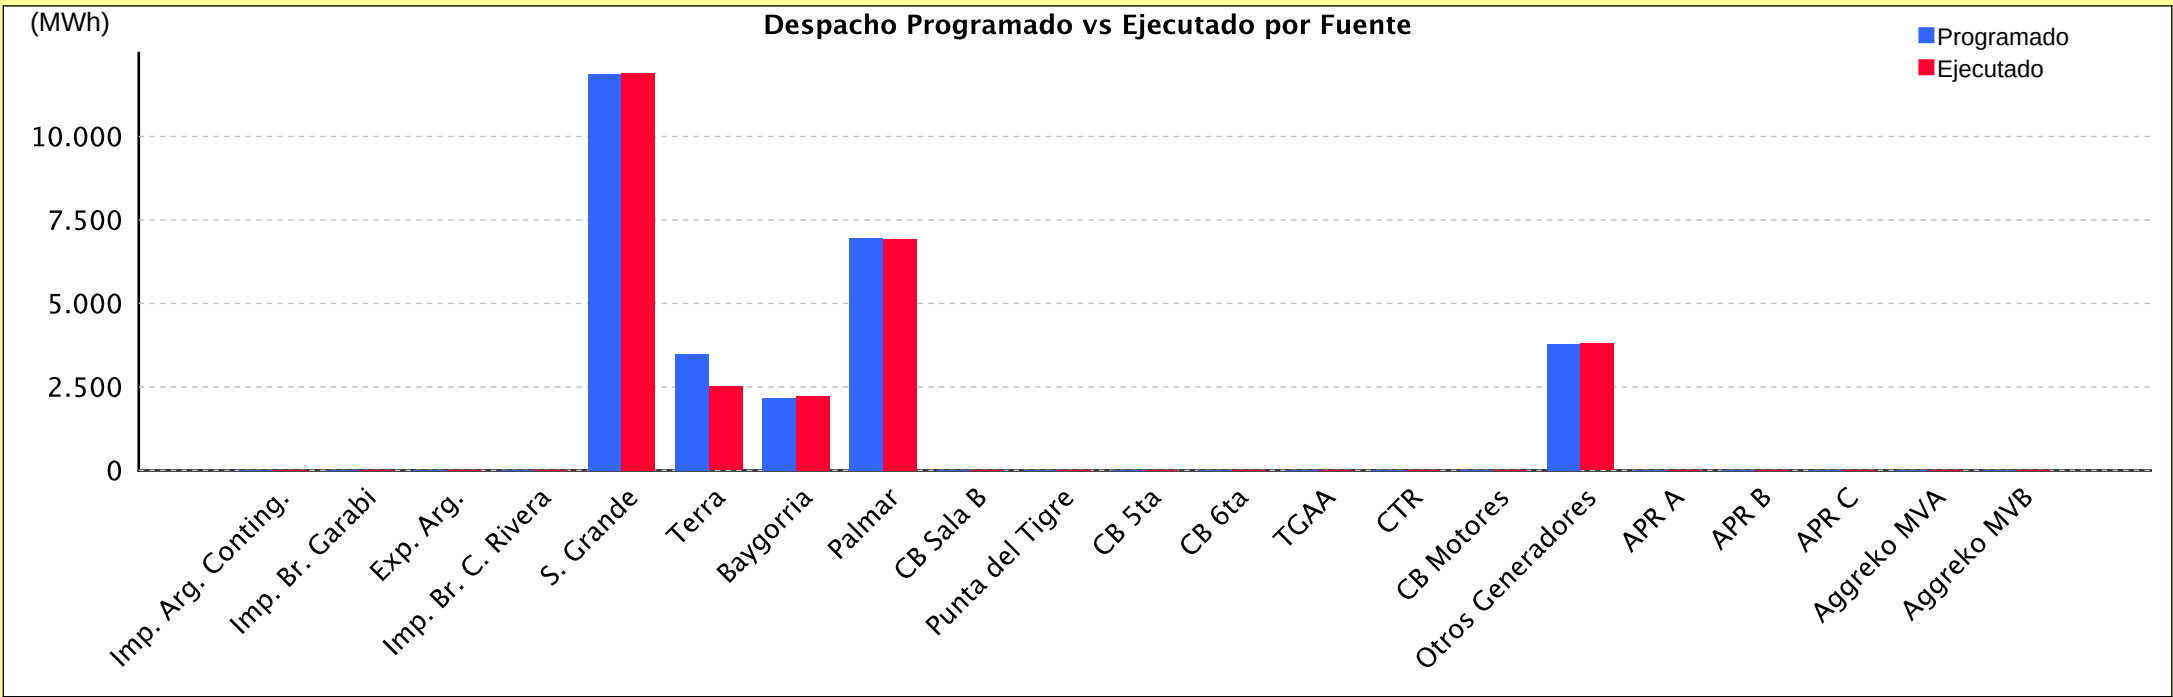
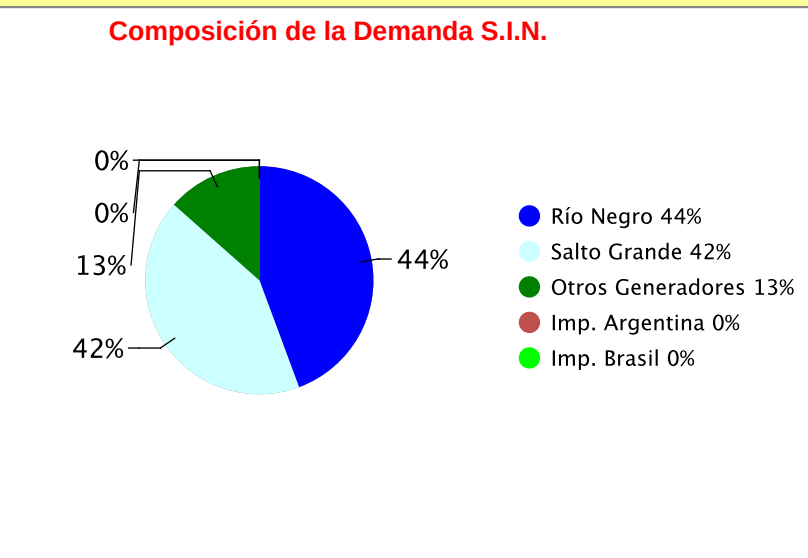


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

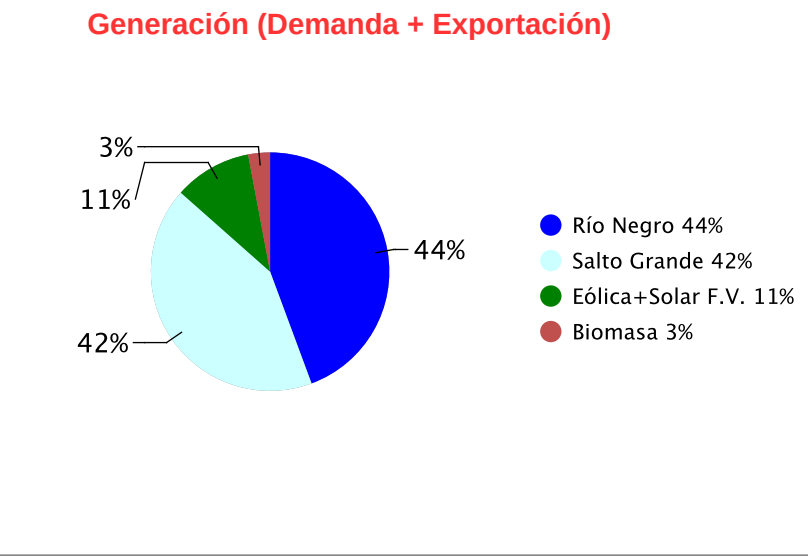



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

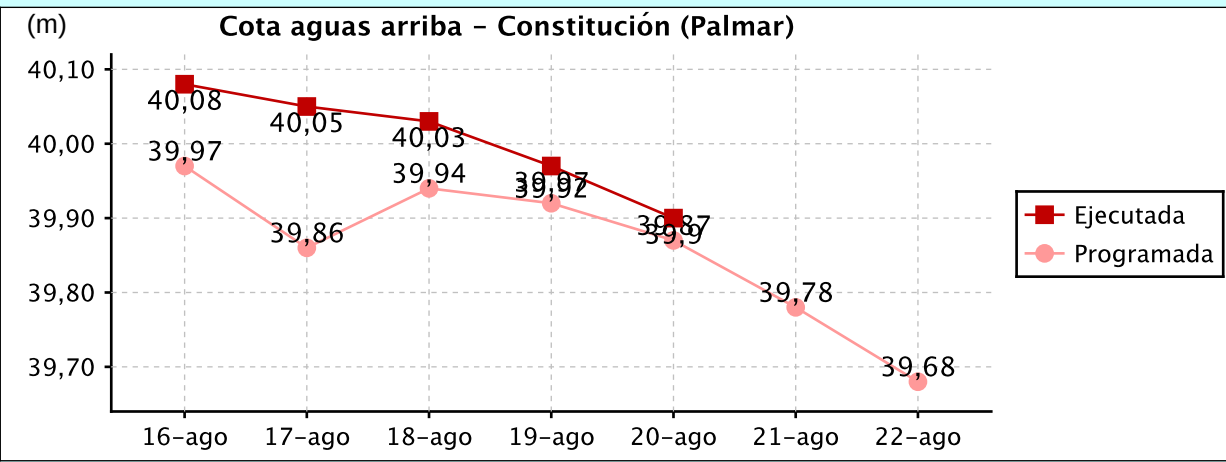
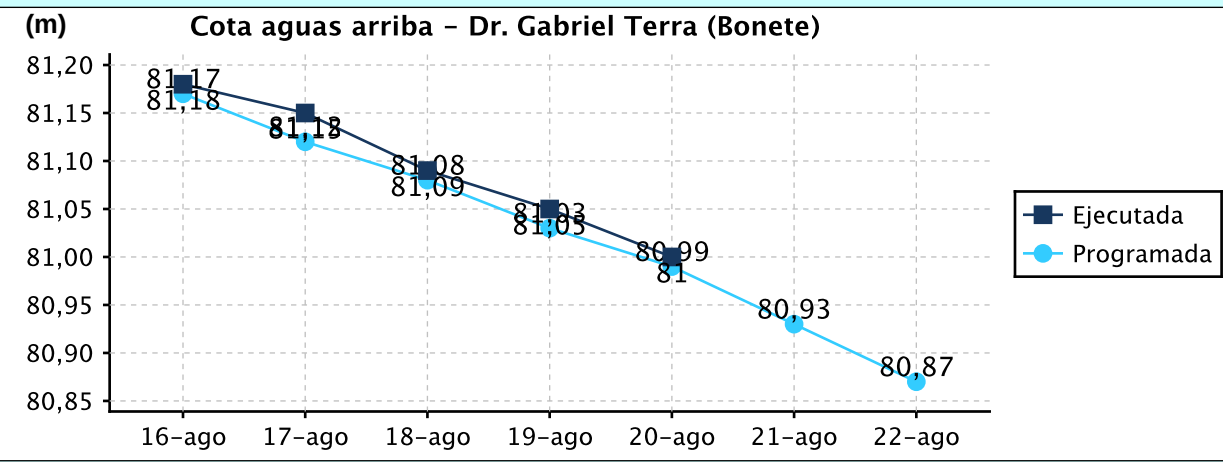


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,99	81
Baygorria	54,15	54,13
Palmar	39,87	39,9
SGU	35,70	35,75

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

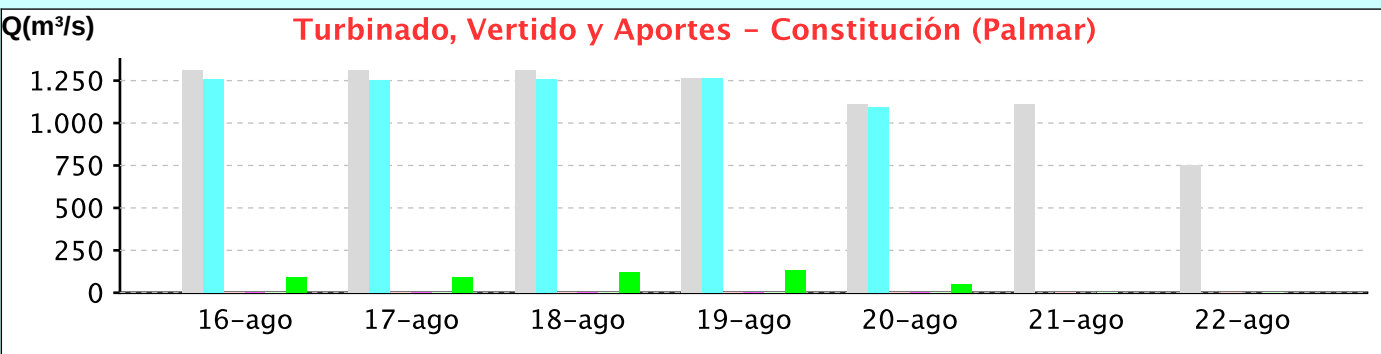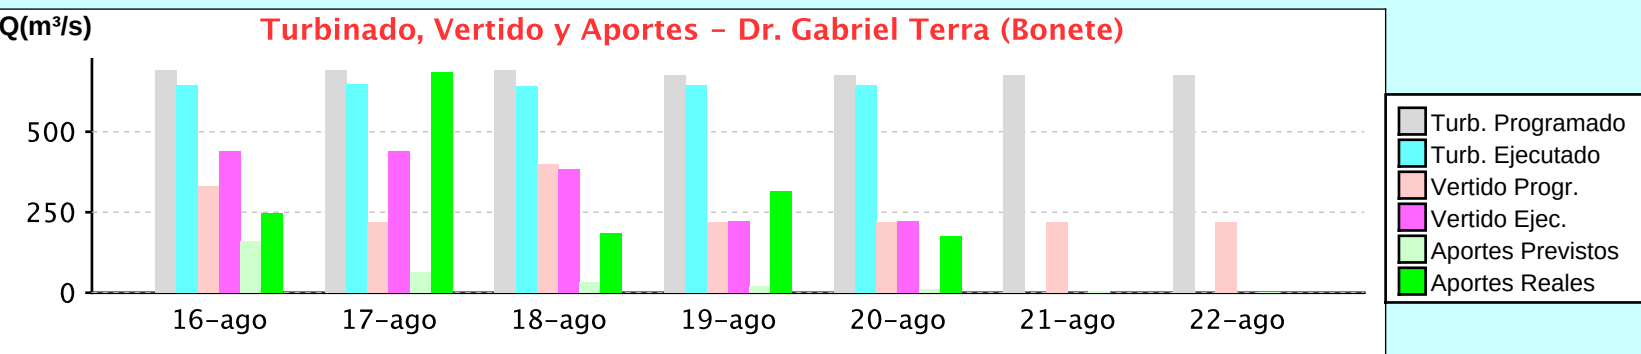

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

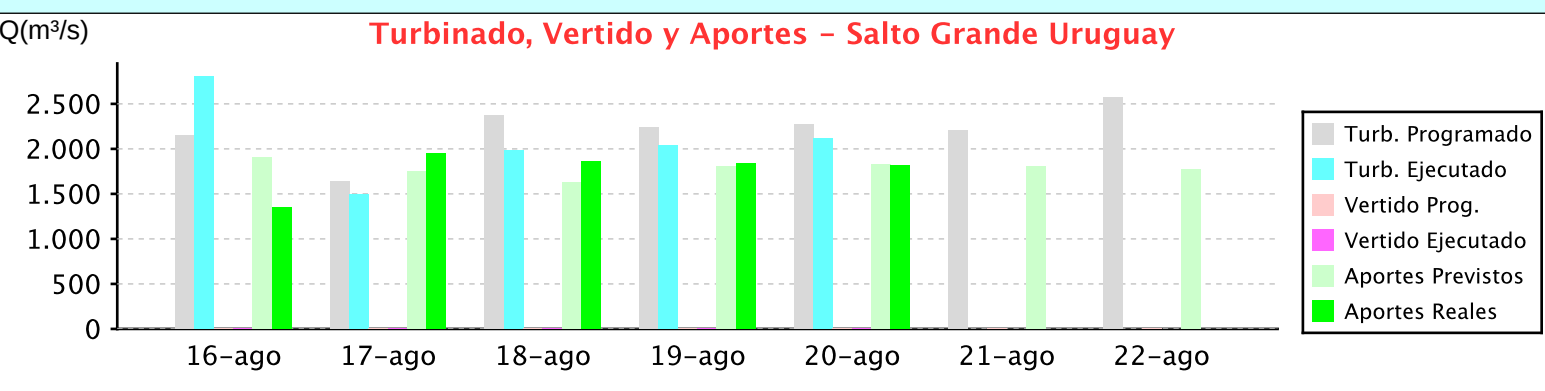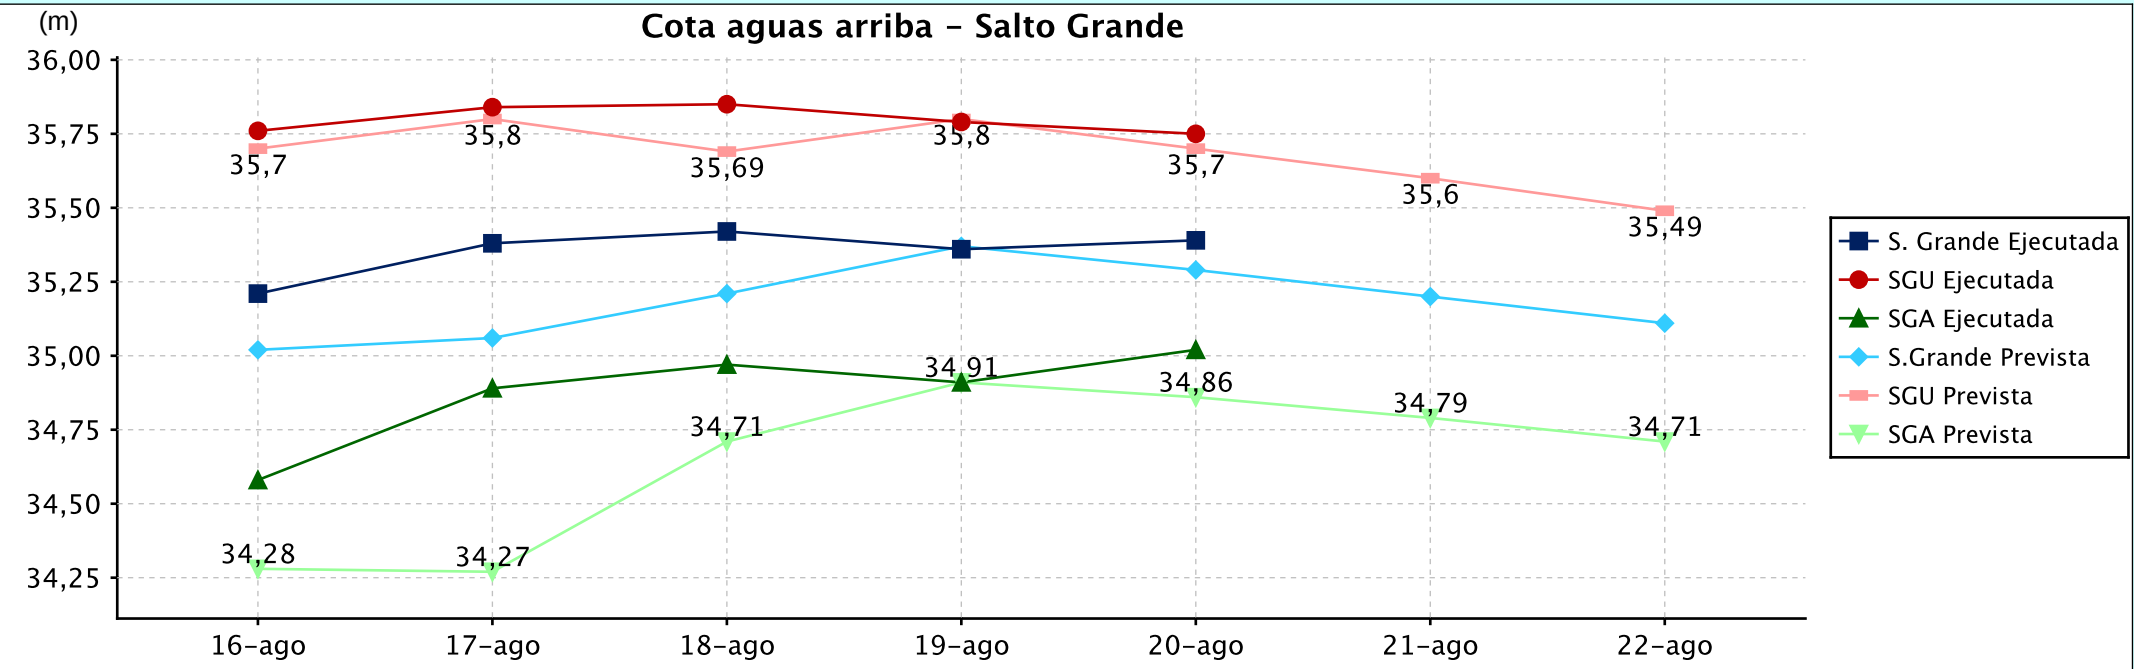

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,75
Cota Vista Arg	35,02
Cota real	35,39
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	17.807

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	675	644
Baygorria	795	807
Palmar	1.112	1.095
SGU	2.271	2.113

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	12	176
Baygorria	0	8
Palmar	0	52
SGU	1.825	1.812

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	221
Baygorria	100	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
