



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 21 de agosto de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-8
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-4
Central La Tablada	-86
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.335
C. Baygorria	2.131
C. Palmar	7.042
C. Salto Grande	11.112
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.420
TOTAL Generación	27.931

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.931
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.550
Diferencia (MWh)	-619
Ejecutada - Programada	-2,17 %

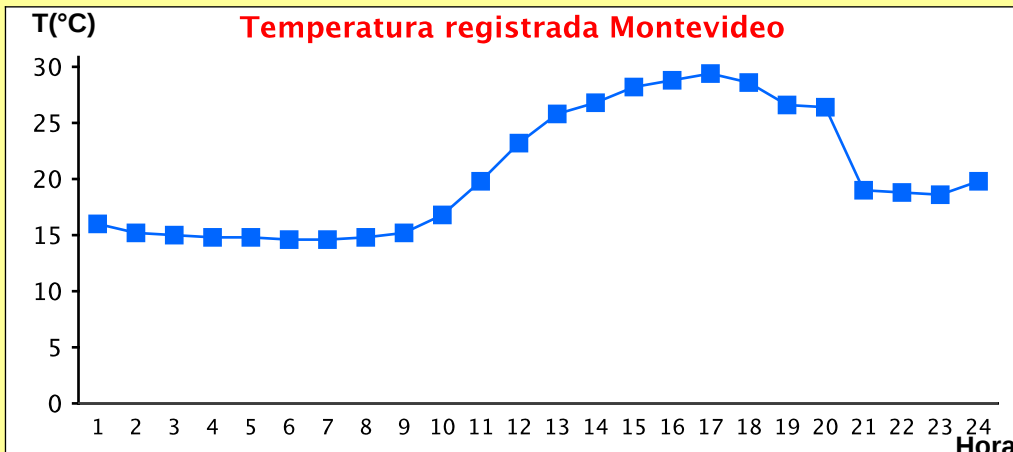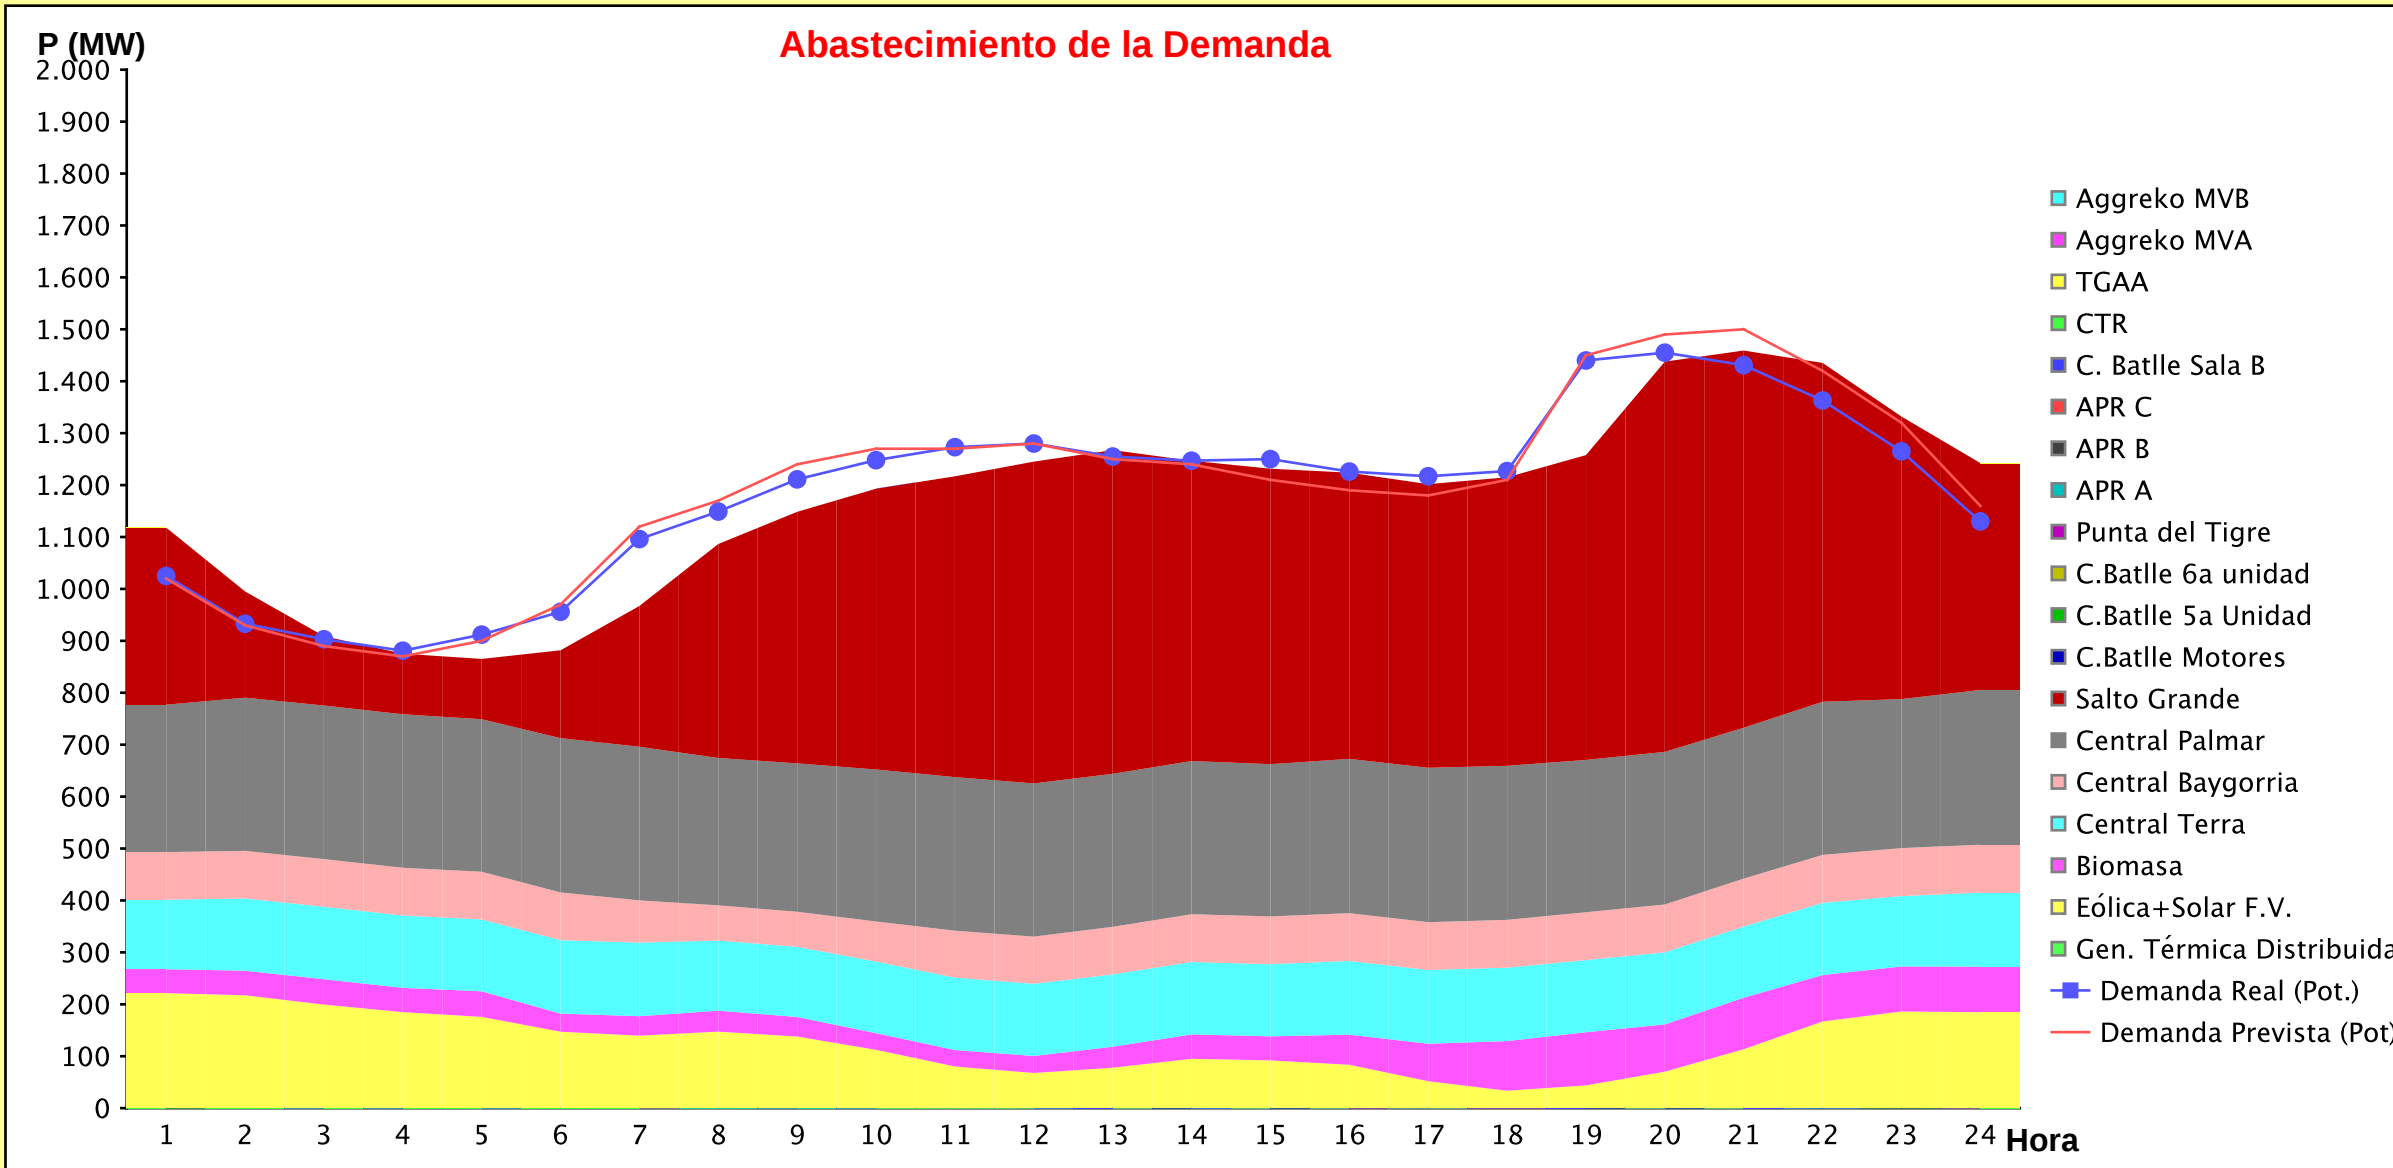



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1303,88 Hora 11:50
Potencia mínima:	866,83 Hora 03:29
Pico noche:	1458,27 Hora 19:33

Generación Media (MW)	
Eólica	126,5
Biomasa	64,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

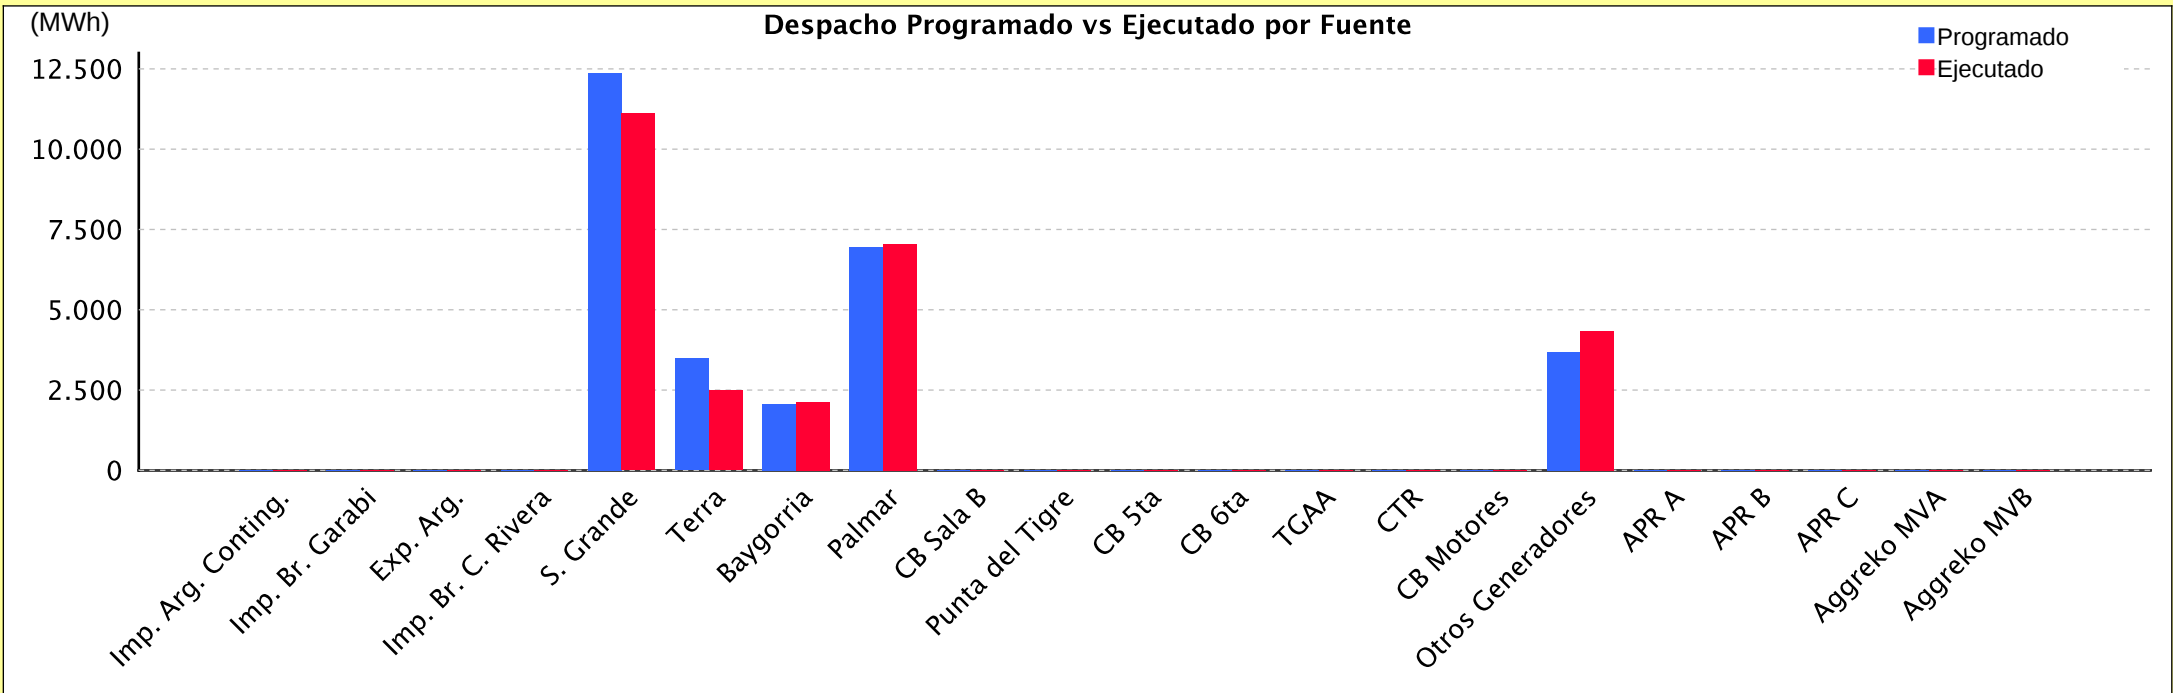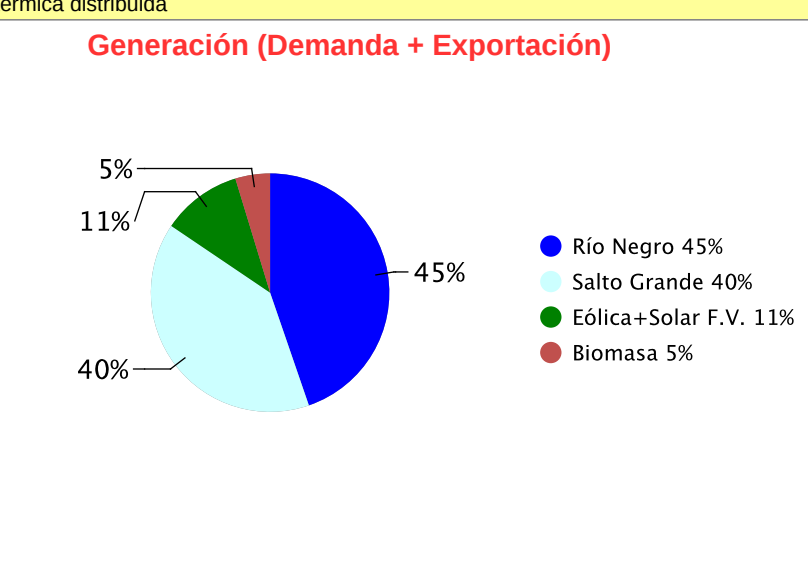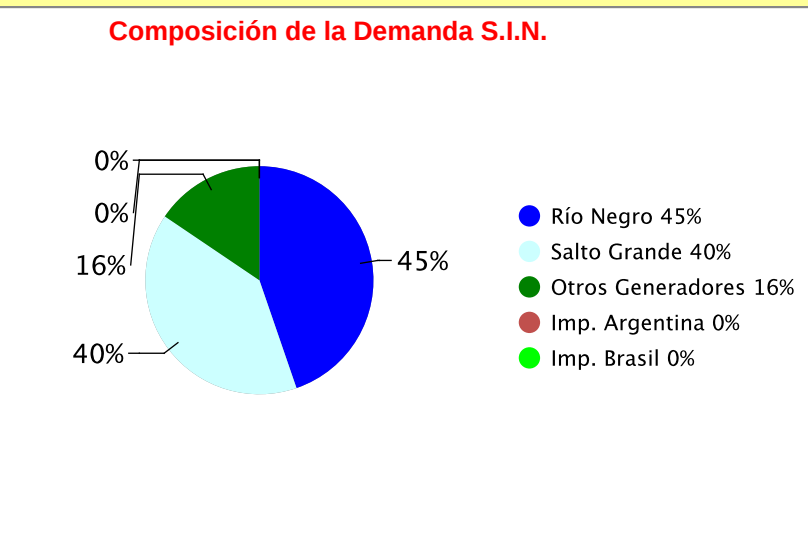



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

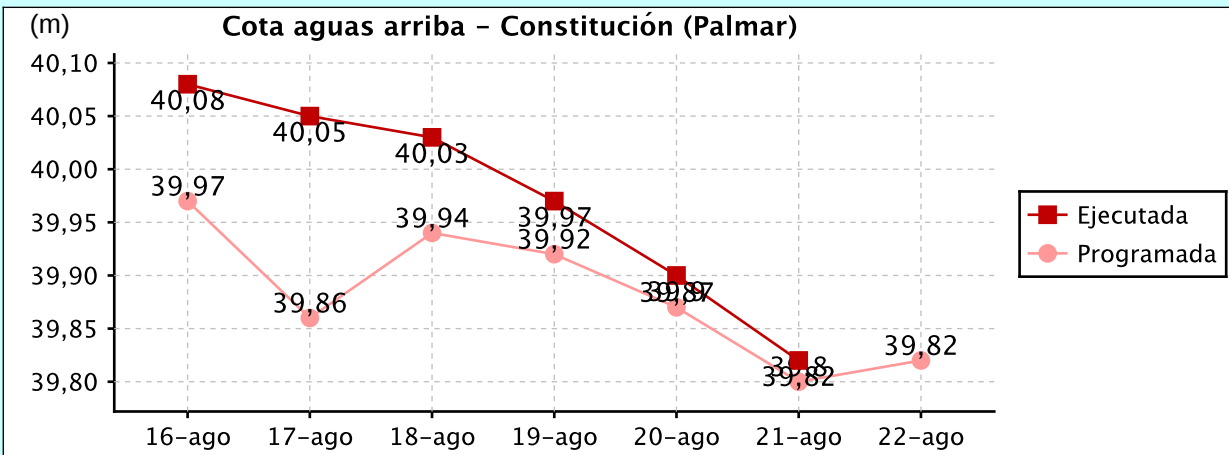
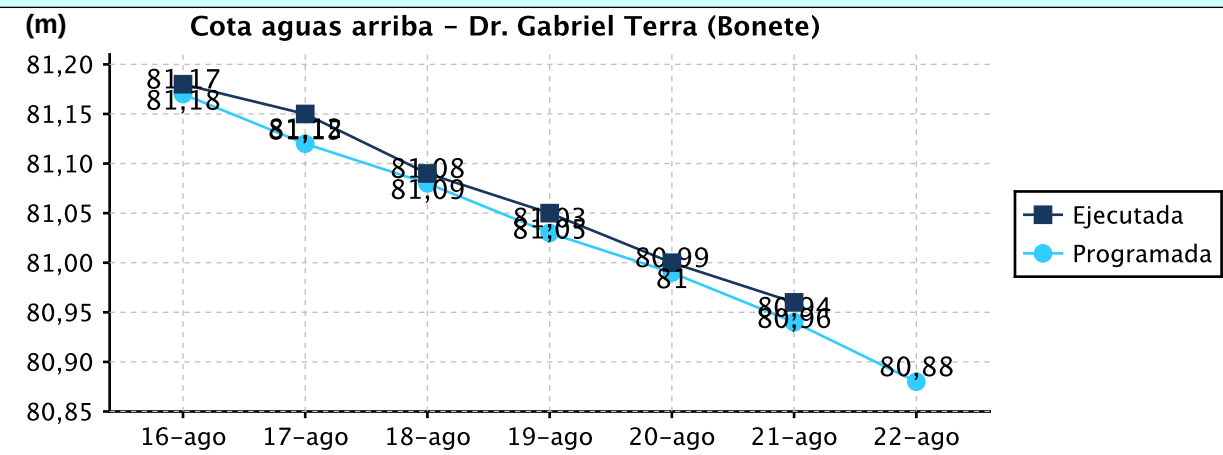


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,94	80,96
Baygorria	54,20	54,23
Palmar	39,80	39,82
SGU	35,64	35,72

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

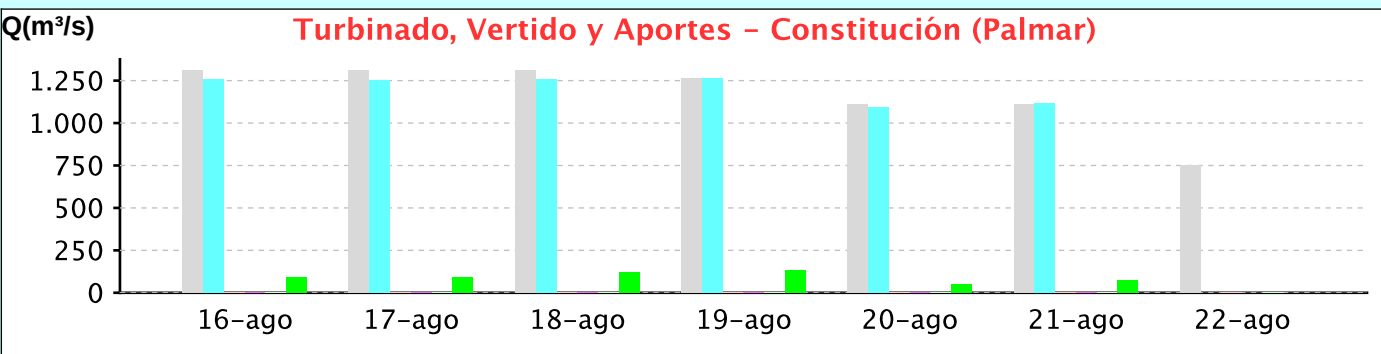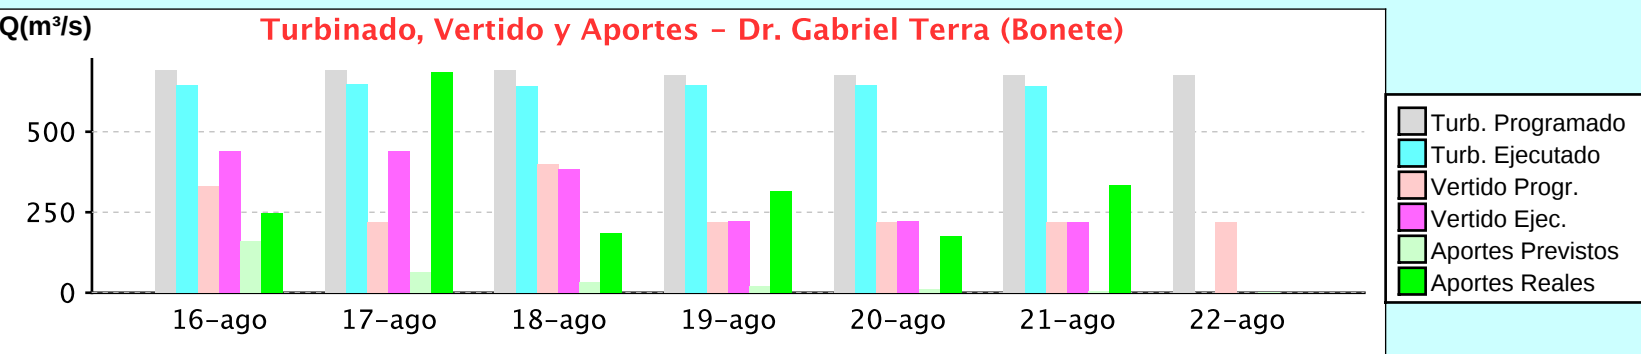

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

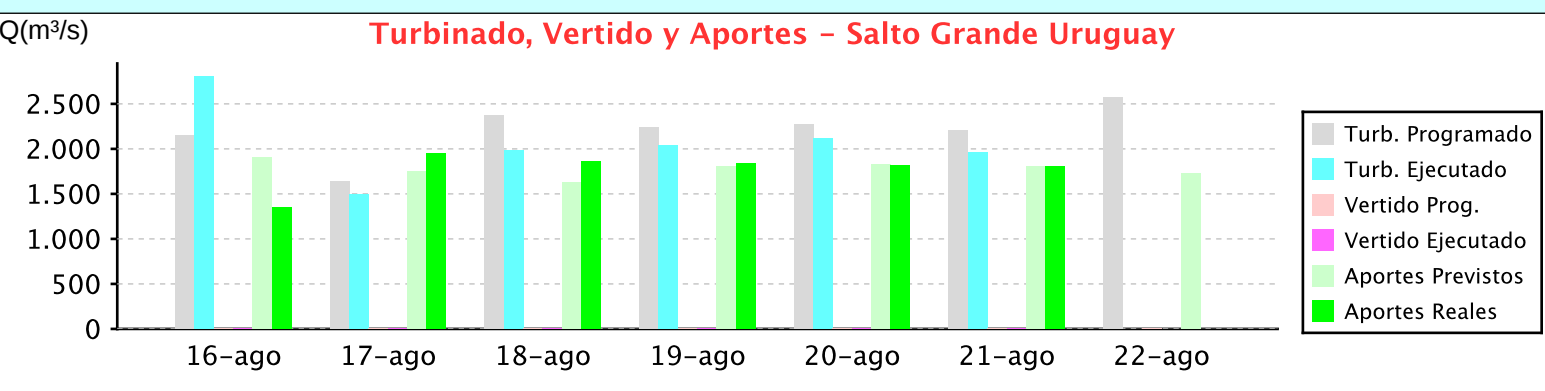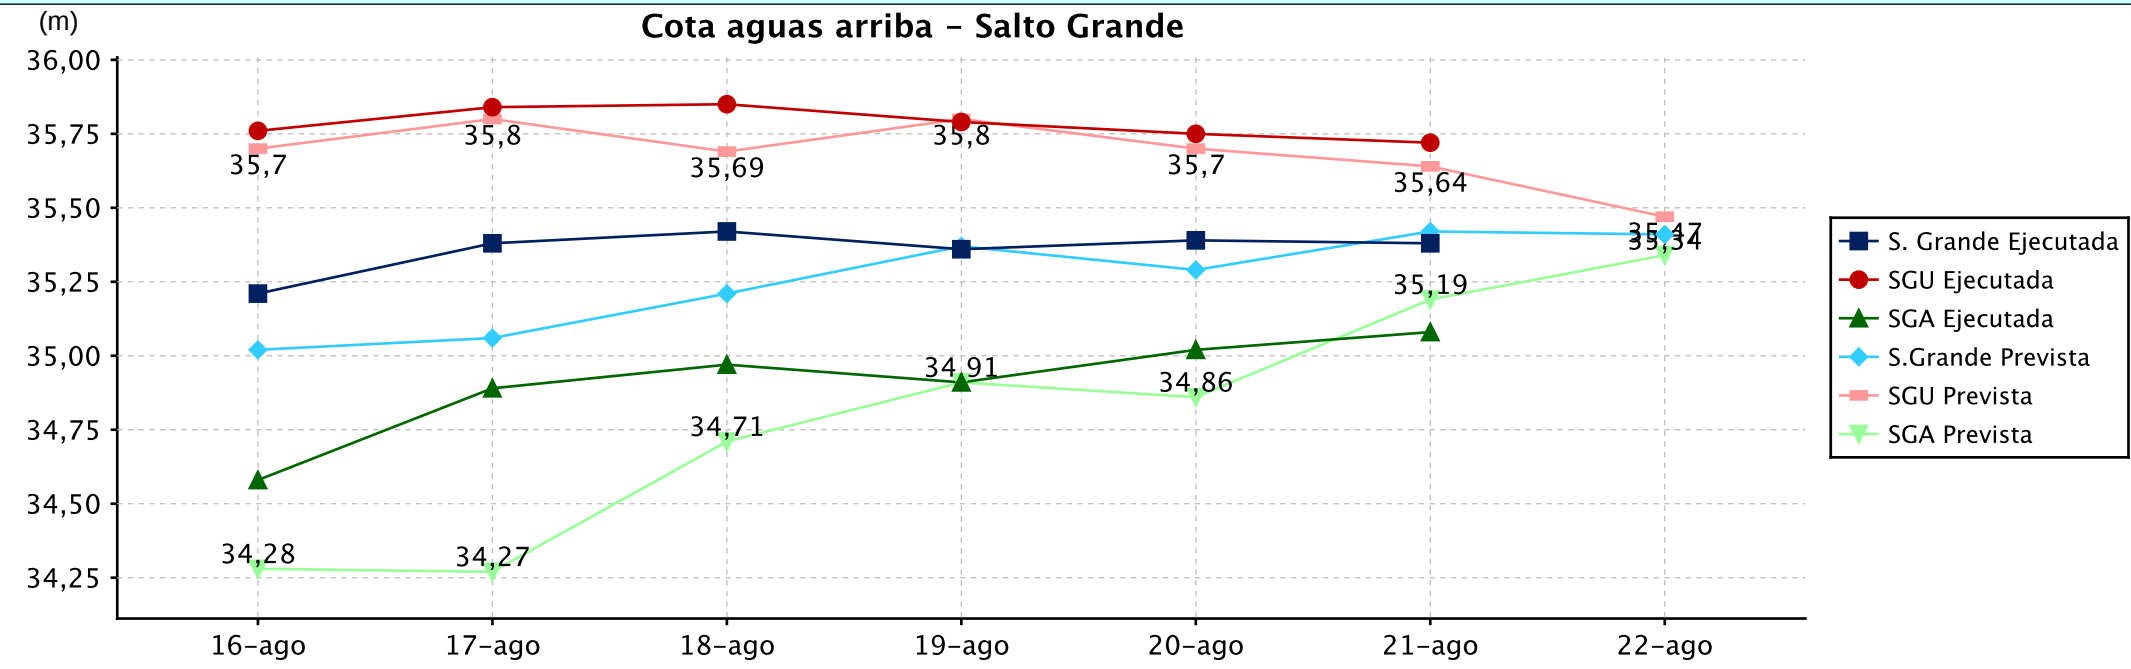

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,72
Cota Vista Arg	35,08
Cota real	35,38
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	15.660

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	675	642
Baygorria	758	760
Palmar	1.112	1.115
SGU	2.203	1.961

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	4	334
Baygorria	0	34
Palmar	0	72
SGU	1.800	1.804

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	219
Baygorria	100	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
