



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 22 de agosto de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-8
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-4
Central La Tablada	-84
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	114
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.329
C. Baygorria	2.036
C. Palmar	3.779
C. Salto Grande	13.309
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.922
TOTAL Generación	27.385

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.385
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.580
Diferencia (MWh)	-1.195
Ejecutada - Programada	-4,18 %

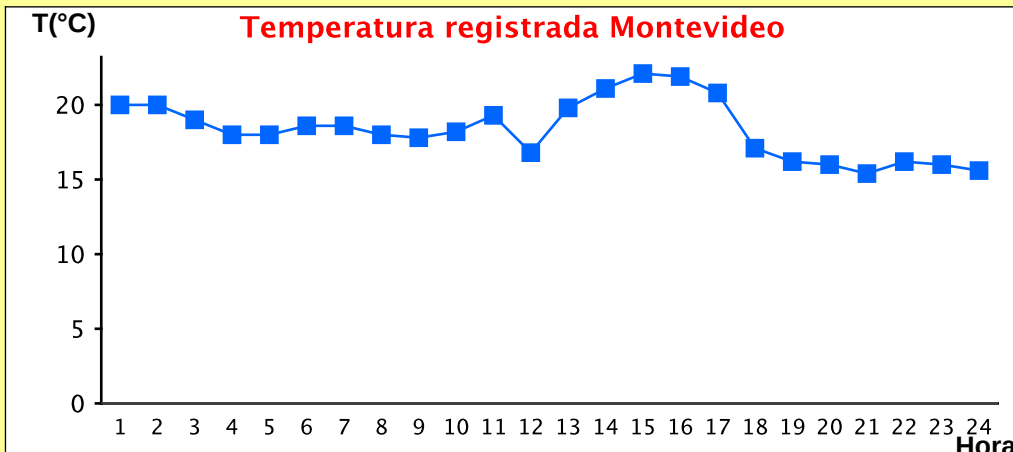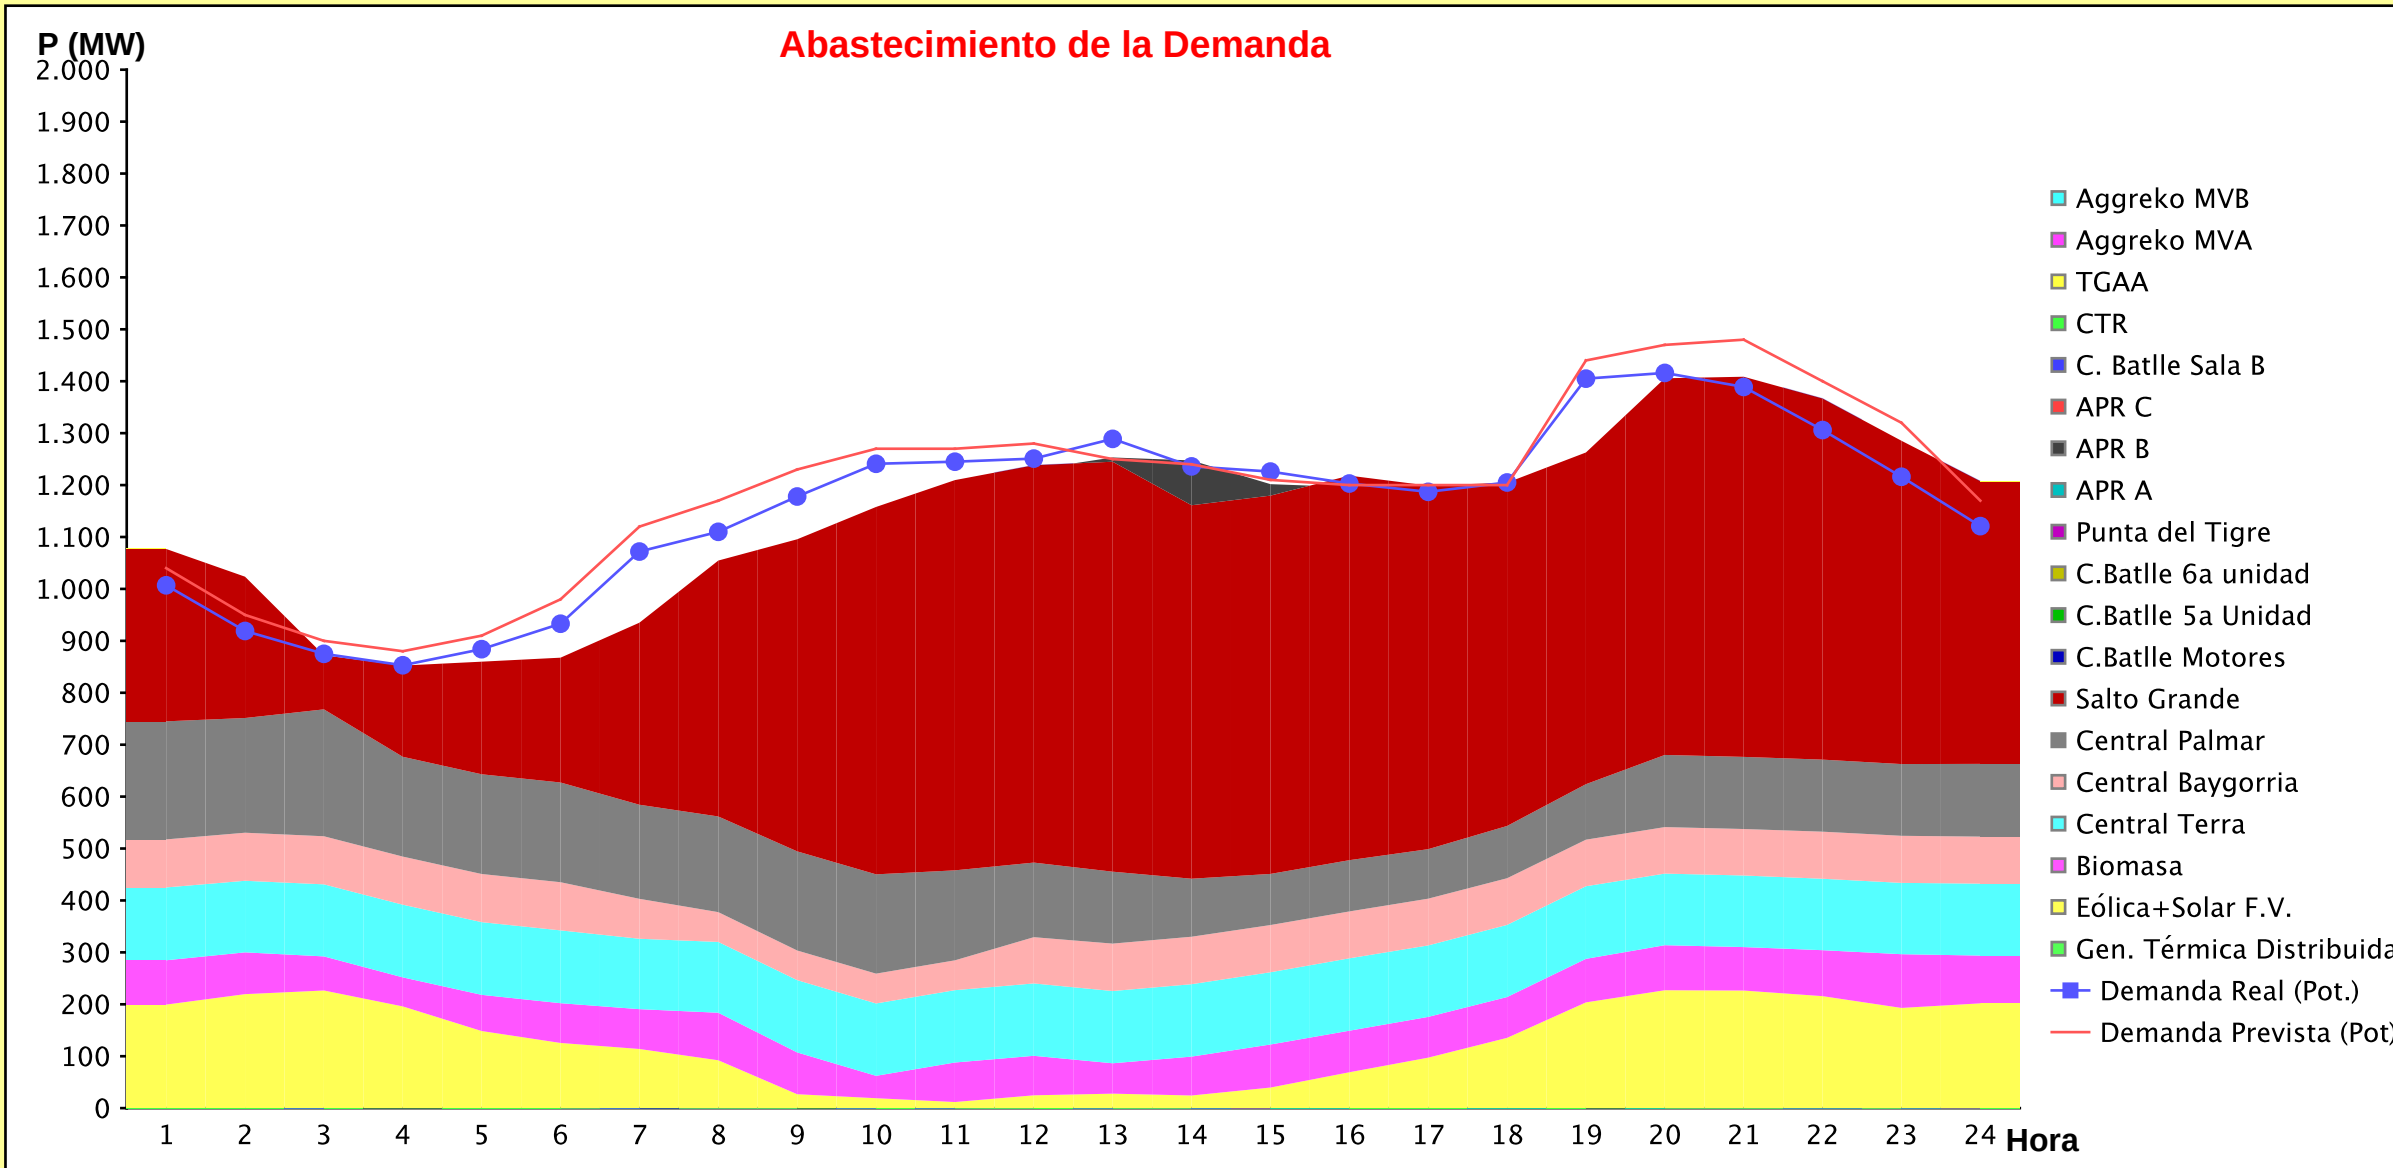



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1279,75 Hora 12:24
Potencia mínima:	850,42 Hora 03:59
Pico noche:	1428,2 Hora 19:22

Generación Media (MW)	
Eólica	128,2
Biomasa	79,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

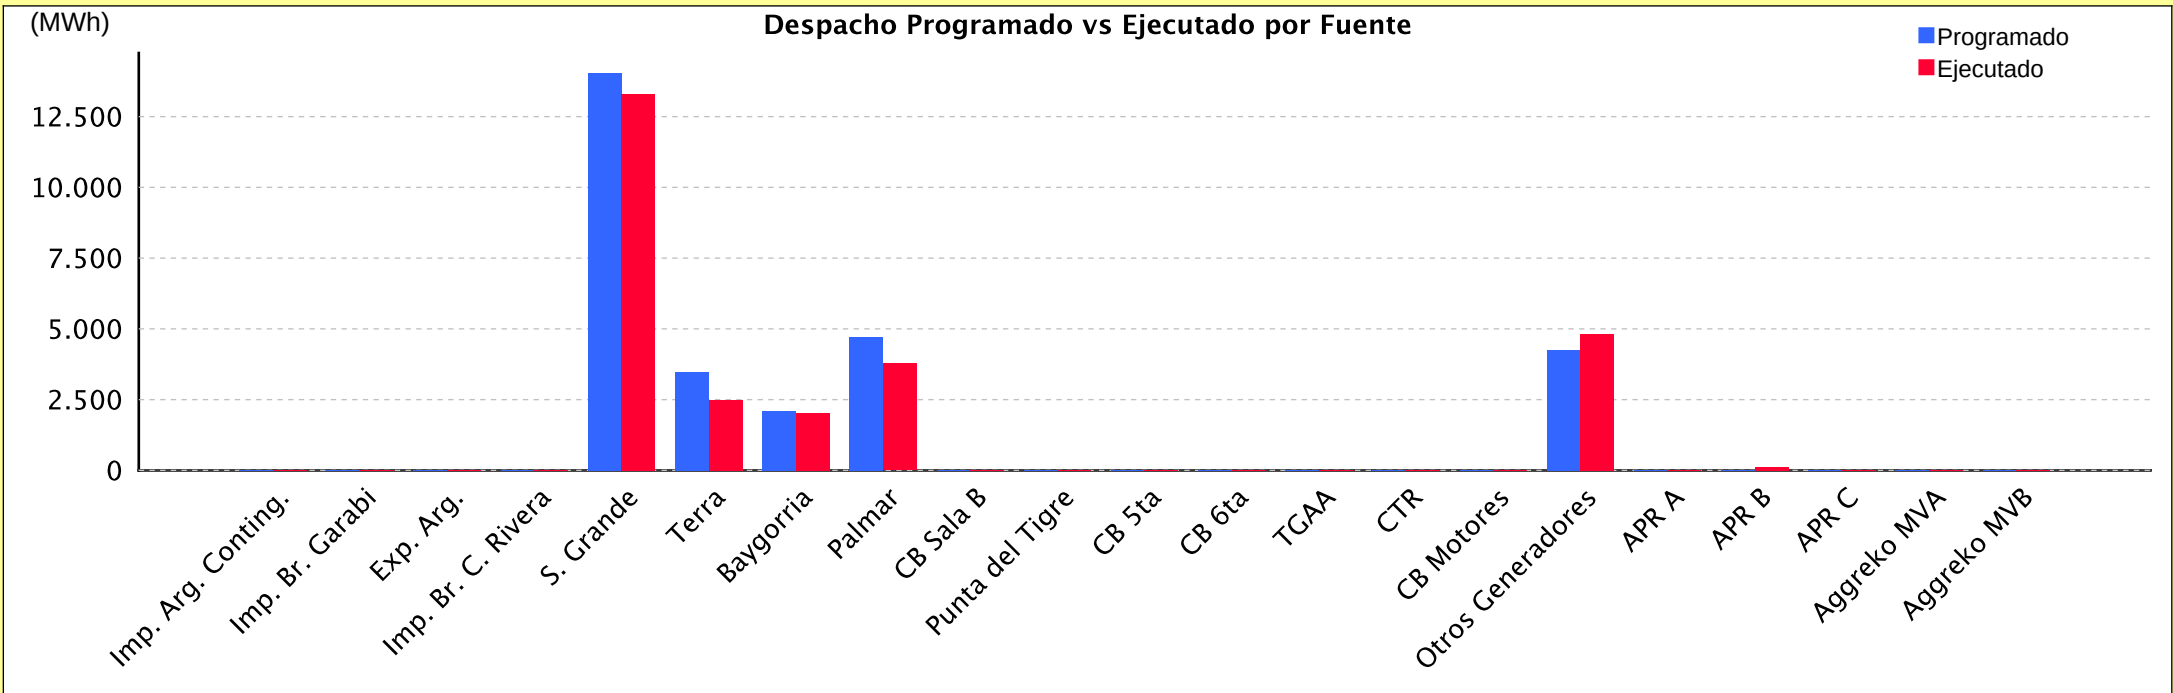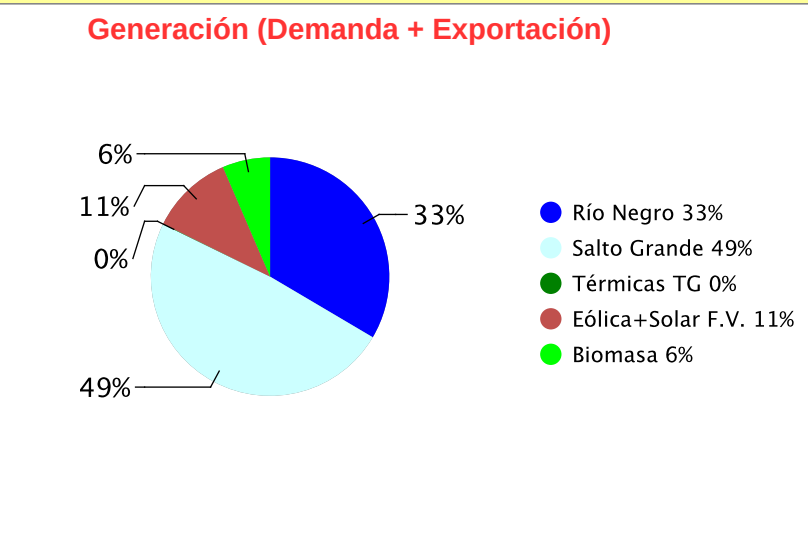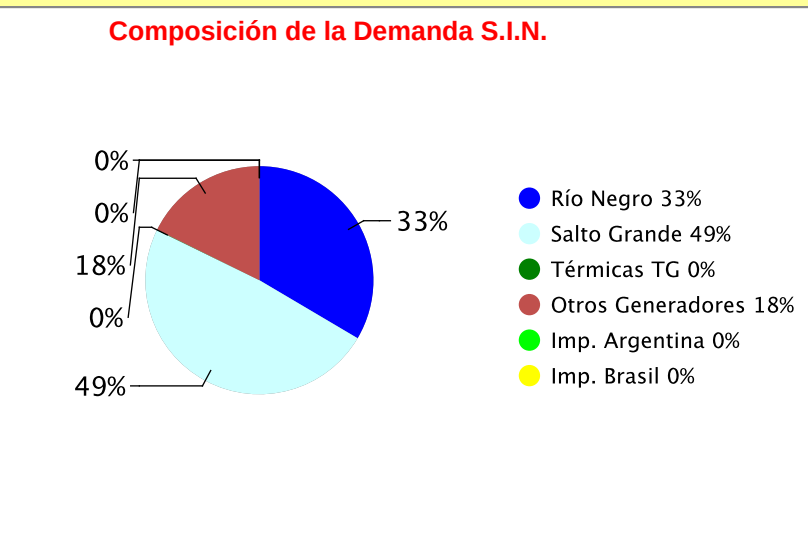



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

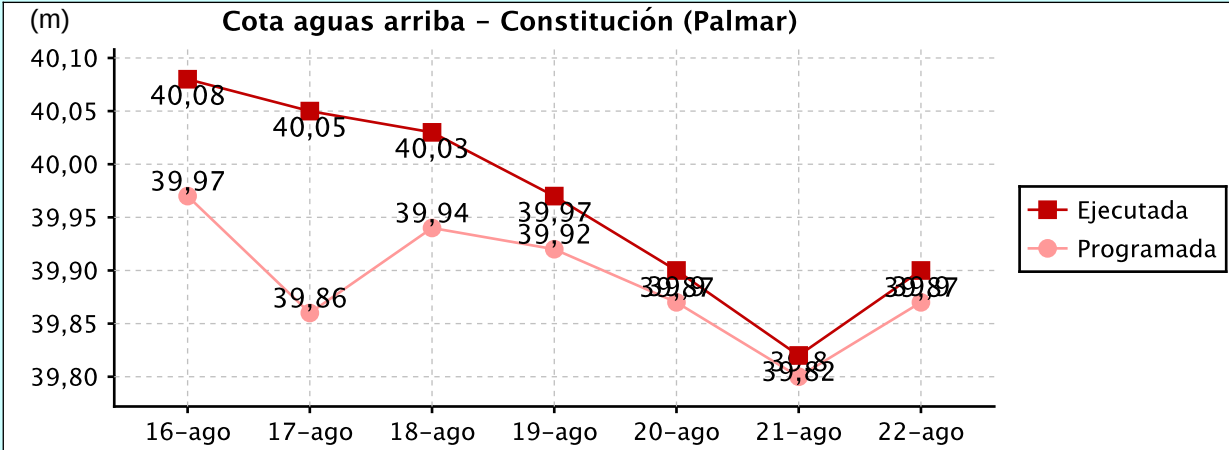
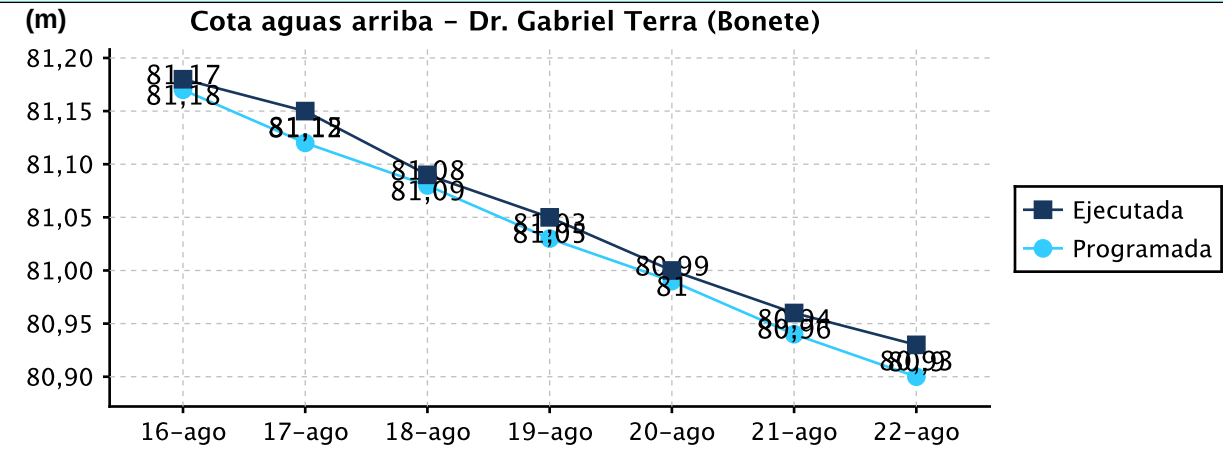


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,90	80,93
Baygorria	54,28	54,26
Palmar	39,87	39,9
SGU	35,54	35,57

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

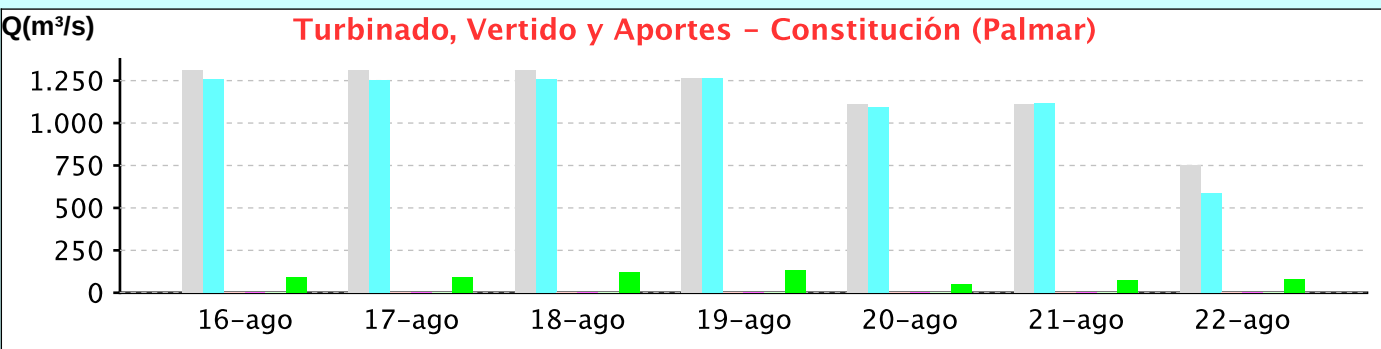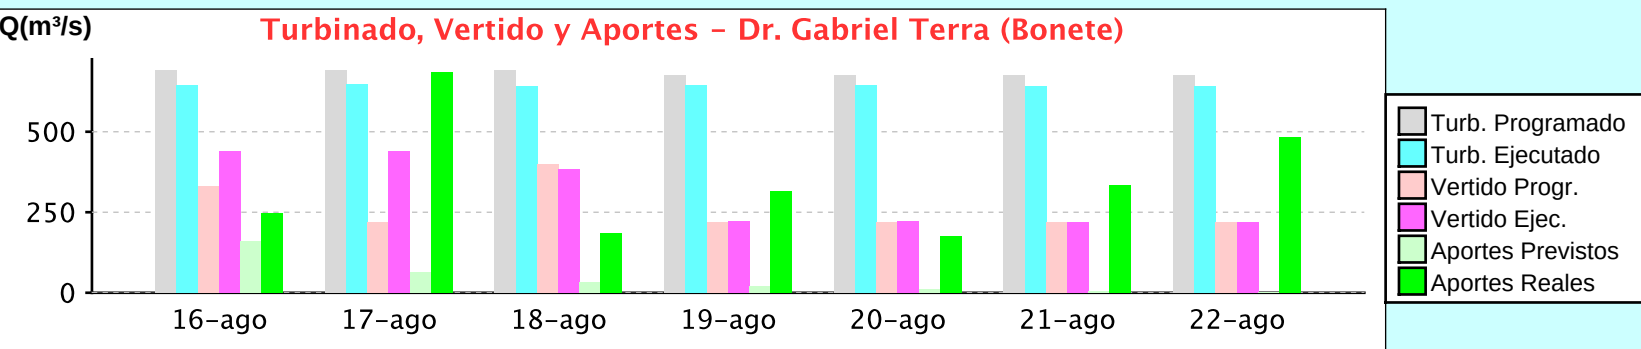

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

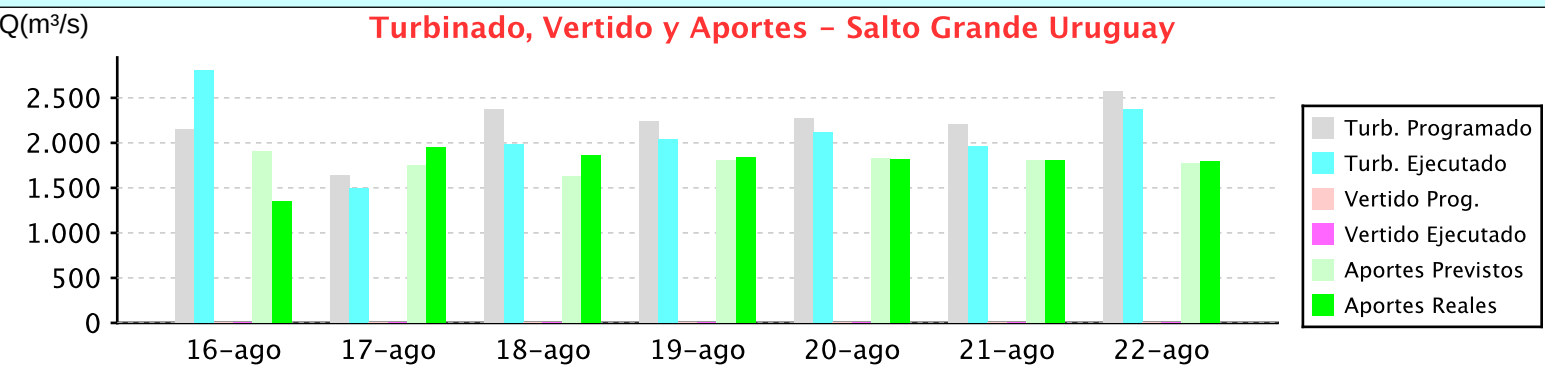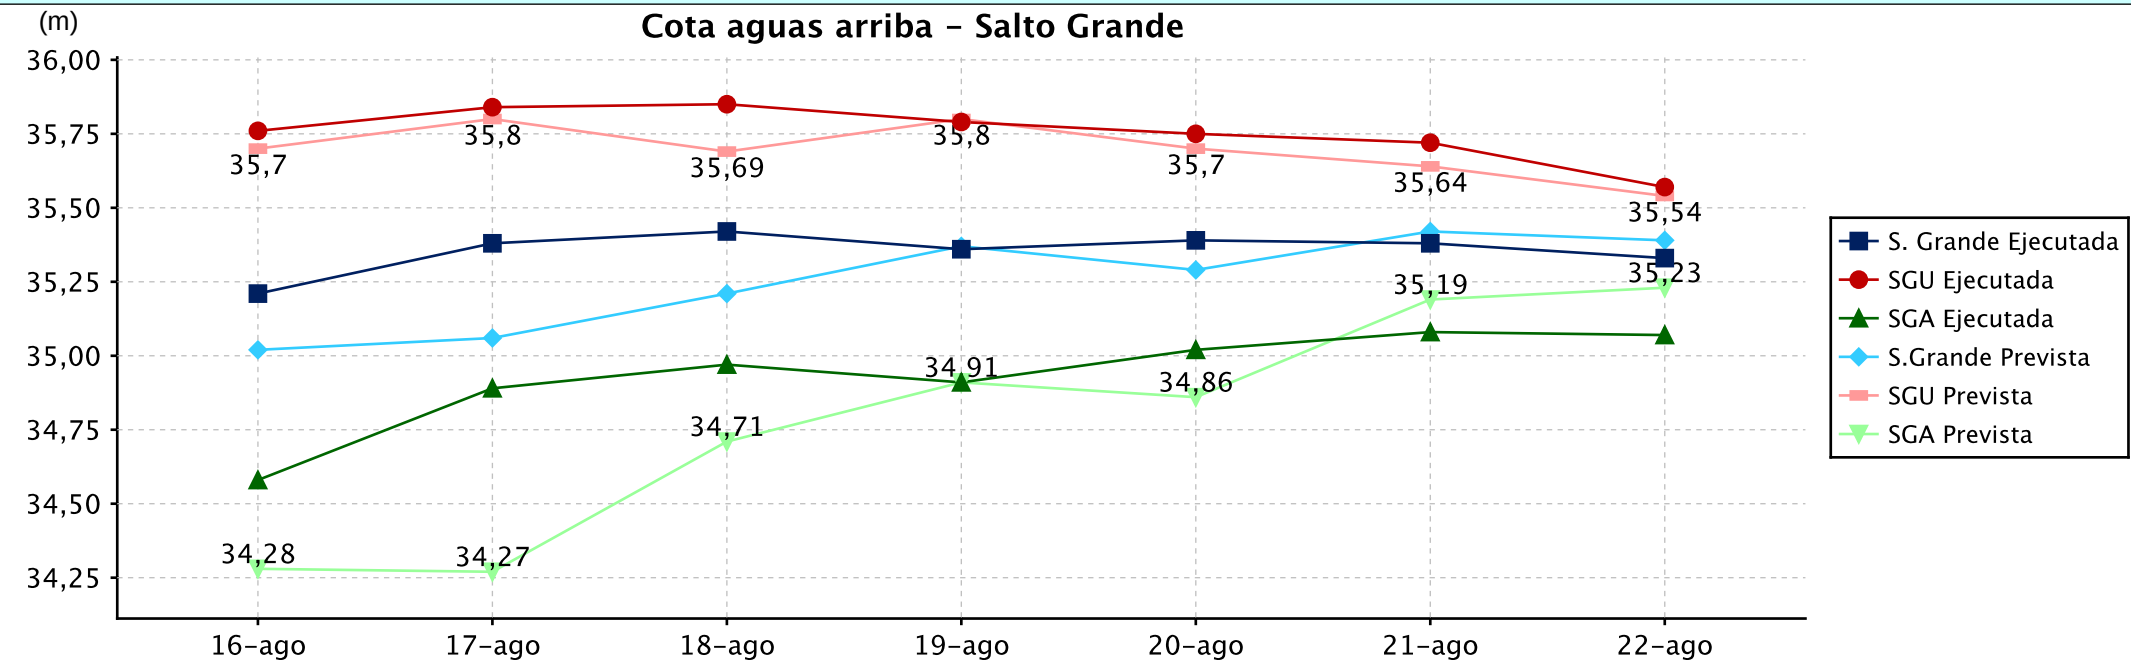

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,57
Cota Vista Arg	35,07
Cota real	35,33
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	12.151

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	675	641
Baygorria	773	714
Palmar	751	588
SGU	2.568	2.367

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	483
Baygorria	0	8
Palmar	0	81
SGU	1.775	1.799

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	218
Baygorria	0	111
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se generó con APR B por pruebas.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

26/08/2014 15:42
