



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 23 de agosto de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-89
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.336
C. Baygorria	2.193
C. Palmar	1.325
C. Salto Grande	11.181
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.646
TOTAL Generación	25.574

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.574
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.180
Diferencia (MWh)	394
Ejecutada - Programada	1,56 %

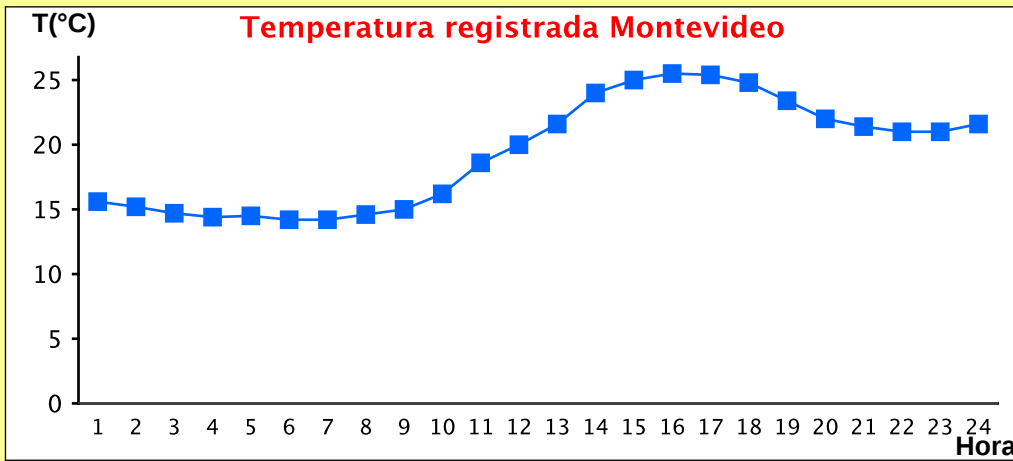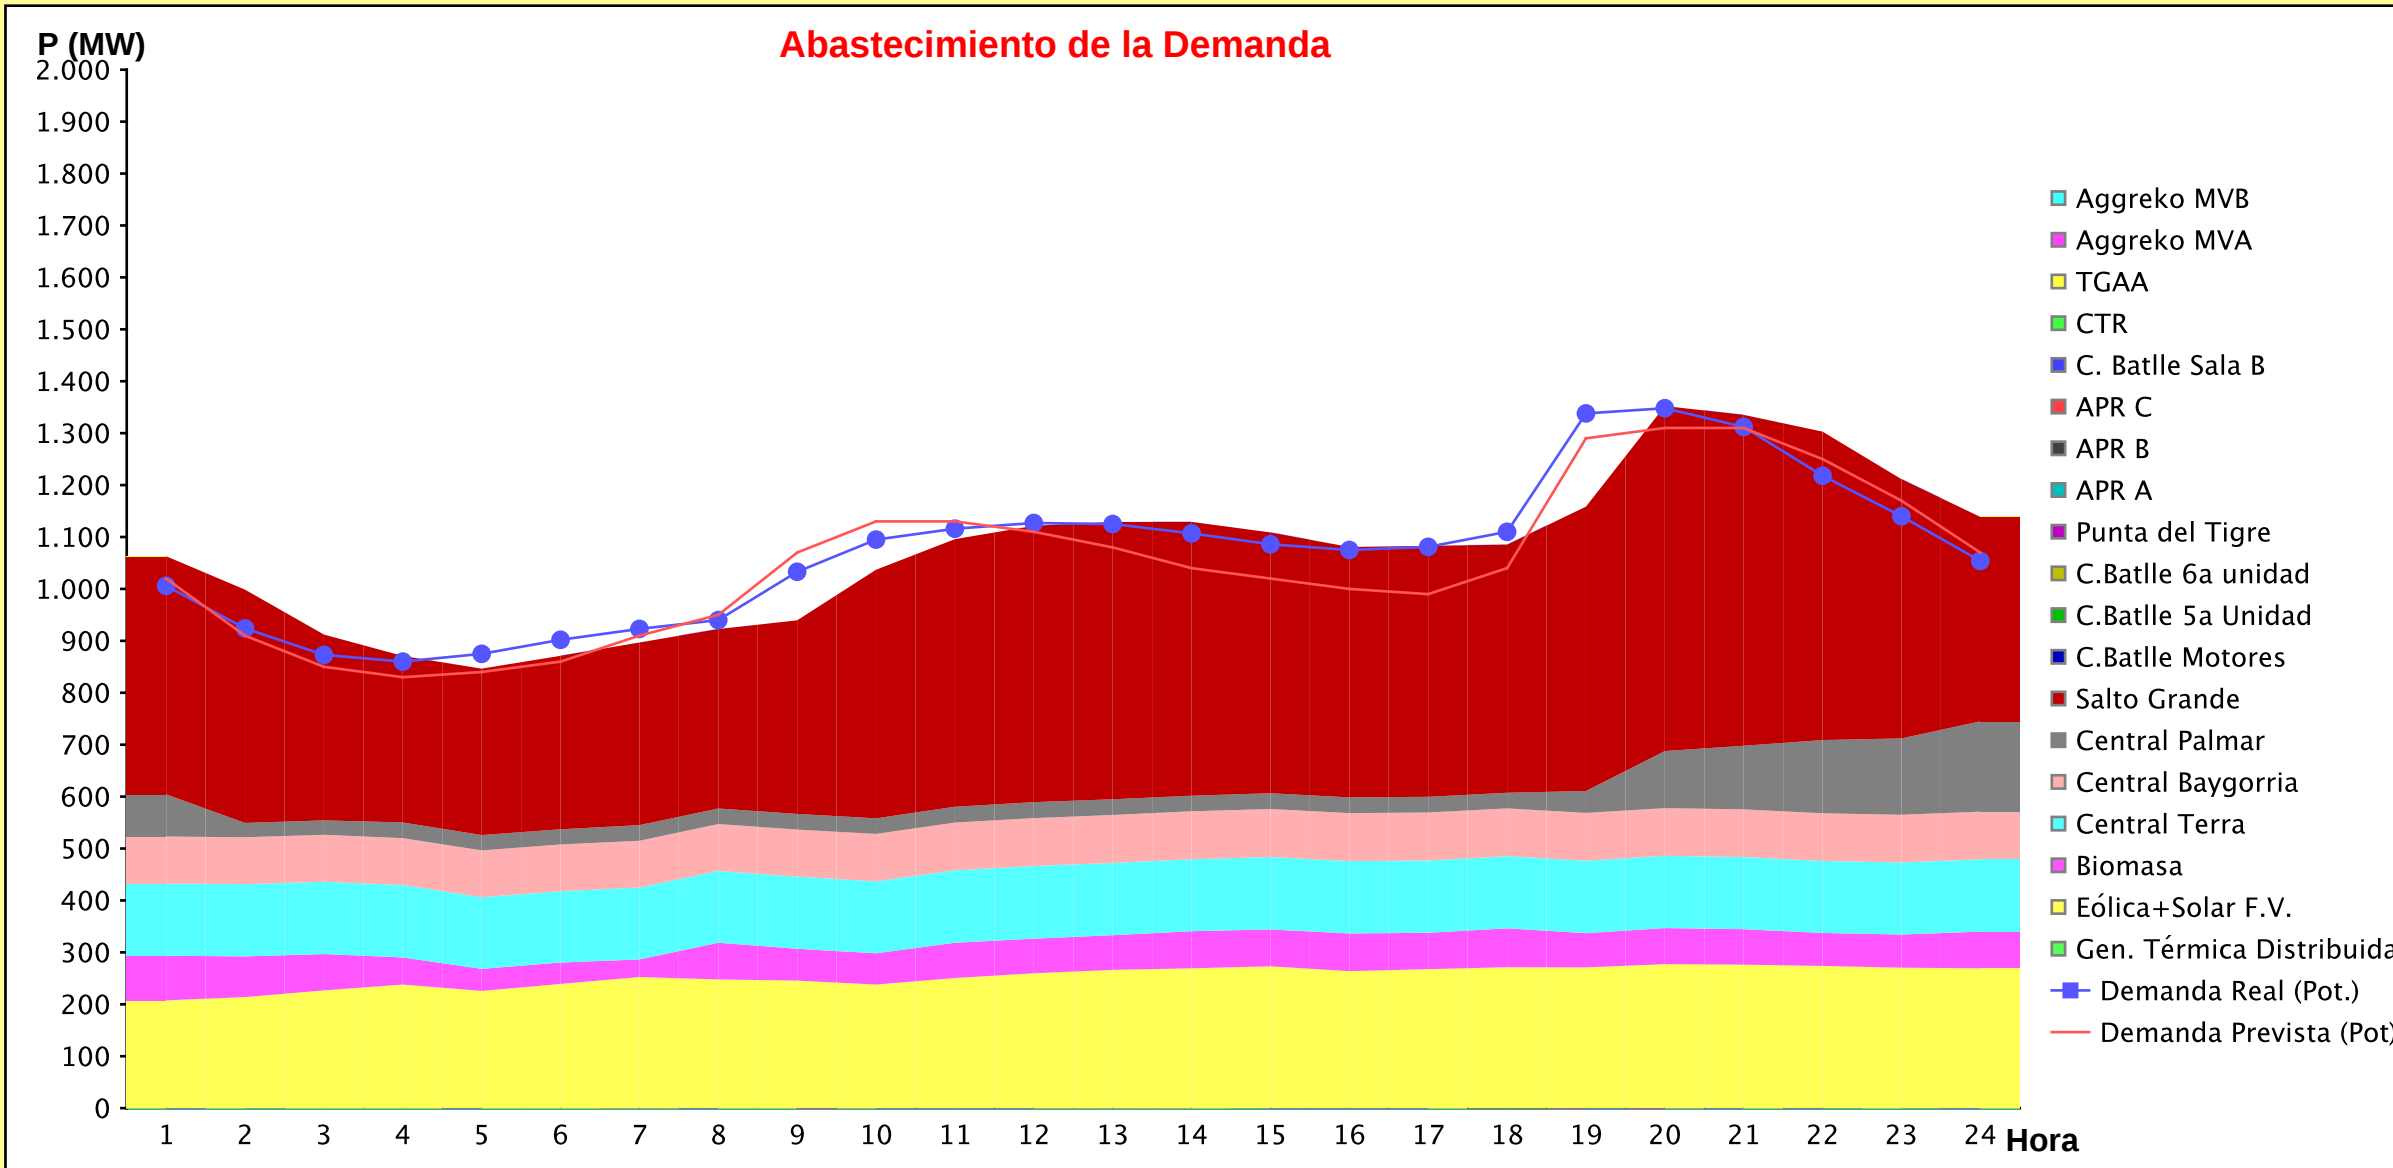



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1140,07 Hora 12:49
Potencia mínima:	849,78 Hora 04:09
Pico noche:	1357,67 Hora 19:29

Generación Media (MW)	
Eólica	254,0
Biomasa	66,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

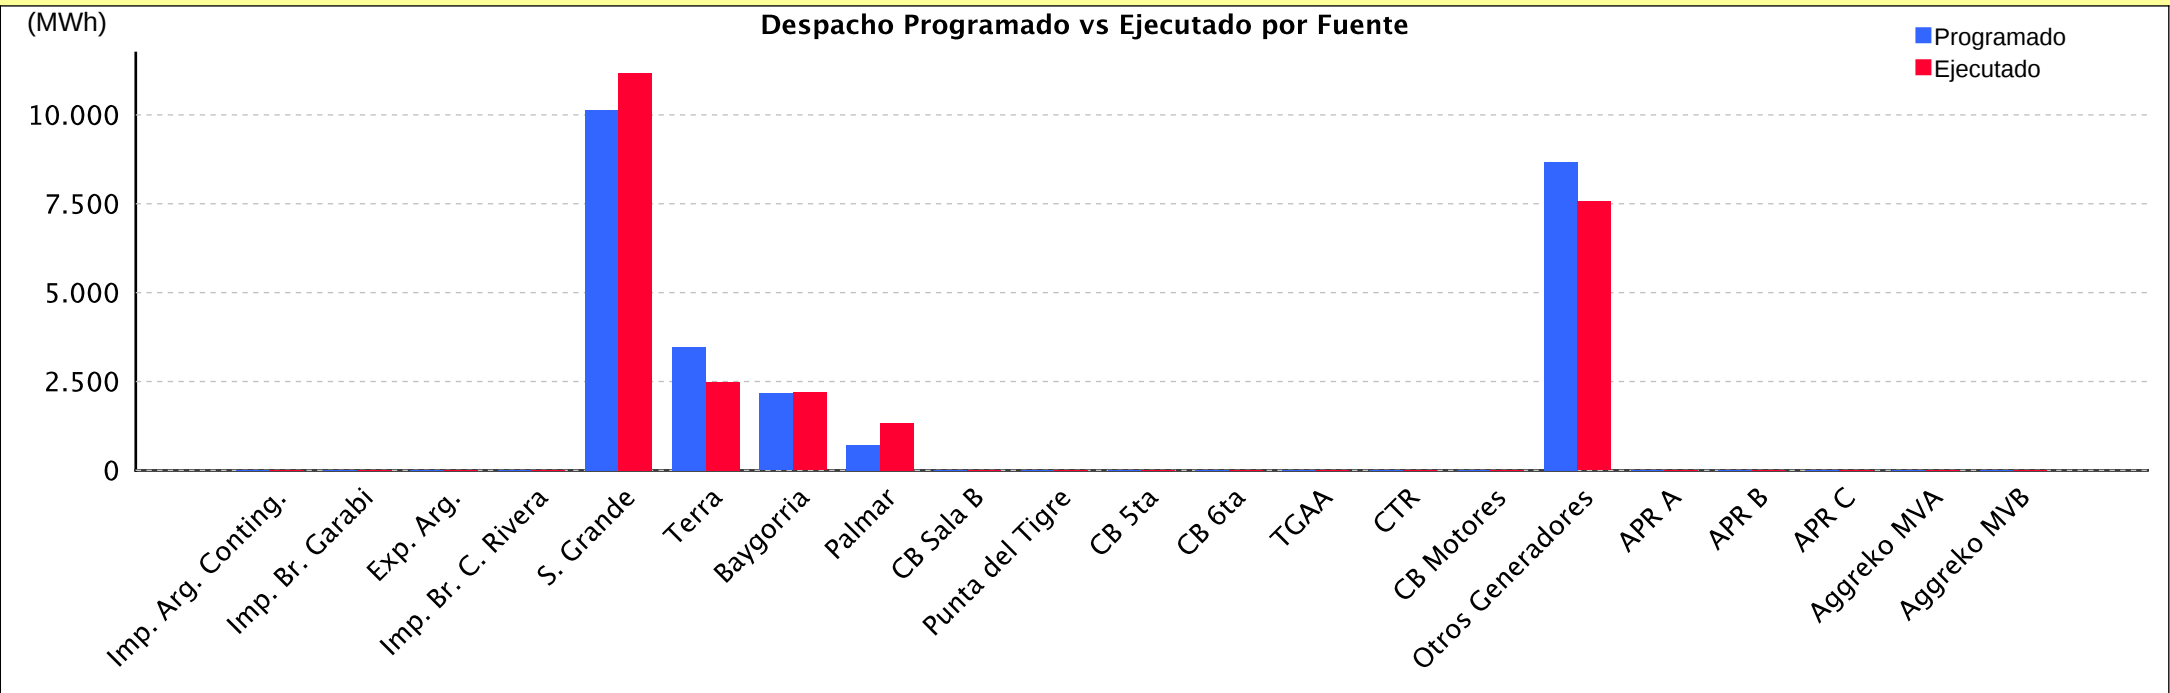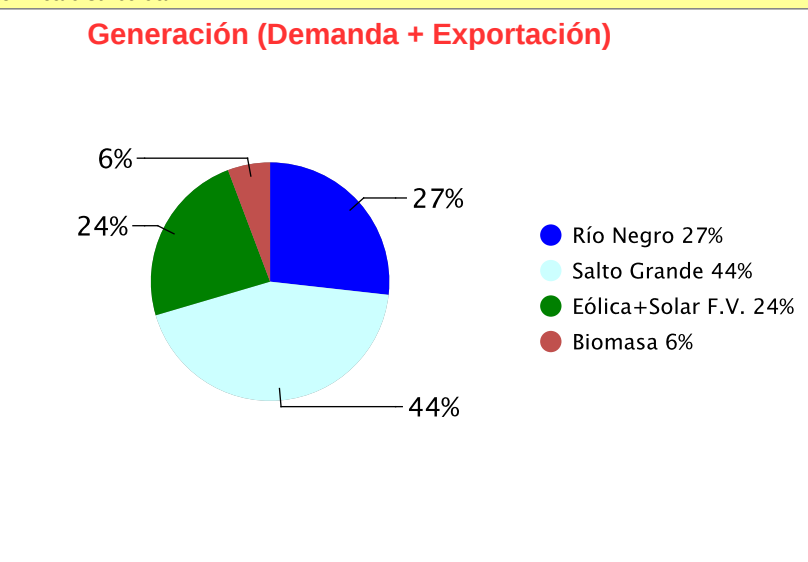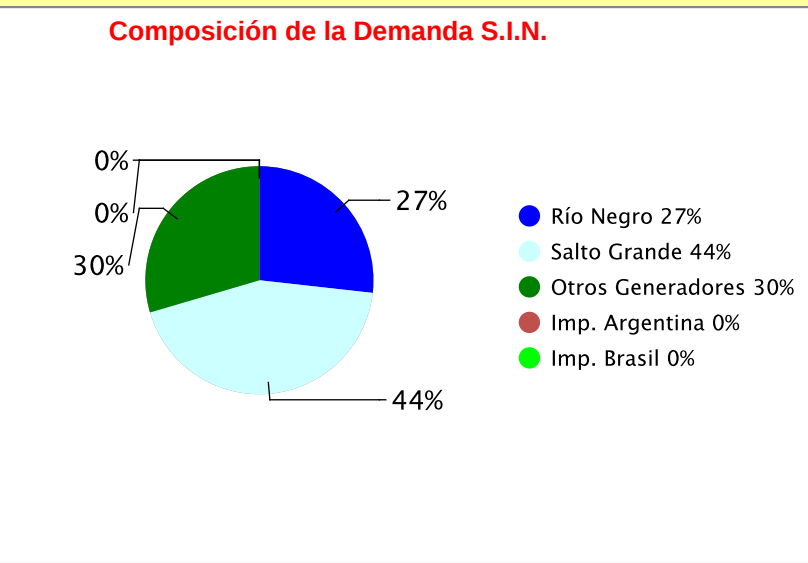



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

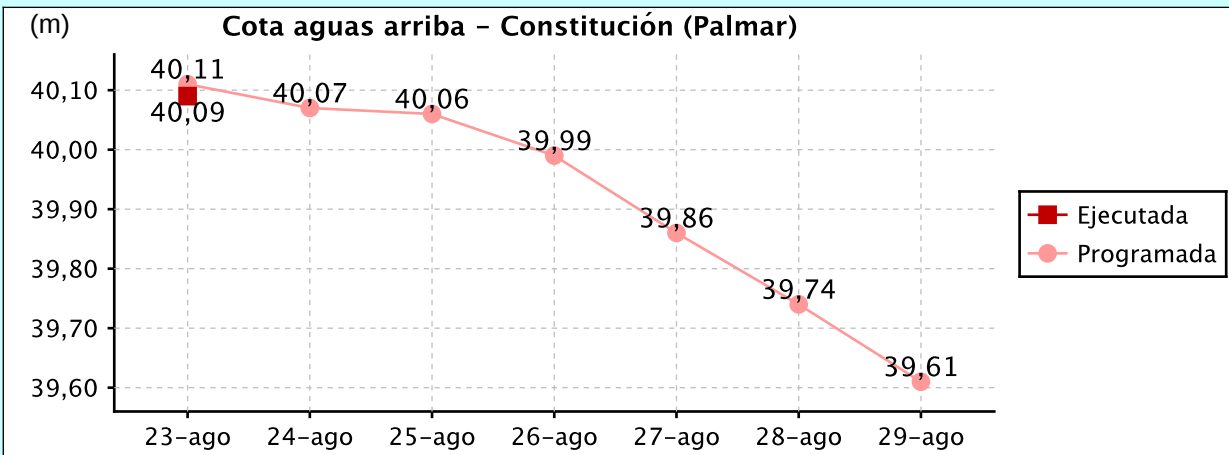
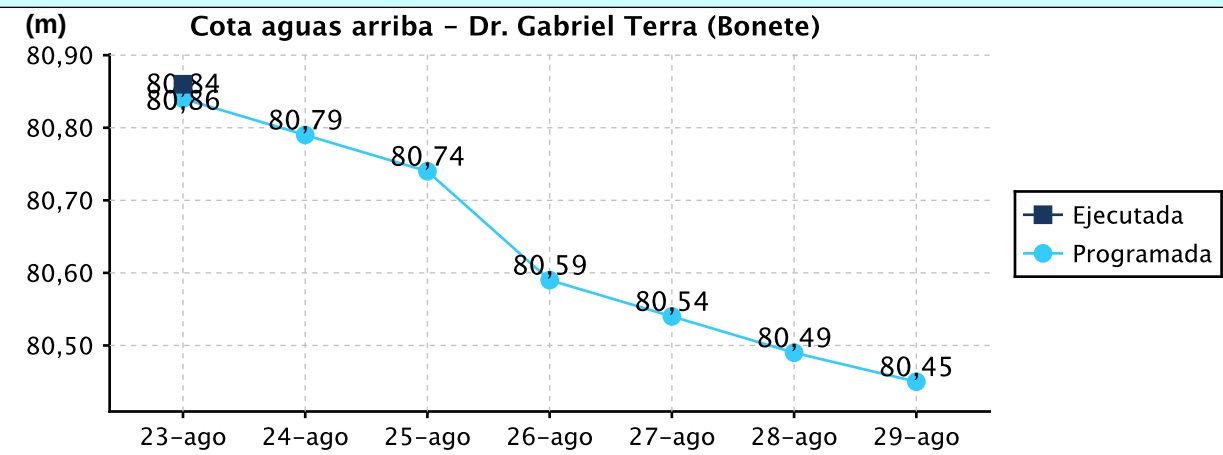


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,84	80,86
Baygorria	54,20	54,23
Palmar	40,11	40,09
SGU	35,51	35,53

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

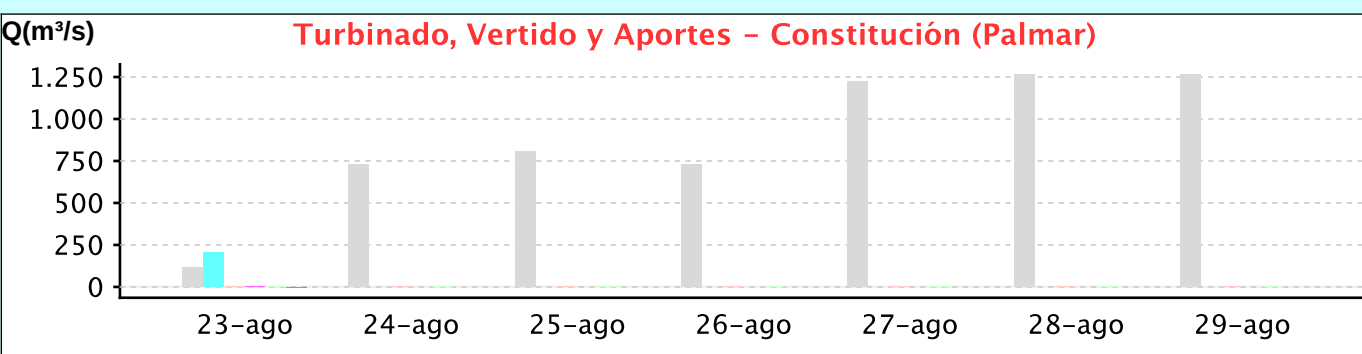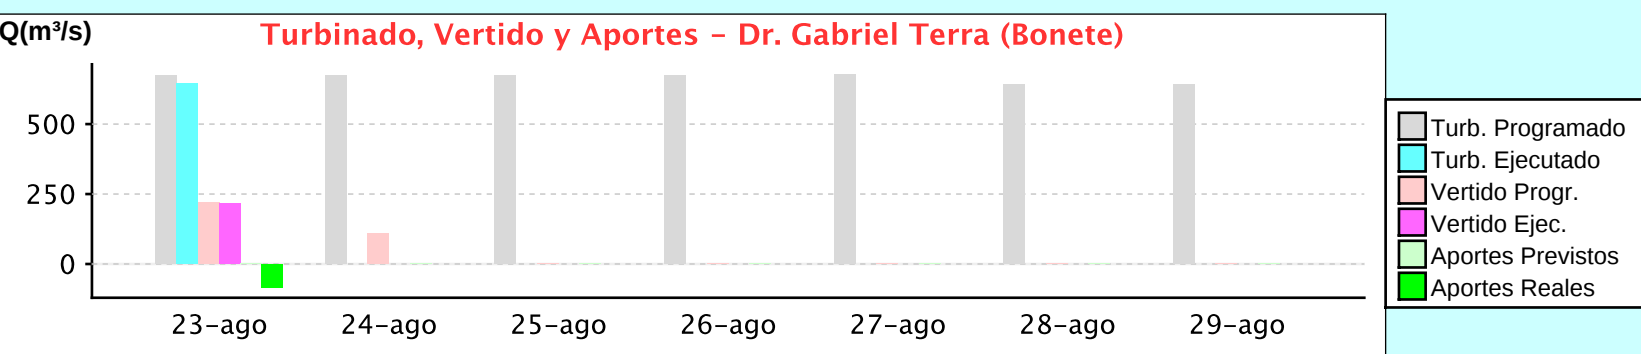

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

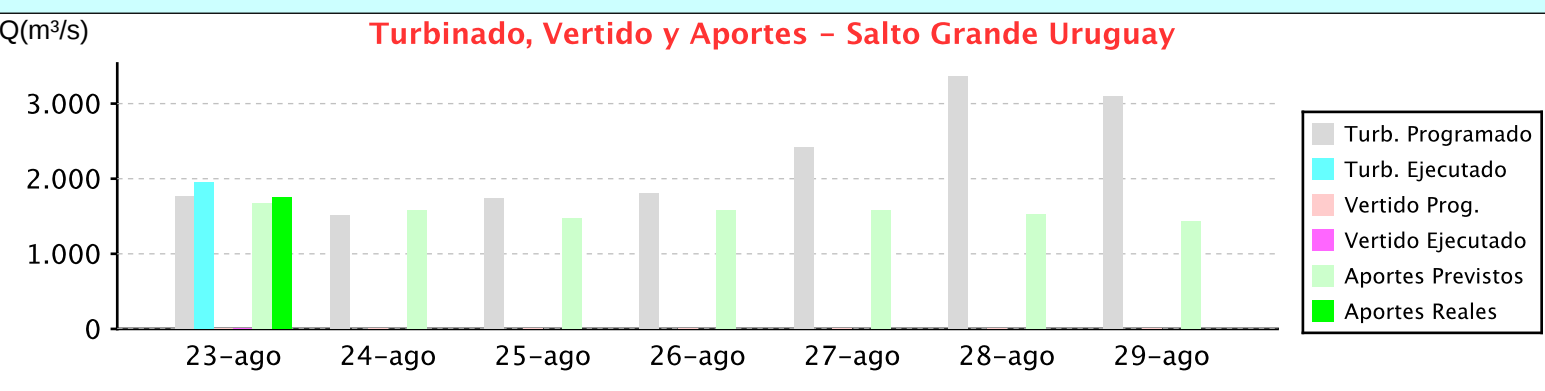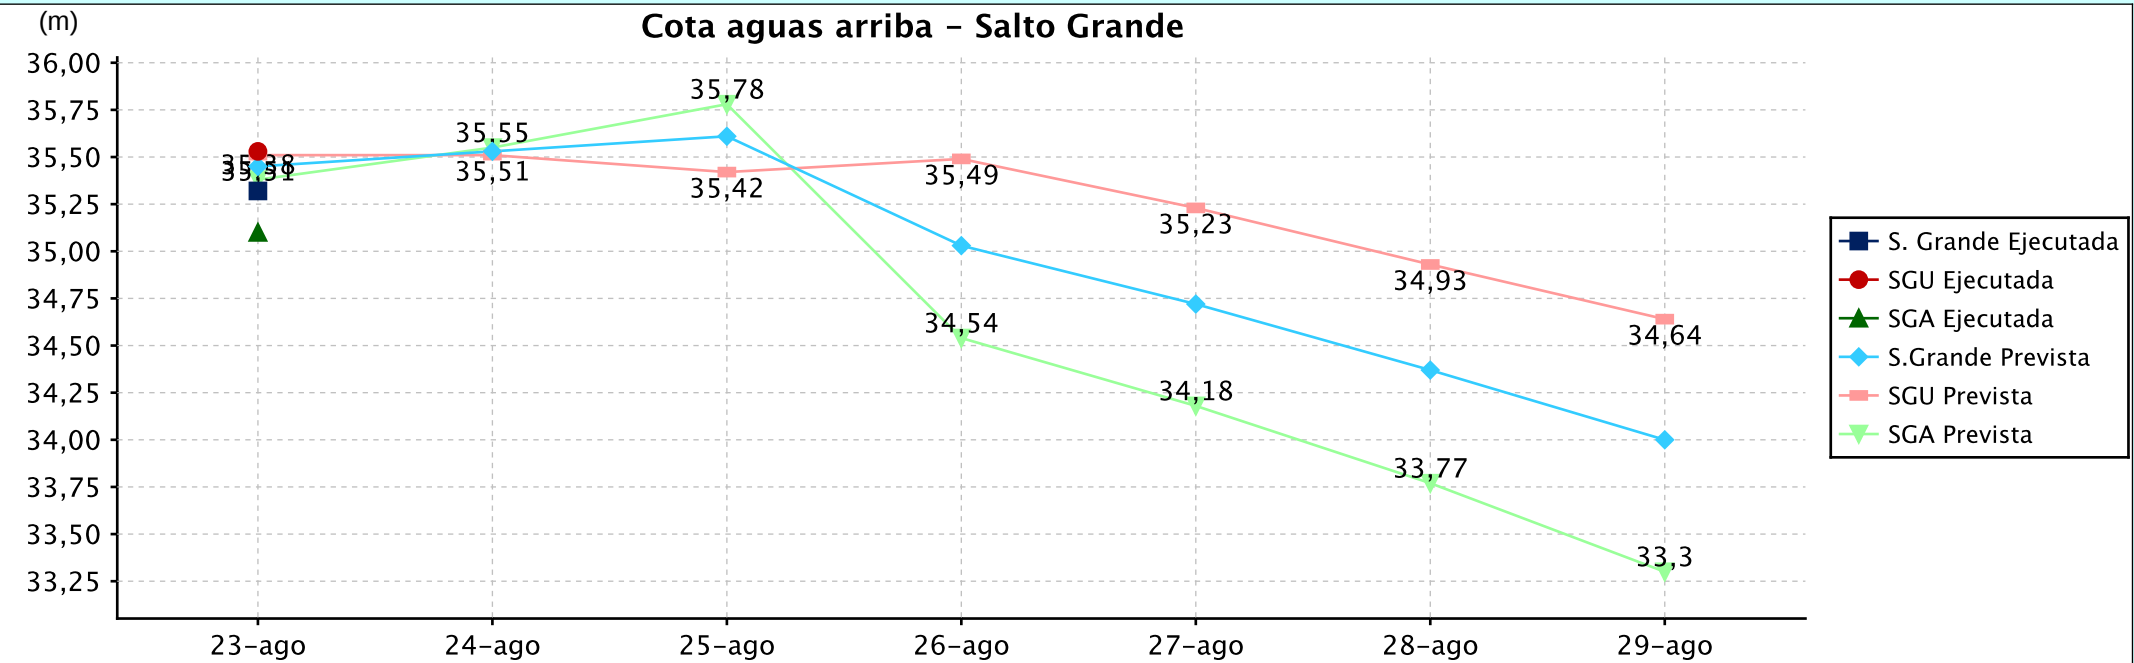

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,53
Cota Vista Arg	35,10
Cota real	35,32
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	10.312

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	675	644
Baygorria	795	771
Palmar	115	206
SGU	1.764	1.956

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-83
Baygorria	0	-3
Palmar	0	-1
SGU	1.675	1.750

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	217
Baygorria	200	114
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
