



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO  
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 24 de agosto de 2014

| Generación Térmica    |        |
|-----------------------|--------|
| Central Battle        | -4     |
| Sala B                | -4     |
| 5ta.                  | 0      |
| 6ta.                  | 0      |
| Motores               | -0     |
| Central La Tablada    | -93    |
| Central P. del Tigre  | -9     |
| APR A                 | -2     |
| APR B                 | -2     |
| APR C                 | 0      |
| Aggreko               | -1     |
| Aggreko MVA           | -1     |
| Aggreko MVB           | -0     |
| Central Maldonado     | 0      |
| Generación Hidráulica |        |
| C.G.Terra             | 3.305  |
| C. Baygorria          | 2.180  |
| C. Palmar             | 4.719  |
| C. Salto Grande       | 7.298  |
| Importación (MWh)     |        |
| Argentina             | 0      |
| Contingente           | 0      |
| Brasil                | 0      |
| Rivera                | 0      |
| SADI                  | 0      |
| Otros Generadores     |        |
| Otros Generadores     | 6.055  |
| TOTAL Generación      | 23.446 |

| Exportación (MWh)       |   |
|-------------------------|---|
| Exportación a Arg.      | 0 |
| Hidráulica              | 0 |
| Térmica                 | 0 |
| Exportación a Brasil    | 0 |
| TOTAL Exportación (MWh) | 0 |




|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)                              | 23.446 |
| (en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) |        |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Demanda Programada (MWh) | 25.150  |
| Diferencia (MWh)         | -1.704  |
| Ejecutada - Programada   | -6,77 % |

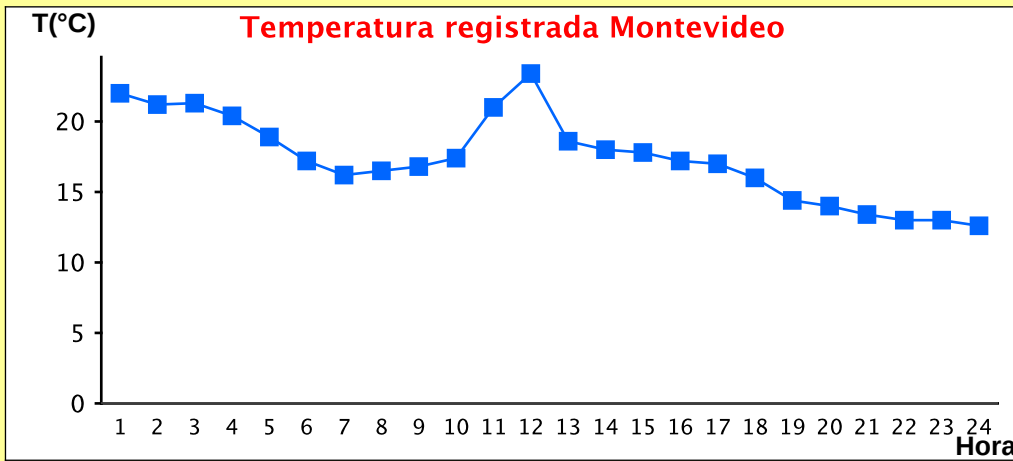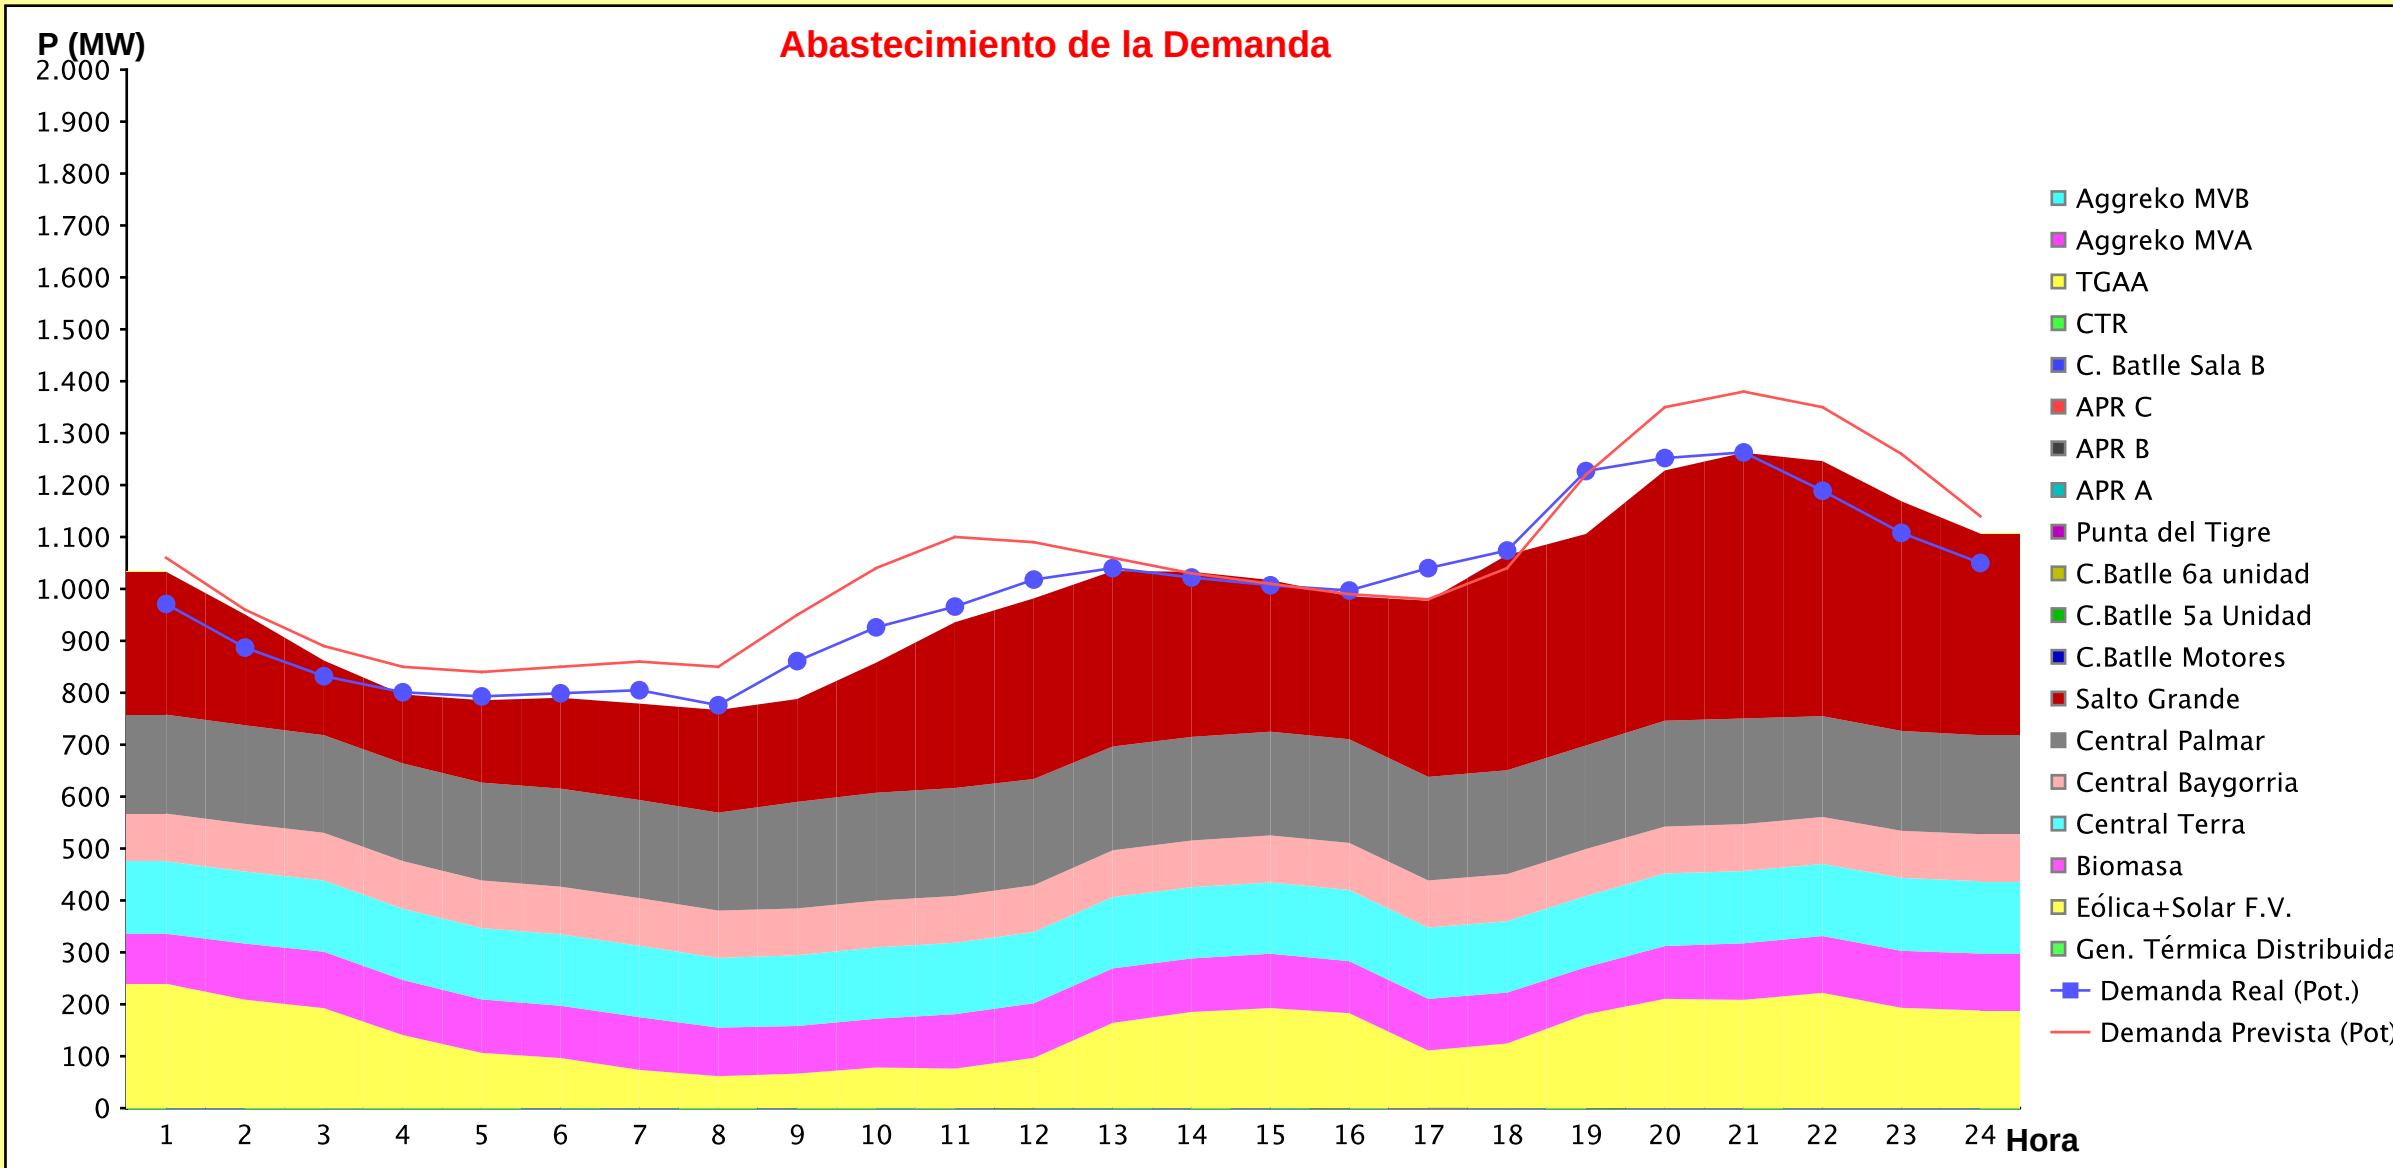



| Picos de Potencia (MW) |                    |
|------------------------|--------------------|
| Pico mediodía:         | 1046,16 Hora 12:57 |
| Potencia mínima:       | 744,76 Hora 07:34  |
| Pico noche:            | 1272,9 Hora 20:35  |

| Generación Media (MW)  |       |
|------------------------|-------|
| Eólica                 | 150,3 |
| Biomasa                | 102,3 |
| Solar fotovoltaica     | 0,0   |
| Térmica distribuida    | 0,0   |
| Imp. Brasil Conversora | 0,0   |
| Imp. Argentina         | 0,0   |

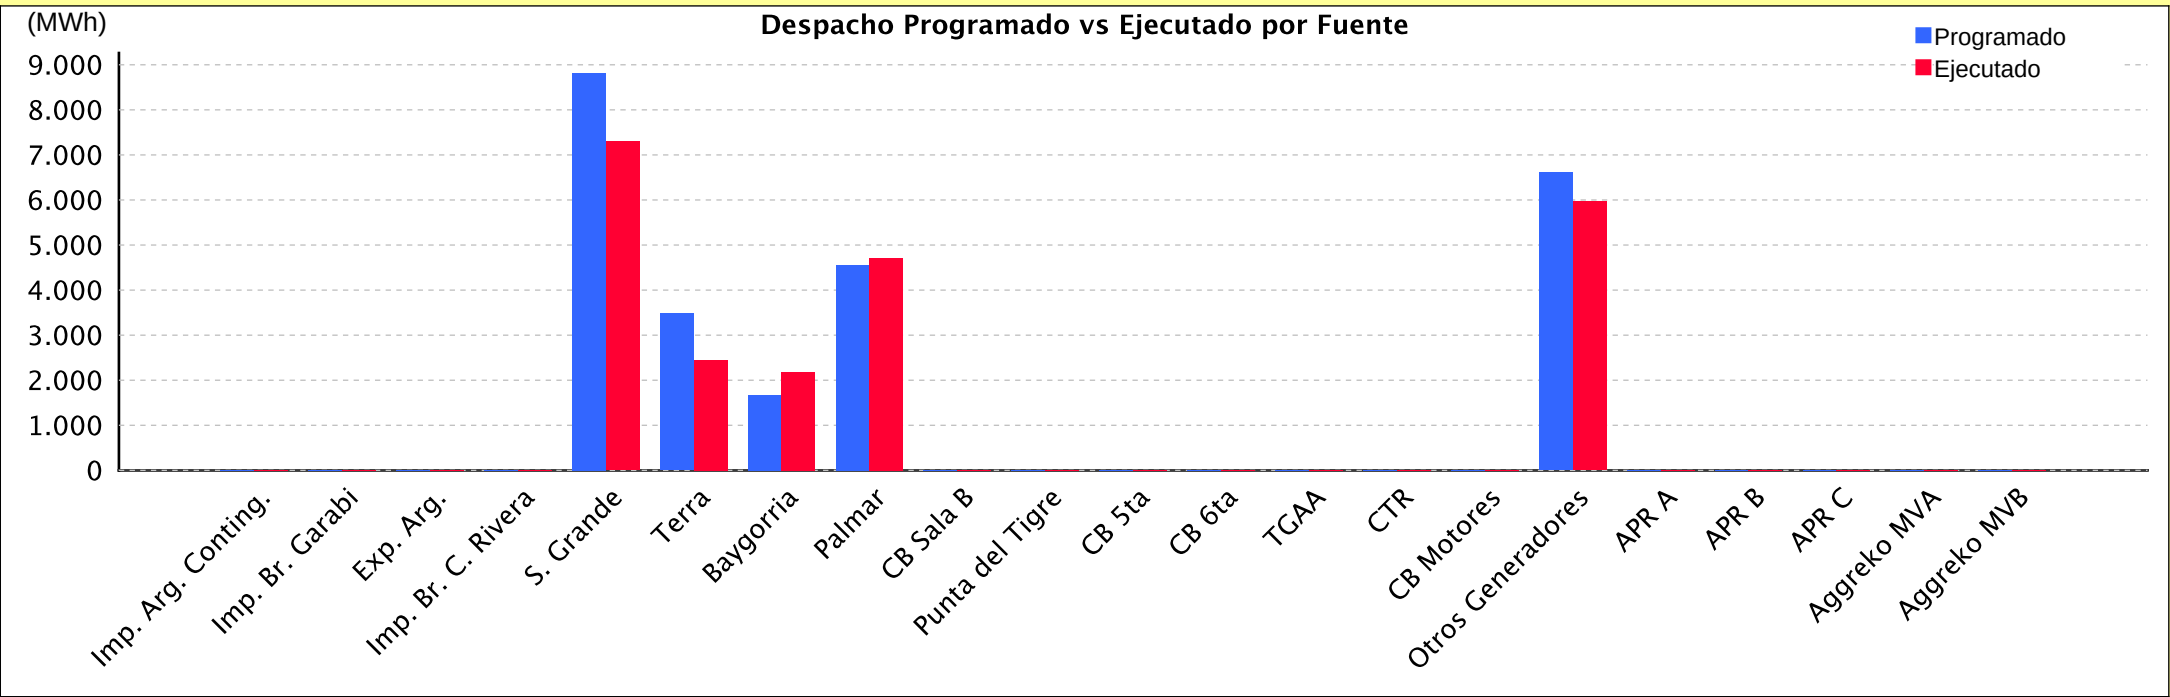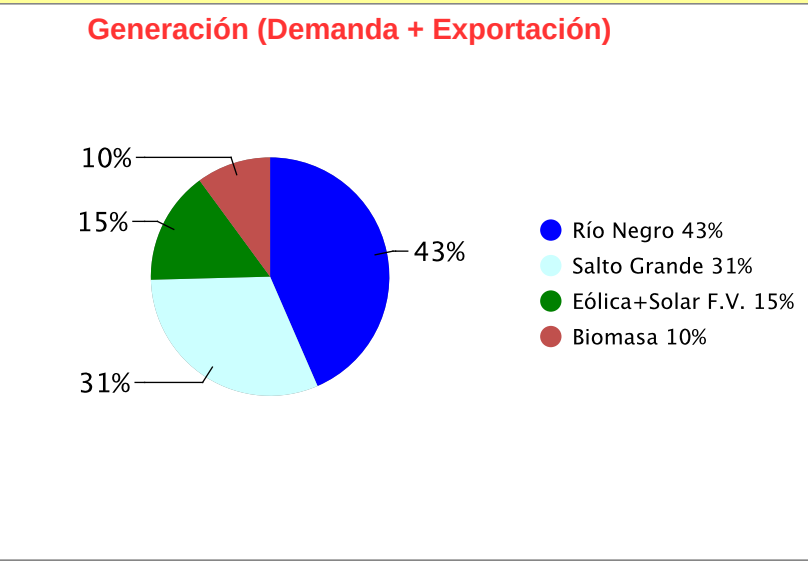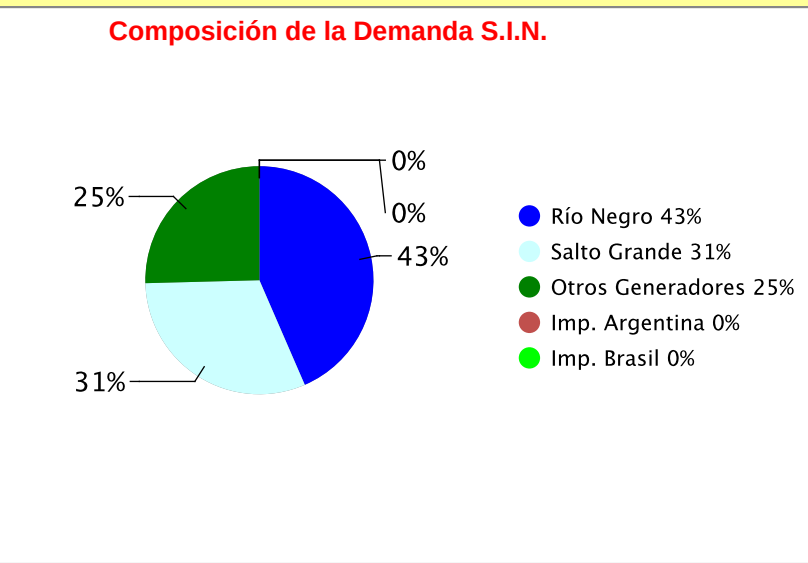



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

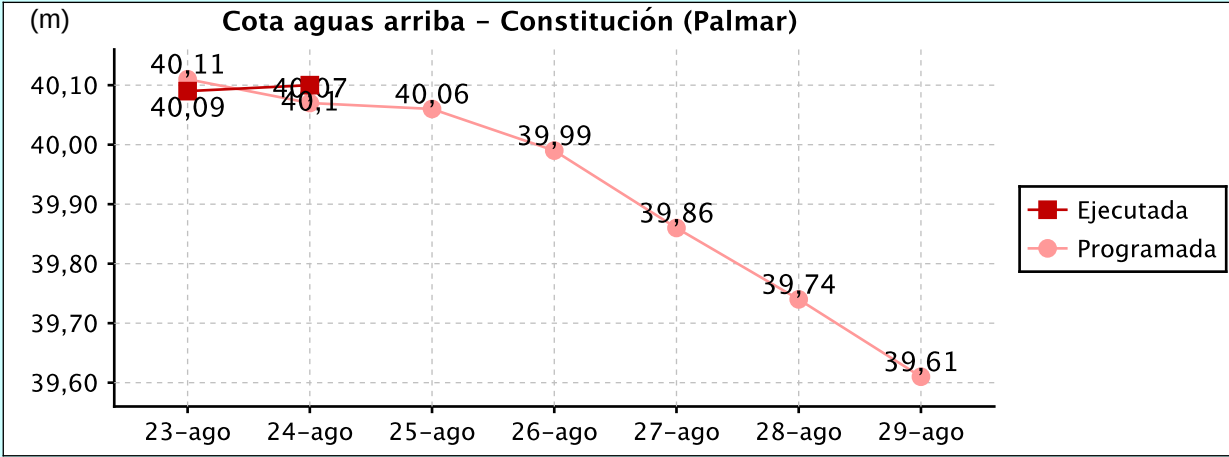
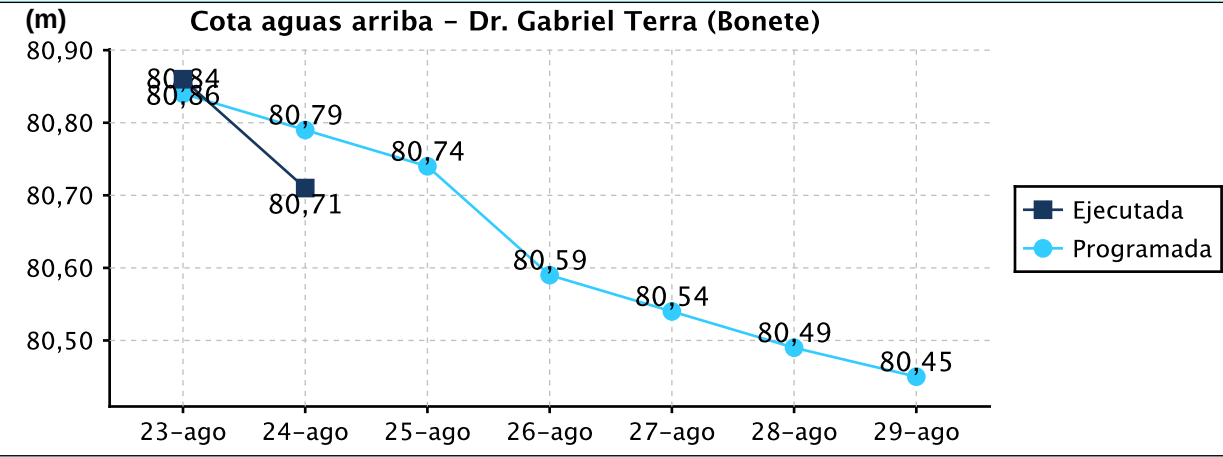


| COTA FINAL | Prevista | Ejecutada |
|------------|----------|-----------|
| Represa    | (m)      | (m)       |
| Terra      | 80,79    | 80,71     |
| Baygorria  | 54,30    | 54,26     |
| Palmar     | 40,07    | 40,1      |
| SGU        | 35,51    | 35,58     |

| Valores de Referencia (operación normal) |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Represa                                  | Cota Min m | Cota Max m |
| Terra                                    | 70         | 80,7       |
| Baygorria                                | 53         | 54,5       |
| Palmar                                   | 36         | 40         |
| Salto Grande                             | 30         | 35         |

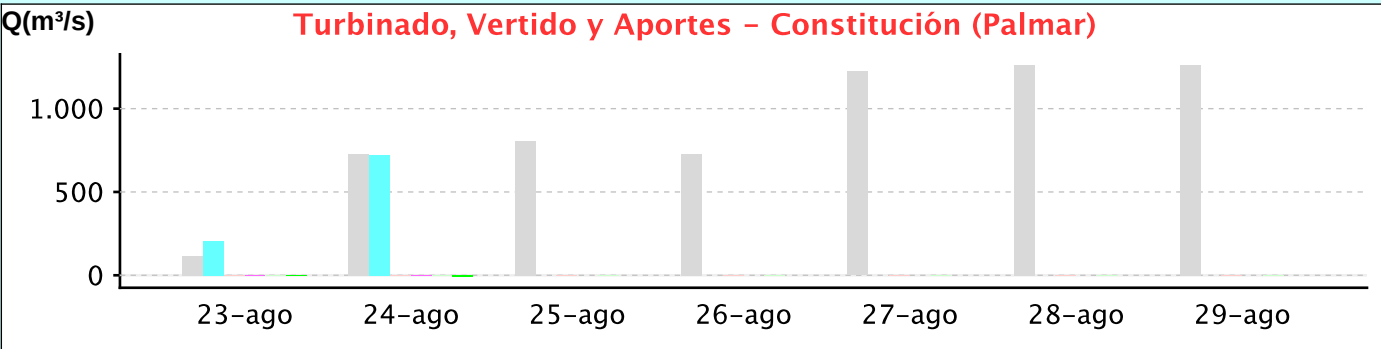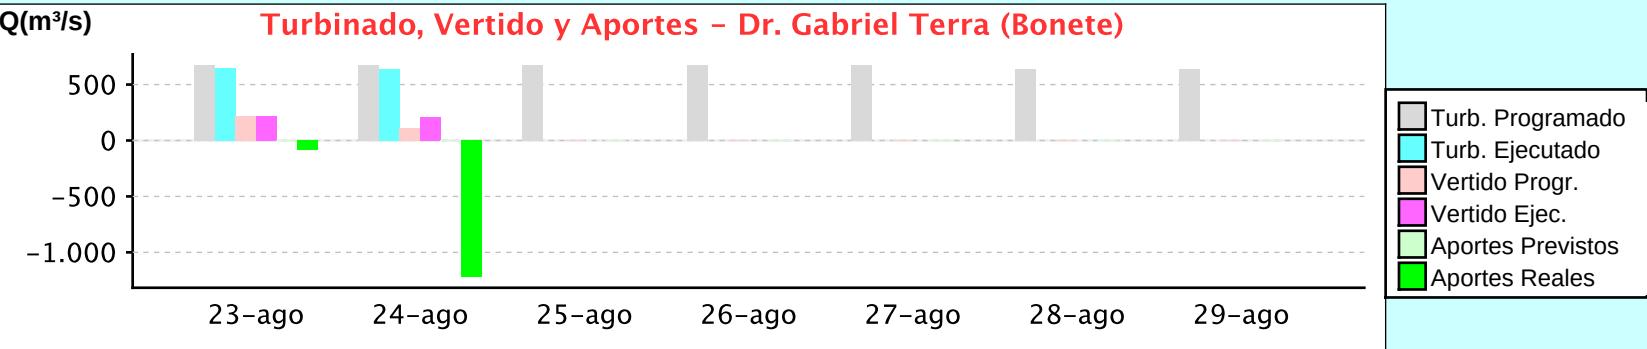

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

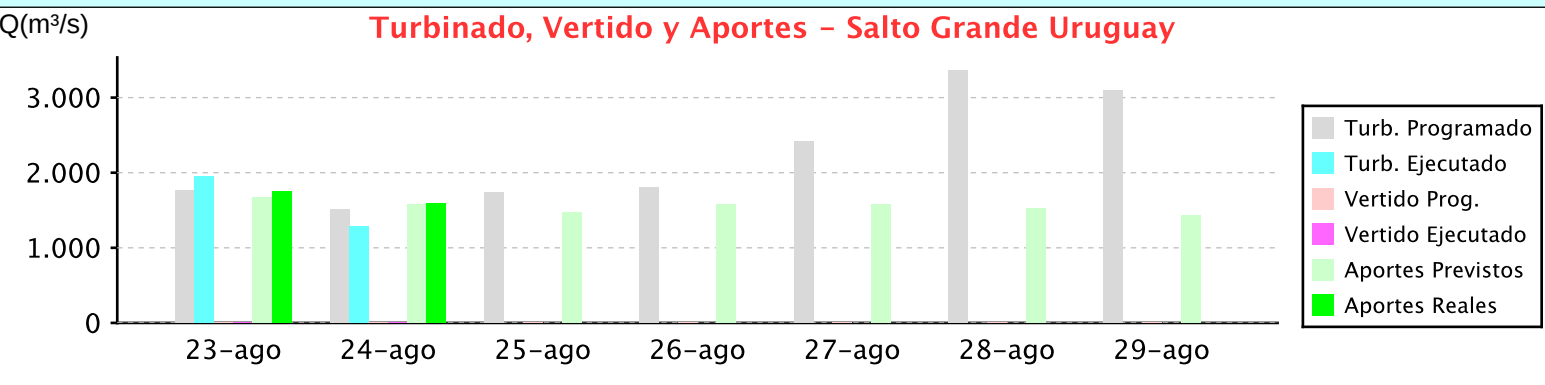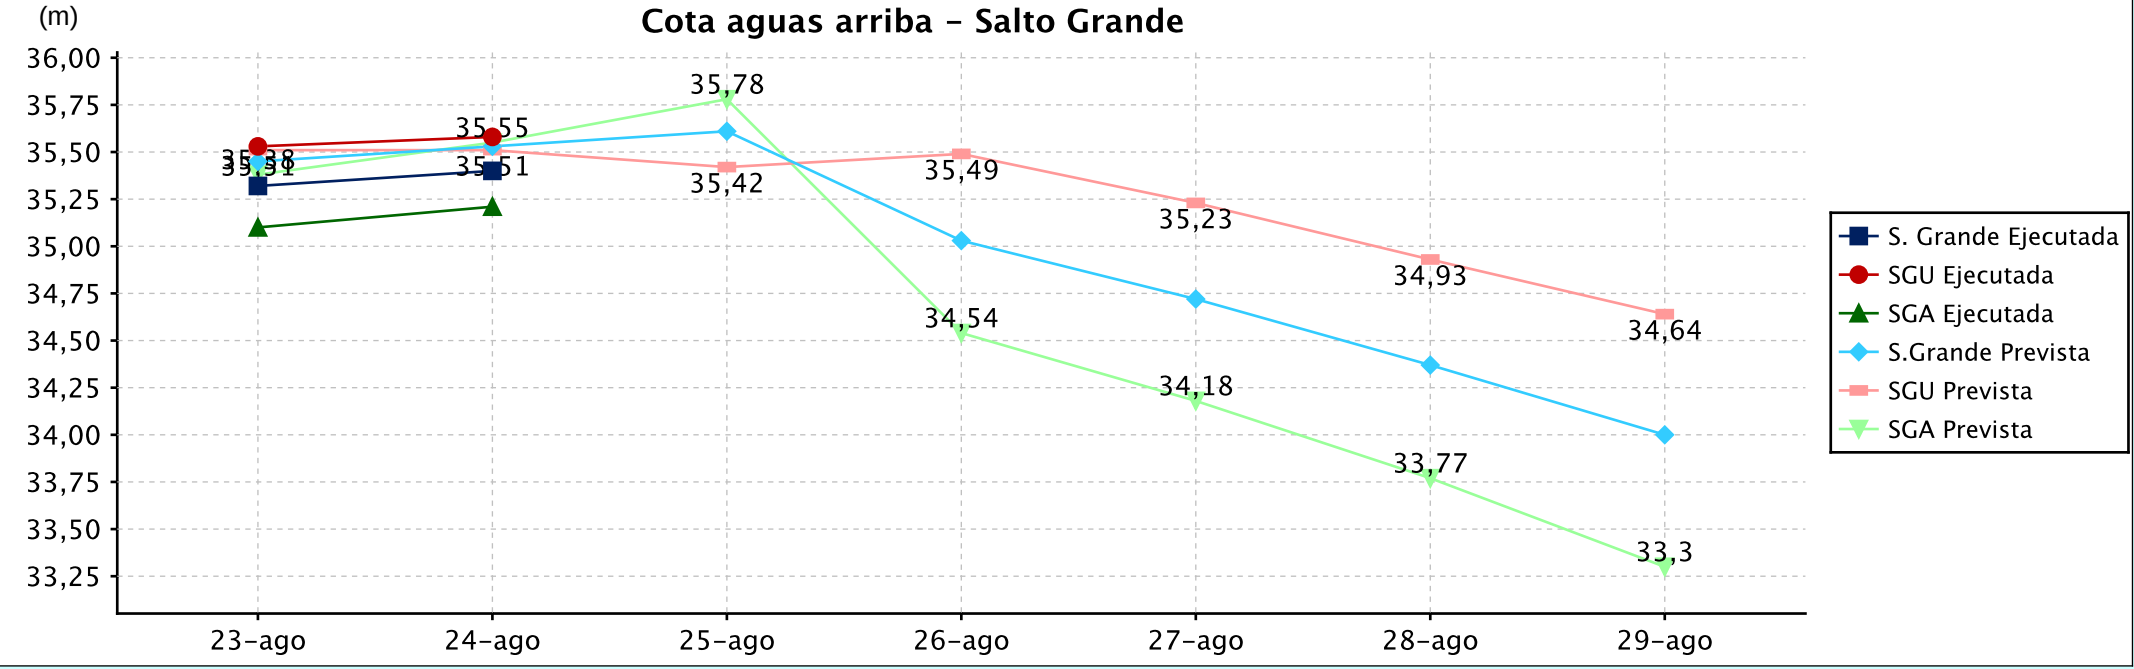

| VALORES CTM                        |       |
|------------------------------------|-------|
| Cotas                              | (m)   |
| Cota Vista Uru                     | 35,58 |
| Cota Vista Arg                     | 35,21 |
| Cota real                          | 35,40 |
| Dif. Energ. (U-A)<br>Acumulado MWh | 8.900 |

| TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 675      | 642       |
| Baygorria | 618      | 786       |
| Palmar    | 729      | 722       |
| SGU       | 1.509    | 1.289     |

| APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
|-----------------|-----------|--------|
| Represa         | (m³/s)    | (m³/s) |
| Terra           | 0         | -1.222 |
| Baygorria       | 0         | -27    |
| Palmar          | 0         | -11    |
| SGU             | 1.575     | 1.594  |

| VERTIDO   | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 110      | 214       |
| Baygorria | 0        | 0         |
| Palmar    | 0        | 0         |
| SGU       | 0        | 0         |

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
