



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 25 de agosto de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-90
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-0
Aggreko MVA	0
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.332
C. Baygorria	2.182
C. Palmar	3.507
C. Salto Grande	8.558
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.180
TOTAL Generación	25.652

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.652
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.470
Diferencia (MWh)	-3.818
Ejecutada - Programada	-12,96 %

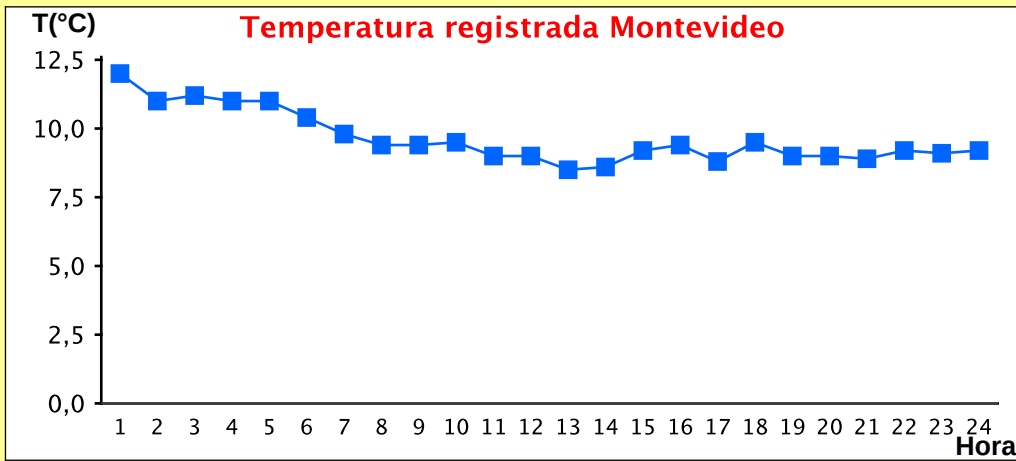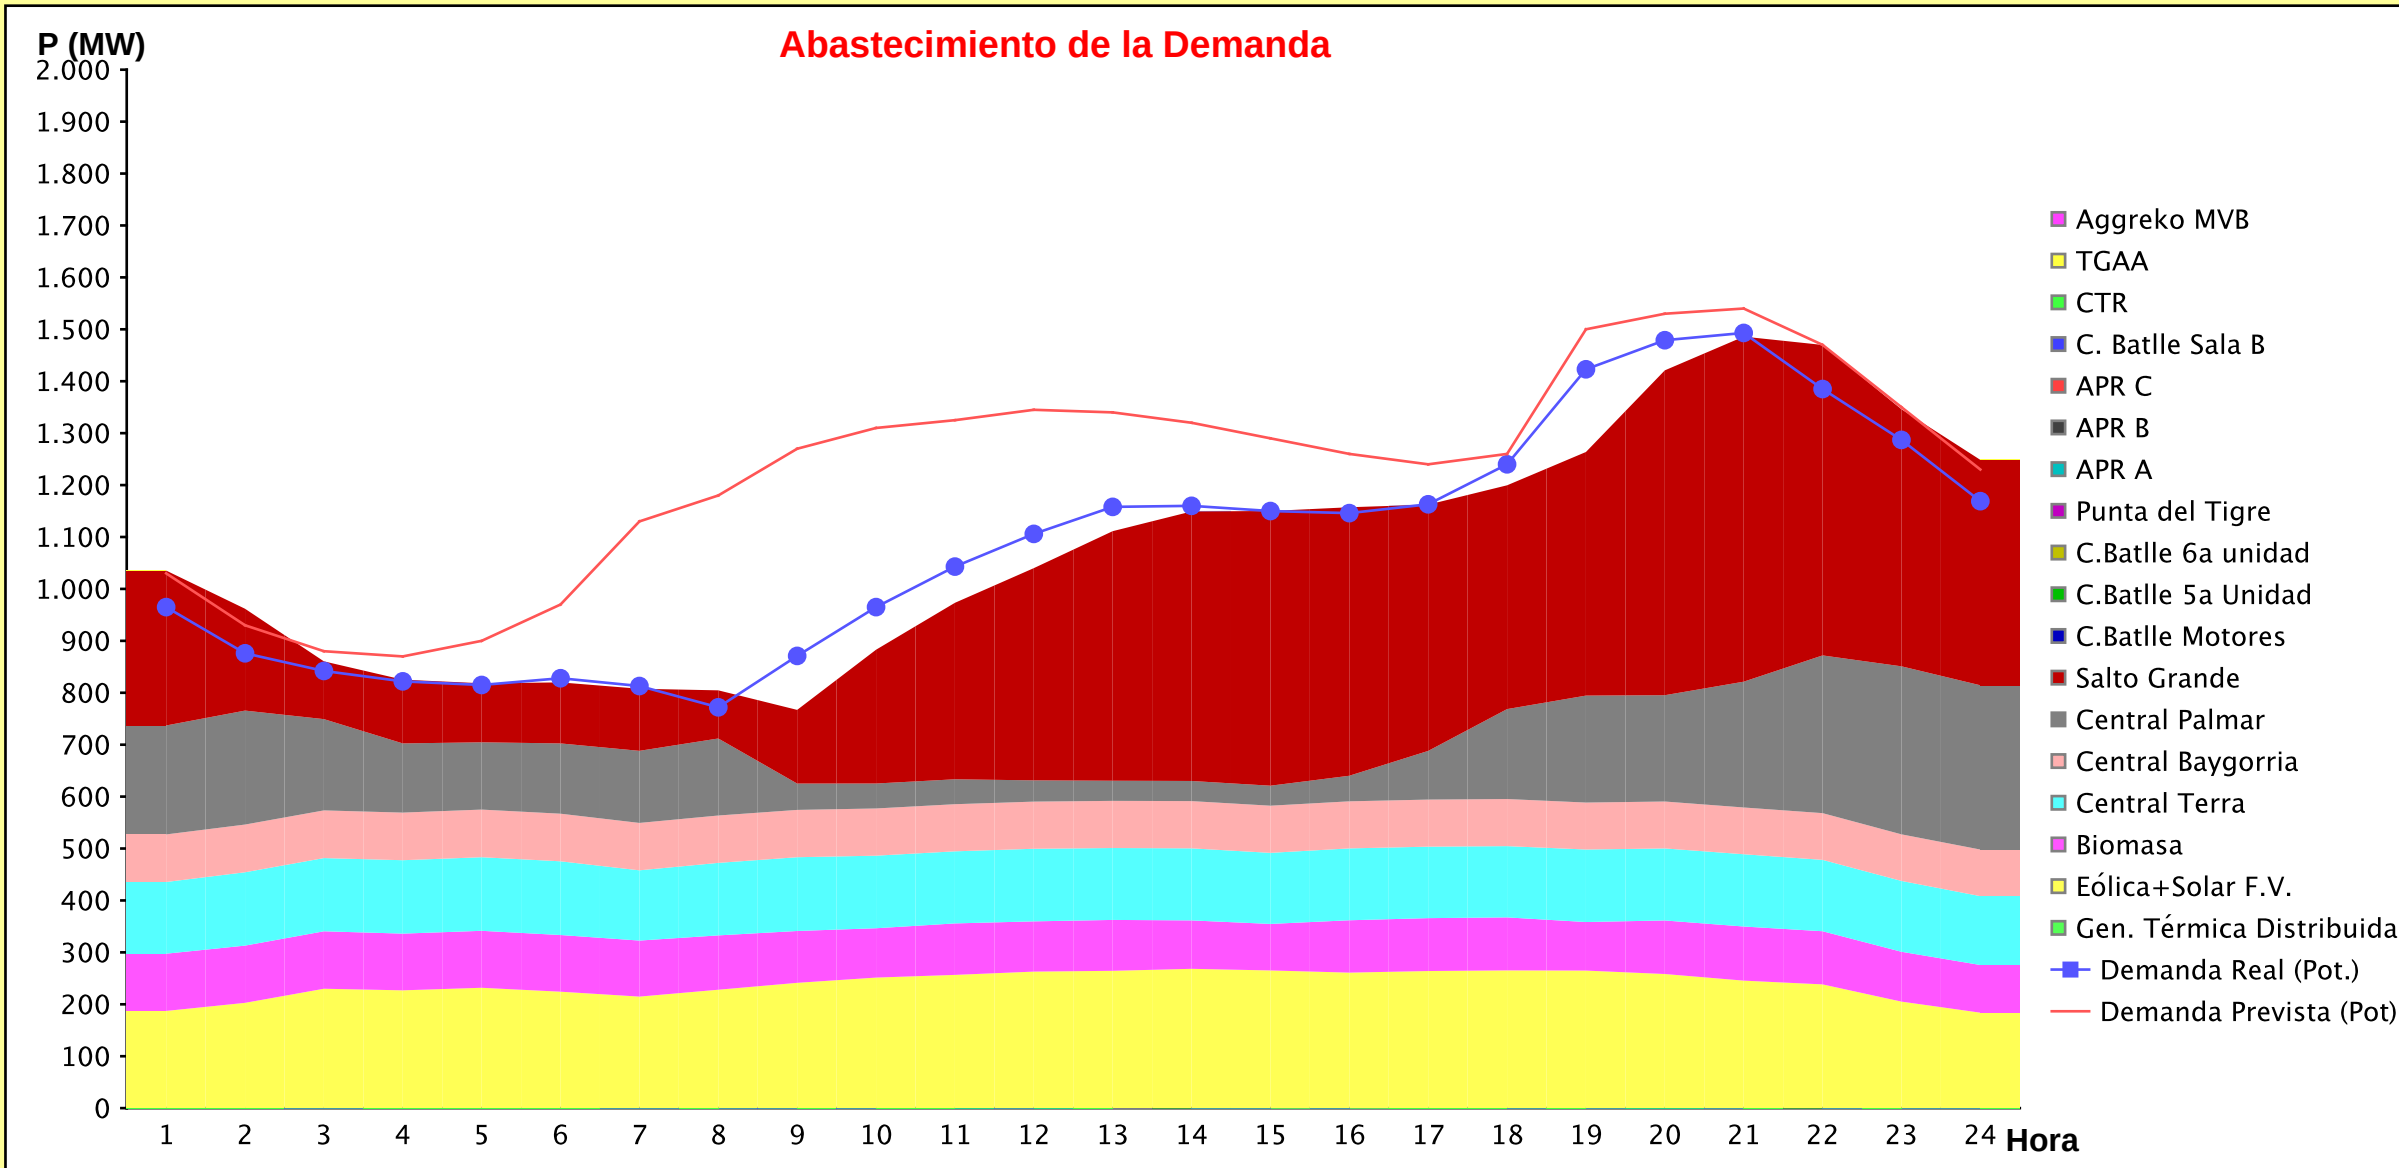



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1173,54 Hora 13:37
Potencia mínima:	760,33 Hora 07:33
Pico noche:	1503,82 Hora 21:10

Generación Media (MW)	
Eólica	239,3
Biomasa	101,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

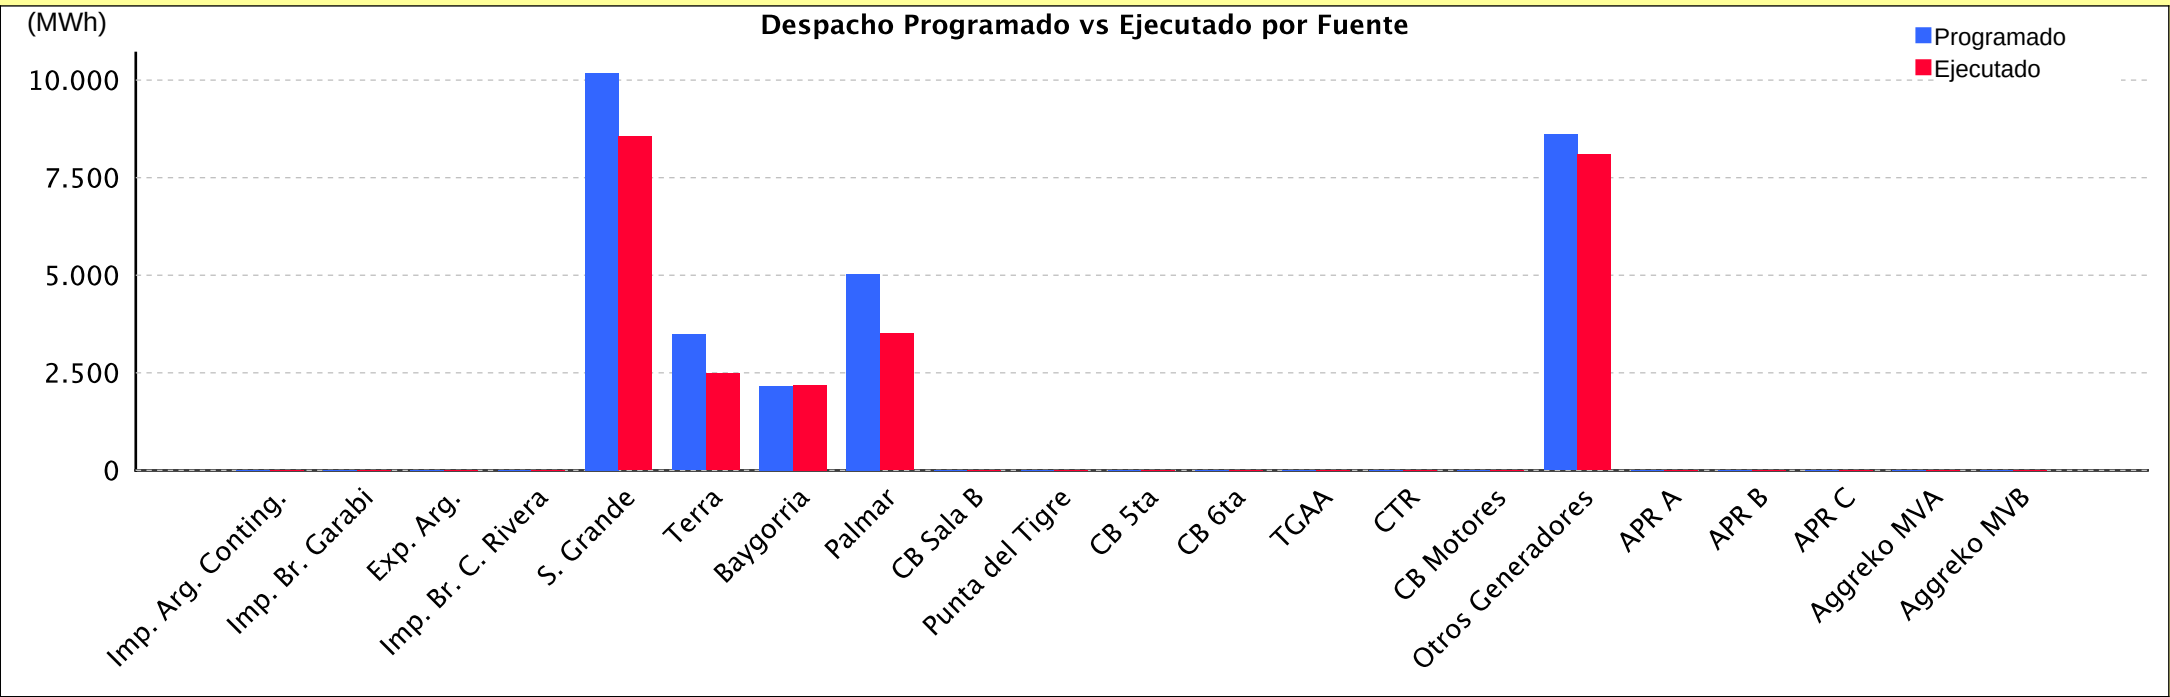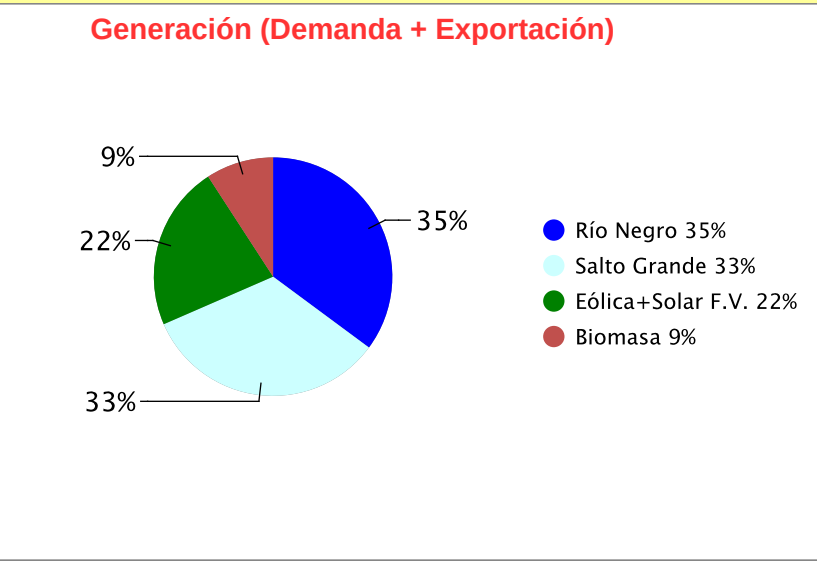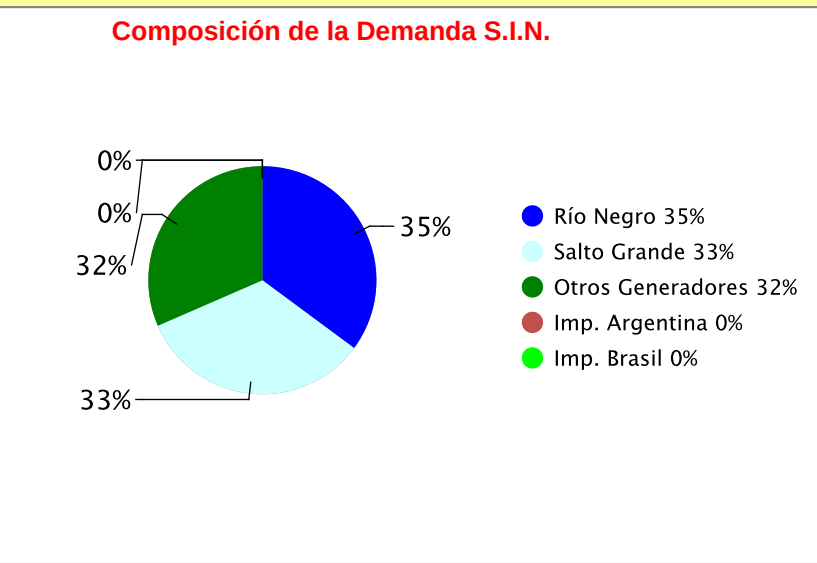



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

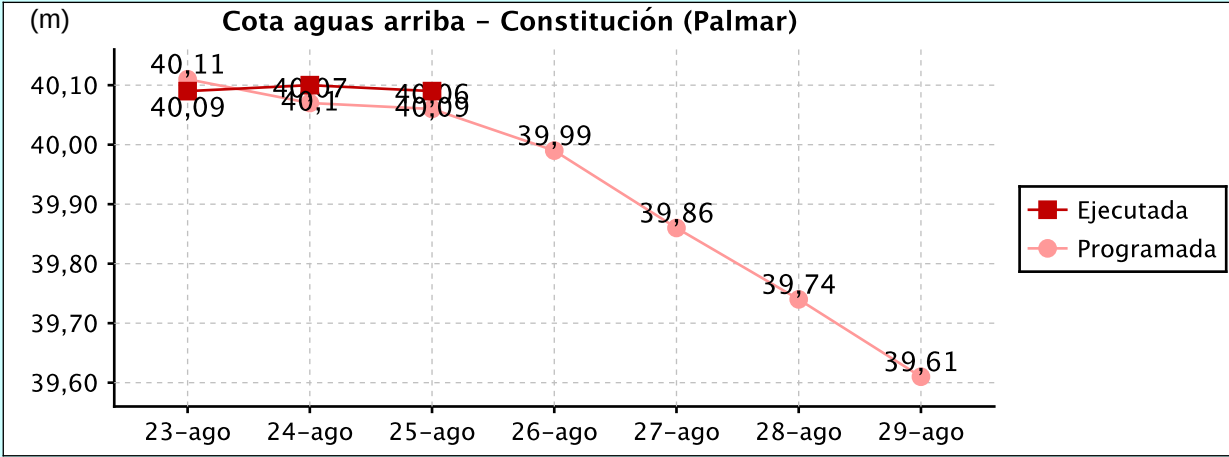
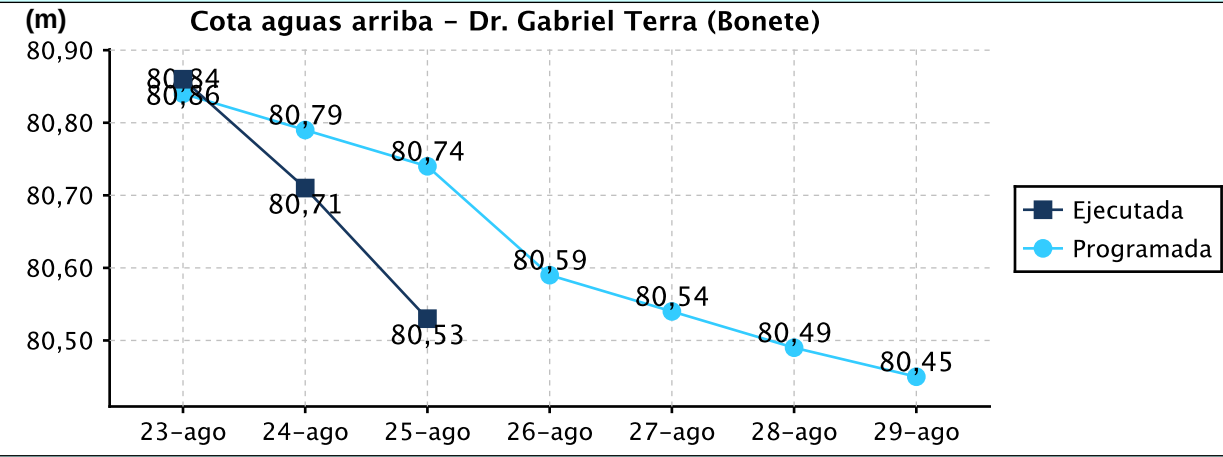


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,74	80,53
Baygorria	54,20	54,2
Palmar	40,06	40,09
SGU	35,42	35,56

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

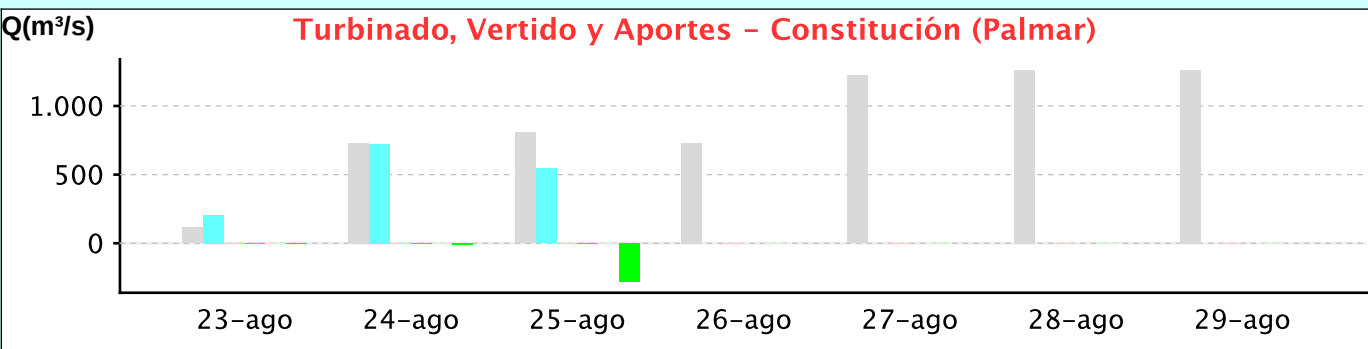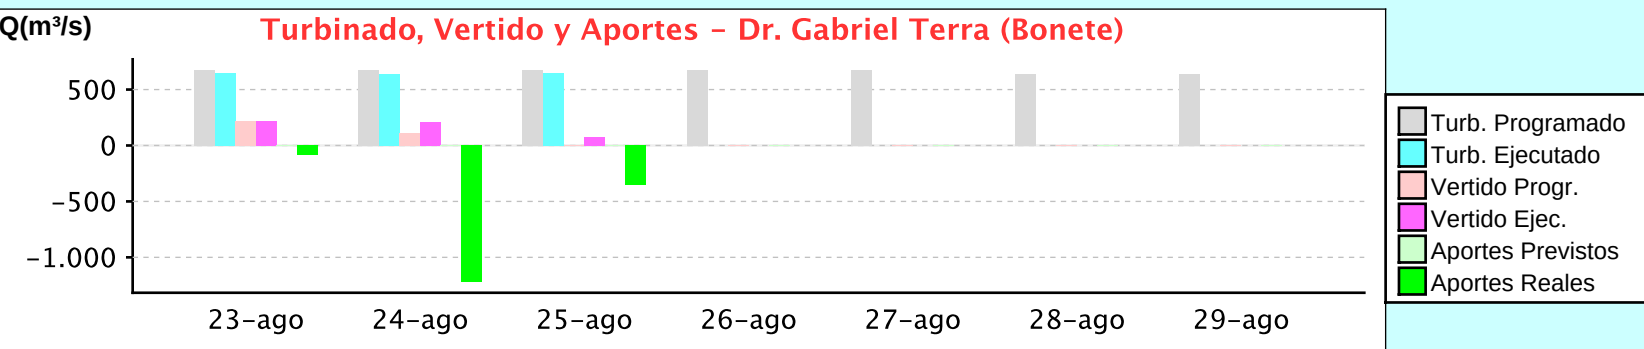

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

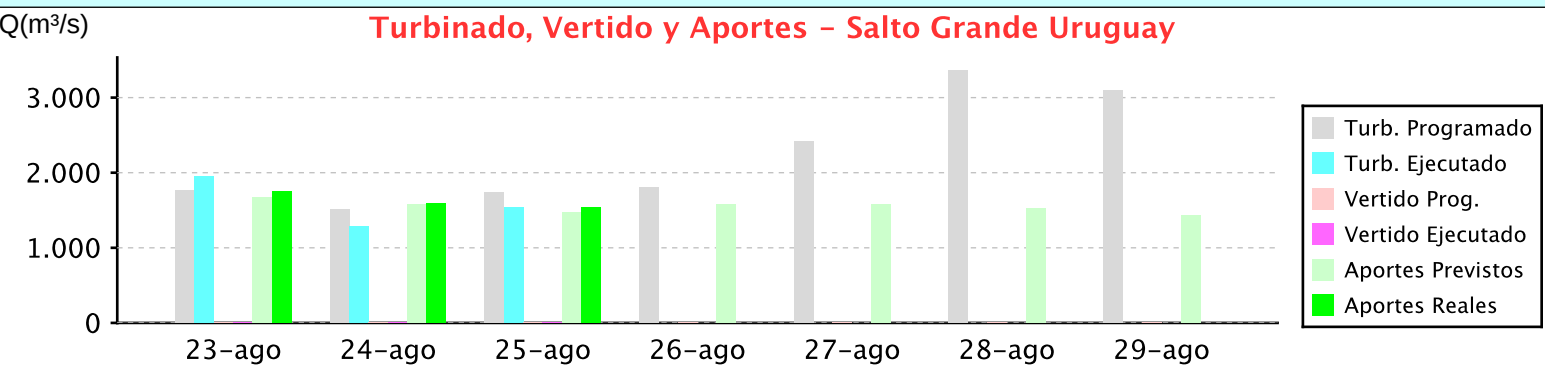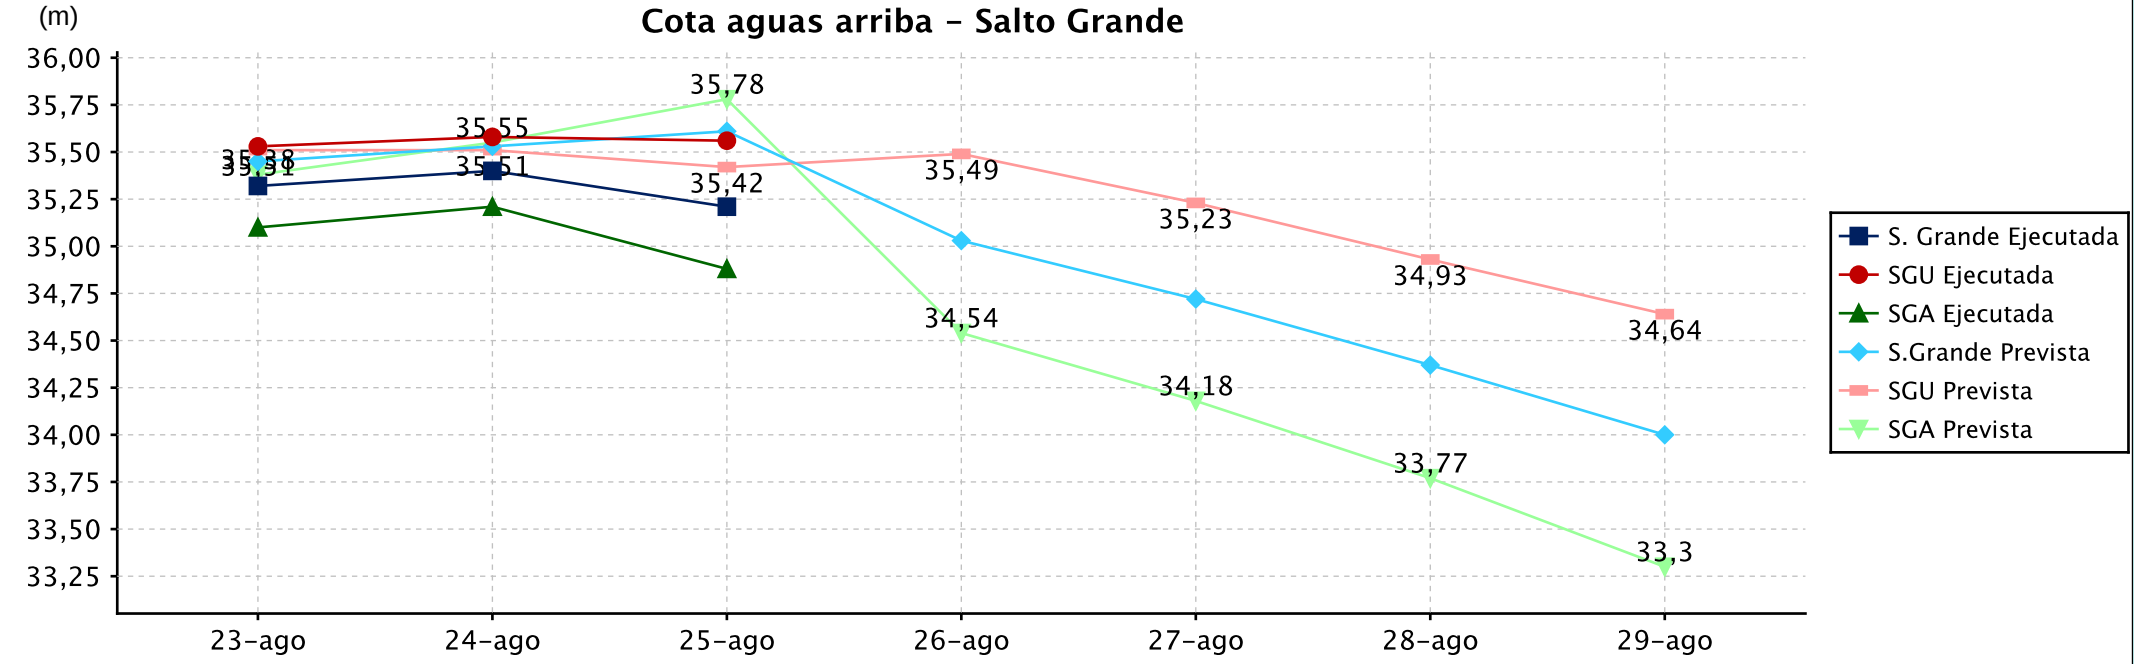

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,56
Cota Vista Arg	34,88
Cota real	35,21
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	16.458

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	675	648
Baygorria	795	800
Palmar	805	543
SGU	1.743	1.544

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-355
Baygorria	0	11
Palmar	0	-283
SGU	1.475	1.532

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	80
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
